

ANEXO No. 2
ACTAS DE REUNION

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 19	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	02-07-2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 19

PARTICIPANTES: Supervisor Mayor (P) O Nelson Mossos, Contratista de obra e interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Definición equipo de aire instrumental, instalación Final

DESARROLLO: Se realiza reunión con el Mayor (P) Nelson Mossos, Contratista de obra e interventoria con el fin de definir el sistema de conexión de los equipos de aire instrumental, el cual quedo establecido en el estudio previo LP-014-2020 Por lo anterior se programa reunión para el día Martes 6 de Julio 2021 a las 8:00 AM con el fin de llegar a consenso para la instalación de los equipos.

2 de 2

SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8

CONTRATO No 335-2020

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

ACTA DE REUNION N° 19

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO COMUNICACIÓN

FECHA

02-07-2021

REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Reunion para el
06 de Julio 2021

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Ing Cristian Herrerera Ponce
My (CA) Nelson Moscoso
Ing Edwin Goy
Ing Fabio Mejia M.

FIRMA

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 18	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	25 JUN- 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 18

PARTICIPANTES: Supervisor

Contratista de obra

Interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance contrato de obra
No 319 de 2020

DESARROLLO: Se realiza recorrido de obra y se evidencia que el contrato sigue con la ejecución de actividades las cuales se relacionan a continuación: En el capítulo de obra civil ya todas las actividades están ejecutadas, al momento se encuentran haciendo retoques a las mismas. En relación al sistema de aire ya está instalado en su totalidad los equipos y el tanque verticular, el contratista está realizando la interconexión de los equipos con los arneses necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 18	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	25-JUN- 2021 REV:00259661

igualmente se verifica que todo el personal este utilizando los elementos de protección personal, como cascos, botas, guantes, gabas. Así mismo se verifica los elementos de Bioseguridad, como topabocas, gel antibacterial, lavado de manos.

La interventoría recomienda mantener suficiente personal para la ejecución de las actividades y así terminar en el plazo contractual del contrato.

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 18	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV”.		FECHA	25-JUN-2021 REV:00259561

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

pruebas equipos

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Fabio Mejia M

My (ca) Nolasco Mozoos @h

Geo. Freddy Pizarro L

FIRMA

[Firma]

[Firma]

nan 1 de 5
pag 1 de 5

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 17	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	24 -Jul- 2021 REV:00259561

ACTA DE REUNION N° 17

PARTICIPANTES: Funcionarios de la entidad contratante Hospital Militar central, contratista de obra e interventoria.

OBJETO DE LA REUNION: Avance de ejecución y Recorrido de obra.

DESARROLLO: Se realizó recorrido de obra con todos los participantes, con el objetivo de verificar el avance de ejecución del contrato e igualmente para informar al nuevo supervisor del contrato de interventoria Mayor Moscos del estado Actual del contrato de obra. El teniente Javier Vega realizó una presentación sobre el objeto del contrato de obra el cual consistió principalmente en la modernización y puesta en funcionamiento de la tercera fase central de gases medicinales con la adquisición de equipos y adecuación de obra civil.

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 17	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	24-JUN-2021 REV:00259661

se menciona que el objetivo principal fue la adquisición de un sistema triplex, con expansión a un cuádruplex, el cual incluye secador refrigerativo, filtros, trampa de condensados, monitor fase, válvulas, manómetros y tanque vertical, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, por la interventoría igualmente se informó el alcance del objeto del contrato de obra, que aparte de los equipos instalados, también se realizó obras civiles y eléctricas tales como, demoliciones de muro, mamposterías, panele, estuco, pintura, pisos, medicación, cielo raso, instalación de lámparas, instalaciones eléctricas en general, igualmente se instalo un equipo de aire acondicionado y de extracción de aire los cuales van instalados en la parte externa del área intervenida. por parte del nuevo su-

Pag 3 de 5
pag 3 de 5

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 17	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	24 JUN- 2021 REV:00259661

supervisor, recomiendo que la obra debe de tener un acabado final según las especificaciones del contrato de obra, como lo especifica el pliego.

La interventoría le solicita al contratista de obra hacer entrega de los documentos de terminación y liquidación, ya que a la fecha no han sido entregados por el contratista de obra. dichos documentos fueron solicitados mediante oficio al contratista catekom. El contratista de obra informa que esta en proceso de recopilación y elaboración de la información solicitada por la interventoría, e igualmente dará respuesta a los oficios enviados por la interventoría.

La interventoría, solicita al supervisor información sobre los formatos de acta de terminación de contrato, Acta de liquidación y demás

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 17	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".		FECHA	24 JUN- 2021 REV:00250661

Formato necesario para la entrega final del contrato de obra e interventoria.

		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 17	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	24 JUN - 2021 REV:00259561

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

[illegible]

ASISTENTES

Luis Carlos Mongui

Edwin Antonio C65

Andrea Ravelo Joya

The Viceroy governor

Arg. Yamid Caceres 3204561231

CP MORA ALFONSO REYNEL

Ing. Johann Salinas

My (PA) Nelson Morales 24

FIRMA

[Handwritten signature]

Anderson, Bruce



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
FORMATO COMUNICACIÓN	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 16	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	18 JUN 2021 REV:00259661

de los mismos por parte de todo el personal que labora en la obra. Igualmente se verifico el uso de tapabocas, gel antibacterial y la toma de temperatura, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. La interventoria solicita agilizar las actividades para cumplir con la ejecución del contrato en el tiempo contractual cuya fecha final es el 29 de junio de 2021.

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 16	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	18 JUN 2021 REV:00259561

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA


ASISTENTES

Fabio Mejia

Edwin Antonio 05

FLEANN OLSON 2

FIRMA



FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 15	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	10-06-2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 15

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega,
Contratista de obra e interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance y ejecución
contrato de obra No 319 - 2020

DESARROLLO: Inicialmente se realiza
recorrido de obra entre los participantes
con el fin de verificar el avance del
contrato y se evidencia la ejecución
de las siguientes actividades: se continúan
con el corte de tubería de cobre para
el armado del manifold para la conexión
de los equipos medicinales, se continúan
con la instalación de la armadura
eléctrica para equipos medicinales y
compresores, se inicia el montaje
del manifold de conexión de equipo
medicinal, pintura antibacterial

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	CONTRATO No 335-2020
		ACTA DE REUNION N° 15
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	FECHA	10-06-2021 REV:00259661

en cielo raso y muros.

En la verificación de los elementos de protección personal, el personal de obra utiliza cascos, botas, guantes, gafas. Igualmente se verificó el uso de tapabocas, gel antibacterial y toma de temperaturas.

La interventoría recomienda agilizar los trabajos de conexión de equipos medicinales, ya que es necesario hacer las pruebas de los mismos, antes de la fecha de entrega final del contrato de obra.

El contratista informa que el compromiso de realizar pruebas de equipo para el día 11 de Junio de 2021, no se podrá realizar debido a que fue necesario desmontar el maníbrico para ajustes e instalación de nuevos accesorios como filtros por lo cual se reprogramaron las pruebas de los equipos.

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 15	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	10-06-2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Fabio Mejia Medina
Edwin Antonio CCA
FELIX BARRERA D

FIRMA

[Signature]

pag 1 de 3

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 14	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	02-JUN 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 14

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega,
contratista de obra e interventoría

OBJETO DE LA REUNION: Avance ejecución contrato
de obra No 319 de 2021

DESARROLLO: se realizó recorrido de obra
evidenciando el avance del contrato de obra
verificando las actividades ejecutadas
como las siguientes: instalación y
Montaje de marco y puerta Metálica.
Armado e instalación sobre base Meta-
lica de los equipos de gases medicinales.
Instalación de tubería EMT, cableado
para orometido eléctrico y para toma-
corrientes, interruptores y salidas de
alumbrado eléctrico. se comenzó
con el armado de Muñero en tubería
de cobre para la distribución y

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	
	ACTA DE REUNION N° 14	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	02 JUN. 2021 REV:00259661

entrega de gases medicinales se
 está en los trabajos de pintura.
 En lo concerniente al componente SISO
 se verificó que el personal haga uso
 de los EPP como cascos, gafas, botas,
 guantes, tapabocas.
 En la parte de bioseguridad se verificó
 el uso de tapa bocas y gel antibacterial.
 El contratista de obra informa que las
 actividades se han visto afectadas por
 el paro nacional, dada la dificultad
 de transporte para el personal de obra.

pag 3 de 3

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8		
	CONTRATO No	335-2020	
	ACTA DE REUNION N° 14		
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".		FECHA	02-Jun-2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Pruebas 11-06-2021. 08
Equipos instalados


PLAZO DE ENTREGA

11-06-2021

ASISTENTES

Ing. Freddy Estrella R
Ing. Edwin Sánchez
Ing. Fabio Mejía
Juan Ugo

FIRMA

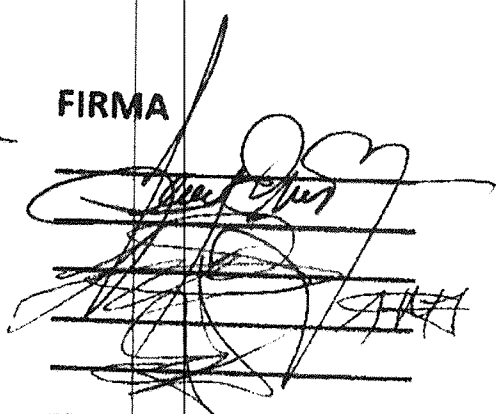

77

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 13	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	28-05-2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 13

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega,
Contratista de obra e interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance ejecución
contrato de obra No 379 de 2020

DESARROLLO: se hace recorrido de obra
en el cual se verifica el avance del
contrato en cuanto a la ejecución
de las actividades de las cuales se
instalan bases antivibratorias para
los equipos de gases medicinales, se
realizo cableado eléctrico para tomas,
corrientes, interruptores y salidas para
lamparas. se realizo apertura de
vanos en cielo raso para las lam-
paras de iluminación. se continuó
con estuco y liado en muros
y cielo raso.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 13	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	28-05-2021 REV:00259661

Se verifica que todo el personal haga uso de las EPP como, Carecas, guantes, gafas, batas, tapabocas.

En relacion a los elementos de bioseguridad, se verificó que todo el personal haga uso de los tapabocas y gel antibacterial.

El contratista de obra informa que el paro nacional que hay en el país a interferido con la programación de las actividades del contrato de obra.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 13	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	28-05-2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*
 Ing. Fabio Mejia
 Ing. *[Signature]*

FIRMA

[Signature]

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 12	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	21.05.2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 12

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega,
contratista de obra e interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance de ejecución
contrato de obra No 319 de 2020

DESARROLLO: Se realiza recorrido de obra
evidenciando el avance del contrato de
obra, igualmente se verifica las actividades
que se están ejecutando las cuales
se relacionan a continuación: se termino
de instalar el cielo raso en dry wall, se
continua con maquila en cielo raso,
estuco en muros, perforación en base
metálica para la instalación de los
equipo de gases, colocación de cavetas
antivibratorias.

En el componente SISO, se verifico
que el personal de obra este utilizando

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 12	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FECHA		27-05-2021 REV:00259661

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

los elementos de protección personal como: cascos, botas, guantes, gafas, tapabocas.

En relación al capitulo de Bioseguridad, se lleva el control de Temperaturas, igualmente se verifica la utilización del tapabocas, utilización de gel antibacterial.

La interventoria recomienda al contratista de obra, mantener el personal necesario y un stock de materiales para evitar atrasos en el contrato y que se pueda ejecutar en el tiempo contractual.

	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 12	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FORMATO COMUNICACIÓN	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	
	FECHA	27-05- 2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Instalación de Acometida de Fuerza para Motores a 440 V

Acometida triforica
por iluminación y
tamoreamiento.

PLAZO DE ENTREGA

24 Mayo 2021

24 Mayo 2021

ASISTENTES

Ing. Edwin Antonio Ag

Ing. Fabio Merino

T. Andre Azevedo Nobrega

TEVEGA SAVITN

1000. *Arctostaphylos* L.

FIRMA

[Signature]

[Handwritten signature]

~~Anda Puyf~~

~~SECRET~~

~~_____~~

[illegible]

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 11	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	11 May 2021	
	FECHA	- - 2021
		REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 11

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
contratista de obra e Interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance contrato de
Obra No 319 de 2020

DESARROLLO: Se realizó recorrido de obra
evidenciando el avance y ejecución
de las actividades del contrato de obra
N. 317 de 2020. se están realizando
actividades de esbozo y litado de muros,
instalación de tubería EMT 1/2 para
instalaciones eléctricas, se realizó
desmonte de equipos.
En el componente SISO, se verificó que
el personal de obra utiliza los elementos
de protección personal como, cascos,
guantes, botas, gafas, tapabujidos,
caretas.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 11	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	11 MAY - 2021 REV:00259661

En relación al tema de Bioseguridad, se
utilizo el tapabocas permanente,
gel antibacterial y toma de temperatura
diaria.

SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
FORMATO COMUNICACIÓN "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	CONTRATO No 335-2020
	ACTA DE REUNION N° 11
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	FECHA 11 MAY 2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Realización pruebas de equipos.


PLAZO DE ENTREGA

26 al 31 mayo de 2021

ASISTENTES

Sr. Freddy B. Sandoz R.
 Ing. Fabio Mejia
 Te Vega Jans E.

FIRMA

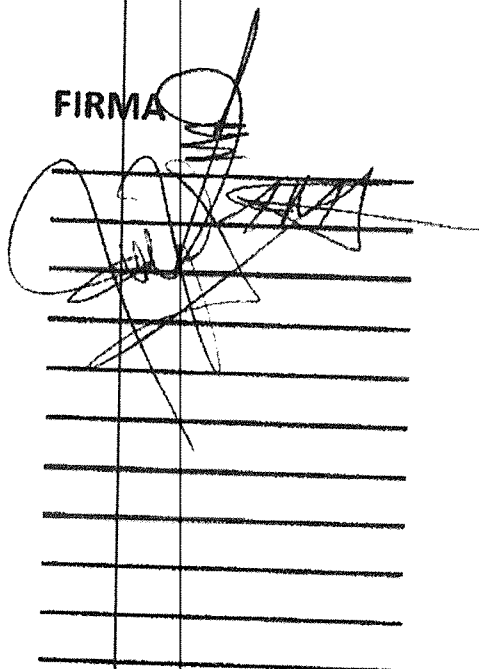
 [Illegible signature]

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 10	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	29-Abril-2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 10

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
Contratista de obra e Interventoría

OBJETO DE LA REUNION: Avance contrato de obra
No 319 de 2020.

DESARROLLO: Se realizó recorrido de obra en el cual se evidenció las actividades efectuadas a la fecha, las cuales son las siguientes: Apertura de huecos en cielo raso, instalación de tuberías EMT de 2" y 1/2" para instalaciones eléctricas, pulido y brillo de piso en granito, Desmonte de equipos, llegada de compresor de Aire Acondicionado, pintura y pintura en cielo raso pasillo principal.

Igualmente se verificó que el personal de obra utilice los elementos

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 10	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	29-Abril-2021 REV:00259661

de protección personal como cascos, guantes, botas, tapa-bocas, gafas y demás elemento de bioseguridad. El contrato tiene un avance programado del 55.05% y un porcentaje ejecutado del 70.74%.

La interventoría recomienda mantener la mano de obra suficiente para evitar posibles atrasos del contrato de obra e igualmente el material necesario para las actividades del contrato de obra.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 10	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	29 Abril 2021 REV:00259661


OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Ing. Fabio Mejia
Dra. Fredy E. Tiam R.
U. Velez

FIRMA



FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 09	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	13 Abril 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 09

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
contratista de obra e Interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance contrato de
obra No. 319 de 2020

DESARROLLO: Se realiza comite de obra en el cual el contratista Ca-tekom informa sobre el avance de ejecución de las actividades contractuales del contrato de obra No 317 de 2020, las cuales se encuentran en ejecución y otras terminadas al 100%. actualmente se estan ejecutando actividades de estuco y lijado de muros, aplicación de pintura antibacterial, lijado de cielo raso, aplicación de pintura vinilo tipo 1, aplicación de pintura antibacterial, instalación de baldosa en granito, instalación de

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 09	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	
	FECHA	13 Abril 2021 REV:00259661

de media caña en granito, pulida y
brillada de piso nuevo. igualmente se eviden-
ció el equipo a desmontar.
La tubería galvanizada de transporte de
Gases se instalará una vez llegren los
equipos del sistema de gases.
La interventoria solicita se entregue
la justificación de los imprevistos cobra-
dos en el acta de corte parcial de obra N. 1
El contratista de obra informa que ya
se remitió el informe de justificación de
los imprevistos a la interventoria.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 09	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	13 Abril 2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

• Llegada de Equipo de Gases

• Llegada de compresor del Aire Acondicionado

PLAZO DE ENTREGA

14 Abril 2021

14 Abril 2021

ASISTENTES

Te Vega Jan
Ing. Fabio Mejia
Sra. Piedad B. JUAN R.

FIRMA

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 08	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FECHA		09-Abril 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 08

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
contratista de obra e interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Avance contrato de
obra N. 319 del 2020.

DESARROLLO: se realiza recorrido de obra
y se evidencia el estado actual del
contrato y se verifica que el cielo
raso esta instalado en su totalidad,
se estan realizando actividades de
pulido de piso en granito, instalacion de
baldosa en granito, instalacion de dilatacion
en bronce, embagullada de piso, enma-
rillado de cielo raso.

En el componente SISO, se verificó que
todo el personal de obra utilice los
elementos de proteccion personal tales
como cascos, botas, guantes, Gafas

pag 2 de 3

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 08	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	09-Abril 2021 REV:00259661

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

Tapa oídos.

La interventoria requiriendo mantener un stock de materiales y mano de obra suficiente para evitar posibles atrasos en la ejecución del contrato y que se pueda ejecutar en el tiempo contractual.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 08	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	09 Abril 2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

- Llegada de sistema de aire instrumental
- Llegada del compresor del aire Acondicionado

PLAZO DE ENTREGA

13 Abril 2021
13 Abril 2021

ASISTENTES

Ing Edwin Coy
Ing Fabio Mejia
Le Vega Juan E
DRA. FREDY B. GILLES

FIRMA

[Handwritten signatures]

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 02	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	25-MAR 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 02

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
Contratista de obra e interventoria.

OBJETO DE LA REUNION: Recorrido de obra
y Verificación Avance contrato de
obra N. 319-2020

DESARROLLO: Se realiza inicialmente
recorrido de obra, y se verifica
que se están ejecutando actividades
de fatura sobre muro, pintura sobre
muro, instalaciones eléctricas,
La instalación de acondicionador de aire
acondicionado, pintura de piso en
granito, cableado eléctrico.
Igualmente se realizó recorrido
sobre cubierta para identificar
el estado de la impermeabilización
existente, y se constata el deterioro
de la misma. Así mismo se

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 07	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	25-MAR-2021 REV:00259661

evidencia que existen elementos sobre la cubierta los cuales deben ser retirados para poder ejecutar la Actividad de impermeabilización.

Se verifica que el personal utilice los elementos de protección personal como cascos, guantes, botas, uniformes.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 07	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	25-MAR 2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

Te Vega Juan E
Torres Leon Antanasios
Torres Fabian Mejia

FIRMA





Fig. 1-3.

FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 06	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".		FECHA	19-MAR 2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 06

PARTICIPANTES: Supervisor Teniente Javier Vega
Contratista de obra
Interventoria

OBJETO DE LA REUNION: Recorrido de obra y
avance del contrato de obra N. 319-2020

DESARROLLO: Se realiza recorrido de obra
y se evidencia que se estan ejecutando
actividades de: estuco, pintura vinilo,
instalación de base metálica para montaje
del condensador de Aire, destruncado de
piso nuevo y existente, instalación de
Salidas para toma corrientes normales,
regulados, interruptores, salidas de
emergencia, instalación de cajas de
paso, instalación de tubería EMT 1/2"
y 3/4"

Se verifica que el personal de obra
cumple con los elementos de protección

pag. 2-3.

	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 06	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FORMATO COMUNICACIÓN	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".	
	FECHA	19 - MAY 2021 REV:00259661

personal, como cascos, guantes, gafas, batas.

La interventoría verificó el equipo del compresor de Aire Medicinal, el cual está en bodega de la firma contratista, el cual cumple con las especificaciones del contrato.

		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 06	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
FORMATO COMUNICACIÓN	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".		FECHA 19-ABR-2021 REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

* Entrenamiento a personal técnico
agosto de vanificación mecánica
14 A.D. —


PLAZO DE ENTREGA

26-03-2021.

ASISTENTES

DR. Freddy Fortuna R. CARRERA FOS.
Fabio Mejia M
Teleguier E

FIRMA


FORMATO COMUNICACIÓN		SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
		CONTRATO No	335-2020
		ACTA DE REUNION N° 05	
		HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA	24/11/2021 REV:00259661

ACTA DE REUNION N° 05

PARTICIPANTES: Supervisores, Ingenieros de Obra y Administrativos

OBJETO DE LA REUNION: Reunión de trabajo para la implementación de la obra

DESARROLLO: Se realizó una reunión con los supervisores, ingenieros de obra y administrativos para la implementación de la obra. Se discutió el estado de la obra y se acordó la siguiente agenda de trabajo para la próxima semana. Se acordó que los supervisores y ingenieros de obra se reúnan los días lunes y miércoles para discutir los avances de la obra y los días martes y jueves para discutir los aspectos administrativos de la obra. Se acordó que los días viernes se reúnan los supervisores y ingenieros de obra para discutir los aspectos técnicos de la obra. Se acordó que los días sábados se reúnan los supervisores y ingenieros de obra para discutir los aspectos de seguridad de la obra.

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 05	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
	FECHA	09-MAR 2021 REV:00259661

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

Recibido por personal de la Gerencia de Supervisión Técnica y Mantenimiento de la Sección de Registro y Radicación

(Pag 3 de 4)

SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8

CONTRATO No 335-2020

ACTA DE REUNION N° 05

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA

09 -MAR- 2021

REV:00259661

FORMATO
COMUNICACIÓN

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES:
"CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE -
CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA
INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL III Y IV".

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES



Te Vega para

David Vega

Edwin Vega Medina

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO DUCTOS EXISTENTES DESMONTADOS

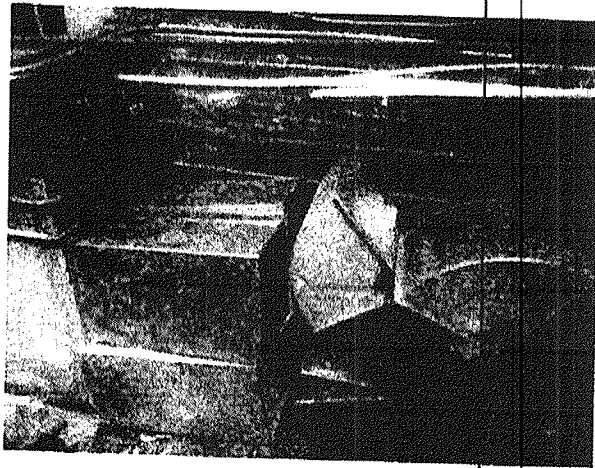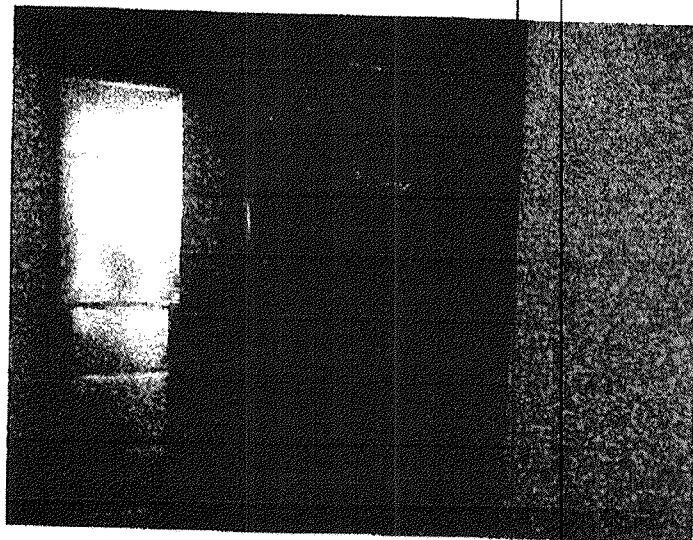

SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

CONTRATO No 335-2020

ACTA DE REUNION N° 04

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA

05-Mar-2021

REV:00259661

FORMATO COMUNICACIÓN

ACTA DE REUNION N° 04

PARTICIPANTES: Supervisor del contrato de Interventoría
Contratista de obra e interventoría.

OBJETO DE LA REUNION: Avance de ejecución
del contrato de obra No 319 de 2020.

DESARROLLO: Se inicia la reunión entre los
participantes, con el objetivo de verificar
el avance del contrato de obra N. 317-2020.
En revisión de la programación de obra
se puede evidenciar que existen actividades
que todavía no han iniciado las cuales
se relacionan a continuación:

- Item 1: Sistema de Aire Instrumental

Fecha inicio: 25 enero 2021.

Fecha terminación: 23 Abril 2021.

- Item 2.05 Desmonte de equipos

Fecha inicio 01 febrero 2021

- Item 3.01 Bases en bloque y concreto para

FORMATO COMUNICACIÓN	SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8	
	CONTRATO No	335-2020
	ACTA DE REUNION N° 04	
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
		FECHA
		05-May-2021
		REV:00259661

equipos

Fecha inicio: 15 Febrero 2021

El contratista de obra informa que el ítem 1 iniciará actividades el día 8 de marzo 2021, debido a que el proveedor de la tubería, por las condiciones de importación tuvo un retraso en la entrega del pedido del material.

Con respecto al ítem 2.05 Desmonte de equipos, el contratista informa que esta actividad se ha venido ejecutando con el desmonte de los ductos de ventilación existentes.

En relación al ítem 3.07 Bases en bloque y concreto para equipos, esta actividad ya se inició con el descapote y nivelación del terreno donde se construirán las placas para la instalación de los nuevos equipos.

La interventoría solicita al contratista de obra, la entrega de los planillos de

SOLIDOS SAS NIT 830.111.297-8

CONTRATO No 335-2020

ACTA DE REUNION N° 04

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA

05-Mar-2021

REV:00259661

FORMATO
COMUNICACIÓN

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV".

Seguridad social y el informe de
Seguridad y Salud en el trabajo, corres-
pondiente al mes de febrero de 2021
