



**FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -
FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1002 de 2021, MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA
GUAJIRA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (LA GUAJIRA)		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CRA 15A #2-25 – ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON		\$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		\$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$ 1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-May-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28-Feb-2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28-Feb-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	OSCAR MARTINEZ CUADRADO		DESDE: 31-May-2021
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	N/A	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	RAFAEL EDUARDO SALAS RODRÍGUEZ	31-May-2021	
	N/A	DD-MES-AAAA	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3014874	24-May-2021	

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-May-2021	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 24/05/2021-CUMPLIMIENTO	
	N/A	
	N/A	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$ 0	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.000	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 2. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO 3. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro	NO APLICA	30/06/2021	\$ 300.000.000,00

	de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	<ol style="list-style-type: none"> 1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI), junto con la presentación de 2. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. 	NO APLICA	NO HA SIDO PAGADO	\$ 250.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	<ol style="list-style-type: none"> 1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir. 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. 4. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP 	90%	NO HA SIDO PAGADO	\$ 500.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	<ol style="list-style-type: none"> 1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de. 	100%	NO HA SIDO PAGADO	\$ 200.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 300.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3014874	Cumplimiento	\$ 250.000.000,00	14/05/2021	31/08/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra (Adjudicado)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato:	N/A		
Link de Consulta:	N/A		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		\$ 0,00
	N/A		\$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		N/A
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	N/A	Fecha Actual de terminación del contrato	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A		
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra (Adjudicado)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato:	N/A		\$
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		\$ 0,00
	N/A		\$ 0,00
Nombre contratista	N/A		NIT
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		N/A
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	N/A	Fecha Actual de terminación del contrato	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		
	N/A		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	<p>Se firma un convenio interadministrativo celebrado entre la nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Villanueva (La Guajira), cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (LA GUAJIRA)", de este convenio de derivan dos contratos, el de estudio, diseño y obra y el de interventoría, posterior a la adjudicación de los contratos derivados viene la etapa de ejecución, esta tiene dos partes, la primera corresponde al estudio y diseño, al hacer entrega de los documentos requeridos viene la ejecución de la obra, en las dos etapas están integradas con la interventoría respectiva.</p>
---------------------	--



**FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -
FONSECON**

GENERALIDADES

- Se dio acta de inicio el 31 de mayo de 2021
- Se inicio el proceso precontractual de los estudios, diseño y obra el día 18 de junio de 2021
- Se recibió el primer desembolso el 30 de junio de 2021.

➤ **Avance de Estudios, Diseños y de Obra (sin contratar)**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

➤ **Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra (sin contratar)**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

➤ **Gestión técnica y documental.**

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES

FECHA OFICIO	REFERENCIA RADICADO	- ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE


➤ **Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.**

NOMBRE	CARGO

➤ **Información Avance Físico – Avance Financiero**

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

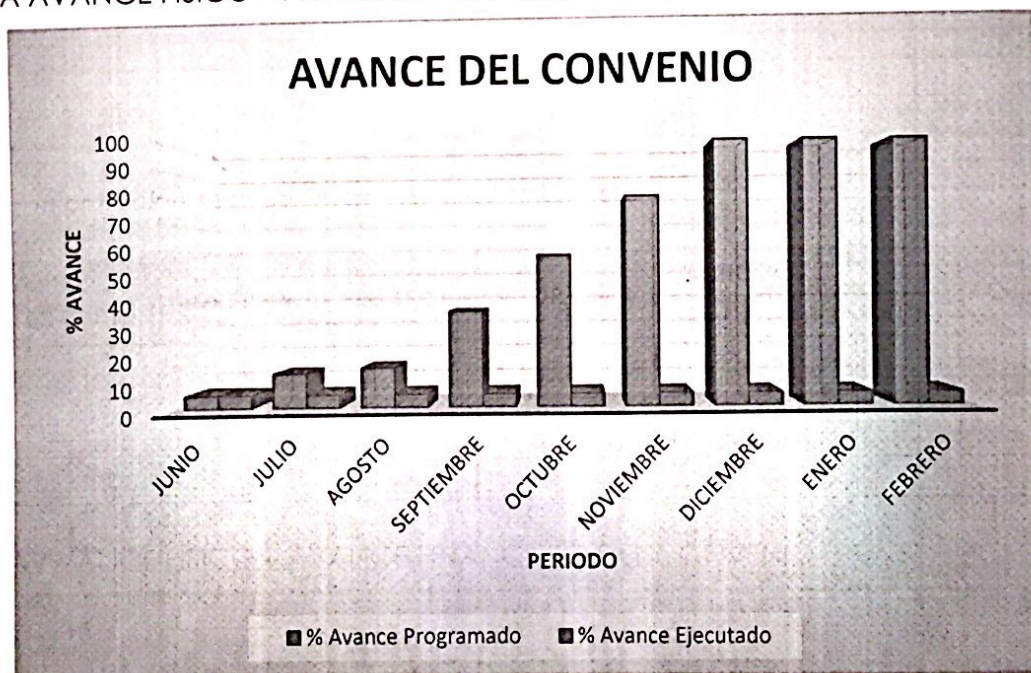

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
1.1	VISITAS TECNICAS		



**FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -
FONSECON**

	N/A		
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	N/A
---	-----

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

N/A					

8. SUPERVISOR

 OSCAR MARTINEZ CUADRADO Supervisor del Convenio Secretario de Planeación e Infraestructura	 RAFAEL EDUARDO SALAS RODRÍGUEZ Apoyo a la Supervisión
--	---
