

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC		Versión: 01 Vigente desde : Octubre 18 de 2018		
FOR-GHT-03				
RADIADO INTERNO:		RECIBIDO POR:		
Diligenciar Únicamente a Computador				
INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA				
1- Clase y Datos del Contrato				
Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRA		Nro. 1061 de 2018	Fecha: 17 08 2018	
Proveedor: LIBARDO CONDE LASSO		NIT: X	C.C. 4.884.664	
Dirección: CALLE 70 No 1D-19		Teléfonos: 315-8236628		
Establecer si es Secop I o II: secop I		Código del contrato por Secop II: MNSDSAMOP049-2018		
Cesión de contrato: SI No X		Entidad donde realiza el Aporte: Banco		
Aporte a pensiones voluntarias: SI No X		Aporte cuenta AFC: X		
Cuenta de ahorro por C.V. Pension Vol.		Banco		
2- Sistema automatico de pagos (SAP)				
Cuenta Bancaria:	07618651246	Banco:	Bancolombia	
3- Información Tributaria		Ahorros:	X	
Régimen Común:	X Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta:	Régimen Simplificado	
Gran Contribuyente:	Prima el factor material	Prima el factor intelectual:	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Nro. de pago de derechos de contratación original:	2018902000002156	Nro. de derechos de contratación adicionales:		
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)				
Pago a Tercero:	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos:	Apoderado	
Beneficiario:		Cual?		
Cuenta Bancaria:		Banco:		
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO				
5- Información del Compromiso				
Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato "el objeto"				
CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA.				
Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto) Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de (2018)				
Forma de Pago: Copiar tal cual aparece en el contrato CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: El Municipio cancelará al Contratista el valor del presente contrato. La entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor.				
Fecha de Inicio:	10 09 2018	Adición No.:		
Valor compromiso inicial:	\$ 353.386.558,75	Valor adición(es):		
		Valor total compromiso:	\$ 353.386.558,75	
6- Clase de Pago				
Único Pago:	Pago Final	Pago Parcial No.:		
Período:		De:	Fecha 02 10 2018	
		A:	Fecha 30 10 2018	
Parcial:		1	% Acta Parcial 49,81%	
		Valor Acta Parcial:	176.032.526,25	
Entrada a Almacén No.:		Fecha Entrada:		
Otros:		Cual:		
7- Pago de Seguridad Social				
Períodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
SEPTIEMBRE	4.500,00	136.000,00	106.300,00	8658312033
OCTUBRE	4.500,00	136.000,00	106.300,00	8658002293
OCTUBRE	38.100,00	87.500,00	68.400,00	8657215314
OCTUBRE	4.100,00	125.000,00	97.700,00	13687516
OCTUBRE	54.400,00	125.000,00	31.300,00	8485415931
OCTUBRE	53.600,00	87.600,00	350.000,00	8657215459
8- Registros Presupuestales y Valores a afectar				
Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2106,2151 y 2795	3763	0206, 0210, 0101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 177.354.032,50	\$ 176.032.526,25
Valor a cobrar en letras y pesos \$ CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$176.032.526,25).				
9- Autorización del pago:				
Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.				
Firma del Contratista:	Firma del Interventor (si aplica):	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)		
ING. LIBARDO CONDE LASSO	ING. Jairo RODRIGUEZ BOCANEGRA	DRA. LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ		
INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD O TESORERÍA				
10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería				
visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)		Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación		
11- Devolución				
Causa	Fecha	Radición	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

BANCOLOMBIA

CERTIFICA QUE:

El cliente **LIBARDO CONDE LASSO** identificado con CC. **4884664** se encuentra vinculado con nuestra entidad financiera a través de la siguiente cuenta:

PRODUCTO	NUMERO	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	076-186512-46	ACTIVA

Cualquier información adicional puede ser solicitada al teléfono 8763016 en donde con gusto atenderemos sus inquietudes.

El presente certificado se expide a solicitud de la interesada a los Veintidós (22) días del mes de Octubre de 2018.

Cordialmente

BANCOLOMBIA
Neiva - Of. 076 Neiva

Ejecutivo Senior No 227
Cédula No
YEIMY LORENA MOJICA SANABRIA
Ejecutivo Senior Centralizada
Gerencia de Zona
Neiva

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8658312033
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8691729803
Fecha Pago Planilla: 2018-09-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LIBARDO CONDE LASSO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	clle 70 # 1 D 19 colmenares	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	libardolasso@yahoo.es	TELÉFONO	0
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	PRIMER APELLIDO	CONDE	SEGUNDO APELLIDO	LASSO
PRIMER NOMBRE	LIBARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 09	Año: 2018	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$781.242		8658312033

Septiembre 2018

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 8658002293

REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8691729803

Fecha Pago Planilla: 2018-10-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LIBARDO CONDE LASSO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	clle 70 # 1 D 19 colmenares	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	libardolasso@yahoo.es	TELÉFONO	0
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	PRIMER APELLIDO	CONDE	SEGUNDO APELLIDO	LASSO
PRIMER NOMBRE	LIBARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 10	Año: 2018	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$781.242		8658002293

Octubre 2018

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8657215314
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605551344
Fecha Pago Planilla: 2018-11-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHN EDISON JORDAN TEJADA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79628185	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 4 41	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	johnjordan_08@hotmail.com	TELÉFONO	8643475
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79628185	PRIMER APELLIDO	JORDAN	SEGUNDO APELLIDO	TEJADA
PRIMER NOMBRE	JOHN	SEGUNDO NOMBRE	EDISON		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 10	Año: 2018	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		8657215314

Octubre 2018

RESIDENTE



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 13687516
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2018-10-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM IGNACIO RAMON MUNOZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12121175	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 8B No 40B 15	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	williramon@yahoo.es	TELÉFONO	8779717
FAX	8779717	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12121175	PRIMER APELLIDO	RAMON	SEGUNDO APELLIDO	MUNOZ
PRIMER NOMBRE	WILLIAM	SEGUNDO NOMBRE	IGNACIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 10	Año: 2018	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		13687516

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900459501	4	AGROCIVIL DEL SUR LTMD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGROCIVIL LTDA	CARRERA 10 N. 9-21	NEIVA-HUILA	8721465	SI

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-10	2018-11	382424009	6485415931	E	2018/11/02	2018/11/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,089,000

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Iden	tae	dp	ap	sp	cor	vt	ln	lge	lma	vac	ap	py	ct	lrl	vlp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AGROCVIL LTDA (39 Afiliados)																						\$25,807,040	\$4,112,600			\$27,369,524	\$1,212,200			\$29,676,831	\$1,011,400			\$27,369,524	\$792,800			\$0	\$0	\$7,089,000
Centro de Trabajo: AGROCVIL ADMON (4 Afiliados)																						\$3,072,886	\$491,700			\$3,072,886	\$123,100			\$3,072,886	\$123,100			\$3,072,886	\$16,200			\$0	\$0	\$754,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																						\$3,072,886	\$491,700			\$3,072,886	\$123,100			\$3,072,886	\$123,100			\$3,072,886	\$16,200			\$0	\$0	\$754,100
1	CC	1075277089																		230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS037	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$4,100	30	\$0	\$0	SI	\$191,700
2	CC	1075307488	X																	25-14	28	\$729,160	\$116,700	CCFC24	28	\$729,160	\$29,200	CCF32	28	\$729,160	\$29,200	14-28	28	\$729,160	\$3,900	28	\$0	\$0	SI	\$179,000
3	CC	1075259131																		230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS005	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$4,100	30	\$0	\$0	SI	\$191,700
4	CC	1075544289																		25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS044	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$4,100	30	\$0	\$0	SI	\$191,700
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (8 Afiliados)																						\$3,958,297	\$619,000			\$3,958,297	\$144,200			\$3,932,255	\$143,100			\$3,958,297	\$248,600			\$0	\$0	\$1,154,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)																						\$3,958,297	\$619,000			\$3,958,297	\$144,200			\$3,932,255	\$143,100			\$3,958,297	\$248,600			\$0	\$0	\$1,154,900
5	CC	83235580																		230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS044	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$54,400	30	\$0	\$0	SI	\$242,000
6	CC	79455671	X	X																25-14	4	\$104,166	\$16,700	EPS017	4	\$104,166	\$4,200	CCF32	4	\$104,166	\$4,200	14-28	4	\$104,166	\$7,300	4	\$0	\$0	SI	\$32,400
7	CC	79455671							X											25-14	6	\$156,249	\$18,800	EPS017	6	\$156,249	\$0	CCF32	6	\$156,249	\$0	14-28	6	\$156,249	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$18,800
8	CC	88306207																		230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS023	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$54,400	30	\$0	\$0	SI	\$242,000
9	CC	1022989711	X	X																25-14	3	\$78,125	\$12,500	EPS005	3	\$78,125	\$3,200	CCF32	3	\$78,125	\$3,200	14-28	3	\$78,125	\$5,500	3	\$0	\$0	SI	\$24,400
10	CC	1075289093																		230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS016	30	\$781,242	\$31,300	CCF32	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$54,400	30	\$0	\$0	SI	\$242,000
11	CC	1075304459																		230301	29	\$755,201	\$120,900	EPS037	29	\$755,201	\$30,300	CCF32	29	\$755,201	\$30,300	14-28	29	\$755,201	\$52,600	29	\$0	\$0	SI	\$234,100
12	CC	1075304459									X									230301	1	\$26,042	\$4,200	EPS037	1	\$26,042	\$1,100	CCF32	0	\$0	\$0	14-28	1	\$26,042	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$5,300
13	CC	7697766	X	X																230201	7	\$182,290	\$29,200	EPS037	7	\$182,290	\$7,300	CCF32	7	\$182,290	\$7,300	14-28	7	\$182,290	\$12,700	7	\$0	\$0	SI	\$56,500
14	CC	7697766								X										230201	4	\$104,166	\$12,500	EPS037	4	\$104,166	\$0	CCF32	4	\$104,166	\$0	14-28	4	\$104,166	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$12,500
15	CC	1024535285							X	X										230301	4	\$104,166	\$16,700	EPS023	4	\$104,166	\$4,200	CCF32	4	\$104,166	\$4,200	14-28	4	\$104,166	\$7,300	4	\$0	\$0	SI	\$32,400
16	CC	1024535285								X										230301	4	\$104,166	\$12,500	EPS023	4	\$104,166	\$0	CCF32	4	\$104,166	\$0	14-28	4	\$104,166	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$12,500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8657215459
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8601769310
Fecha Pago Planilla: 2018-11-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LIBARDO CONDE LASSO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	libardocondelasso@yahoo.es	TELÉFONO	0
FAX	0	SUCURSAL	CONTRATO	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4884664	PRIMER APELLIDO	CONDE	SEGUNDO APELLIDO	LASSO
PRIMER NOMBRE	LIBARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 10	Año: 2018	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$2.187.480		8657215459

Octubre con Noviembre 2018

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7724561	CONFAMILIAR DEL HUILA	21	\$546.870	0.0400000	\$21.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7730502	CONFAMILIAR DEL HUILA	21	\$546.870	0.0400000	\$21.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12137822	CONFAMILIAR DEL HUILA	21	\$546.870	0.0400000	\$21.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7705144	CONFAMILIAR DEL HUILA	21	\$546.870	0.0400000	\$21.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2018 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$175.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$175.000
PORVENIR	2	\$175.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$175.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$43.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$43.800	0	\$0	\$0	\$43.800	\$0	0	\$0	\$0	\$43.800	\$0	\$0	\$43.800
MEDIMAS EPS	2	\$43.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$43.800	0	\$0	\$0	\$43.800	\$0	0	\$0	\$0	\$43.800	\$0	\$0	\$43.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	\$53.600	0	\$0	\$0	\$53.600	0	\$0	\$53.600	0	\$0	\$0	\$53.600



ALCALDIA DE NEIVA

ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
POSESION / CONTRATACION

No.

341934

Fecha Exp.: 19/10/2018

Cédula: 4884664

Avaluo:

Nombre: **LIBARDO CONDE LASSO**

Dirección: **CALLE 8 NO. 8 - 35**

Valido para: **POSESION / CONTRATACION**

Valido Hasta: **31 de diciembre de 2018**



(415)7709998000506(8020)4884664(3900)0000341934(96)20181019

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Y MANRIQUE



LIBARDO CONDE LASSO.

AGENTE RETENEDOR DEL IVA
EN TRANSACCIONES
CON REGIMEN SIMPLIFICADO

Ingeniero Civil
Especialista Ingeniería Ambiental
Diseños, Consultoría, Interventoría
y Construcción de Obras civiles.
Nit. 4884664-8

Calle 70 No. 1D-19 Tel.: 8762127 - NEIVA - HUILA

RESOLUCION N° 130000015449 DEL 2001/10/30 DESDE EL N° 0001 AL 200

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

FECHA

DIA	MES	AÑO
1	11	2018

No. 0170

SEÑORES: *Municipio de Neiva*

NIT:

CIUDAD

TEL.

OBRA: *Contrato de Obra 1061 de 2018*

CONDICIONES DE PAGO:

Cant.	DESCRIPCION	Unid.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL.
	<i>Pago Acta Parcial N°1 Contrato de Obra N°1061 de 2018 que tiene como Objeto: Construcción VALLAS DE Protección Para los Barrios Vicente Araujo, Villa Urbe, Bonilla y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - Huila</i>			<i>176032526,125</i>
SON:			SUB-TOTAL	<i>176032526,125</i>
			I.V.A.	
			TOTAL	<i>176032526,125</i>

PAGO CONTRA ENTREGA - PASADOS 30 DIAS, CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

La presente factura cambiaria de Compraventa se asimila para todosus efectos a una Letra de Cambio, Artículo, 774 del Código del Comercio

FIRMA DEL CLIENTE

Pres. Conde
ce 4884664

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA		FECHA DE EMISIÓN 15/12/2014
	OFICIO		VERSIÓN : 02
			CÓDIGO: E-GE-F-05
			PAGINA: 1 DE 1

Neiva, 23 de Octubre de 2018

Al contestar, favor citar este número:
Oficio No. GDH – MA – 01834

Señores:

JOSE TOVAR
LIDA MARCELA LUCUARA
Calle 80 A No. 1 H - 03
Ciudad

KELLY TORRES
ROLANDO BALANTA M.
3173200504

ORLANDO PASCUAS T.
libardocondelasso@yahoo.es

Cordial saludo:


Me permito informarles que según Acta de fecha 6 de Septiembre de 2018, ustedes conforman el Comité de Veeduría Ciudadana VAYAS POLIDEPORTIVOS que realizará control social a los recursos públicos que se invertirán en la construcción de ~~vayas~~ de protección en polideportivos de los barrios Vicente Araujo, Bonilla, Villa Urbe y San Carlos III Etapa, Neiva; el cual quedó inscrito en el Folio No. 729 del registro de Veedurías de esta Personería Municipal, con ámbito local y vigencia hasta el 5 de Noviembre de 2018 o hasta que termine la obra.

El Objeto de la veeduría será hacer control a la cantidad y calidad de las obras. El sector de aplicación o medio en el cual desempeñará sus funciones es en Infraestructura Deportiva y el campo de aplicación será la ejecución del contrato.

De conformidad con el artículo 8º de la ley 850 de 2003, "Las veedurías se constituyen y actúan por la libre iniciativa de los ciudadanos, gozan de plena autonomía frente a todas las entidades públicas y frente a los organismos institucionales de control, por consiguiente los veedores ciudadanos no dependen de ellas ni son pagados por ellas. En ningún caso los veedores pueden ser considerados funcionarios públicos."

Esta Personería solicita a los veedores ciudadanos no incurrir en conductas que atenten contra los principios rectores de las veedurías, contemplados en los artículos 7º a 14º de la Ley 850 de 2003.

Atentamente,


CARLOS ARTURO RIVERA HERRERA
P.U. Personería Delegada Derechos Humanos



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA

FOR-GCO-08

Versión: 01

Vigente desde:
Noviembre 21 de 2012

En Neiva, a los seis (6) días de septiembre de 2018, se reunieron los abajo firmantes con el fin de constituir la veeduría del **CONTRATO DE OBRA No. 1061** fecha 17 de Agosto de 2018, suscrito entre el Municipio de Neiva y **LIBARDO CONDE LASSO**, cuyo objeto es "Construcción vallas de proyección para los Barrios: Vicente Araujo, Villa Urbe, Bonilla y San Carlos III etapa del Municipio de Neiva Huila", teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan la Veedurías Ciudadanas

Plazo de Ejecución del Contrato: Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

JOSÉ TOVAR

C.C. 12.106.989 de Neiva

Dirección: *Calle 80A # 14-03*
Veedor Barrio Vicente Araujo

ORLANDO PASCUAS TAMAYO

C.C. 12.115.275 de Neiva

Dirección:
Veedor Barrio Villa Urbe

Kely Torres Trojillo

KELY TORRES

C.C. 7.726.756 de

Dirección: *CRA 14-20*
Veedor Barrio Bonilla

Lida Marcela Lucuara

LIDA MARCELA LUCUARA

C.C. 36.304.909 de

Dirección:
Veedor Barrio San Carlos

RONALDO BALANTA MEDINA

C.C. 1.075.309.839 de

Dirección:
Veedor Barrio San Carlos

LIBARDO CONDE LASSO

C.C. 4.884.664 de Aipe

Dirección: Calle 57 No. 18 A 45
Contratista

INFORME PARCIAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1061 DE 2018

**CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE
ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO
DE NEIVA – HUILA**

Presentado por:

ING. LIBARDO CONDE LASSO

Presentado a:

DOCTORA LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ

Supervisor

ING. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA

Apoyo a la Supervisión

NEIVA-HUILA

NOVIEMBRE-2018

TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. LOCALIZACIÓN.....	3
3. ALCANCE DEL PROYECTO	5
4. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO	5
5. EVALUACIÓN TECNICA DEL PROYECTO	6
6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO	6
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6
SOPORTE FOTOGRAFICO	7
Demolición y Construcción de Placa Barrio Villa Urbe	7
Demolición de Muros Villa Urbe Y Bonilla.....	7
Desmonte de Malla Bonilla y Villa Urbe.....	8
Excavación	8
Concreto Ciclópeo	9
Construcción Zapata.....	9
Construcción de Viga, incluye Acero.....	10
Construcción de Vallas.....	10



1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía del Municipio de Neiva-Departamento del Huila, se ha propuesto continuar con el mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos tanto rurales como urbanas, realizando procesos de contratación como el proceso de selección abreviada de menor cuantía MNSDSAMOP049-2018 del cual resulta el **contrato de obra pública N° 1061 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LIBARDO CONDE LASSO, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA"**

2. LOCALIZACIÓN

Las obras correspondientes al objeto de este contrato se realizan en el área urbana del Municipio de Neiva, en los barrios de Vicente Araujo – Villa Urbe – Bonilla – San Carlos III.

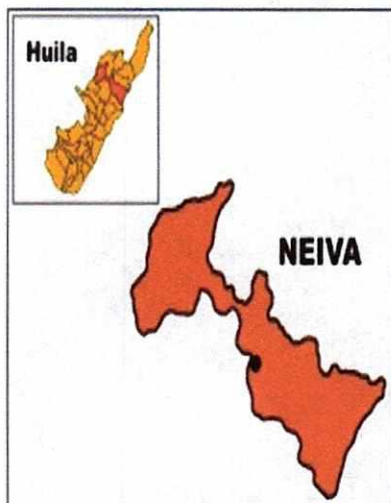

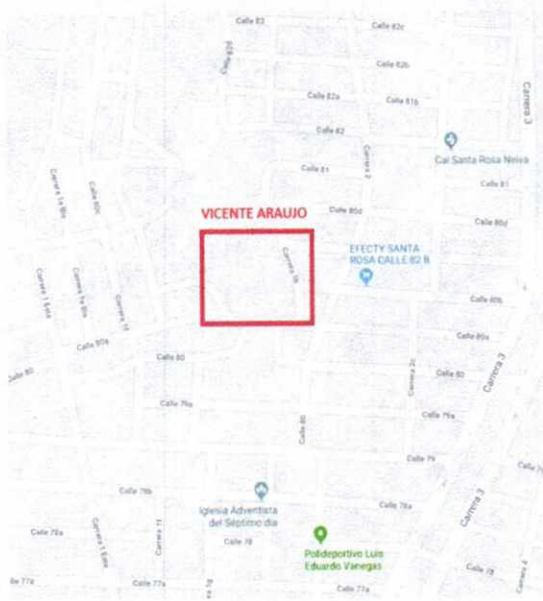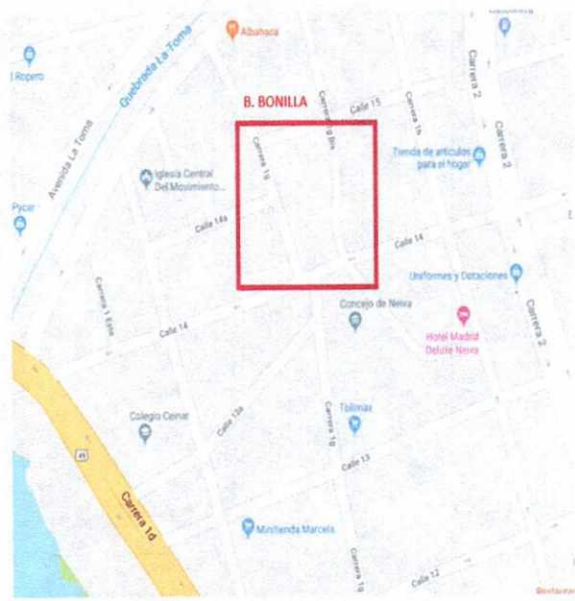

3. ALCANCE DEL PROYECTO

CONTRATISTA: Realizar las obras propuestas en el contrato de obra pública N° 1061 DE 2018 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA”

SUPERVISOR: Se realiza por parte del personal que dispone la Dirección de deportes y recreación del Municipio de Neiva para hacer el seguimiento técnico a la ejecución de los trabajos.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO
NUMERO DEL CONTRATO:	1061 DE 2018
NIT DEL CONTRATISTA:	4.884.664
No. POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES:	N° 2953404
No. DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:	N° 689616
ACTO DE APROBACIÓN DE POLIZAS:	<u>Veinte y ocho (28) de Agosto de 2018</u>
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO:	2 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	Diez (10) de Septiembre de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Trece (13) de Septiembre de 2018
FECHA DE REINICIO:	Dos (2) de Octubre de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Veinte y siete (27) de Noviembre de 2018
VALOR ANTICIPO:	0
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	\$ 353.386.558,75
SUPERVISOR:	Dra. LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA

5. EVALUACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Las obras mencionadas en el presente informe, comprenden aquellas ejecutadas durante el periodo comprendido entre el Dos (02) de octubre de 2018 y el Treinta (30) de octubre de 2018, las cuales se relacionan a continuación:

Se realiza localización y replanteo de las obras a intervenir en los barrios Vicente Araujo, Villa Urbe, San Carlos III y Bonilla, así:

- Excavaciones
- Demolición de muros
- Desmonte de Vallas
- Demolición de Cimientos en Ciclópeo.
- Excavación, Construcción de Zapatas y pedestales.
- Anclaje de tubería diámetro 3" estructural.
- Construcción Concreto en Ciclópeo en las diferentes brechas.
- Construcción Viga de Amarre, incluye Hierro.
- Demolición y construcción de Placa en Polideportivo Villa Urbe

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Las obras del contrato 1061 del 2018, objeto de este informe, se han ejecutado en un 50%, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato y de las sugeridas por el apoyo a la supervisión.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la ejecución de estas obras y con el propósito de que las obras en estos escenarios deportivos queden funcionando a cabalidad se realizan algunos pequeños ajustes consultados a la supervisión que en ningún momento afectan la funcionalidad de las obras.



LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

SOPORTE FOTOGRAFICO

Demolición y Construcción de Placa Barrio Villa Urbe



Demolición de Muros Villa Urbe Y Bonilla



Desmonte de Malla Bonilla y Villa Urbe



Excavación



Concreto Ciclópeo



Construcción Zapata



Construcción de Viga, incluye Acero



Construcción de Vallas







ACTA DE RECIBO DE OBRA

FOR-CO-15

Versión: 01

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA		
CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018
INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75
SUPERVISOR	LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0
FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 353.386.558,75
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75
PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25
ACTA DE SUSPENSIÓN1	13 De Septiembre de 2018	ACTA DE REINIICO	2 de octubre de 2018
FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA No.	1	Parcial	X
		Final	
Hoja	1	de	1

Fecha Acta	Mes	Día	Año
	10	30	2018

		CANTIDADES CONTRATADAS				EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		CONDICIONES VIGENTES							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.02	Demolición de placa de piso concreto hasta - e=0.12 m., incluye retiro en sitio autorizado	M2	14	13.857,00	193.998,00	12,00	166.284,00	12,00	166.284,00
1.02	Demolición de muro en mampostería. Incluye retiro y bote de escombros a escombrera autorizada.	M2	10	11.252,00	112.520,00	10,00	112.520,00	10,00	112.520,00
1.03	Desmonte cerramiento en malla eslabonada existente incl. malla, tubería, muro y cimentación a todo factor con bote de material en sitio autorizado	M	193	8.006,00	1.545.158,00	193,00	1.545.158,00	193,00	1.545.158,00
1.04	Desmonte y traslado a Parque La Rebeca de canchas existentes, incl. demolición concreto, resane y transporte estructuras	UN	2	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	2,00	103.156,00
2	VALLAS DE PROTECCIÓN								
2.01	Excavación manual sin clasificar – incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	63	31.047,00	1.955.961,00	58,00	1.800.726,00	58,00	1.800.726,00
2.02	Suministro y construcción de concreto ciclópeo cimentación: 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 PSI	M3	15	253.345,00	3.800.175,00	11,00	2.786.795,00	11,00	2.786.795,00
2.03	Suministro y Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI de 0,60X0,60X0,60 m	M3	31	484.299,00	15.013.269,00	18,00	8.717.382,00	18,00	8.717.382,00
2.04	Suministro y Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	369	43.975,00	16.226.775,00	248,00	10.905.800,00	248,00	10.905.800,00


2.08	Suministro y construcción muro en ladrillo prensado macizo a la vista de 24.5x12x5.5 cm. Incluye mortero 1:4 y dilataciones de 1.0 cm.	M2	95	76.222,00	7.241.090,00		0,00	0,00	0,00
2.09	Suministro y Construcción losa e = 0.08 m en concreto 2.500 psi.	M2	8	34.707,00	277.656,00	8,00	277.656,00	8,00	277.656,00
2.10	Suministro y construcción valla de protección en varilla 1/2": tubo 3"x2 mm estructural, tubo 1 1/2"x 2.0 mm AN, ángulo 1 1/4"x3/16", platina 1 1/4"x1/8", varilla lisa 1/2", soldadura 6010 fusión materiales. Incl. anticorrosivo, esmalte. S/diseño.	M2	2.014,00	99.864,00	201.126.096,00	1.046,00	104.457.744,00	1.046,00	104.457.744,00
2.11	Suministro e instalación apoyo para valla de protección: tubo estructural 3" cal 3mm, incl. anticorrosivo, esmalte y soldadura.	M	180	37.149,00	6.686.820,00		0,00	0,00	0,00
2.12	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (4,00X2,30 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	UN	2	636.777,00	1.273.554,00		0,00	0,00	0,00
2.13	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (7,32X2,44 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	UN	2	720.260,00	1.440.520,00		0,00	0,00	0,00
2.14	Suministro y aplicación Pintura vinilo resistente a intemperie, incluye limpieza y resanes con estuco. Tres manos.	M2	190	7.848,00	1.491.120,00		0,00	0,00	0,00
2.15	Suministro y aplicación Pintura vinilo Gris basalto resistente a intemperie a tres manos.	M2	104	7.848,00	816.192,00		0,00	0,00	0,00

COSTOS DIRECTOS	\$ 282.709.247,00		\$ 140.826.021,00		\$ 140.826.021,00
COSTOS INDIRECTOS A.I.U. 25%	\$ 70.677.311,75		\$ 35.206.505,25		\$ 35.206.505,25
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 353.386.558,75	49,8%	\$ 176.032.526,25	49,81%	\$ 176.032.526,25

MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:	0,0%	\$ -
---	-------------	-------------

VALOR A GIRAR:	49,8%	\$ 176.032.526,25
-----------------------	--------------	--------------------------

VALOR A GIRAR: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 25/100 MCTE.


LIBARDO CONDE LASO
 Contratista


Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA
 Apoyo Técnico, Administrativo Y Financiero a la Supervisión SDR

 Libertad y Orden	LIBARDO CONDE LASSO NIT 4884664	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSION: 01
			FECHA: 30-10-2018

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL PROYECTO:

VALLAS DE PROTECCIÓN POLIDEPORTIVO VICENTE ARAUJO, VILLA URBE,
BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATO: 1061 DE 2018

CONTRATISTA: LIBARDO CONDE LASSO

OCTUBRE 2018

 Libertad y Orden	LIBARDO CONDE LASSO NIT 4884664	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSION: 01
			FECHA: 30-10-2018

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GENERALIDADES

En el desarrollo de todo trabajo se considera fundamental la seguridad, la salud y la higiene. Por tal motivo es compromiso identificar los peligros y riesgos en cada actividad, así como su control en cada uno de ellos cumpliendo las normas.

OBJETO

Desarrollar las actividades del contrato 1061 de 2018 previniendo los posibles peligros y riesgos que se pueden presentar y evitar posibles accidentes laborales, enfermedades y daños a otras personas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Las posibles afectaciones en seguridad y salud estarían presentes en el desarrollo de las obras del contrato 1061, objeto que incluye actividades constructivas de vallas de protección en los barrios Vicente Araujo, Villa Urbe, Bonilla y San Carlos III Etapa.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer lineamiento y compromiso en el desarrollo de las actividades, establecer una buena comunicación, prevenir y minimizar los riesgos presentes en cada actividad ejecutada.

 Libertad y Orden	LIBARDO CONDE LASSO NIT 4884664	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSION: 01
			FECHA: 30-10-2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VALLAS

FECHA INICIO: 10 SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA SUSPENSIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA REINICIO: 2 DE OCTUBRE 2018

A partir del 2 de Octubre de 2018 se han desarrollado actividades generales como:

- Información del proyecto y sus actividades de las cuales se requiere personal como Maestro de Obra, oficiales y ayudantes.
- Entrega de dotación general.
- Charla de uso obligatorio de los elementos de protección.
- Uso de herramientas y sus cuidados.
- Inspección de Área de trabajo.
- Mantener limpios lugares de trabajo y manejo de residuos.



LIBARDO CONDE LASSO
CONTRATISTA

	LIBARDO CONDE LASSO NIT 4884664	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSION: 01
			FECHA: 30-10-2018

REGISTRO FOTOGRAFICO

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR



	LIBARDO CONDE LASSO NIT 4884664	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSION: 01
			FECHA: 30-10-2018

CHARLA SOBRE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN





ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión

01

TIPO DE CONTRATO:

OBRA CIVIL

NUMERO DE CONTRATO:

1061 de 2018

CONTRATISTA:

LIBARDO CONDE IASSO

INTERVENTOR:

JAIRO RODRIGUEZ

PERIODO:

2 de octubre al 30 octubre de 2018.

PERSONAL OPERATIVO- ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PERSONAL OPERATIVO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL										
No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						
				CASCO	TAPA BOCAS	GUANTES	BOTAS	CAMISAS	PANTALON	OBSERVACION
CIVILES										
1	7724561	Miguel GONZALEZ	Ayudante	X	X	X	X	X	-	
2	7730502	HECTOR HERRERA	Ayudante	X	X	X	X	X	-	
3	12137822	HERNANDO MORENO	Ayudante	X	X	X	X	X	-	
4	7705144	CARLOS A. RODRIGUEZ	Oficial	X	X	X	X	X	-	
5		RICARDO GONZALEZ	MAESTRO	X	X	X	X	X	-	
CHARLAS DIARIAS										
1	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, MANEJO DE HERRAMIENTAS									✓
2	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ORDEN Y ASEO									✓
3	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SOCIALIZACION FICHAS DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS QUIMICOS									✓
4	USO DE EPP, RIESGO FISICO POR RUIDO									✓
5	USO DE EPP, PUNTO ECOLOGICO Y MANEJO DE RESIDUOS									✓
6	USO DE EPP, RIESGOS FISICOS HERRAMIENTAS MANUALES									✓
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD										
1	SE SEÑALIZARON Y DEMARCARON LAS AREAS INTERVENIDAS O DE TRABAJO									✓
2	SE REALIZO INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO									✓
3	SE REALIZO INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO									✓
4	SE REALIZAN LAS CHARLAS DIARIAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES SEGÚN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS									✓
MANEJO AMBIENTAL										
1	SE SOCIALIZO CAPACITACION SOBRE MANEJO DE RESIDUOS									✓
2	SE REALIZO RETIRO DE ESCOMBROS									✓
REPORTE ACCIDENTES E INCIDENTES										
1	0 ACCIDENTE Y 0 INCIDENTES EN OBRA									

Firma:

Nombre:


FABIO NELSON ARDILA
SISOMA



CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Versión

01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		INFORMACIÓN GENERAL		Y EL		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		CONTRATO No.	
CONTRATISTA:		<u>LIBARDO CONDE</u>		<u>2 octubre</u>		<u>30 octubre</u>		<u>2 octubre</u>		<u>1061/2018</u>	
DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018											
FECHA	CANTIDAD	EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
30 octubre.	1	PULIDORAS GRANDES		X	X		Bonilla Barrio	Desmonte Malla			
		TALADRO GRANDE									
24/30	5	HERRAMIENTA MENOR		X	X		Vicente Araujo Vila urbo	EXCAVACION, JIGA ZAPATAS			
10/3 NOV	1	DEMOLEDOR		X		X	Barrio Bonilla	JIGA DEMOLICION			
8 y 20 octa	1	MEZCLADORA		X		X	Araujo, Bonilla urbo, Sancerle	FUNDIR JIGA CICLOPES ZAPATAS			

Firma:

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

MEMORIAS DE CÁLCULO C.O.P. No. 1061 de 2018

Objeto:

**"CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE
ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA"**

Contratista: Ing. LIBARDO CONDE LASSO

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
		FOR-GI-12				Versión: 01			
						Vigente desde: Junio 17 de 2016			
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X	
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANIEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final		
	SUPERVISOR	LEIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000					
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1	
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75					
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25	Fecha Acta	Mes	Día	Año	
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				10/30/2018	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA					UNIDAD	M2	
CAPITULO	I								
ITEM	1,01 Demolición de placa de piso concreto hasta - e=0.12 m., incluye retiro en sitio autorizado								
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL			
POLIDEPORTIVO VILLA URBE	M2	4,00	3,10	0,08	12,40	12,40			
					TOTAL	12,40			
SOPORTE GRAFICO									
									
OBSERVACION									
<div style="height: 150px; border: 1px solid black;"></div>									

[Handwritten signature]

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
	FOR-GI-12					Versión: 01		
	Vigente desde: Junio 17 de 2016							
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANIEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75				
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M2
CAPITULO	I		
ITEM	1,02 Demolición de muro en mampostería. Incluye retiro y bote de escombros a escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Polideportivo Villa Urbe	M2	22,00		0,50	1,00	11,00
TOTAL						11,00

SOPORTE GRAFICO


OBSERVACION
<p>En este sitio se demolió una longitud de muro de 22m por una altura de 0.50m. Así mismo el cerramiento existente se trasladó e instaló en la parte posterior por petición de la comunidad.</p>



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIOENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M
---------	--	--------	---

CAPITULO	I
ITEM	1,03 Desmonte cerramiento en malla eslabonada existente incl. malla, tubería, muro y cimentación a todo factor con bote de material en sitio autorizado

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Polideportivo Villa Urbe	Mts	22,00				22,00
Cancha Barrio Bonilla	Mts	172,00				172,00
					TOTAL	194,00

SOPORTE GRAFICO	
-----------------	--



OBSERVACION	
-------------	--

L

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

<p>Versión: 01</p>

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00			de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	UN
---------	--	--------	----

CAPITULO	I
ITEM	1,04 Desmonte y traslado a Parque La Rebeca de canchas existentes, incl. demolición concreto, resane y transporte estructuras

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
BARRIO BONILLA	2				2,00	2,00
					TOTAL	2,00

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00			Hoja	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M3
---------	--	--------	----

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,01 Excavación manual sin clasificar – incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
San Carlos						
Zapata	M3	0,60	0,60	0,60	10,00	2,16
Ciclopeo	M3	26,00	0,20	0,20		1,04
Viga Amarre	M3	26,00	0,20	0,20		1,04
Apoyo Pie de Amigo	M3	0,60	0,60	1,00	1,00	0,36
TOTAL						4,60

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION	
-------------	--



	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
	FOR-GI-12					Versión: 01		
	Vigente desde: Junio 17 de 2016							

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2016	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANIEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2016	VR.MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1

DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				10/30/2018

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M3
---------	--	--------	----

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,01 Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Villa Urbe						
Zapata	M3	0,60	0,60	0,60	18,00	3,89
Ciclopeo	M3	33,20	0,20	0,20		1,33
Viga Amarre	M3	33,20	0,20	0,20		1,33
Apoyo Pie de Amigo	M3	0,60	0,60	0,60	3,00	0,65
TOTAL						7,19

SOPORTE GRAFICO


OBSERVACION



	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
	FOR-GI-12					Versión: 01		
	Vigente desde: Junio 17 de 2016							

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2016	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ	VR ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2016	VR MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1

DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR VIGENTE:	\$ 353.386.558,75				
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2016	VR PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25	Fecha Acta	Mes	Día	Año
								10/30/2018

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M3
---------	--	--------	----


CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,02 Suministro y construcción de concreto ciclópeo cimentación: 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 PSI

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Vicente Araujo	M3	96,32	0,20	0,20		3,85
Villa Urbe	M3	33,20	0,20	0,20		1,33
San Carlos	M3	26,00	0,20	0,20		1,04
Bonilla	M3	134,20	0,20	0,20		5,37
TOTAL						11,59

SOPORTE GRAFICO


OBSERVACION



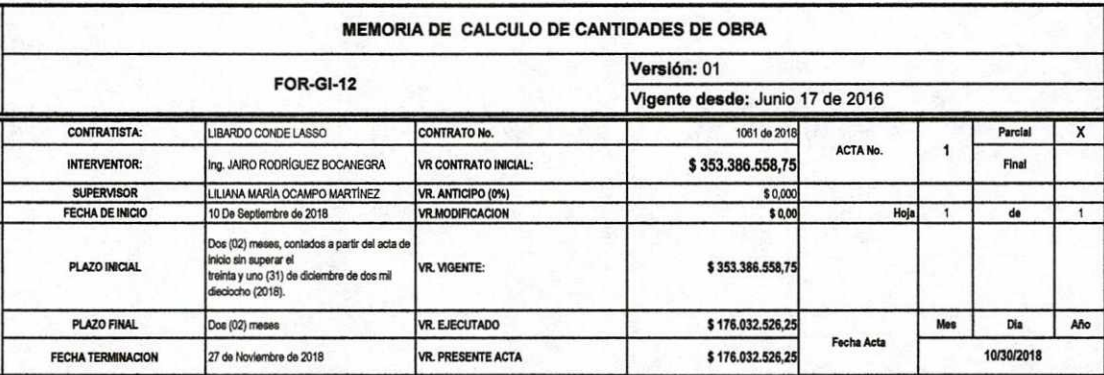

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,03 Suministro y Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI de 0,60X0,60X0,60 m

OBSERVACION	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final	
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000				
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00	Hoja	1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25				
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25				

OBJETO:	UNIDAD	Kg
CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA		

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,05 Suministro e instalación Acero de refuerzo 60.000 PSI para estructuras de 1/2" y 3/8"

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
VICENTE ARAUJO						
ZAPATA	KG	= 0,6 * 8 = 4,8		1Kg	42,00	201,60
VIGA AMARRE	KG	121,52	4,00	1 Kg		486,08
TRASLAPE	KG	0,60	4,00	1,00	20,00	48,00
ESTRIBOS	KG	0,84		0,56	810,00	381,02
COLUMNETAS	KG	1,00	4,00	1,00	42,00	168,00
ESTRIBOS COLUMNETAS	KG	0,84		0,56	210,00	98,78
TOTAL						1.383,49

SOPORTE GRAFICO	
-----------------	--



OBSERVACION	
-------------	--



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X	
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final		
	SUPERVISOR	LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000					
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 0,00			Hoja	1	de
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta				
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25			Mes	Día	Año
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25			10/30/2018		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	Kg
---------	--	--------	----

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,05 Suministro e instalación Acero de refuerzo 60.000 PSI para estructuras de 1/2" y 3/8"

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
BONILLA						
ZAPATA	KG	= 0,6 * 8 = 4,8		1Kg	20,00	96,00
VIGA AMARRE	KG	58,00	4,00	1 Kg		224,00
TRASLAPE	KG	0,60	4,00	1,00	10,00	24,00
ESTRIBOS	KG	0,84		0,56	373,00	175,46
COLUMNETAS	KG	1,50	4,00	1,00	20,00	120,00
ESTRIBOS COLUMNETAS	KG	0,84		0,56	200,00	94,08
TOTAL						733,54

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X	
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final		
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0,000					
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 353.386.558,75			Hoja	1	de
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta		Mes	Día	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25					
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25			10/30/2018		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M2
---------	--	--------	----

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,09 Suministro y Construcción losa e = 0.08 m en concreto 2.500 psi.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
POLIDEPORTIVO VILLA URBE	M2	4,00	3,10			12,40
TOTAL						12,40

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION	
-------------	--



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

<p>Versión: 01</p>

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1061 de 2018	ACTA No.	1	Parcial	X	
	INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA	VR CONTRATO INICIAL:	\$ 353.386.558,75			Final		
	SUPERVISOR	LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ	VR. ANTICIPO (0%)	\$ 0.000					
	FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018	VR.MODIFICACION	\$ 353.386.558,75			Hoja	1	de
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).	VR. VIGENTE:	\$ 353.386.558,75	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	PLAZO FINAL	Dos (02) meses	VR. EJECUTADO	\$ 176.032.526,25					
	FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018	VR. PRESENTE ACTA	\$ 176.032.526,25					

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTA ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	UNIDAD	M2
---------	--	--------	----

CAPITULO	2 VALLAS DE PROTECCIÓN
ITEM	2,10 Suministro y construcción valla de protección en varilla 1/2": tubo 3"x2 mm estructural, tubo 1 1/2"x 2.0 mm AN, ángulo 1 1/4"x3/16", platina 1 1/4"x1/8", varilla lisa 1/2", soldadura 6010 fusión materiales. Incl. anticorrosivo, esmalte. S/diseño.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
VICENTE ARAÚJO	M2	121,52	5,85			710,89
VILLA URBE	M2	45,30	5,95			269,54
SAN CARLOS	M2	3,91	30,21			118,12
TOTAL						1.098,55

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION:



BITACORA CONTRATO 1061 de 2018

Octubre 2/2018 se da inicio formal a las obras objeto del contrato

Octubre 3 de 2018, se realiza visita al barrio Vicente Araujo se socializa con la comunidad, junta comunal y el señor JOSE TOLOS Veedor contrato.

[Firma]

Octubre 4 de 2018, se realiza Replanteo barrio Vicente Araujo, Se da comienzo a la excavación Porteria sur, excavación de 20 cm a 25 cm de ancho por 40 cm de altura y zapatas cada 3 mts de $0,60 \times 0,60 \times 0,80$ incluida los 20 cm de la viga.

[Firma]

Octubre 5 de 2018
continúamos con la obra
hasta ~~terminar~~
el frente de la Portada. Palfundo la él
a la taral.

Sábado 6 de Octubre de 2018.
debido a la lluvia de la noche anterior
la brecha se llamo porque al faltar
que esta continuo es en material de Relleno
el personal nuevamente tiene que retirar
esto material.

8 de Octubre de 2018.
Se deja hasta la excavación de esta
Portada (sur), brecha para cecolpo,
viga y zapatas.

9 de Octubre de 2018. Iniciamos sumins
tro y consiguieron de cecolpo en la
longitud de esta Portada.

Octubre

10 octubre de 2018 iniciamos construcción de zapatas, instalaciones de pedestales o columnas y colocación de tubería de $\phi 3"$ para soporte de valles.

11 octubre de 2018. Se realiza consulta al apoyo de la supervisión ya que la veduría solicitó que se le deje instalado un portón para cuando se necesite entrar vehículo de la electrificadora para realizar mantenimiento al alumbrado de / campo deportivo, se da inicio a la construcción de la viga.

Prof. [Signature]

12 de octubre de 2018. Se tiene que retirar algún trorro de las vigas. Porque nuevamente la lluvia causó desprendimiento del talud y llena el espacio de la viga y se retira todo este material.


13 de octubre de 2018 se termina la
Viga y la instalacion de la Tuberia de
este costado sur. ϕ


15 de octubre de 2018 se da inicio a la
excavacion Costado Norte Portaria
 $A = 20 \text{ cm}$ $h = 0.40$ + excavacion
Zapatas de $0.60 \times 0.60 \times 0.80$.

16 Octubre de 2018. continuamos
con la excavacion y se termina.
este costado Norte. ϕ

17 Octubre de 2018. se realiza la
Mezcla e instalacion del concreto
ciclofeo.

A seguir damos comienzo a la
excavacion en el Polideportivo Villa Urbe


William Razon.
Resident.



18 Octubre de 2018. Se instalan Pedestales,
y tubería $\phi 3''$. y continuaron
la excavación Polideportivo villa urbe.

19 Octubre de 2018.

Se construye la viga cimentado en su
Totalidad.

20 Octubre de 2018

se continúa con la excavación en el
Polideportivo barrio villa urbe.

Surge algún contratiempo en relación
a que el vecedor no quiere dejar
hacer la brecha costado Norte, alegando
que la Valla debe quedar en forma
diagonal y no paralela al polideportivo.

- También se retira malla existente y se da muela
cimentado existente.

22 Octubre de 2018 Se da inicio a la
construcción del cicloped viga amarró y
construcción de zapatas y su respectivos
pedestales para el anclamiento de la tubería
sin

W.
Calleja
Ramon

J. Pineda

23 Octubre de 2018. Se demuele Placa
en mal estado y se construye Muro de
concreto los muros y la malla
existente en nuevo sitio.

24 Octubre de 2018. Se termina la
construcción del cemento de la nueva
Valla y se deja anclada la tubería.

25 Octubre de 2018 Se realiza excavación
en el Polideportivo barrio San Carlos
y se comienza el desmonte de la malla
en el campo barrio Bonilla.

William Ramon

Héctor Hondo

26 Octubre de 2018. Se instala Cielo
Piso y Viga Zapatas y Tubería barrio
San Carlos.

Se continúa con el retiro de la malla barrio
Bonilla así como demoliciones de muros
y cemento.

Héctor Hondo

27 de octubre / 2018 Se instala malla
polideportivo barrio San Carlos

A si como tambien continuamos con el
retiro de malla y excavacion en el barrio
Bomilla.

29 Octubre / 2018 Se da inicio a la instalacion
de la malla polideportivo
Villa Urbana y campo barrio Vicente
Arango

W
IWB William

Rafael

30 Octubre / 2018

Se instalan Valla. Otro nivel de
Valla en el barrio Vicente Arango
y continuamos con el barrio Villa Urbana

- y Demolicion y construccion de
brecha sitio de Porteros.

Rafael
Héctor Cordero
Contratista

W
IWB William
Ramón
Residente
