

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0	
TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 10		
FECHA 27 de octubre de 2021	HORA 7:00 am	LUGAR Virtual	
1. ASISTENTES			
NOMBRE		ENTIDAD/DEPENDENCIA	
Rut Yurdley Sánchez Manosalva		Secretaria Distrital de Movilidad	
Juan Camilo Rodríguez Cárdenas		Secretaria Distrital de Movilidad	
Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez		Secretaria Distrital de Movilidad	
Ross Slendy Martínez Angulo		Secretaria Distrital de Movilidad	
Marco Sierra		Secretaria Distrital de Movilidad	
Miguel Andrés Forero		Secretaria Distrital de Movilidad	
John Alexander Torres Pérez		Secretaria Distrital de Movilidad	
Nelson Ricardo Beltrán Mojica		Director de Interventoría	
John Jairo Arbeláez		Especialista de Transito de Interventoría	
Juan José Lamk		Representante Legal	
Luis Arnaldo Grandas Olarte		Residente de Interventoría	
Liliana Yanneth Bohórquez Avendaño		Directora de obra del Contratista	
Mauricio Alejandro Prieto		Coordinador de obra del Contratista	
Ing. Jeisson Núñez Triana		Especialista de Transito de SDM	
2. ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none"> Compromisos acta anterior. Programación de obra detallada para la semana que inicia. Reporte resumen del avance de obra del contrato. Formato de seguimiento de señalización del contrato. Hoja de vida del contrato actualizada y completa, con corte a la semana anterior. Reporte del seguimiento de garantías del contrato objeto de supervisión. Varios 			
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS	
Entrega plan de contingencia	Contratista	22-10-2021	
Dar respuesta a correos de Ing. Rut Sánchez	Interventoría	21-10-2021	
Reporte de estacionamientos en vía Lote 2 y 3	Contratista/Interventoría	Continuo	
<ol style="list-style-type: none"> Compromisos de acta anterior. 			

- El contratista dio cumplimiento a la entrega del plan de contingencia y la interventoría hace entrega a la SDM para revisión y aprobación.
- La interventoría da cumplimiento a la respuesta de correos a la Ing. Rut
- Contratista e interventoría cumplen con el reporte de cajones.

La supervisora del contrato manifiesta que recibió el Plan de contingencia e informa que se hará una consulta a la parte de Financiera y Jurídica al interior de la SDM, pero la SDM en cabeza del Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez indica que el cronograma del plan de contingencia debe estar ajustado a las vigencias futuras de este año y no se aceptará ningún cambio sobre estas, por tal motivo no se hará ninguna consulta y se solicita a la interventoría trasladar esta decisión al contratista.


2. Programación de obra detallada para la semana que inicia.

PROGRAMACIÓN OBRA

Resumen breve actividades:

Se programan actividades de implementación en el ID EX_03_001_1841_17_V1 localidad de Santa Fe, Ejecución de obra en el ID EX_02_033_1556_10_V19 Plano 1, 2 , y 3 localidad de Chapinero, Recorrido de inspección en el ID EX_17_034_1881_12- Localidad de La Candelaria y Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto del ID EX_03_085_1881_12 y EX_17_034_1881_12 localidad de Santa Fe

Se presenta la programación del Contratista enviada del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2021.

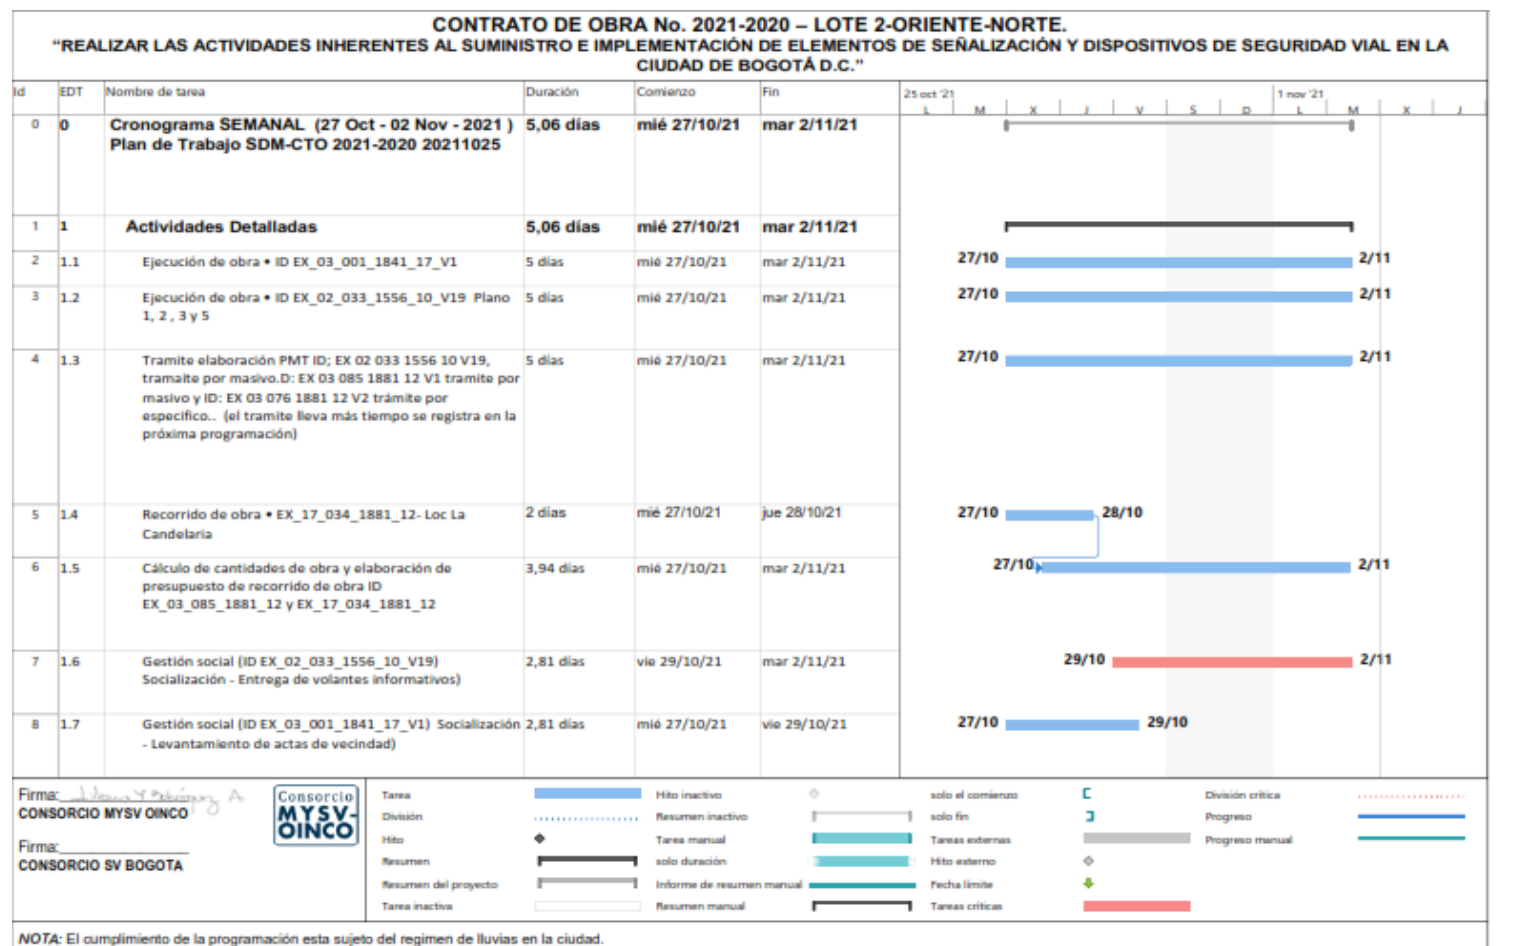

PROGRAMACIÓN INTERVENTORÍA

Seguimiento a las actividades de implementación en el ID EX_03_001_1841_17_V1, Ejecución de obra, ID EX_02_033_1556_10_V19 Plano 1, 2, 3 y 5

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES DE INTERVENTORIA										
Contrato:	2021-2013									
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2) CONTRATO 2020-2013									
Periodo:	Desde	27 de octubre de 2021	hasta	2 de noviembre de 2021						
1. Presentación actividades semanales contrato adjunto de obra										
2. Actividades de Interventoría para cumplimiento de funciones										
		27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	1/11/21	2/11/21		
Actividad	M	J	V	S	D	L	M		Responsable	
Reunión con contratista para seguimiento semanal									Director Interventoría	
Ejecución de obra • ID EX_03_001_1841_17_V1									Residente Nocturno y aux. Ing.	
Ejecución de obra • ID EX_02_33_1556_10_V19 PLANO 1,2,3,4 Y 5									Residente Nocturno y aux. Ing.	
Trámite elaboración PMT ID: EX 02 033 1556 10 V19, trámite por masivo.D: EX 03 085 1881 12 V1 trámite por masivo y ID: EX 03 076 1881 12 V2 trámite por específico.. (el trámite lleva más tiempo se registra en la próxima programación)									Especialista de Tránsito	
Recorrido de obra • EX_17_034_1881_12- Loc La Candelaria									Residente diurno y aux. Ing.	
Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX_03_085_1881_12 y EX_17_034_1881_12									Residente diurno y aux. Ing.	
Gestión social (ID EX_02_033_1556_10_V19) Socialización - Entrega de volantes informativos)									Residente diurno y aux. Ing.	
Gestión social (ID EX_03_001_1841_17_V1) Socialización - Levantamiento de actas de vecindad)									Residente diurno y aux. Ing.	
Verificación presupuestos diseños									Director Interventoría	

EJECUCIÓN FÍSICA

ACTIVIDADES CONTRATISTA 20 AL 26 DE OCTUBRE


Se continua con señalización horizontal en el ID EX_02_356_946_10 lote 2 localidad de Chapinero (calle 88 a calle 93 entre Kr 12 y 15) y se continua con la señalización en el ID EX_03_001_1841_17_V1 localidad de Santa fe (carrera 1bis e entre calle 1 a la 3)

% Avance en tiempo:	7.93%
Días para finalizar el plazo del contrato:	813
Valor ejecutado mensual subdivido por componente (señalización vertical y horizontal):	
% Financiero Programado Contrato:	5.95%
% Financiero Ejecutado Contrato:	2.23%
Valor Programado para el mes	\$ 1,061,535,699.00
% Financiero Programado para el mes:	100.00%
% Financiero Ejecutado para el mes:	37.40%
Atraso / Adelanto mes	-62.60%
Valor Ejecutado Mensual Señalización Vertical:	\$ 10,005,624.00
Valor Ejecutado Mensual Señalización Horizontal:	\$ 340,246,004.97
Suministros	\$ 46,733,368.00
Valor ejecutado en el mes	\$ 396,984,996.97

La SDM a través del Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas manifiesta que la responsabilidad de hacer el reporte diarios de actividades a través de la plataforma WhatsApp es de la interventoría y adicionalmente solicita que también se incluya el tremas de señalización vertical, este reporte debe incluir el % de cajones adelantados con respecto al total de los cajones del diseño sin tener en cuenta bicicletas y motos individualmente, así mismo solicita el avance de instalación de señalización vertical en cuanto a tiempo de fabricación e instalación a la fecha. Adicionalmente presentar cronograma de ejecución de estas señales a la fecha de finalización de la actividad 1 noviembre 2021. El contratista informa que ya se inició la instalación de señalización vertical del ID lote 1, 2 y 3 a partir de 25 de Oct, por último, la interventoría manifiesta que, si está reportado a diario lo indicado por la SDM, pero el día de hoy, por lo que se tenía la reunión de seguimiento se iba a reportar en el comité el avance de la jornada de ayer.

GRÁFICA DE AVANCE DE LA INVERSIÓN:

Para el periodo el avance reportado es del 2,23% vs el avance programado del 5,16%, eso indica que se trae un atraso del 3,73% con respecto al global del contrato.

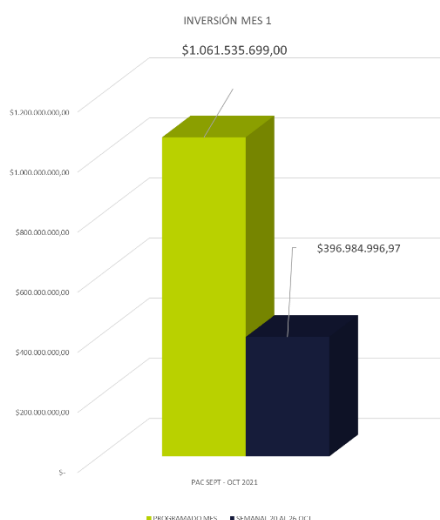

PRESUPUESTOS INICIALES CTO 2021-2013			
NUMERO	IDENTIFICADOR DISEÑO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1	CPS_676_MV_01_04_V28_OBRA KR 7-85	\$ 31.226.138	\$ 29.945.860
2	CPS_676_MV_01_04_V28_OBRA CL92	\$ 9.980.417	\$ 8.207.111
3	EX_03_001_1841_17_V1	\$ 805.140.175	\$ 608.906.601
4	EX_03_066_1881_12_V2	\$ 96.066.517	\$ 95.577.066
5	EX_02_356_946_10	\$ 118.215.872	\$ 107.728.212
		\$ 1.060.629.119	\$ 850.364.850

3. PMTs

TRÁMITES PARA APROBACIONES DE PMT

PMT General - **LOTE 2-ZONA ORIENTE – NORTE**

Aprobado mediante oficio SDM-SPMT-20213126464821 fechado septiembre 22 de 2021

PMTS POR EMERGENCIA:

Ninguno

PMTS POR ORDINARIOS:

PMT MASIVO, PMT020M-EX_03_066_1881_12_V2

PMT ESPECÍFICO - PMT021N, ID: EX_03_066_1881_12_V2

PMT MASIVO - PMT022M ID EX_03_070_1881_12_V2

PMT ESPECÍFICO - PMT023N, ID: EX_03_070_1881_12_V2

En revisión:

PMT025M-EX_02_033_1556_10_V19

PMT026M para el Id: EX_03_085_1881_12_V1

PMT027N para el Id: EX_03_076_1881_12_V2

El contratista a través del Ing. Jeison indica que hay observaciones por parte de la SDM para el radicado 2021819372 masivo del 20 octubre. Entrega apenas termina comité.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD																			
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA																			
CONDICIONES GENERALES																			
No CONSECUTIVO	ID	UBICACIÓN	LOCALIDAD	ELEMENTOS A IMPLEMENTAR (SUBCATEGORÍA)	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD ESTIMADA		CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE PONDERACIÓN			TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN		%Avance de implementación a la fecha de corte	Observaciones del avance/Alertas	Estado de Ejecución	Prioridad	
						UN	CANT	Suministrados	Instalados	Estado de vinculación	Fecha inicio	Fecha Fin	Fecha de inicio real	Días hábiles					
1	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA DOG 75m ENTRE KR 3 Y KR 118 E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Inspeccionado a P	NORMAL
2	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9 A DOG 3A DESDE KR 3 HASTA LA KR 8A	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Inspeccionado a P	PRIORIDAD
4	CPS_676_MV_01_04_V29_08	AV KR 7 ENTRE CL 05 Y CL 32	02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert										2/09/2021				En ejecución	NORMAL
5	EX_03_078_1881_12_V4		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
6	MV_13_153_1249_11_V5		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
7	TPD_PL_2342_V2		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
8	EX_03_041_670_11	DOG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
9	EX_03_065_1881_12	CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR SE	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
10	EX_03_071_1881_12	CL 2B #5-7R KR 6 #4F-15 CL 8ABIS HASTA CL 10 ENTRE KR 1A Y KR 7	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
11	EX_03_076_1881_12	KR 2E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
12	EX_03_085_1881_12	CL 6 Y CL 10 DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 8A E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
13	EX_17_001_1841_17	CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
14	EX_17_034_1881_12	AC 19 HASTA AC 25 ENTRE KR 10 Y KR 3	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
15	EX_17_036_1881_12	CL 33B HASTA CL 29BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL
16	MV_02_280_941_09	KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert														Por inspeccionar	NORMAL

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN:

NOCHE
NOCHE
24H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES:

OBSERVACIONES:

HOJA DE VIDA DEL CONTRATO ACTUALIZADA Y COMPLETA, CON CORTE A LA SEMANA ANTERIOR


No.	ASIGNACIONES						LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD				INFORMACIÓN PREVIA SDM				
	ID Diseño	Fecha de Entrega Diseño	Medio de Entrega	Tipo (CP - Emergencia-Ciclona - Compromiso-Diseño)	Subcategoría	No. CP	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección	Institución Beneficiada	Prioridad	Número Radicado SDM	Número Oficio SDM	Clase de Solicitud de Implementación
1	CPS_676_MV_01_04_V29	23/08/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Intervención Integral	1	Vertical y Horizontal	02 - Chapinero	90 PARDO RUBIO	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32		1 - Alta			
2	EX_03_001_1841_17_V1	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 4 HASTA DOG 75m ENTRE KR 3 Y KR 118 E	Hogar Comunitario del ICBF, Colegio Cooperativo Comunal San Blas, Hogar Comunitario La Princesita, Jardín Infantil El Triunfo, Centro Educativo La Graciela, Colegio José María Caballero, Comedor comunitario El Triunfo, Hogar Comunitario Páido, Colegio Teatro de Luz Luna, Hogar Comunitario Butujillas de Papel, Colegio Autos Colombianas San Luis, Hogar Infantil Gólicas de Fusión, Hogar Infantil Niños y niñas por un Futuro, Hogar comunitario Mía Párragos Lucenora, Casa Cultural Henry Luján, Leonardo Gómez, Fe y Alegría, Hogar Infantil Garabatos y Letras	3 - Baja	SDM-DSVICT-99498-17, SDM-DOCV-61639-17, SDM-48572-17		
3	EX_03_066_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 9 A DOG 3A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	Colegio C.E.D Los Laches, Hogar Comunitario de Benavente, Comedor Comunitario La Peña, Biblioteca Pública La Peña, Hospital Comio, Oratorio Laches, Liceo Infantil un Mundo Para la Comprensión, Centro Julia Rencoroso, Colegio CED Los Pinos, Fundación Los Ahoque La Diosa, Proximidad, Colegio Elvira Caballero	3 - Baja	SDM-071-277786-2018, SDM-3647003, SDM-365885		
4	EX_03_070_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	Colegio Simón de la Mota de Dios, Jardín Gólicas de Roca, Comedor Comunitario Roca, Hogar Comunitario Mariana Rojas	3 - Baja			
5	EX_03_041_670_11	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	Universidad Distrital, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Colombia	3 - Baja			
6	EX_17_034_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR SE	ICBF Las Aguas, Universidad Externado de Colombia, Colegio La concordia, Colegio La Candelaria, Universidad de los Andes	3 - Baja			
7	EX_17_036_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		CL 2B #5-7R, KR 6 #1F-15, CL 8ABIS HASTA CL 10 ENTRE KR 1A Y KR 7	Colegio de Salome, Colegio El Rosalito	3 - Baja			
8	EX_17_001_1841_17	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		KR 3E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10	Institución Educativa Distrital Los Pinos	3 - Baja			
9	EX_03_065_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 6 Y CL 10 DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 8A E		3 - Baja			
10	EX_03_071_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1		3 - Baja			
11	EX_03_076_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		AC 19 HASTA AC 25 ENTRE KR 10 Y KR 3		3 - Baja			
12	EX_03_085_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 33B HASTA CL 29BIS ENTRE KR 5 Y KR 1		3 - Baja			
13	MV_02_280_941_09	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR		3 - Baja			
14	EX_03_078_1881_12	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé				3 - Baja			
15	MV_13_153_1249_11_V5	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé				3 - Baja			
16	TPD_PL_2342_V2	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé				3 - Baja			
17	EX_02_356_946_10	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	02 - Chapinero	87 CHICÓ LAGO			1 - Alta			
18	EX_02_353_1356_10_V19	12/10/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	02 - Chapinero	87 CHICÓ LAGO			1 - Alta			

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Para esta semana no se realizo recorridos para registro de garantías.

Nota: sin Observaciones.

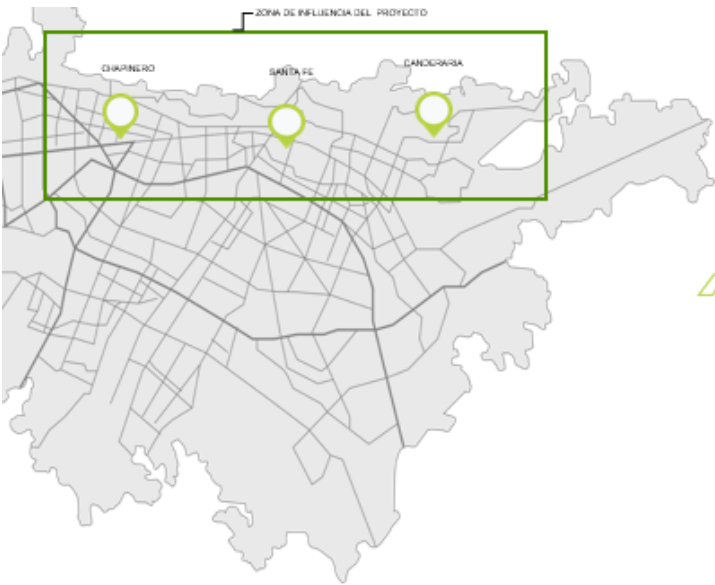

INDICADORES



Pasos acumulados semana 123 Peatonales hasta est



Estacionamientos en vía acumulados hasta esta semana:

192 cupos



36 cupos



Zonas 4

GERENCIA EN VÍA



SECRETARÍA DE MOVILIDAD



REPORTE DEL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS.



Reporte del seguimiento actividades ejecutadas.

Carrera 14 No. 88-80



Calle 88 Kra 15



Reporte del seguimiento actividades ejecutadas.

Calle 90 No. 11-71.




carrera 13 No. 89-59.



COMPARATIVO SEMANAS: 13 A 19 DE OCTUBRE- 20 A 26 DE OCT

El avance semanal fue, incluyendo los suministros, de \$ 74.387.615,88, por consiguiente, no se cumplió el PAC de la semana

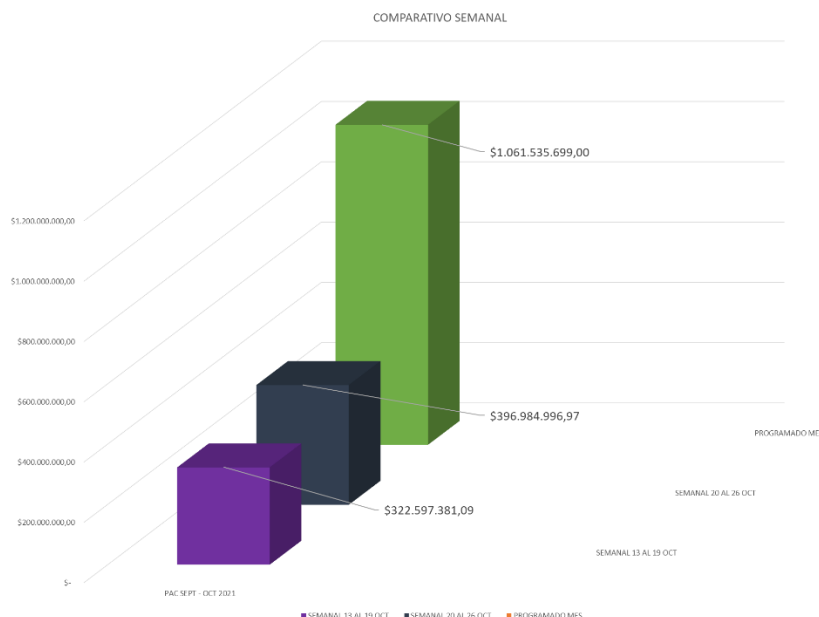

CONCLUSIÓN

- El contrato presenta atraso de 3,78% con respecto a la ejecución presupuesta.
- Esta semana que paso la ola invernal de la Capital no permitió desarrollar el programa planteado por el contratista
- Se recibió el plan de contingencia el 22 de oct 2021, pero el clima no ha permitido su implantación.

TEMAS VARIOS

1. Factor Climático en la zona de trabajo
2. Plan de Contingencia

La SDM solicita reportar el avance por cajones, según su número.

La SDM solicita la respuesta al oficio de Joyco para el día de hoy 27-10-2021, la interventoría informa que se recibió un correo de parte del contratista donde se está solicitando el acta de reunión para poder dar respuesta tal cual se informó en el comité anterior, el contratista manifiesta que volverá a adelantar gestión para la respuesta y pregunta que si puede dar los números de los CIVs que quedaron asignados al contrato 2021-2020. La interventoría indica que los pase para dar la respectiva respuesta.

La supervisora del contrato informa que ayer se recibió solicitud de aclaración a anchos de carril de dos CIVs, en el ID de estacionamientos en vía del Lote 2 -3 e informa que se elevó la consulta al ing. John Torres para que precise el tema sobre la solicitud plantea de anchos de carril. Así mismo se pregunta de parte de la Supervisara que si eso no se detecto en la inspección a lo que se respondió indicando que esa revisión se realiza al momento de la implementación.

La interventoría solicita información sobre el tema de facturación para el mes de diciembre 2021, la supervisora manifiesta que aún no tiene fechas para radicación de PAC ni de facturación, por lo que se preguntará.


La supervisión solicita entregar lo más pronto posible el informe mensual No. 2 de interventoría, a lo que la interventoría responde que se recibió el informe mensual No. 2 del contratista y se observó, por lo tanto, ya se inició con la elaboración del informe mensual No2 de interventoría y se entregara en el transcurso de la finalización de esta semana.


El contratista a través del Representante Legal solicita la palabra para aclarar el tema del presupuesto propuesto para el plan de contingencias y la SDM indico que ya se había tocado el tema y se había informado en el presente comité

que no se aceptan cambio al plan de inversión aprobado inicialmente, el cual debe cumplir con el presupuesto de vigencia 2021 y vigencias futuras 2022, 2023.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Cumplimiento presupuesto 2021 en el plan de contingencia del contratista	Contratista	22-10-2021
Reportar diariamente ID de estacionamientos lote 1, 2 y 3 por cajón implementado y señalización vertical instalada.	Interventoría	CONTINUO

APROBADO


SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD


CONTRATISTA DE OBRA


CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
