

FECHA	18 de octubre de 2018	PERIODO No.	26	DEL	11/10/2018	AL	17/10/2018
-------	-----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

I. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	2018353			CONTRATO No.	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL	SETE (7) MESES			PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN				**FECHA DE SUSPENSIÓN			
**FECHA DE REINICIACIÓN				**FECHA DE REINICIACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de diciembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN	18 de diciembre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO	243			PLAZO ACTUALIZADO	243		
PLAZO TRANSCURRIDO	181	EQUIVALE AL	74.49%	PLAZO TRANSCURRIDO	181	EQUIVALE AL	74.49%
VALOR INICIAL	\$		433.207.600,00	VALOR INICIAL	\$		4.658.441.199,00
VALOR ADICIONALES	\$			VALOR ADICIONALES	\$		
VALOR ACTUALIZADO	\$		433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO	\$		4.658.441.199,00
VALOR PAGADO	\$			VALOR PAGADO	\$		
VALOR POR PAGAR	\$		433.207.600,00	VALOR POR PAGAR	\$		4.658.441.199,00
SUPERVISOR	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez			INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas			
Semana	Acumulado	Indicador	
1	0		
2	0		
3	47	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	34,81%
4	10	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	42,22%
5	0	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	42,22%
6	5	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	45,83%
7	7	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	51,61%
8	62	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	69,62%
9	14	Indicador = $\frac{\text{Visitas Realizadas}}{\text{Visitas Totales a Visitar}}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)			
Semana	Acumulado	Indicador	
7	1	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	1,45% V2
8	1	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	1,45% V2
9	12	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	16,84% V2
10	0	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	18,81% V2
11	3	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	22,19% V1
12	3	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	27,84% V1
13	8	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	39,19% V1
14	8	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	50,72% V1
15	3	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	65,07% V1
16	0	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	65,07% V1
17	14	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	75,28% V1
18	0	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	75,96% V1
19	8	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	85,91% V1
20	2	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	89,65% V0
21	0	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	89,65% V0
22	0	Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	89,65% V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)			
Semana	Acumulado	Indicador	
		Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	V0
		Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	V1
		Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	V2
		Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	V3
		Indicador = $\frac{\text{Diseños recibidos}}{\text{Total de diseños}}$	Adicional

FECHA	18 de octubre de 2018	PERIODO No.	28	DEL	11/10/2018	AL	17/10/2018
-------	-----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

5. Ejecución de Obra		
Trabajados en la semana		Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
Aceler		21

Programados Semana	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	47,18%

6. Actividades Administrativas

En la vigésimo sexta semana de ejecución del contrato 2017-1633 realizaron las siguientes actividades:

- Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantienen iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 69,66%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 69,66%.
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

- En el componente de obra se trabajó en los ID 11_4, 9_2 y 19_2.

ID 2_7 : Posterior a la instalación de las defensas metálicas, instaladas la semana pasada, el Contratista ejecutó la instalación de la terminal de impacto diseñada y aprobada en este contrato. Con esta intervención este ID reporta 100% de avance.

ID 9_2: Se realizó la instalación de 14 unidades de malla de canalización peatonal sobre el corredor de la Av. Ciudad de Cali. Con esta intervención este ID reporta avances en su ejecución pero quedan pendientes la instalación de la fase B de este ID.


ID 11_4: En este ID se instalaron durante esta semana las 3 terminales de impacto faltantes y se reporta un avance de obra del 100%. ID culminado.

- Se realiza comitá de seguimiento de obra # 26.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 9_2 Av. Ciudad de Cali entre Calles 18 y 20

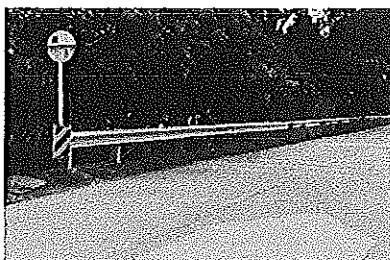

ID 11_4 Carrera 51 entre Calles 212 y 215

FIRMA INTERVENTOR (INGENIERO RESIDENTE O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: ING. JHON HAROLD ALAPE OROZCO

* Voto SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aprobado este Informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma
