

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 				INFORME SEMANAL				
Código: FO-JEM-JEING-288		Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-08-21		Pág. 1 de 1		
FECHA		DÍA	25	MES	JUNIO	AÑO	2018	
SEMANA N°	1	DEL	18 DE JUNIO DE 2018		AL	23 DE JUNIO DE 2018		
FECHA INICIO :	05 DE JUNIO DE 2018		FECHA TERMINACIÓN :		05 DE NOV DE 2018			
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	"GRUPO I: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COMEDOR DE TROPA - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 3"							
INTERVENTOR	SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ		NIT O C.C.	7.573.021 - 9		CONTRATO N°	289 DE 2018	
CONTRATISTA	ECO HABITAT SAS		NIT O C.C.	830.091.013-6		CONTRATO N°	273 DE 2018	
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO					
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS			
PRELIMINARES	8,55%	7,68%						
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	3,24%	3,14%						
MAMPOSTERIA	0,07%	0,00%						
INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%						
PAÑETES - RESANES	0,00%	0,00%						
CUBIERTAS	0,00%	0,00%						
CIELO RASOS	0,00%	0,00%						
PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%						
ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%						
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%						
CERRAJERIA	0,00%	0,00%						
PINTURA	0,00%	0,00%						
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%						
	0,00%							
TOTAL SEMANAS ANTERIORES	12,30%	12,06%						
TOTAL PRESENTE SEMANA	11,87%	10,82%						
TOTALES	24,17%	22,88%						
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	SEMANA	ACUMULADO		
	\$215.579.687,47	\$49.324.632,49	\$166.255.054,98		10,82%	22,88%		
IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA								
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS SI ☐ NO ☐
ARQUITECTOS	1	INSPECTOR	1					
INGENIEROS		OBREROS	1					
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	4					
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO								

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Código: FO-JEM-JEING-288

Versión: 0

Fecha de Emisión: 2014-08-21

Pág. 1 de 1

FECHA

DÍA

25

MES

JUNIO

AÑO

2018

SEMANA N°

1


DEL

18 DE JUNIO DE 2018

AL

23 DE JUNIO DE 2018

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCIÓN Vs PROGRAMADO)

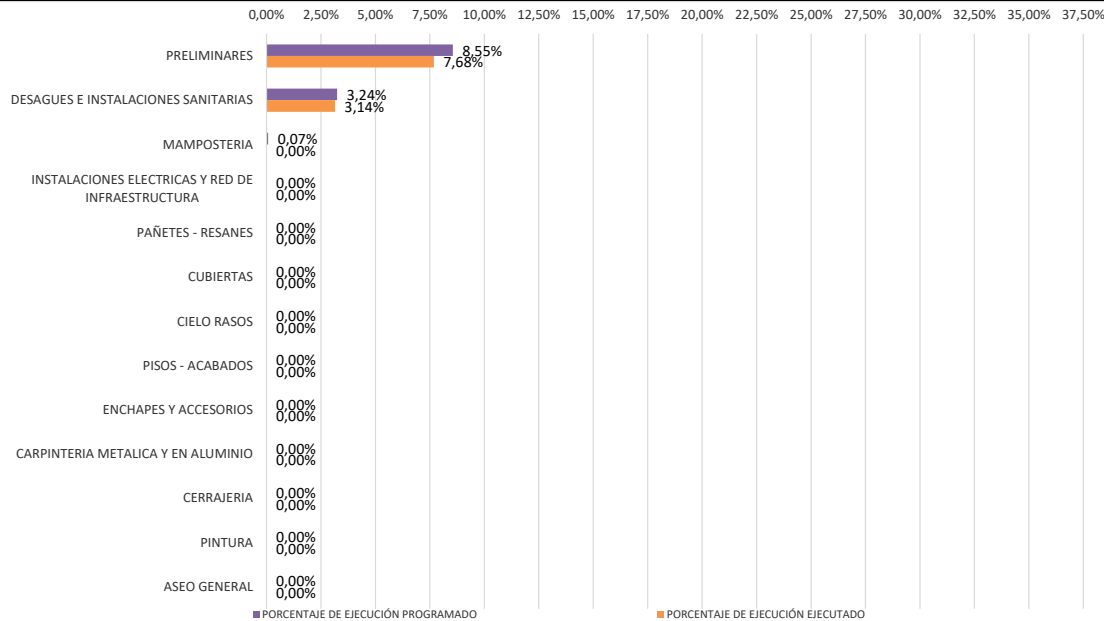

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El Contratista realiza el inicio de las actividades, interviniendo la zona noreste del comedor donde se realiza el desmontaje de la tubería eléctrica, ventiladores y tejas de cubierta, se realiza mantenimiento de perfilera metálica de cubierta y adecuación de espacio para bodega.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR
