


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1					
		VERSION 1										PÁGINA 1 DE 3					
		FECHA 30 DE 4 2022 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,419,520,822.00		MES 1 al 30 de Abril de 2022									
		ACTA FINAL															
CONTRATO No: 973 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Indique día/mes/año)													
		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)													
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.054,00													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 982 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		INTERVENTOR: CONSORCIO ECDIVISION 188		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387.695.087.388,00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ICCOIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 2		Última Acta de de fecha Noviembre 2021		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1-11601	11601	200-13		EXPLANACIONES	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784	2,00	\$ 3.633.784		\$ -		\$ -		\$ -
2	1-11601	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.795.970	95,00	\$ 112.795.970		\$ -		\$ -		\$ -
3	1-11601	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.414.170	530,00	\$ 60.414.170	84,00	\$ 9.575.076		\$ 529,90		\$ 60.402.771
4	1-11601	11601	201-13		Remoción de alcantarías	m	751	\$ 69.636	\$ 52.296.636	751,00	\$ 52.296.636		\$ -		\$ -		\$ -
5	1-11601	11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	\$ 4.475	\$ 19.103.775	5.769,00	\$ 25.816.275		\$ -		\$ -		\$ -
6	1-11601	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.860.000	241.035,00	\$ 14.462.100.000	360,00	\$ 21.600.000		\$ 360,00		\$ 21.600.000
7	1-11601	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	\$ 10.642	\$ 23.235.295.836	2.114.112,00	\$ 22.498.379.904	1.554,00	\$ 16.537.668		\$ 3.279,00		\$ 34.895.118
8	1-11601	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683232	\$ 9.747	\$ 6.659.462.304	683.232,00	\$ 6.659.462.304	14.543,00	\$ 141.750.621		\$ 73.241,00		\$ 713.880.027
9	1-11601	11601	220-1		Terraplenes	m3	58950	\$ 13.119	\$ 772.053.150	58.950,00	\$ 772.053.150		\$ -		\$ -		\$ -
10	1-11601	11601	221-13		Pedregal compacto	m3	2625	\$ 18.609	\$ 48.848.625	2.625,00	\$ 48.848.625		\$ -		\$ -		\$ -
11	1-11601	11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10.393	\$ 619.994.415	59.655,00	\$ 619.994.415		\$ -		\$ 2.876,40		\$ 29.894.425
12	1-11601	11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.332	\$ 973.361.664	730.752,00	\$ 973.361.664		\$ -		\$ -		\$ -
13	2-11602	11602	310-13		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
14	2-11602	11602	311-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329.520	1.864.240,00	\$ 1.728.150.480		\$ -		\$ 424.154,00		\$ 393.190.758
15	2-11602	11602	311-13		Afirmado	m3	70266	\$ 132.094	\$ 9.281.717.004	60.266,00	\$ 7.960.777.004	182,00	\$ 24.041.108		\$ 182,00		\$ 24.041.108
15	2-11602	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180.000	\$ 31.358.880.000	193.113,00	\$ 34.760.340.000		\$ -		\$ -		\$ -
16	2-11602	11602	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 206.680	\$ 20.121.215.100	118.047,00	\$ 24.399.134.430		\$ -		\$ -		\$ -
17	2-11602	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000	21.000,00	\$ 4.663.596.000		\$ -		\$ -		\$ -
18	7-11603	11603	420-13		PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												
19	7-11603	11603	421-13		Rego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848	723.499,00	\$ 2.111.170.082		\$ -		\$ -		\$ -
20	7-11603	11603	450-1P		Rego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	\$ 1.849	\$ 802.524.550	496.965,00	\$ 918.888.295		\$ -		\$ -		\$ -
20	7-11603	11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651	29.881,00	\$ 25.798.149.803		\$ -		\$ -		\$ -
21	7-11603	11603	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879.613	\$ 22.849.706.901	30.677,00	\$ 26.983.888.001		\$ -		\$ -		\$ -
22	7-11603	11603	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	\$ 908.124	\$ 6.674.711.400	12.068,00	\$ 10.959.240.432	1.096,80	\$ 996.030.403		\$ 4.441,90		\$ 4.033.795.996
23	7-11603	11603	460-1P		Freído de pavimento asfáltico	m3	14600	\$ 72.922	\$ 1.063.701.200	19.318,00	\$ 1.406.775.396	1.096,00	\$ 79.812.912		\$ 4.227,00		\$ 307.818.594
24	7-11603	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la	m3	18250	\$ 78.894	\$ 1.439.815.500	18.250,00	\$ 1.439.815.500		\$ -		\$ -		\$ -
25	7-11603	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000	15.000,00	\$ 65.130.000		\$ -		\$ -		\$ -
26	5-11604	11604	600-13		PAVIMENTOS DE CONCRETO												
26	5-11604	11604	600-13		Pavimento de concreto hidráulico	m3	35	\$ 783.524	\$ 27.423.340	61,00	\$ 47.794.964		\$ -		\$ -		\$ -
27	5-11604	11604	600-13		ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
28	5-11604	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	\$ 30.000	\$ 6.258.780.000	215.005,00	\$ 6.450.150.000		\$ -		\$ -		\$ -
29	5-11604	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	\$ 32.000	\$ 4.230.720.000	132.210,00	\$ 4.230.720.000		\$ -		\$ -		\$ -
29	5-11604	11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	\$ 25.968	\$ 3.895.200	150,00	\$ 3.895.200		\$ -		\$ -		\$ -
30	5-11604	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640	120,00	\$ 7.829.640		\$ -		\$ -		\$ -
31	5-11604	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44.832	\$ 785.456.640	17.520,00	\$ 785.456.640		\$ -		\$ 463,20		\$ 20.766.182
32	5-11604	11604	610-13		Releno para estructuras con rebozo	m3	52356	\$ 65.112	\$ 3.409.003.872	52.356,00	\$ 3.409.003.872		\$ -		\$ -		\$ -
33	5-11604	11604	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.592	\$ 89.343.680	40,00	\$ 89.343.680		\$ -		\$ -		\$ -
34	5-11606	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	\$ 368.509	\$ 1.387.067.876	3.764,00	\$ 1.387.067.876		\$ -		\$ -		\$ -
35	5-11604	11604	630.1.1P		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	\$ 1.254.085	\$ 5.905.486.265	4.709,00	\$ 5.905.486.265		\$ -		\$ -		\$ -
36	5-11606	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	\$ 871.292	\$ 4.175.039.984	4.912,00	\$ 4.279.589.824		\$ -		\$ -		\$ -
37	5-11604	11604	630.3.1P		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	\$ 1.033.388	\$ 2.432.595.392	2.354,00	\$ 2.432.595.392	8,00	\$ 8.267.104		\$ 8,00		\$ 8.267.104
38	5-11604	11604	630.3.3P		Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	\$ 1.127.087	\$ 463.232.757	411,00	\$ 463.232.757		\$ -		\$ -		\$ -
39	5-11604	11604	630.3.4P		Concreto clase 28 MPA para tablero y arden	m3	1412	\$ 1.184.864	\$ 1.673.027.968	1.412,00	\$ 1.673.027.968		\$ -		\$ -		\$ -
40	5-11606	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100	5.444,00	\$ 3.929.343.100		\$ -		\$ -		\$ -
41	5-11606	11606	630.4.1P		Concreto armado para parrillas ancladas (Fc = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.480	5.382,00	\$ 5.231.578.480		\$ -		\$ -		\$ -
42	5-11606	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140	1.541,00	\$ 862.570.060	0,60	\$ 323.556		\$ 0,60		\$ 323.556
43	5-11606	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA Colópeo	m3	1137	\$ 485.168	\$ 551.636.016	1.137,00	\$ 551.636.016		\$ -		\$ -		\$ -
44	4-11604	11604	632.1P		Baranda Metálica	m	2915	\$ 545.130	\$ 1.589.053.950	2.915,00	\$ 1.589.053.950		\$ -		\$ -		\$ -
45	4-11606	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	2611800	\$ 5.378	\$ 14.046.290.400	2.615.190,00	\$ 14.064.300.400	920,00	\$ 4.947.760		\$ 920,00		\$ 4.947.760
46	4-11606	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	256153	\$ 6.483	\$ 1.664.486.898	2.561.53,00	\$ 1.664.486.898		\$ -		\$ -		\$ -
47	4-11604	11604	641-13		Acero de Presfuerzo	T-m	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527	2.143.171,00	\$ 4.794.273.527		\$ -		\$ -		\$ -



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
		VERSIÓN 1										PÁGINA 3 DE 3			
FECHA 30 / 4 / 2022 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.419.520.822,00		MES 1 al 30 de Abril de 2022					
		ACTA FINAL													
CONTRATO No.: 873 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-Jun-2021				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-Ago-2029									
		(Indique día/mes/año)				(Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 386 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.054,00							
						(Según contrato principal)									
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387.695.087.388,00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 2	Última Acta de fecha Noviembre 2021	OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.															
			VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES								
OBRA			\$ 1.419.520.822,00		\$ 6.224.053,00		\$ 1.425.744.875								
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -		\$ -		\$ -								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -		\$ -		\$ -								
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -		\$ -		\$ -								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			\$ -		\$ -		\$ -								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			\$ -		\$ -		\$ -								
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			\$ -		\$ -		\$ -								
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ -		\$ -		\$ -								
VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ 1.419.520.822,00		\$ 6.224.053,00		\$ 1.425.744.875								
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)															
G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO											
E		\$ 189.463.365		\$ 860.672.341											
SB		\$ -		\$ -											
B		\$ 24.041.108		\$ 417.231.866											
P		\$ 1.075.843.315		\$ 4.341.614.590											
QA		\$ 15.665.564		\$ 45.233.364											
SCT		\$ -		\$ 1.177.926.407											
OV		\$ -		\$ -											
T		\$ 114.507.470		\$ 472.664.060											
TOTAL		\$ 1.419.520.822		\$ 7.315.342.628											
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)															
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE ICOCIV															
GRUPOS			VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO										
1. Preliminares y explanación			\$ 189.463.365		\$ 860.672.341										
2. Afirmados, subbases y bases			\$ 24.041.108		\$ 417.231.866										
3. Pavimentos asfálticos / concreto			\$ 1.075.843.315		\$ 4.341.614.590										
4. Estructuras hidráulicas y drenajes			\$ 8.267.104		\$ 37.834.904										
5. Obras de urbanismo			\$ -		\$ -										
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental			\$ 7.398.460		\$ 7.398.460										
7. Señalización y control de tránsito			\$ -		\$ 1.177.926.407										
8. Transporte y sobre acarreo			\$ 114.507.470		\$ 472.664.060										
TOTAL			\$ 1.419.520.822		\$ 7.315.342.628										
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE ICOP															
GRUPOS			VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO										
1 Obras de Explanación			\$ 189.463.365		\$ 860.672.341										
2 Sub-bases y bases			\$ 24.041.108		\$ 417.231.866										
3 Transporte de materiales			\$ 114.507.470		\$ 472.664.060										
4 Aceros y elementos metálicos			\$ 4.947.760		\$ 4.947.760										
5 Concretos, morteros y obras varias			\$ 10.717.804		\$ 40.285.604										
6 Concreto para superestructuras			\$ -		\$ -										
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles			\$ 1.075.843.315		\$ 5.519.540.997										
TOTAL			\$ 1.419.520.822		\$ 7.315.342.628										
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.419.520.822															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.121.421.449															
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.127.645.502															
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)															
VALOR EN LETRAS: Mil ciento veintisiete millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos dos Pesos Mte															
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.															
OBSERVACIONES															
NOTAS:															
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.															
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.															
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.															
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).															
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.															
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.															
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.															
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma: Liliana Navarro															
Firma: Mauricio Gómez Caicedo															
Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ															
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAIEDO															
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO															
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO															
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA															
Interventor: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
Matrícula Profesional No.: 25202-80319 CND															
Matrícula Profesional No.: N/A															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).															
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial															

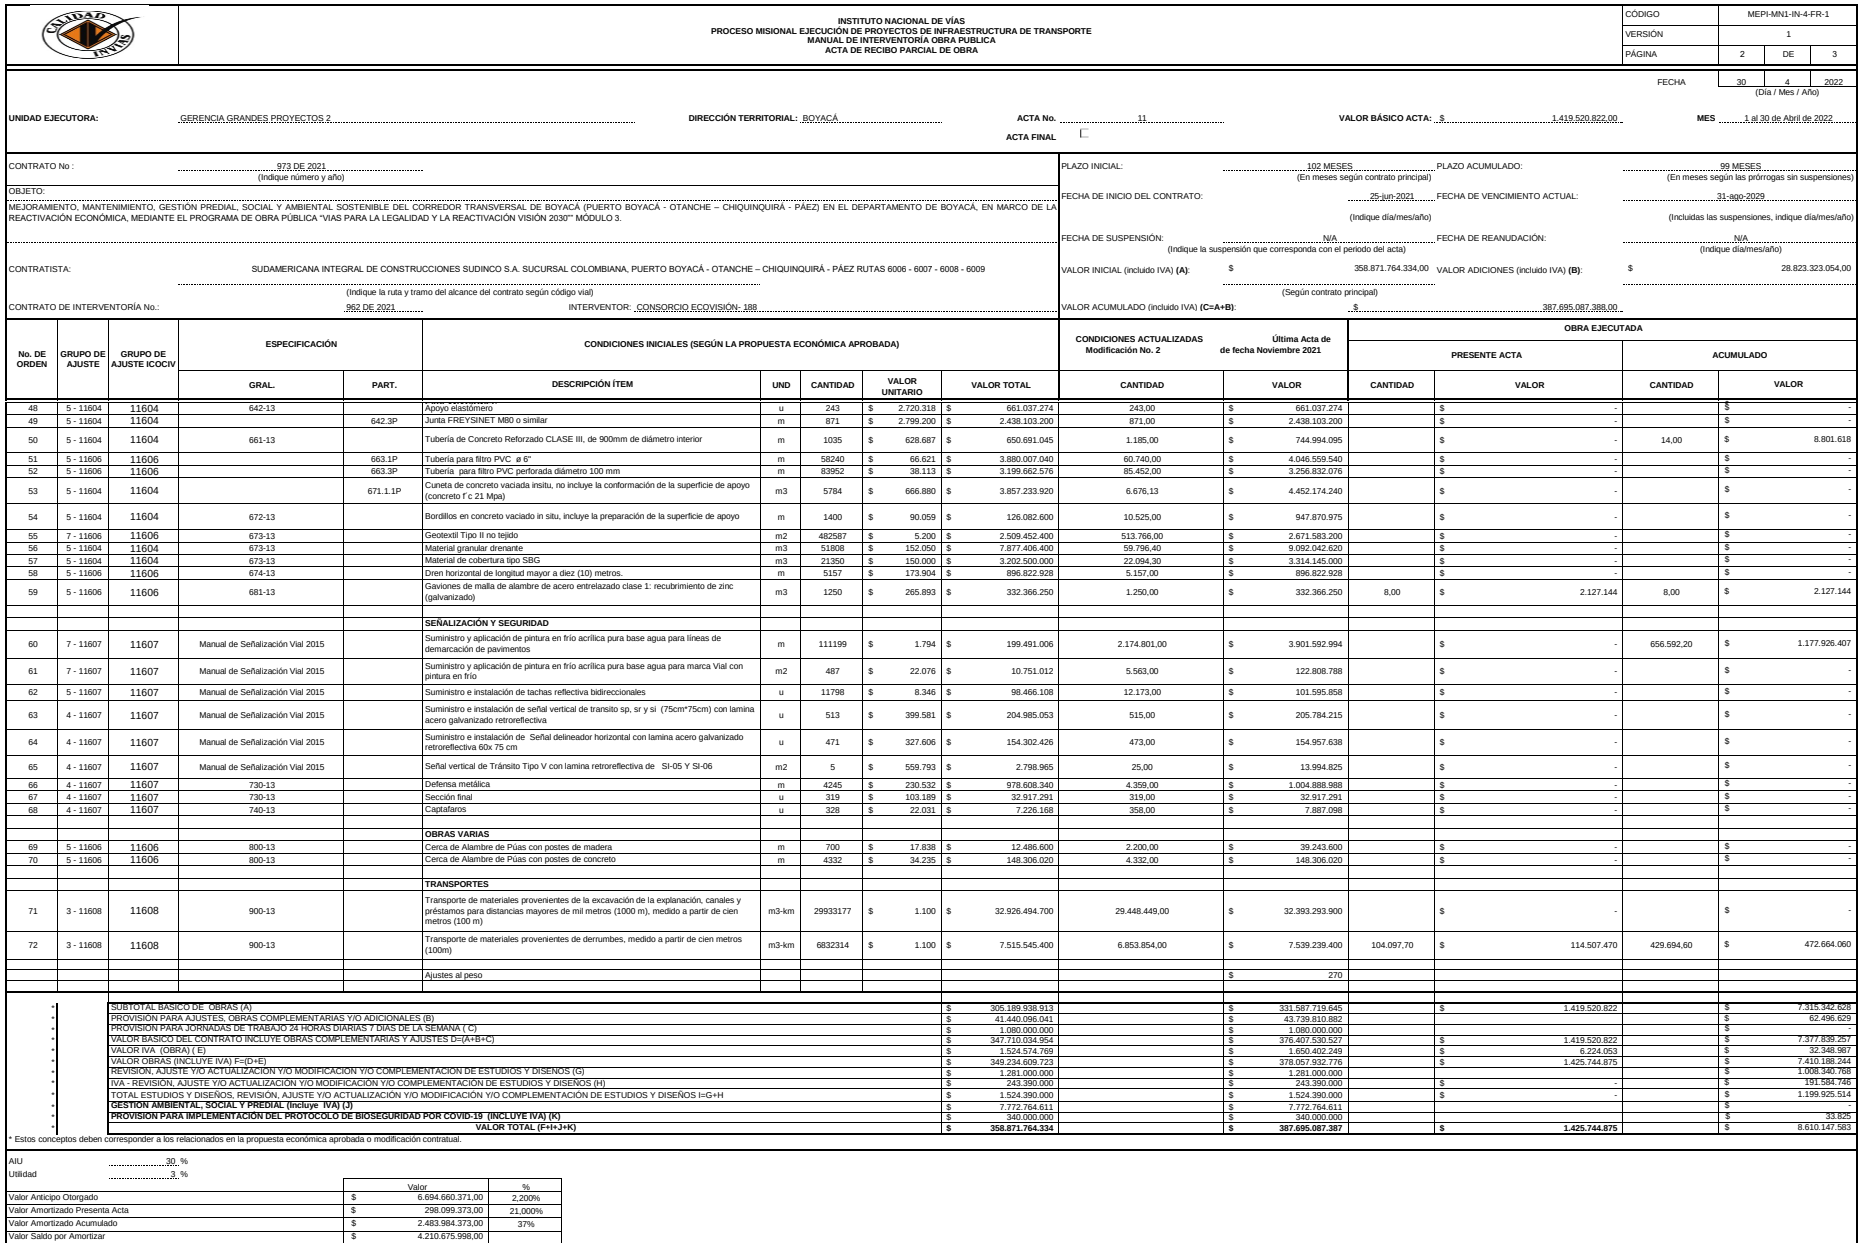

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

		%	TIPO PAGO:	NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☒ 11	1 al 30 de Abril de 2022
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	<u>425821</u>	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	<u>425821</u>	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	<u>153422</u>	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	<u>153422</u>	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	<u>\$ 1.127.645.502</u>
TOTAL ACTA				\$	<u>1.127.645.502</u>

NOTA: El valor total del acta es de \$ 1.425.744.875 y se descuenta el valor por concepto de amortización de anticipo (\$ 298.099.373), por tal razón queda el valor a afectar es de \$ 1.127.645.502

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 1521917469 BOY

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° **973 DE 2021** Contratista: **SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 Acta de **Obra** N°: 11 Valor básico \$ 1.419.520.822 Período: 1 al 30 de Abril de 2022
 Valor Incluido IVA \$ 1.425.744.875

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá		\$ -	\$ -	\$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche		\$ -	\$ 591.040.028	\$ 591.040.028
3	6007	Otanche - Chiquinquirá		\$ -	\$ 39.800.725	\$ 39.800.725
4	6008	Chiquinquirá - Tunja		\$ -	\$ 755.023.352	\$ 755.023.352
5	6009	Tunja - Páez		\$ -	\$ 39.880.770	\$ 39.880.770
						\$ -
						\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 1.425.744.875	\$ 1.425.744.875

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 356.898.661	\$ 355.340.629
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 234.141.367	\$ 233.119.228
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ 14.739.901	\$ 14.675.554
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ 25.060.824	\$ 24.951.422
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ -	\$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ 723.661.813	\$ 720.502.686
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ -	\$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ 31.361.539	\$ 31.224.631
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891802089-1	Cucaíta	Boyacá	\$ -	\$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ -	\$ -
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ 39.880.770	\$ 39.706.672
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ -	\$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ			\$ 1.425.744.875	\$ 1.419.520.822

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
 Matrícula: 25202-80319 CND



Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
 Matrícula: N/A

ACTA DE OBRA No.11	\$ 14 200 000
No. ESTAMPILLA	VALOR
538791	\$ 50 000
538957	\$ 50 000
538958	\$ 50 000
538959	\$ 50 000
538960	\$ 50 000
538961	\$ 50 000
538962	\$ 50 000
538963	\$ 50 000
538964	\$ 50 000
538965	\$ 50 000
538966	\$ 50 000
538967	\$ 50 000
538968	\$ 50 000
538969	\$ 50 000
538970	\$ 50 000
538971	\$ 50 000
538972	\$ 50 000
538973	\$ 50 000
537108	\$ 50 000
537109	\$ 50 000
537110	\$ 50 000
546016	\$ 50 000
546017	\$ 50 000
546018	\$ 50 000
546019	\$ 50 000
546026	\$ 50 000
546027	\$ 50 000
546028	\$ 50 000
546029	\$ 50 000
546030	\$ 50 000
546031	\$ 50 000
546032	\$ 50 000
546033	\$ 50 000
546034	\$ 50 000
546035	\$ 50 000
546036	\$ 50 000
546037	\$ 50 000
546038	\$ 50 000
546039	\$ 50 000
546040	\$ 50 000
546041	\$ 50 000
546042	\$ 50 000
546043	\$ 50 000
546044	\$ 50 000
546045	\$ 50 000
546046	\$ 50 000
546047	\$ 50 000
546048	\$ 50 000

546049	\$ 50 000
546050	\$ 50 000
546051	\$ 50 000
546052	\$ 50 000
546053	\$ 50 000
546054	\$ 50 000
546055	\$ 50 000
546056	\$ 50 000
546057	\$ 50 000
546058	\$ 50 000
546059	\$ 50 000
546060	\$ 50 000
546061	\$ 50 000
546062	\$ 50 000
546063	\$ 50 000
546064	\$ 50 000
546065	\$ 50 000
546066	\$ 50 000
546067	\$ 50 000
546068	\$ 50 000
546069	\$ 50 000
546070	\$ 50 000
546071	\$ 50 000
546072	\$ 50 000
546073	\$ 50 000
546074	\$ 50 000
546075	\$ 50 000
546076	\$ 50 000
546077	\$ 50 000
546078	\$ 50 000
546079	\$ 50 000
546080	\$ 50 000
546081	\$ 50 000
546082	\$ 50 000
546083	\$ 50 000
546084	\$ 50 000
546085	\$ 50 000
546086	\$ 50 000
546087	\$ 50 000
546088	\$ 50 000
546089	\$ 50 000
546090	\$ 50 000
546091	\$ 50 000
546092	\$ 50 000
546093	\$ 50 000
546094	\$ 50 000
546095	\$ 50 000
546096	\$ 50 000
546097	\$ 50 000
546098	\$ 50 000

546099	\$ 50 000
546100	\$ 50 000
546101	\$ 50 000
546102	\$ 50 000
546103	\$ 50 000
546104	\$ 50 000
546105	\$ 50 000
546106	\$ 50 000
546107	\$ 50 000
546108	\$ 50 000
546109	\$ 50 000
546110	\$ 50 000
546111	\$ 50 000
546112	\$ 50 000
546113	\$ 50 000
546114	\$ 50 000
546115	\$ 50 000
546116	\$ 50 000
546117	\$ 50 000
546118	\$ 50 000
546119	\$ 50 000
546120	\$ 50 000
546121	\$ 50 000
546122	\$ 50 000
546123	\$ 50 000
546124	\$ 50 000
546125	\$ 50 000
546126	\$ 50 000
546127	\$ 50 000
546128	\$ 50 000
546129	\$ 50 000
546130	\$ 50 000
546131	\$ 50 000
546132	\$ 50 000
546133	\$ 50 000
546134	\$ 50 000
546135	\$ 50 000
546136	\$ 50 000
546137	\$ 50 000
546138	\$ 50 000
546139	\$ 50 000
546140	\$ 50 000
546141	\$ 50 000
546142	\$ 50 000
546143	\$ 50 000
546144	\$ 50 000
546145	\$ 50 000
546146	\$ 50 000
546147	\$ 50 000
546148	\$ 50 000

546149	\$ 50 000
546150	\$ 50 000
546151	\$ 50 000
546152	\$ 50 000
546153	\$ 50 000
546154	\$ 50 000
546155	\$ 50 000
546156	\$ 50 000
546157	\$ 50 000
546158	\$ 50 000
546159	\$ 50 000
546160	\$ 50 000
546161	\$ 50 000
546162	\$ 50 000
546163	\$ 50 000
546164	\$ 50 000
546165	\$ 50 000
546166	\$ 50 000
546167	\$ 50 000
546168	\$ 50 000
546169	\$ 50 000
546170	\$ 50 000
546171	\$ 50 000
546172	\$ 50 000
546173	\$ 50 000
546174	\$ 50 000
546175	\$ 50 000
546176	\$ 50 000
546177	\$ 50 000
546178	\$ 50 000
546179	\$ 50 000
546180	\$ 50 000
546181	\$ 50 000
546182	\$ 50 000
546183	\$ 50 000
546184	\$ 50 000
546185	\$ 50 000
546186	\$ 50 000
546187	\$ 50 000
546188	\$ 50 000
546189	\$ 50 000
546190	\$ 50 000
546191	\$ 50 000
546192	\$ 50 000
546193	\$ 50 000
546194	\$ 50 000
546195	\$ 50 000
546196	\$ 50 000
546197	\$ 50 000
546198	\$ 50 000

546199	\$ 50 000
546200	\$ 50 000
546201	\$ 50 000
546202	\$ 50 000
546203	\$ 50 000
546204	\$ 50 000
546205	\$ 50 000
546206	\$ 50 000
546207	\$ 50 000
546208	\$ 50 000
546209	\$ 50 000
546210	\$ 50 000
546211	\$ 50 000
546212	\$ 50 000
546213	\$ 50 000
546214	\$ 50 000
546215	\$ 50 000
546216	\$ 50 000
546217	\$ 50 000
546218	\$ 50 000
546219	\$ 50 000
546220	\$ 50 000
546221	\$ 50 000
546222	\$ 50 000
546223	\$ 50 000
546224	\$ 50 000
546225	\$ 50 000
546226	\$ 50 000
546227	\$ 50 000
546228	\$ 50 000
546229	\$ 50 000
546230	\$ 50 000
546231	\$ 50 000
546232	\$ 50 000
546233	\$ 50 000
546234	\$ 50 000
546235	\$ 50 000
546236	\$ 50 000
546237	\$ 50 000
546238	\$ 50 000
546239	\$ 50 000
546240	\$ 50 000
546241	\$ 50 000
546242	\$ 50 000
546243	\$ 50 000
546244	\$ 50 000
546245	\$ 50 000
546246	\$ 50 000
546247	\$ 50 000
546248	\$ 50 000

546249	\$ 50 000
546250	\$ 50 000
546251	\$ 50 000
546252	\$ 50 000
546253	\$ 50 000
546254	\$ 50 000
546255	\$ 50 000
546256	\$ 50 000
546257	\$ 50 000
546258	\$ 50 000
546259	\$ 50 000
546260	\$ 50 000
546261	\$ 50 000
546262	\$ 50 000
546263	\$ 50 000
546264	\$ 50 000
546265	\$ 50 000
546266	\$ 50 000
546267	\$ 50 000
546268	\$ 50 000
546269	\$ 50 000
546270	\$ 50 000
546271	\$ 50 000
546272	\$ 50 000
546273	\$ 50 000
546274	\$ 50 000
546275	\$ 50 000
546301	\$ 50 000
546302	\$ 50 000
546303	\$ 50 000
546304	\$ 50 000
546305	\$ 50 000
246913	\$ 20 000
246914	\$ 20 000
246915	\$ 20 000
246916	\$ 20 000
246917	\$ 20 000
246918	\$ 20 000
246919	\$ 20 000
248154	\$ 20 000
248155	\$ 20 000
246920	\$ 20 000
VALOR TOTAL	\$ 14 200 000

