
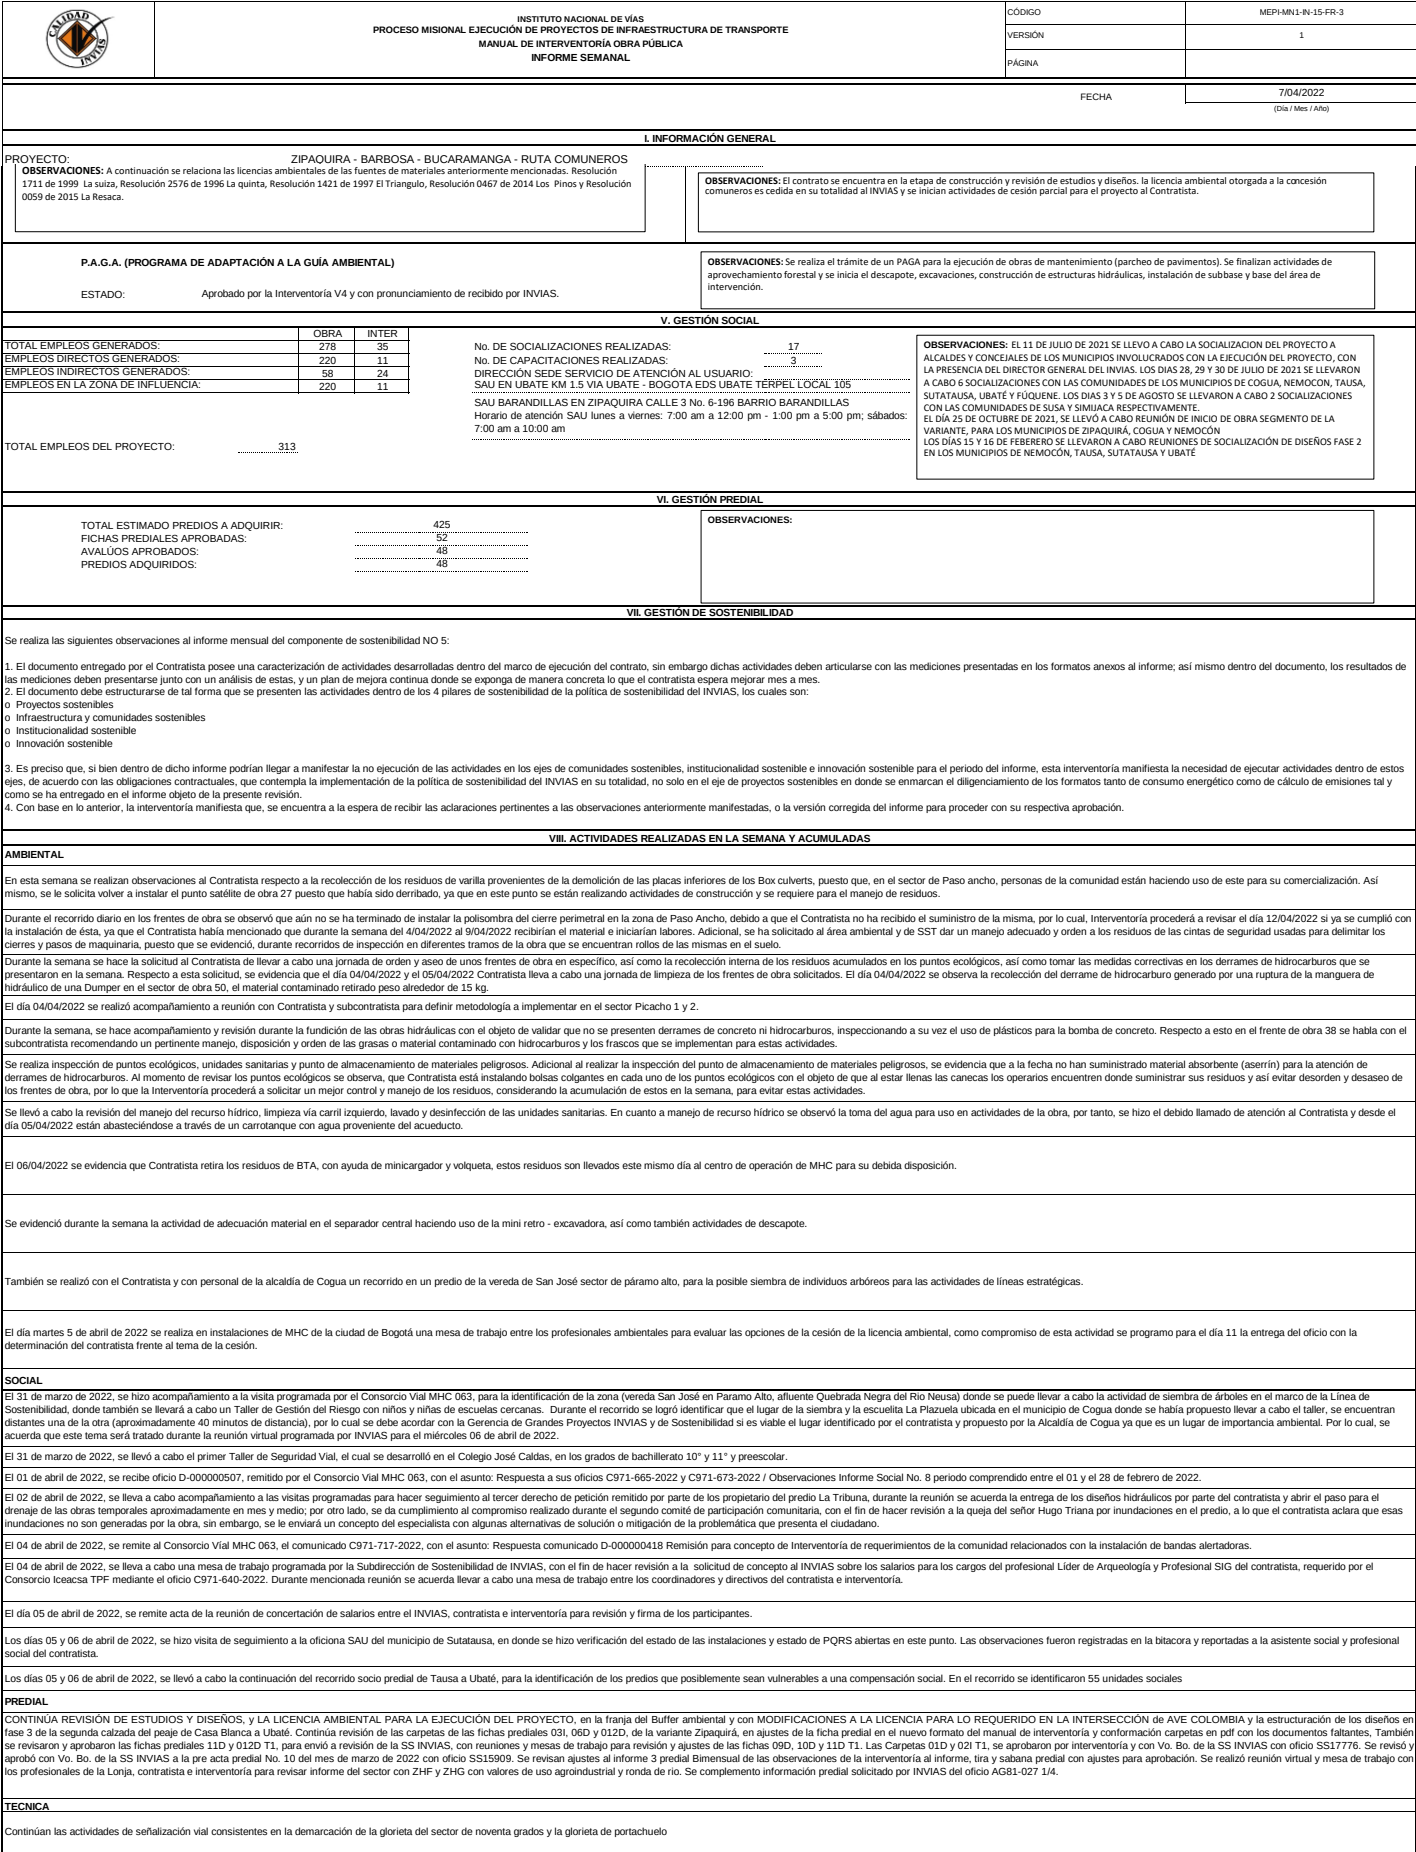




	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP/MN1-RN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/04/2022 (Día / Mes / Año)
L INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS			
Continúan las actividades de construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades: K 0+010 - K 0+084: Se realiza excavación, construcción de pedraplén, instalación de geotextil y conformación de terraplén de ramal de acceso de la intersección de 90° a Variante de Zipaquirá K 0+084 - K 0+125: Se encuentra en corona de terraplén , ramal de acceso de al intersección de 90° a la variante de Zipaquirá K 0+125 - K 0+245 : Se encuentra en corona de terraplén. Ramal de acceso de la intersección de 90° a la variante de Zipaquirá K 0+245 - K 0+330: Se encuentra en corona de terraplén. Ramal de acceso de la intersección de 90° a la variante de Zipaquirá. K 0+370 - K 0+440: instalación de emulsión asfáltica y BTA K 6+555 - K 6+615: instalación de emulsión asfáltica y BTA K 6+560 - K 6+370: Se encuentra instalada BTA K 6+290 - K 6+360: se realiza instalación de subbase K 6+297 - K 6+240: Se encuentra instalada BTA K 6+240 - K 6+120: Se encuentra instalada BTA K 6+120 - K 6+030: Se encuentra instalada BTA K 6+020 - K 5+894: Se encuentra en 8va capa, corona de terraplén K 5+894 - K 5+751: Se encuentra en 9na capa, corona de terraplén K 5+751 - K 5+650: Se encuentra en 8va capa, corona de terraplén K 5+650 - K 5+550: Se encuentra conformado el piso para la instalación de los geo bloques K 5+400 - K 5+530: instalación de 4ta capa de terraplén K 5+210 - K 5+400, continúa instalación de 5ta capa de terraplén K 5+300 Retorno: continúa excavación e instalación de pedraplén K 5+157 - K 5+096: En quinta capa de terraplén K 5+096 - K 4+954: En quinta capa de terraplén K 4+950 - K 5+000: instalación de 5ta capa de terraplén K 4+860 - K 4+950: instalación de 5ta capa de terraplén K 4+800 - K 4+860: instalación de 4ta capa de terraplén K 4+700 - K 4+750: En tercera capa de terraplén K 4+686 - K 4+620: En primera capa de terraplén K 4+620 - K 4+555: Se encuentra en 3ra capa de terraplén K 4+555 - K4+354: En tercera capa de terraplén. K 4+354 - K 4+250: En primera capa de terraplén K 4+170 - K 4+220: continúa instalación de sello rajón K 4+150 - K 4+170: continúa la excavación para estructura de vía K 3+560 - K 4+050: toma de densidades 1er capa de terraplén K 1+570 - K 1+690: Continúa la instalación de pedraplén K 1+530 - K1+570: Se encuentra en excavación K 1+450 - K 0+750: Se encuentra descapotado con zonas de excavación iniciadas En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente de excavación de la explanación: 100m3, Terraplén; 7416m3, Pedraplén Compacto: 3401m3, Base Tratada con Asfalto: 215m3. Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada : Descapote: 5km, Excavación de explanación 3,955km, pedraplén 3,880 km, Terraplén 2,977km, Subbase SGB-38 0,650 km, BTA 0,577 Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 1546m y 290m en proceso de liberación por densidades El horario de trabajo evidenciado durante la semana para la ejecución de las actividades de obra es de 6:00am - 6:00 pm			
Continúa la clasificación y mezclado de materiales provenientes de la cantera de la Resaca y los Pinos, para la obtención de un subbase granular. El Contratista radica la caracterización completa del material a la interventoría, la cual da visto bueno de aprobación.			
La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: (6) Retroexcavadora de oruga, (1) Miniexcavadora de oruga, (1) Retrocargador, (4) Cargadores, (2) minicargadores, (3) Wheelloader (tornadera), (4) Bulldozer de Oruga, (2) Motorveladores, (6) Vibrocompactadores de rodillo, (1) vibrocompactador misto, (2) Benlín, (1) Carrotanque de agua (Ballerena), (7) Volquetas Tipo dumper, (2) Auto hormigonera, (1) Bomba de concreto, (3) Torres de iluminación, (1) Grúa telescópica, (3) compresor, (6) volquetas doble troque , (2) terminadoras de asfalto y (1) Clasificadora de material en el frente de la Variante de Zipaquirá			
Dentro del control de calidad se avanza en la toma de densidades con el ensayo de cono y arena y densímetro nuclear para verificar el cumplimiento del porcentaje de compactación y porcentaje de humedad con el humidómetro (Speedy) de las diferentes capas del terraplén en material adecuado. En los sitios que se inicia la excavación se evalúa la resistencia del suelo con el ensayo del Penetrómetro dinámico de cono. La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.			
Continúa la construcción para la prolongación de las obras transversales existentes en la Variante de Zipaquirá ejecutando las siguientes actividades: K 0+154- Obra No 54 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. K 0+251 - Obra No 53 (Box 2x2): Se encuentran fundida los módulos 1 y 2 K 6+720 - Obra No 52 (Box 2x2): Se encuentran fundida los módulos 1 y 2 K 6+475 - Obra No 51 (Box de 1x1): Inicia la construcción de la caja. K 6+330 - Obra No 50 (Box de 3x3): Obra finalizada K 6+295 - Obra No 49 (Box de 1x1): pendiente las aletas. K 6+240 - Obra No 48 (Box de 1x1): continúa armado de acero de caja K 6+122 - Obra No 47 (Box de 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 6+017 - Obra No 46 (Box de 1x1): continúa conformación para aleta y caja K 5+892 - Obra No 45 (Box de 1x1): continúa excavación para aleta y caja K 5+752 - Obra No 44 (Box de 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 5+637 - Obra No 43 (Alcantarilla de 90cm): Se encuentra con el solado de limpieza. K 5+595 - Obra No 42 (Box de 3x3): se encuentra fundido modulo 1 y 2, placa inferior y muros modulo 3 K 5+577 - Obra No 41 (Box de 4x4): se encuentra fundido módulos 1 y 2 aleta derecha, losa inferior de aleta izquierda K 5+218 - Obra No 39 (Box 1x1): Instalado los módulos prefabricados, pendiente aletas y caja de transición K 5+154 - Obra No 38 (Box 3x3): se encuentra fundida losa inferior modulo 1 , 2 y 3 muros modulo 1 y 2, muro derecho modulo 3 y losa superior modulo 1 K 5+096 - Obra No 37 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+951 - Obra No 36 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+765 - Obra No 35 (box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+686 - Obra No 34 (Box 1x1): instalación de solado de limpieza K 4+555 - Obra No 33 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+355 - Obra No 32 (Box 1x1): instalado módulos prefabricados tramo 1, continúa instalacion de prefabricados tramo 2 K 4+075 - Obra No 31 (Box 1x1): excavación para construcción de prolongación de box culvert existente K 3+840 - Obra No 29 (Box 1x1): Excavada, mejorado el suelo con rajón y fundido solado de limpieza K 3+675 - Obra No 28 (Box 1x1): Excavada, mejorado el suelo con rajón y fundido solado de limpieza K 3+641 - Obra No 27 (Box 1x1): fundida de placa de aletas K 2+130 - Obra No 15: (Box3x3) : continúa armado de acero de vlstapo K 2+010 - obra NO 14 (Box2x2): Se encuentra demolida de placa inferior de losa de aletas de box existente K 1+866 - Obra No 13 (Box 1x1): excavación y mejoramiento de suelo de cimentación K 0+956 - Obra No 4 (Box 2x2): se encuentra fundida losa inferior modulo 1,2,3 y muros de modulo 1 En la semana se ejecutaron cantidades de: Concreto 28 Mpa 8m3			
CORRESPONDENCIA			
El 01 de abril de 2022 se recibió el oficio D-00000503 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-689-2022 (R-229) con asunto: "Solicitud documentación Comunicado D-000000447" junto con su anexo: https://docs.b360.autodesk.com/shares/tfBacfa0-46ab-4800-8add-df2d3e67cc06			
El 01 de abril de 2022 se recibió el oficio D-00000505 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-689-2022 (R-229) con asunto: "Solicitud documentación Comunicado D-000000447" junto con su anexo: https://docs.b360.autodesk.com/shares/e41ea237-8526-46a5-bfc0-2ef83d8a38d4			
El 01 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000506 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a comunicado C971-642-2022 (R-191) con asunto: "Revisión Comunicación D-276 Entrega del diseño geométrico de la Intersección a nivel sector 90 grados Variante Zipaquirá VC Etapa 1. Alcance a Comunicaciones D-522 VA y D193 VB." y a comunicado C971-645-2022 (R-196) con asunto: "Revisión Comunicación D-276 Entrega del diseño geométrico de la Intersección a nivel sector 90 grados Variante Zipaquirá VC Etapa 1. Alcance a Comunicaciones D-522 VA y D193 VB" junto con su anexo: https://docs.b360.autodesk.com/shares/51402246-db65-4696-84ab-15d2e59480d2			
El 01 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000507 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a sus oficios C971-665-2022 y C971-673-2022 / Observaciones Informe Social No. 8 periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2022			
El 31 de marzo de 2022 se recibió el oficio D-000000508 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Entrega de informe semanal SST-semanal, correspondiente a la cuarta semana de marzo (21 al 26 de marzo de 2022)			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000509 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Solicitud de respuesta al oficio D-000000148 de fecha 14 de marzo de 2022 con asunto: Remisión para concepto de Interventoría de requerimientos de la comunidad relacionados con la instalación de bandas alertadoras			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000510 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Entrega Parcial del Diseño de la estructura del Box Culvert Susagua de la Intersección Calle 8. " junto con su anexo: https://docs.b360.autodesk.com/shares/9f71084d-6b4f-4742-853b-e07733d2afa6			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000511 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a sus oficios C971-694-2022, C971-695-2022 y C971-696-2022 / Llamados de atención oficina SAU Sutatausa.			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000512 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a su oficio C971-624-2022 / Recomendaciones para próximas reuniones de Comité de Participación			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000513 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: ENTREGA CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A CANTERA DROMO			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000514 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y DOCUMENTACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL PROYECTO ZIBU." junto con su anexo: https://we.tl/tcFUVh7wLWM			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000516 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a sus oficios C971-599-2022 y C971-676-2022 / Plan de Inversión Social No. 2.			
El 06 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000517 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: ENTREGA FASE 2 COMPILADA EN VERSION D." junto con su anexo: https://docs.b360.autodesk.com/shares/9aa4c41b-965a-472c-a43c-2e5ba4421cca			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000518 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: ETREGA DISEÑOS DE CONCRETO PREMEZCLADO			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000520 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO C971-681-2022 SU OFICIO D000000450 RESPUESTA AL OFICIO C-971-653-2022. RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000521 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Atención comunicado C971-711-2022– R-000000247 – Llamado de atención por incumplimiento Programas de Manejo Ambiental			
El 04 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000522 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Atención comunicado C971-702-2022– R-000000239 – Solicitud de cumplimiento en fechas de entrega del Informe del mes de marzo y el Informe Trimestral			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000524 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-709-2022 (R-245) con asunto: "Remisión acta de reunión 14 de marzo de 2022			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000525 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a comunicado C971-715-2022 (R-253) con asunto: "Su oficio D000000439 Respuesta a comunicados C971-649-2022 (R-199), C971-650-2022 (R-200) y C971-651-2022 (R-201)			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000526 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a comunicado C971-721-2022 (R-258) con asunto: "Respuesta comunicado: D-000000460: Respuesta a C971-613-2022 (R-161), Entrega informe final Volumen III. Geología para la ingeniería-V1 Sector 3 Variante Zipaquirá.			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000527 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta Oficio C971-664-2022 Atención observaciones precio unitario no previsto para traslado de redes eléctricas			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000528 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Solicitud de ítem No previsto TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3 +220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/04/2022 (Día / Mes / Año)
L INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio SS 17776 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Respuesta a Entrada No. 28536 con Fecha 23/03/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SS-17776			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio AF-INVIAS-029 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Solicitud de acompañamiento visitas a sitios ejecución de obras. Auditoría Financiera Vigencia 2021 // Oficio Solicitud de Acompañamiento Visitas AF-INVIAS-029			
El 05 de abril de 2022 se recibió el oficio SS 17614 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Respuesta a Entrada No. 24310 con Fecha 11/03/2022. Respuesta Solicitud de concepto sobre valor máximo para aprobación de salarios de profesionales componente de arqueología. // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SS 17614			
El 06 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000530 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-671-2021, R000000216 con asunto: "Remisión actas de comité de obra"			
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-703-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de información sobre la ejecución del Plan de Acción Consorcio Vial MHC 063 para la implementación de las Líneas Estratégicas INVIAS – Gerencia de Regiones			
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-704-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D-000000422 de asunto entrega de informe semanal correspondiente a la primera semana de marzo (01 al 06 de marzo del 2022)			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA
FECHA		7/04/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL		
PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-705-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D-000000433 de asunto entrega de informe semanal correspondiente a la segunda semana de marzo (07 al 12 de marzo del 2022)		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-706-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado SMC-GGP2 15629		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-707-2022 al Bomberos Zipaquirá con asunto: Información de actividad control del fuego y manejo de extintores		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-708-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Incumplimientos en Seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de obra en la Variante de Zipaquirá.		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-709-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Remisión acta de reunión 14 de marzo de 2022.		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-710-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado Oficio No. 28641 del 23/03/2022.		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-711-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Llamado de atención por incumplimiento Programas de Manejo Ambiental.		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-712-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Ambiental N°6 V2		
El 31 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-713-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Respuesta derecho de petición No 23909		
El 01 de marzo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-714-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Su oficio D-000000466 Traslado de recursos financieros de la vigencia 2023 para la vigencia 2022.		
El 01 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-715-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Su oficio D-000000439 Respuesta a comunicados C971-649-2022 (R-199), C971-650-2022 (R-200) y C971-651-2022 (R-201).		
El 01 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-716-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Solicitud cambio especialista de Geología y/o Geotecnia de Interventoría		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-717-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-000000418 Remisión para concepto de Interventoría de requerimientos de la comunidad relacionados con la instalación de bandas alertadoras.		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-718-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Incumplimiento de entrega de información solicitada componente de Arqueología.		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-719-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Contrato 989 de 2021 – Llamado de Apremio por atraso en ejecución de obras de la Variante de Zipaquirá.		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-720-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a oficio D-000000497 del 29 de marzo de 2022 y concepto sobre ofertas de costos		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-721-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado: D-000000460: Respuesta a C971-613-2022 (R-161), Entrega informe final Volumen III. Geología para la ingeniería-V1 Sector 3 Variante Zipaquirá.		
El 04 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-722-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado: D-000000412: Entrega de Informe Final de Metodología Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención – V0 de Casablanca Ubaté		
El 05 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-724-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Aprobación adición contrato de obra No 989-2021.		
El 05 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-725-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Información Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Recorrido estudiantes en el marco de la línea estratégica del "aula a la obra" programada para el viernes 08 de abril de 2022.		
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.		
Continuar los trabajos de descapote, excavación y mejoramiento de suelo de cimiento con pedraplén y extensión de material adecuado para terraplén. Reanudar la extensión de subbase granular, base tratada con asfalto en la Variante de Zipaquirá, así como verificación de los controles de calidad de materiales y procedimientos constructivos		
Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes, incluyendo la construcción de la caja de transición y estructuras de salida en la Variante de Zipaquirá		
Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubaté y controles de cotas de excavación, mejoramiento con pedraplén y extensión de suelo adecuado para la construcción del terraplén		
Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, mantenimiento de cerramientos, localización de obras de drenaje.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Instalación de emulsión K6+550 - K0+370 (conectante)	Extendido de Base Tratada con Asfalto BTA	Fundida placa inferior aletas OBRA 27
		
Toma de densidades con cono de arena	Instalación capa corona de terraplén K4+860 - K4+950	Excavación e instalación de pedraplén en K5+300 Retorno
		
Visita al predio La Tribuna - atención PQRS	Acompañamiento reunión para definir metodología a implementar en el sector Picacho 1 y 2.	Inspección de puntos ecológicos y unidades sanitarias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-R-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/04/2022 (Día / Mes / Año)
I INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/04/2022 (Día / Mes / Año)
I INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE PEDRAPLÉN, TERRAPLÉN, SUBBASE Y BASE TRATADA CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVIAS Y PARTICULARES DEL PROYECTO			
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ EN LO QUE RESPECTA A LAS INTERSECCIONES DE AVE COLOMBIANA, 90 GRADOS Y PORTACHUELO Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS FASE 2 ENTRE PEAJE DE CASABLANCA - UBATE			
EN LO QUE RESPECTA AL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS DEL PRIMER KILOMETRO PAVIMENTADO DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA AL 18 DE MARZO, LA INTERVENTORÍA REMITÓ OFICIO AL CONTRATISTA INFORMANDO EL INCUMPLIMIENTO Y EL INICIO DE PROCESO SANCIONATORIOS.			
LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA REMISIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, PROGRAMA DE TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN ACORDE A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE EMITIDAS, PARA LA APROBACIÓN Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE TRASLADO DE RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS AL 2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA DE 7 KM PAVIMENTADOS DE SEGUNDA CALZADA AL MES DE JULIO DE 2022.			
REVISIÓN, APROBACIÓN Y REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.			
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (CAMBIOS MENORES Y MODIFICACIONES).		FIRMA: _____ NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD	
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARCHEO, DEMARCACIÓN VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, RUTA 45 A 04, RUTA 45 A 05 RUTA 45ACND Y 45ACNB.			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			
