

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MNFRA-MN-IN-4-FR-1 1 3 DE 3															
FECHA														11		12		2021											
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA GRANDES PROYECTOS				DIRECCIÓN TERRITORIAL				CUNDINAMARCA				ACTA Nº ACTA FINAL		5		VALOR BÁSICO ACTA: \$		1,467,772,666.00		MES		NOVIEMBRE 2021					
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según los prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPOAGUA-BARBOSA-SUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:		21/06/2021				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		28/12/2030							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 883														FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A (Indique la suspensión, indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971-2021														INTERVENIDOR:		CONSORCIO ICEACSA-TFF				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 465,288,090,475.00 (Indique día/mes/año)							
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (A)+(B):		\$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)													
No. de ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2		OBRA EJECUTADA															
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO													
				GRAL.		PART.		DESCRIPCIÓN ITEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
EXPLANACIONES																													
1		1		200-13				Desmonte y limpieza en zonas no boscosas		Ha		72.00		\$ 1,154,770.00		\$ 83,143,440.00		72.00		\$ 83,143,440.00		4.40		\$ 5,080,988.00		4.40		\$ 5,080,988.00	
2		5		201-13				Demolición de Estructuras		m3		4,039.00		\$ 113,400.00		\$ 458,022,600.00		4,039.00		\$ 458,022,600.00		-		\$ -		-		\$ -	
3		5		201-13				Remoción de cercas de alambre		m		9,334.00		\$ 4,470.00		\$ 41,722,980.00		9,334.00		\$ 41,722,980.00		-		\$ -		-		\$ -	
5		1		210-13				Excavación sin clasificar de la explanación y canales		m3		566,041.00		\$ 10,000.00		\$ 5,660,410,000.00		566,041.00		\$ 5,660,410,000.00		6,634.00		\$ 66,340,000.00		6,634.00		\$ 66,340,000.00	
4		1		210-13				Excavación sin clasificar de préstamos		m3		146,834.00		\$ 12,570.00		\$ 1,845,703,380.00		146,834.00		\$ 1,845,703,380.00		-		\$ -		-		\$ -	
6		1		210-13				Excavación en roca de la explanación y canales		m3		14,784.00		\$ 62,890.00		\$ 929,765,760.00		14,784.00		\$ 929,765,760.00		-		\$ -		-		\$ -	
7		1		210-13				Excavaciones en material común de la Explanación y Canales		m3		368,680.00		\$ 10,000.00		\$ 3,686,800,000.00		368,680.00		\$ 3,686,800,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
8		1		220.1				Terraplenes		m3		734,168.00		\$ 12,000.00		\$ 8,810,016,000.00		734,168.00		\$ 8,810,016,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
SUBTOTAL																\$ 21,515,584,160.00				\$ 21,515,584,160.00				\$ 71,420,988.00				\$ 71,420,988.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																													
9		2		320-13				Subbase Granular clase A		m3		184,744.00		\$ 139,000.00		\$ 25,679,416,000.00		184,744.00		\$ 25,679,416,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
10		2		330-13				Base granular clase A		m3		124,370.00		\$ 150,000.00		\$ 18,655,500,000.00		124,370.00		\$ 18,655,500,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
11		2		330-13				Base granular para bacheo clase A		m3		12,600.00		\$ 179,850.00		\$ 2,266,110,000.00		12,600.00		\$ 2,266,110,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
SUBTOTAL																\$ 46,601,028,000.00				\$ 46,601,028,000.00									
PAVIMENTOS ASFALTICOS																													
12		7		420-13				Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		m2		197,124.00		\$ 2,910.00		\$ 573,630,840.00		197,124.00		\$ 573,630,840.00		-		\$ -		-		\$ -	
13		7		421-13				Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		m2		522,324.00		\$ 1,840.00		\$ 961,076,160.00		522,324.00		\$ 961,076,160.00		7,627.00		\$ 14,033,680.00		7,627.00		\$ 14,033,680.00	
14		7				450.1P		Mazda densa en caliente tipo MDC-25		m3		29,548.00		\$ 750,000.00		\$ 22,161,000,000.00		29,548.00		\$ 22,161,000,000.00		789.10		\$ 591,825,000.00		789.10		\$ 591,825,000.00	
15		7				450.2P		Mazda densa en caliente tipo MDC-19		m3		26,624.00		\$ 760,000.00		\$ 20,234,240,000.00		22,378.96		\$ 17,008,009,600.00		-		\$ -		-		\$ -	
16		7				450.10P		Mazda densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos		m3		5,040.00		\$ 795,600.00		\$ 4,009,824,000.00		11,039.00		\$ 8,782,628,400.00		764.40		\$ 608,156,640.00		7,756.40		\$ 6,170,991,840.00	
17		7				460.1P		Fresado de pavimento asfáltico		m3		14,175.00		\$ 72,820.00		\$ 1,032,223,500.00		14,175.00		\$ 1,032,223,500.00		1,554.60		\$ 113,205,972.00		8,524.60		\$ 620,761,372.00	
18		7		465-13				Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.		m3		22,680.00		\$ 78,890.00		\$ 1,789,225,200.00		320.00		\$ 25,244,800.00		-		\$ -		-		\$ -	
19		7		466-13				Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo		m		10,000.00		\$ 4,340.00		\$ 43,400,000.00		60,093.64		\$ 260,806,400.00		-		\$ -		30,006.00		\$ 130,226,040.00	
SUBTOTAL																\$ 50,804,619,700.00				\$ 50,804,619,700.00				\$ 1,327,221,292.00				\$ 7,527,837,932.00	
PAVIMENTOS DE CONCRETO																													
20		7		500-13				Pavimento de concreto Hidráulico		m3		932.00		\$ 837,200.00		\$ 780,270,400.00		932.00		\$ 780,270,400.00		-		\$ -		-		\$ -	
SUBTOTAL																\$ 780,270,400.00				\$ 780,270,400.00									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																													
21		5		600-13				Excavaciones varias sin clasificar		m3		122,977.00		\$ 28,000.00		\$ 3,443,356,000.00		122,977.00		\$ 3,443,356,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
22		5		600-13				Excavaciones varias en roca en seco		m3		11,429.00		\$ 81,880.00		\$ 935,806,520.00		11,429.00		\$ 935,806,520.00		-		\$ -		-		\$ -	
23		5		600-13				Excavaciones varias en material común en seco		m3		3,500.00		\$ 25,950.00		\$ 90,825,000.00		3,500.00		\$ 90,825,000.00		184.80		\$ 4,795,560.00		184.80		\$ 4,795,560.00	
24		1		610-13				Rellenos para Estructuras con suelo		m3		34,322.00		\$ 52,470.00		\$ 1,800,875,340.00		34,322.00		\$ 1,800,875,340.00		-		\$ -		-		\$ -	
25		5		610-13				Relleno para estructuras con rebase		m3		1,884.00		\$ 119,000.00		\$ 224,196,000.00		1,884.00		\$ 224,196,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
26		5		610-13				Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.		m3		34,991.00		\$ 140,000.00		\$ 4,898,740,000.00		34,991.00		\$ 4,898,740,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
27		5				621.1.1P		Plote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)		m		184.00		\$ 2,269,000.00		\$ 421,176,000.00		184.00		\$ 421,176,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
28		5				621.1.2P		Plote de concreto vaciado in situ de diametro 1.50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)		m		3,985.00		\$ 2,300,000.00		\$ 9,165,500,000.00		3,985.00		\$ 9,165,500,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
29		6				630.1.1P		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.		m3		5,986.00		\$ 1,200,000.00		\$ 7,183,200,000.00		5,986.00		\$ 7,183,200,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
30		6				630.1.3P		Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes		m3		14,785.00		\$ 1,500,000.00		\$ 22,177,500,000.00		14,785.00		\$ 22,177,500,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
31		5		630-13				Concreto clase 28 MPA		m3		19,118.00		\$ 810,000.00		\$ 15,485,580,000.00		19,118.00		\$ 15,485,580,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
32		5				630.3.1P		Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas		m3		25,957.00		\$ 900,000.00		\$ 23,361,300,000.00		25,957.00		\$ 23,361,300,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
33		5				630.3.3P		Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes		m3		5,339.00		\$ 1,200,000.00		\$ 6,406,800,000.00		5,339.00		\$ 6,406,800,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
34		5		630-13				Concreto clase 21 MPA		m3		27,163.00		\$ 650,000.00		\$ 17,655,950,000.00		27,163.00		\$ 17,655,950,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
35		5		630-13				Concreto clase 14 MPA		m3		5,433.00		\$ 495,350.00		\$ 2,691,236,550.00		5,433.00		\$ 2,691,236,550.00		-		\$ -		-		\$ -	
36		4				632.1P		Baranda Metálica		m		1,420.00		\$ 548,010.00		\$ 778,174,200.00		1,420.00		\$ 778,174,200.00		-		\$ -		-		\$ -	
37		5		632-13				Baranda de concreto		m		687.00		\$ 214,420.00		\$ 147,306,540.00		687.00		\$ 147,306,540.00		-		\$ -		-		\$ -	
38		4		640-13				Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg		11,840,561.00		\$ 5,378.00		\$ 63,678,537,058.00		11,840,561.00		\$ 63,678,537,058.00		-		\$ -		-		\$ -	
39		4		640-13				Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.		Kg		76,562.00		\$ 5,480.00		\$ 419,559,760.00		76,562.00		\$ 419,559,760.00		-		\$ -		-		\$ -	
40		4		641-13				Acero de Presfuerzo		Tf-m		1,572,187.00		\$ 2,230.00		\$ 3,505,977,010.00		1,572,187.00		\$ 3,505,977,010.00		-		\$ -		-		\$ -	
41		5		642-13				Apoyo elastomérico de 35cm*45cm*5cm		u		156.00		\$ 768,350.00		\$ 119,862,600.00		156.00		\$ 119,862,600.00		-		\$ -		-		\$ -	
42		5				642.2P		Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)		m		228.00		\$ 1,583,120.00		\$ 360,951,360.00		228.00		\$ 360,951,360.00		-		\$ -		-		\$ -	
43		4		650-13				Fabricación de estructura metálica		kg		53,475.00		\$ 11,325.00		\$ 605,604,375.00		53,475.00		\$ 605,604,375.00		-		\$ -		-		\$ -	
44		4		650-13				Transporte de estructura metálica		kg		53,475.00		\$ 200.00		\$ 10,695,000.00		53,475.00		\$ 10,695,000.00		-		\$ -		-		\$ -	
45		4		650-13				Montaje de estructura metálica		kg		53,475.00		\$ 4,286.00		\$ 229,193,850.00		53,475.00		\$ 229,193,850.00		-		\$ -		-		\$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MNFRA-MN-RN-4-FR-1 1 3 DE 3									
												FECHA		11 12 2021								
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL			CUNDINAMARCA			ACTA Nº ACTA FINAL		6		VALOR BÁSICO ACTA: \$		1,467,772,666.00		MES		NOVIEMBRE 2021	
CONTRATO No. : 989 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según los prórrogos sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPOQUIRA -BARBOSA -SUCARAMANGA- GIRÓN -PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 883												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 971-2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4,465,288,090,475.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -								
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4,465,288,090,475.00										
46	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	\$ 600,000.00	\$ 2,233,200,000.00	3,722.00	\$ 2,233,200,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
47	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	\$ 1,264,890.00	\$ 311,162,940.00	246.00	\$ 311,162,940.00	-	\$ -	-	\$ -								
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	\$ 1,834,530.00	\$ 623,740,200.00	340.00	\$ 623,740,200.00	-	\$ -	-	\$ -								
49	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	\$ 38,110.00	\$ 1,601,267,870.00	42,017.00	\$ 1,601,267,870.00	176.00	\$ 6,707,360.00	176.00	\$ 6,707,360.00								
50	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	\$ 580,000.00	\$ 2,056,680,000.00	3,546.00	\$ 2,056,680,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
51	5	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	\$ 86,540.00	\$ 204,753,640.00	2,366.00	\$ 204,753,640.00	-	\$ -	-	\$ -								
52	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	\$ 7,700.00	\$ 486,640,000.00	63,200.00	\$ 486,640,000.00	400.20	\$ 3,081,540.00	400.20	\$ 3,081,540.00								
53	5	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	\$ 130,000.00	\$ 3,548,610,000.00	27,297.00	\$ 3,548,610,000.00	97.00	\$ 12,610,000.00	97.00	\$ 12,610,000.00								
54	5	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	\$ 170,000.00	\$ 928,030,000.00	5,459.00	\$ 928,030,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
55	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	\$ 173,900.00	\$ 227,635,100.00	1,309.00	\$ 227,635,100.00	87.00	\$ 15,129,300.00	189.00	\$ 32,867,100.00								
56	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	\$ 248,500.00	\$ 534,275,000.00	2,150.00	\$ 534,275,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
Subtotal								\$ 198,553,897,913.00		\$ 198,553,897,913.00		\$ 42,323,760.00		\$ 60,061,960.00								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																						
57	7	1P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	\$ 1,790.00	\$ 1,675,184,030.00	935,857.00	\$ 1,675,184,030.00	4,301.10	\$ 7,698,969.00	9,340.40	\$ 16,719,316.00								
58	7	2P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	3,068.00	\$ 22,070.00	\$ 67,710,760.00	3,068.00	\$ 67,710,760.00	205.96	\$ 4,545,537.00	434.71	\$ 9,594,050.00								
59	7	3P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	\$ 59,980.00	\$ 647,424,120.00	10,794.00	\$ 647,424,120.00	-	\$ -	-	\$ -								
60	7	4P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	\$ 8,340.00	\$ 446,306,760.00	53,514.00	\$ 446,306,760.00	294.00	\$ 2,451,960.00	294.00	\$ 2,451,960.00								
61	4	5P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	\$ 397,600.00	\$ 860,406,400.00	2,164.00	\$ 860,406,400.00	-	\$ -	-	\$ -								
62	4	6P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	\$ 325,630.00	\$ 883,759,820.00	2,714.00	\$ 883,759,820.00	-	\$ -	-	\$ -								
63	4	6P	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	\$ 504,590.00	\$ 80,229,810.00	159.00	\$ 80,229,810.00	24.00	\$ 12,110,160.00	108.00	\$ 54,495,720.00								
64	5	720-13		Poste de referencia	u	500.00	\$ 254,830.00	\$ 127,415,000.00	500.00	\$ 127,415,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
65	4	730-13		Defensa metálica	m	4,000.00	\$ 230,530.00	\$ 922,120,000.00	4,000.00	\$ 922,120,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
66	4	740-13		Captafaros	u	1,000.00	\$ 22,030.00	\$ 22,030,000.00	1,000.00	\$ 22,030,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
Subtotal								\$ 5,732,586,700.00		\$ 5,732,586,700.00		\$ 26,806,626.00		\$ 83,261,046.00								
OBRAS SUBTERRÁNEAS																						
67	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	\$ 221,660.00	\$ 2,290,191,120.00	10,332.00	\$ 2,290,191,120.00	-	\$ -	-	\$ -								
68	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	\$ 253,200.00	\$ 4,100,574,000.00	16,195.00	\$ 4,100,574,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
69	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	\$ 291,510.00	\$ 979,473,600.00	3,360.00	\$ 979,473,600.00	-	\$ -	-	\$ -								
70	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	\$ 300,000.00	\$ 4,402,200,000.00	14,674.00	\$ 4,402,200,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
71	5		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas andados con lechada	m	2,000.00	\$ 100,640.00	\$ 201,280,000.00	2,000.00	\$ 201,280,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
72	5		PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	\$ 1,166,190.00	\$ 2,811,684,090.00	2,411.00	\$ 2,811,684,090.00	-	\$ -	-	\$ -								
73	5		PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto. En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	\$ 970,770.00	\$ 593,140,470.00	611.00	\$ 593,140,470.00	-	\$ -	-	\$ -								
74	4		PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	\$ 10,648.00	\$ 1,875,144,744.00	176,103.00	\$ 1,875,144,744.00	-	\$ -	-	\$ -								
75	5		PT-8	Geomembrana Impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	\$ 83,100.00	\$ 259,604,400.00	3,124.00	\$ 259,604,400.00	-	\$ -	-	\$ -								
76	5		PT-9	Caja de inspección de 0.65 m x 0.65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	\$ 1,053,100.00	\$ 74,770,100.00	71.00	\$ 74,770,100.00	-	\$ -	-	\$ -								
77	4		PT-10	Tubería para entífies: Tubería metálica de 4" de diametro	m	5,341.00	\$ 258,899.00	\$ 1,382,779,559.00	5,341.00	\$ 1,382,779,559.00	-	\$ -	-	\$ -								
Subtotal								\$ 18,970,842,083.00		\$ 18,970,842,083.00		\$ -		\$ -								
OBRAS VARIAS																						
78	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	\$ 34,230.00	\$ 1,023,477,000.00	29,900.00	\$ 1,023,477,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
79	5	810-13		Proteccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	\$ 13,000.00	\$ 3,524,794,000.00	271,138.00	\$ 3,524,794,000.00	-	\$ -	-	\$ -								
Subtotal								\$ 4,548,271,000.00		\$ 4,548,271,000.00		\$ -		\$ -								
TRANSPORTES																						
80	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	\$ 1,100.00	\$ 8,228,339,900.00	7,480,309.00	\$ 8,228,339,900.00	-	\$ -	-	\$ -								
Subtotal								\$ 8,228,339,900.00		\$ 8,228,339,900.00		\$ -		\$ -								
SUBTOTAL OBRAS								\$ 356,735,437,856.00		\$ 356,735,437,856.00		\$ 1,467,772,666.00		\$ 7,742,581,528.00								
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 27,957,104,337.00		\$ 27,957,104,337.00		\$ -		\$ 312,247,709.00								
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA								\$ 1,200,000,000.00		\$ 1,200,000,000.00		\$ -		\$ -								
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES								\$ 384,892,542,193.00		\$ 384,892,542,193.00		\$ 1,467,772,666.00		\$ 8,054,829,235.00								
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 1,125,070,508.00		\$ 1,125,070,508.00		\$ 4,290,412.00		\$ 23,544,886.00								
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 386,017,612,701.00		\$ 386,017,612,701.00		\$ 1,472,063,078.00		\$ 8,078,374,121.00								



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	6	NOVIEMBRE 2021
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO <u>422021</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$	1,472,063,078.00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO \$	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO \$	
			TOTAL ACTA \$	1,472,063,078.00

NOTAS:

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO
ALFONSO VARGAS
LEYTON

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 25202-099324

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	989-2021	Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 063
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.			
Acta N° 6	Valor básico	\$	1,467,772,666.00
Valor Incluido Iva	\$		1,472,063,078.00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45A04 - 45A07	CORREDOR VIAL ZIQAUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ 1,472,063,078.00	\$ -		\$ 1,472,063,078.00
2					\$ -	\$ -
3					\$ -	\$ -
4					\$ -	\$ -
5					\$ -	\$ -
6					\$ -	\$ -
7					\$ -	\$ -
8					\$ -	\$ -
9					\$ -	\$ -
10					\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 1,472,063,078.00	\$ -	\$ -	\$ 1,472,063,078.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	\$ 50,050,144.65	\$ 49,904,270.64
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	\$ 16,192,693.86	\$ 16,145,499.33
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	\$ 2,944,126.16	\$ 2,935,545.33
	MUNICIPIO 5	SUSA	\$ 606,489,988.14	\$ 604,722,338.39
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	\$ 2,944,126.16	\$ 2,935,545.33
	MUNICIPIO 7	TAUSA	\$ 98,628,226.23	\$ 98,340,768.62
	MUNICIPIO 8	UBATE	\$ 48,578,081.57	\$ 48,436,497.98
	MUNICIPIO 9	ZIQAUIRA	\$ 30,913,324.64	\$ 30,823,225.99
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 856,740,711.40	\$ 854,243,692.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUINQUIRA	\$ 615,322,366.60	\$ 613,528,974.00
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 615,322,366.60	\$ 613,528,974.00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente
por MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES
Fecha: 2021.12.13
08:21:38 -05'00'

CONTRATISTA
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
 Representante Legal

INTERVENTOR
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
 Representante Legal (S)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2

VERSION 1

PÁGINA 1 DE 10

FECHA 11 DE 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE NOVIEMBRE 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,467,772,666.00

SEGUIMIENTO No. 6

(La numeración debe ser consecutiva y correspondiente al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.:	989 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIACIÓN:	21-jun-21	FECHA DE VENCIMIENTO:	26-dic-30
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A04, 45A05, 45A06 Y 45A07	FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	971 - 2021	INTERVENIENTOR:	CONSORCIO ICEACSA - TFF	VALOR INICIAL (Incluido IVA):	\$ 465,288,090,475.00
		VALOR TOTAL ACUMULADO:	\$ 465,288,090,475.00	VALOR ADICIONES:	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR ACUMULADO Miles de pesos	ACTA N°	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						21-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	1-sep-21	1-oct-21	1-nov-21	1-dic-21	1-ene-22	1-feb-22	1-mar-22	1-abr-22	1-may-22	
						30-jun-21	31-jul-21	31-ago-21	30-sep-21	31-oct-21	30-nov-21	31-dic-21	31-ene-22	28-feb-22	31-mar-22	30-abr-22	31-may-22	
EXPLANACIONES	(\$ 21,515,584.16)	(6.05%)	0.02%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 60,544	\$ 1,724,610	\$ 2,509,206	\$ 3,539,513	\$ 4,511,009	\$ 4,956,506	\$ 5,077,752	100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	(\$ 46,601,026.00)	(13.10%)	0.00%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 71,421							96%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	(\$ 50,804,619.70)	(14.28%)	2.116%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 6,767,197	\$ 7,201,365	\$ 7,288,207	\$ 7,418,470	\$ 7,529,789	\$ 7,613,781	\$ 8,071,799	92%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	(\$ 780,270.40)	(0.22%)	0.00%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								98%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	(\$ 198,553,897.91)	(55.82%)	0.02%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 48,090	\$ 137,405	\$ 387,124	\$ 559,920	\$ 753,379	\$ 973,880	\$ 1,194,380	84%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	(\$ 5,732,586.70)	(1.61%)	0.02%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 17,738	\$ 60,062						80%
OBRAS SUBTERRANEAS	(\$ 18,970,842.08)	(5.33%)	0.00%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 42,386	\$ 56,454	\$ 262,586	\$ 296,913	\$ 318,364	\$ 327,825	\$ 337,285	76%
OBRAS VARIAS	(\$ 4,548,271.00)	(1.28%)	0.00%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 83,261							72%
TRANSPORTES	(\$ 8,228,339.90)	(2.31%)	0.00%	% P \$ P \$ E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 23,494	\$ 579,568	\$ 835,301	\$ 1,166,094	\$ 1,241,701	\$ 1,354,833	\$ 1,407,953	68%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	(\$ 355,735,437.86)	(100.00%)	2.18%			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	(\$ 355,735,437.86)	100.00%	\$ 7,742,581.53			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.47%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.50%	0.47%	0.65%
VALOR (Miles de Pesos)		0.00	8,684.20	1,997,366.00	1,409,652.26	1,664,361.42	2,081,846.51	2,777,950.19	1,398,341.46	1,810,069.86	1,763,742.23	1,678,661.36	2,297,983.08
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.56%	0.96%	1.43%	2.01%	2.79%	3.19%	3.70%	4.19%	4.66%	5.31%
VALOR (Miles de Pesos)		0.00	8,684.20	2,006,050.20	3,415,702.46	5,080,063.88	7,161,910.39	9,939,860.58	11,338,202.03	13,148,271.89	14,912,014.12	16,590,675.48	18,888,658.56
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.13%	0.48%	0.46%	0.79%	0.41%						
VALOR (Miles de Pesos)		0.00	458,959.97	1,700,773.33	1,628,695.73	2,486,379.83	1,467,772.67						
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.13%	0.61%	1.06%	1.76%	2.18%						
VALOR (Miles de Pesos)		0.00	458,959.97	2,159,733.30	3,788,429.03	6,274,808.86	7,742,581.53						

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	(\$ 27,957,104.34)	(\$ 0.00)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	(\$ 1,200,000.00)	(\$ 0.00)
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	(\$ 1,125,070.51)	(\$ 4,290.41)
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	(\$ 2,640,000.00)	(\$ 0.00)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	(\$ 501,600.00)	(\$ 0.00)
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	(\$ 75,778,877.77)	(\$ 0.00)
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	(\$ 350,000.00)	(\$ 1,622.18)
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	(\$ 109,552,652.62)	(\$ 4,290.41)
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	(\$ 465,288,090.48)	(\$ 1,472,063.08)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 465,288,090.48	\$ 8,552,100.00

NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:


MARIO ALBERTO HUERTAS COTES


MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
MAT. PROF. 14502 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL MHC 063


Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2021.12.13 08:22:05 -05'00'


LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
MAT. PROF. 68202-16905 SDER
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
CONSORCIO ICEACSA - TFF


CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		







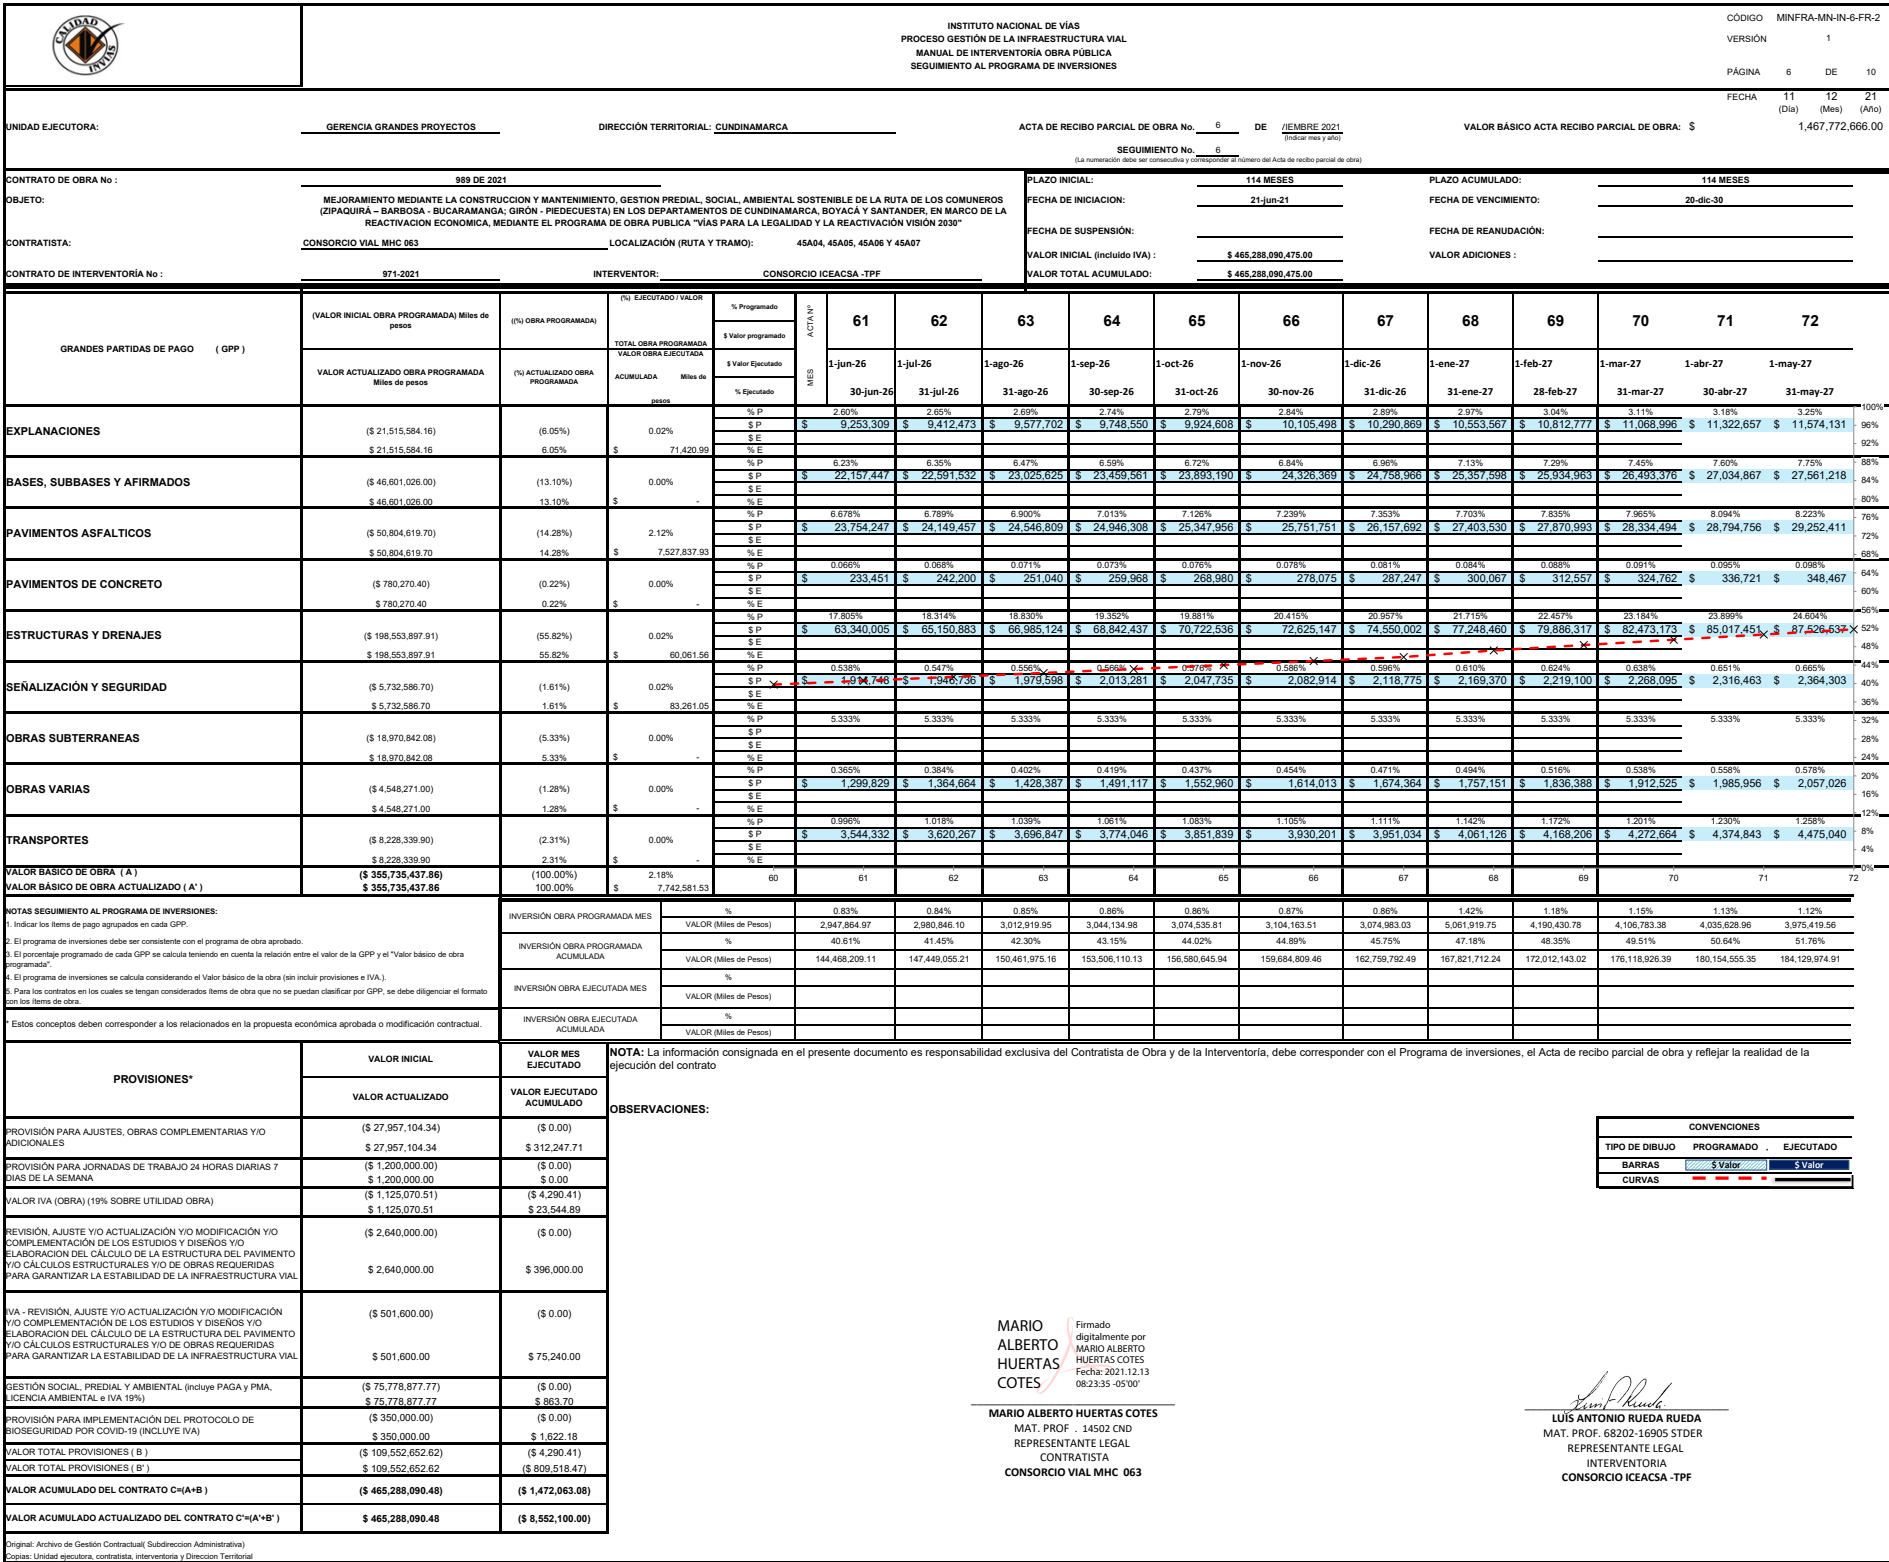



VERSIÓN 1

FECHA	11	12	21
-------	----	----	----

(Día) (Mes) (Año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$	1,467,772,666.00
---	----	------------------

SEGUIMIENTO No. 6

PLAZO INICIAL:	114 MESES
----------------	-----------

E INICIACION: 21-jun-21

.....

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

VALOR TOTAL ACUMULADO:	\$ 465.288.090.475,00
------------------------	-----------------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

INTERVENTOR: _____

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES												
1. 1.10% 1.10% 1.09% 1.08% 1.07% 1.08% 1.09% 0.77% 0.79% 0.81% 1.00% 1.21%												
2. VALOR (Miles de Pesos)												
3. 3,924,794.04 3,897,270.85 3,861,297.14 3,831,832.10 3,806,095.62 3,829,686.03 3,878,393.21 3,726,988.01 3,812,424.86 3,893,770.79 3,562,224.25 4,300,847.62												
4. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.												
5. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA												
6. VALOR (Miles de Pesos)												
7. 52.86% 53.04% 56.12% 57.19% 59.36% 60.13% 60.92% 61.73% 62.73% 63.94%												
8. 188,054,768.95 191,952,039.80 195,813,336.94 199,645,169.04 203,453,264.66 207,282,950.69 211,161,343.90 213,888,331.91 216,701,756.77 219,595,527.56 223,157,751.81 227,458,599.43												
9. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.)												
10. Para los contratos en los cuales se tengan considerados Items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los Items de obra.												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES												
VALOR (Miles de Pesos)												
%												
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA												
VALOR (Miles de Pesos)												
%												

NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		


MARIO
ALBERTO
HUERTAS
COTES

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
MAT. PROF . 14502 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL MHC 063


LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
MAT. PROF. 68202-16905 STDER
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
CONSORCIO ICEACSA -TPF

Original: Archivo de Gestión Contractual(Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad ejecutora, contratista, interventoria y Direccion Territorial



SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR	% Programado	ACTIV. N°	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Ejecutado	% Ejecutado														
	VALOR OBRA EJECUTADA	% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	% Ejecutado	% Ejecutado													
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	ACUMULADA Miles de pesos	ACUMULADA Miles de pesos	ACUMULADA Miles de pesos	MES	1-jun-28	31-jul-28	31-ago-28	30-sep-28	31-oct-28	30-nov-28	31-dic-28	31-ene-29	28-feb-29	31-mar-29	30-abr-29	31-may-29
	pesos	pesos	pesos	pesos	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P
EXPLANACIONES	(\$ 21,515,584.16)	(6.05%)	0.02%	\$ 71,420.09		4.12%	4.22%	4.33%	4.43%	4.54%	4.64%	4.75%	4.83%	5.09%	5.18%	5.25%	5.32%
	\$ 21,515,584.16	6.05%				\$ 14,654,620	\$ 15,025,834	\$ 15,407,250	\$ 15,759,579	\$ 16,154,159	\$ 16,510,267	\$ 16,902,047	\$ 17,553,497	\$ 18,105,528	\$ 18,430,836	\$ 18,686,133	\$ 18,918,754
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	(\$ 46,601,026.00)	(13.10%)	0.00%			9.38%	9.56%	9.75%	9.91%	10.10%	10.27%	10.45%	10.75%	11.00%	11.14%	11.26%	11.36%
	\$ 46,601,026.00	13.10%				\$ 33,367,933	\$ 34,013,274	\$ 34,668,975	\$ 35,270,595	\$ 35,936,517	\$ 36,531,281	\$ 37,176,784	\$ 38,243,785	\$ 39,132,781	\$ 39,545,944	\$ 40,042,057	\$ 40,389,277
PAVIMENTOS ASFALTICOS	(\$ 50,804,619.70)	(14.28%)	2.12%			9.834%	10.033%	10.239%	10.430%	10.645%	10.841%	11.058%	11.422%	11.734%	11.923%	12.074%	12.214%
	\$ 50,804,619.70	14.28%	\$ 7,527,837.93			\$ 34,984,108	\$ 35,692,246	\$ 36,423,448	\$ 37,102,677	\$ 37,868,119	\$ 38,563,806	\$ 39,335,495	\$ 40,630,432	\$ 41,743,486	\$ 42,414,076	\$ 42,951,698	\$ 43,450,145
PAVIMENTOS DE CONCRETO	(\$ 780,270.40)	(0.22%)	0.00%			0.137%	0.141%	0.146%	0.151%	0.156%	0.160%	0.165%	0.173%	0.184%	0.187%	0.189%	0.190%
	\$ 780,270.40	0.22%				\$ 487,196	\$ 503,614	\$ 520,465	\$ 536,017	\$ 553,420	\$ 569,117	\$ 586,376	\$ 615,062	\$ 639,360	\$ 653,673	\$ 664,905	\$ 675,139
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	(\$ 198,553,897.91)	(55.82%)	0.02%			33.225%	34.287%	35.384%	36.406%	37.559%	38.610%	39.778%	41.745%	43.443%	44.473%	45.303%	46.076%
	\$ 198,553,897.91	55.82%	\$ 60,061.95			\$ 118,193,902	\$ 121,969,817	\$ 125,874,300	\$ 129,507,627	\$ 133,610,413	\$ 137,348,566	\$ 141,505,142	\$ 146,501,699	\$ 154,542,289	\$ 158,505,287	\$ 161,158,741	\$ 163,908,120
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	(\$ 5,732,586.70)	(1.61%)	0.02%			0.936%	0.972%	1.006%	1.042%	1.078%	1.111%	1.147%	1.256%	1.285%	1.307%	1.328%	1.328%
	\$ 5,732,586.70	1.61%	\$ 83,261.05			\$ 3,331,207	\$ 3,458,361	\$ 3,587,438	\$ 3,705,322	\$ 3,835,973	\$ 3,952,748	\$ 4,080,116	\$ 4,290,266	\$ 4,466,748	\$ 4,569,748	\$ 4,650,209	\$ 4,723,533
OBRAS SUBTERRANEAS	(\$ 18,970,842.08)	(5.33%)	0.00%			5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
	\$ 18,970,842.08	5.33%															
OBRAS VARIAS	(\$ 4,548,271.00)	(1.28%)	0.00%			0.799%	0.824%	0.849%	0.873%	0.899%	0.923%	0.949%	0.962%	1.028%	1.050%	1.066%	1.062%
	\$ 4,548,271.00	1.28%				\$ 2,841,278	\$ 2,930,291	\$ 3,021,359	\$ 3,105,152	\$ 3,198,666	\$ 3,282,800	\$ 3,375,118	\$ 3,528,293	\$ 3,657,810	\$ 3,734,007	\$ 3,793,824	\$ 3,848,425
TRANSPORTES	(\$ 8,228,339.90)	(2.31%)	0.00%			1.606%	1.644%	1.684%	1.720%	1.761%	1.798%	1.838%	1.905%	1.962%	1.995%	2.021%	2.045%
	\$ 8,228,339.90	2.31%				\$ 5,711,627	\$ 5,										

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	(\$ 27.957,104.34)	(\$ 0.00)
	\$ 27.957,104.34	\$ 312,247.71
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	(\$ 1,200,000.00)	(\$ 0.00)
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	(\$ 1,125,070.51)	(\$ 4,290.41)
	\$ 1,125,070.51	\$ 23,544.89
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	(\$ 2,640,000.00)	(\$ 0.00)
	\$ 2,640,000.00	\$ 396,000.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	(\$ 501,600.00)	(\$ 0.00)
	\$ 501,600.00	\$ 75,240.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA, 19%)	(\$ 75,778,877.77)	(\$ 0.00)
	\$ 75,778,877.77	\$ 863.70
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	(\$ 350,000.00)	(\$ 0.00)
	\$ 350,000.00	\$ 1,622.18
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	(\$ 109,552,652.62)	(\$ 4,290.41)
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	\$ 109,552,652.62	(\$ 809,518.47)
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	(\$ 465,288,090.48)	(\$ 1,472,063.08)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 465,288,090.48	(\$ 8,552,100.00)

NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES

PROGRAMADO

EJECUTADO

\$ Valor

\$ Valor

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2021.12.13 08:24:17 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

MAT. PROF . 14502 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL MHC 063

Luis Antonio Rueda Rueda


LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA


MAT. PROF. 68202-16905 STDER

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
CONSORCIO ICEACSA -TPF


LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
 MAT. PROF. 68202-16905 STDER
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORIA
 CONSORCIO ICEACSA - TPF

Copias: Unidad electora, contratista, interventoría y Dirección Territorial

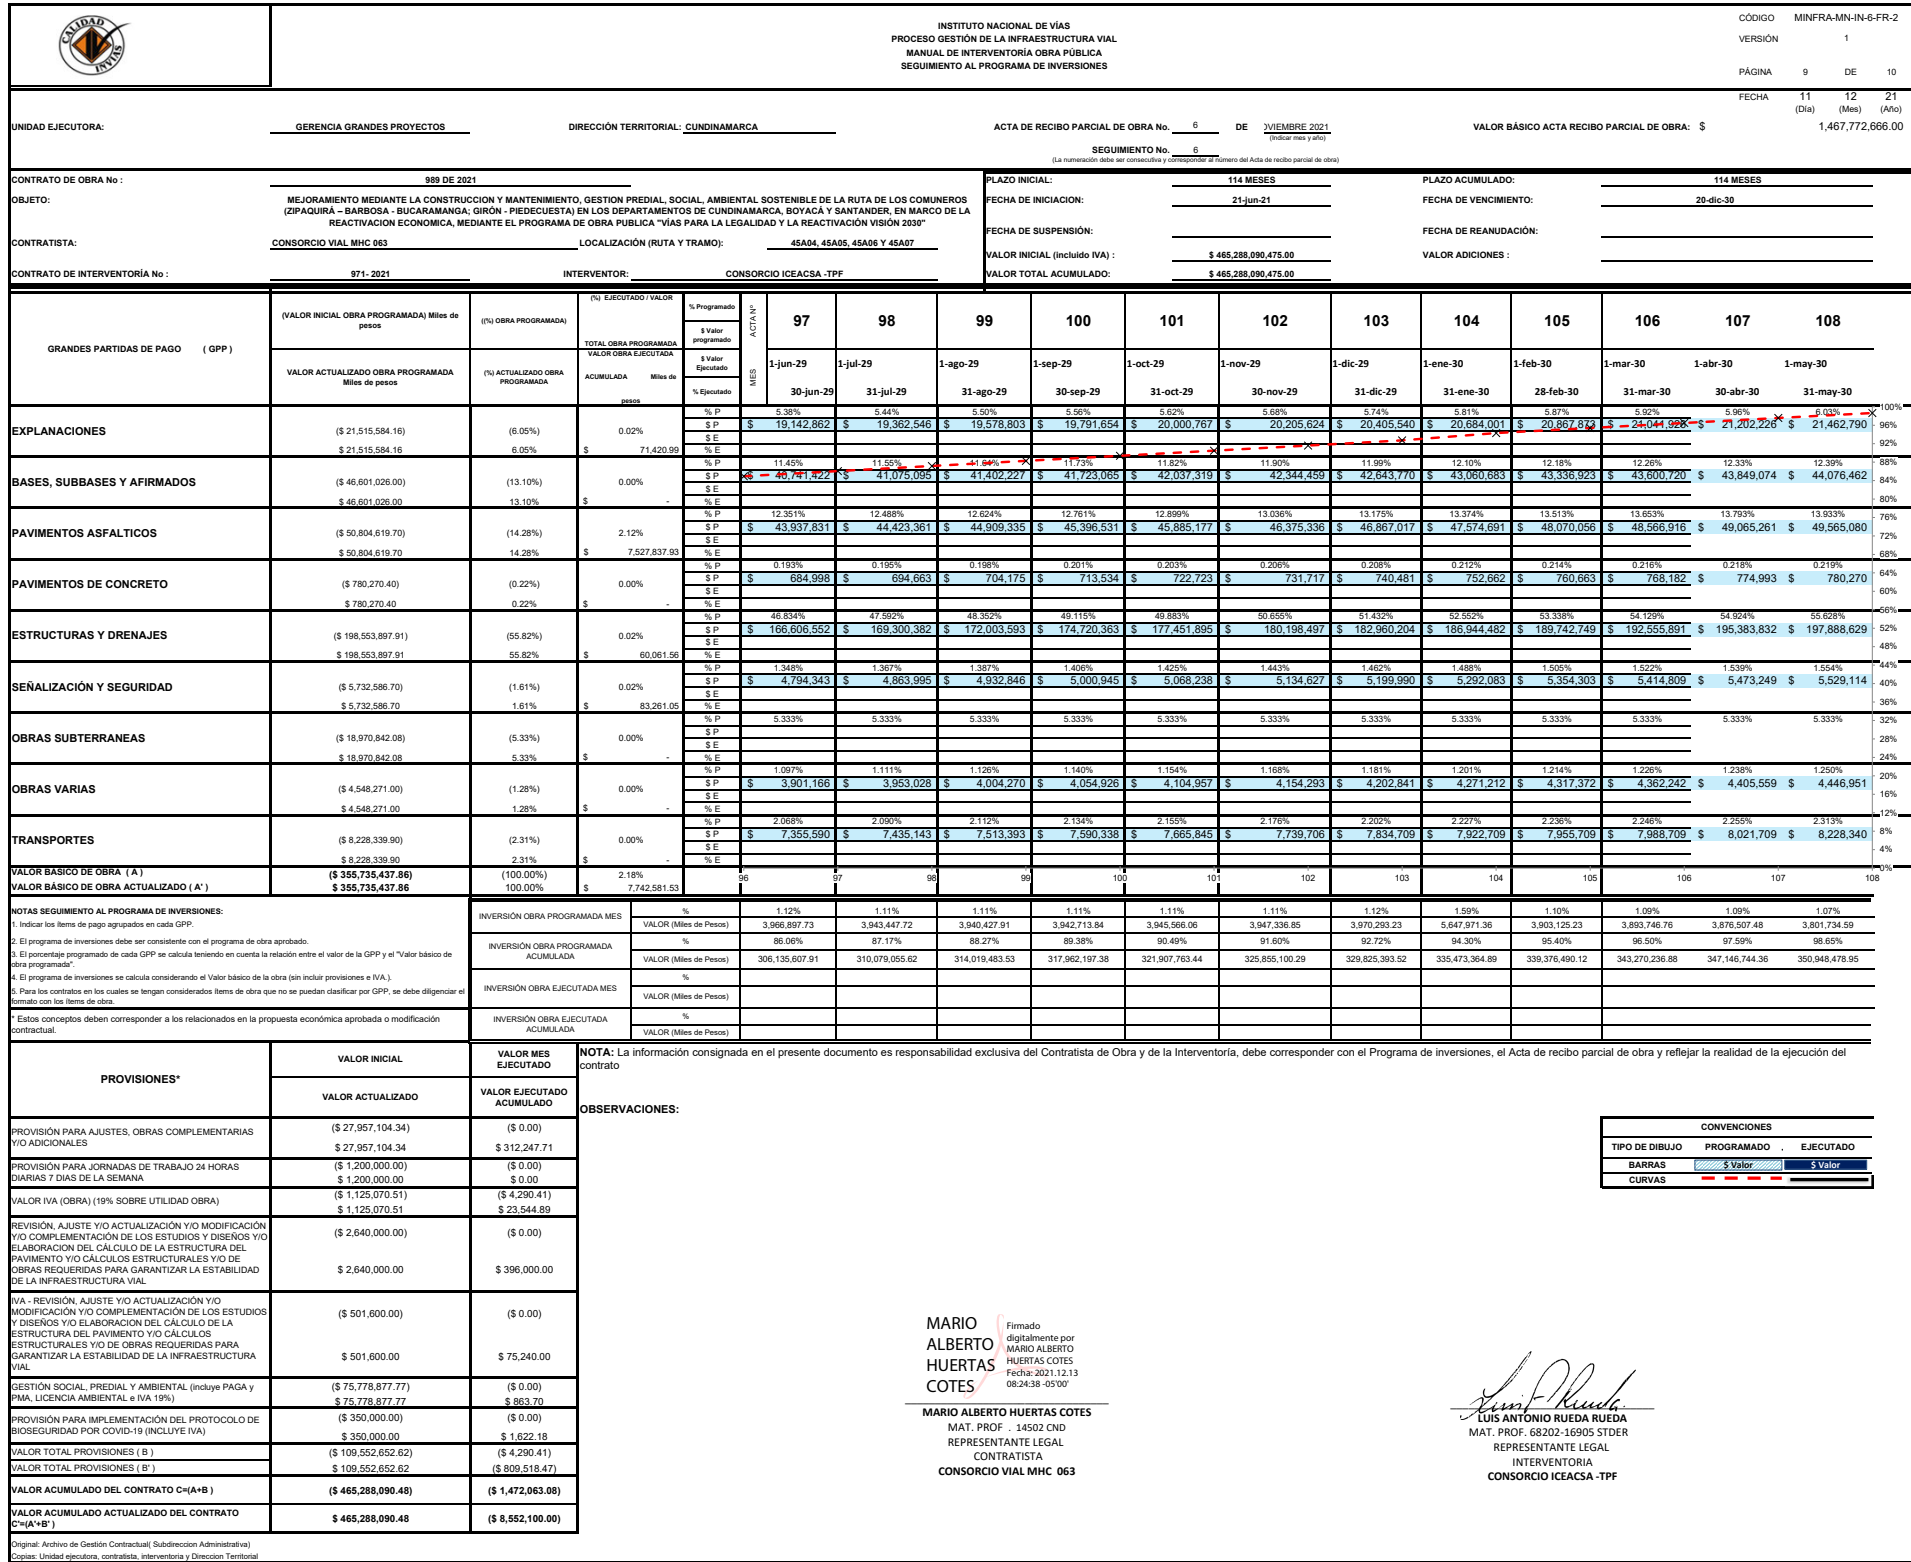

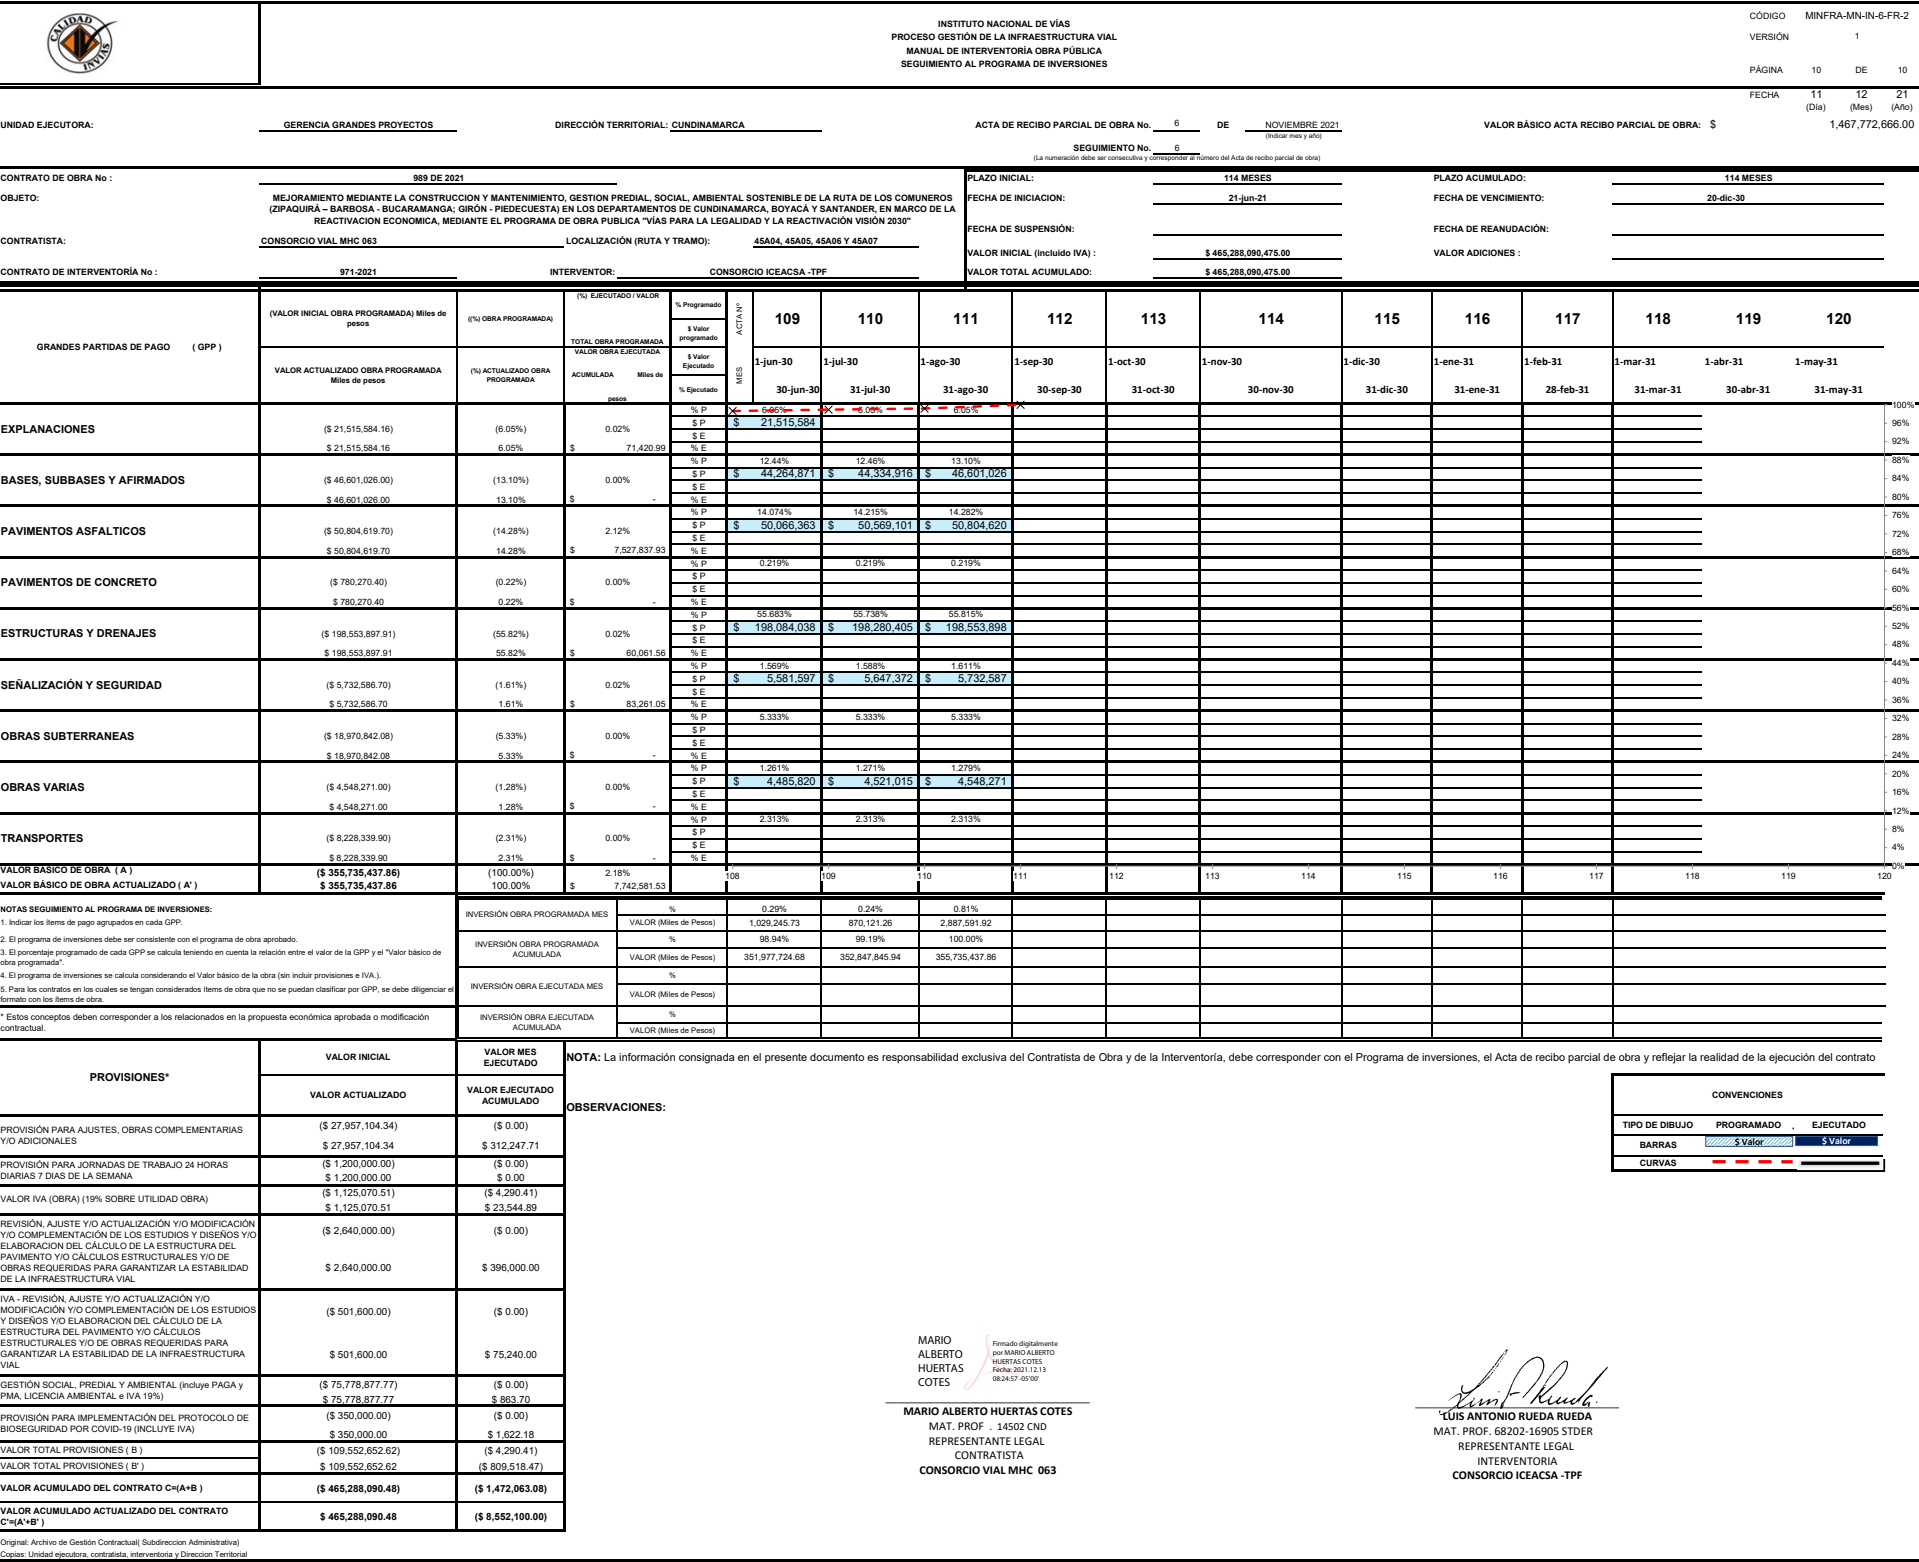

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8																																																																																																																																																																																										
VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																					
PÁGINA 1 DE 1																																																																																																																																																																																																					
FECHA 11 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																					
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA, GIRON -PIEDRECUESTA																																																																																																																																																																																																					
SECTOR: RUTA 45A04 - 45A07																																																																																																																																																																																																					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Vigencia Fiscal</th><th>Registro No.</th><th>Programa-Subprograma-Proyecto</th><th>Recurso No.</th><th>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</th><th>Contrato Principal / Adicional No.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td>R. P. No. 422021</td><td>C-2401-0600-41-0-2401008-02</td><td>20</td><td>Propios</td><td>989-2021</td><td>9.910.906.523.00</td></tr><tr><td>2021</td><td>R. P. No. 422021</td><td>C-2401-0600-41-0-2401017-02</td><td>20</td><td>Propios</td><td>989-2021</td><td>791.727.768.00</td></tr><tr><td>2021</td><td>R. P. No. 422021</td><td>C-2401-0600-41-0-2401023-02</td><td>20</td><td>Propios</td><td>989-2021</td><td>533.075.232.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>11.235.709.523.00</td></tr></table>							Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	9.910.906.523.00	2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	791.727.768.00	2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	533.075.232.00	TOTAL						11.235.709.523.00	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 11,235,709,523.00																																																																																																																																																											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor																																																																																																																																																																																															
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	9.910.906.523.00																																																																																																																																																																																															
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	791.727.768.00																																																																																																																																																																																															
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	533.075.232.00																																																																																																																																																																																															
TOTAL						11.235.709.523.00																																																																																																																																																																																															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th rowspan="2">Acta No.</th><th rowspan="2">Tipo de Acta</th><th rowspan="2">Mes/Año de Ejecución</th><th rowspan="2">Valor Acta sin IVA</th><th rowspan="2">Valor IVA</th><th rowspan="2">Valor Total</th><th rowspan="2">Anticipo Amortizado</th><th rowspan="2">Saldo Anticipo por Amortizar</th><th rowspan="2">Saldo Registro Presupuestal No.422021 De (24/05/2021)</th><th rowspan="2">Valor Total Ejecutado Acumulado</th><th rowspan="2">Saldo del Contrato</th><th rowspan="2">No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS</th><th colspan="2">Indicar pago según reporte SIIF</th><th rowspan="2">Observaciones</th></tr><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>1</td><td>Obra</td><td>Junio 2021</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 11,235,709,523.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 465,288,090,475.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Ajuste</td><td>Junio 2021</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 11,235,709,523.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 465,288,090,475.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Obra</td><td>Julio 2021</td><td>\$ 856,064,031.00</td><td>\$ 76,582,689.00</td><td>\$ 932,646,720.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 10,303,062,803.00</td><td>\$ 932,646,720.00</td><td>\$ 464,355,443,755.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Ajuste</td><td>Julio 2021</td><td>\$ 23,621,314.00</td><td>\$ 69,047.00</td><td>\$ 23,690,361.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 10,279,372,442.00</td><td>\$ 956,337,081.00</td><td>\$ 484,331,753,394.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Obra</td><td>Agosto 2021</td><td>\$ 1,701,826,111.00</td><td>\$ 4,976,370.00</td><td>\$ 1,706,802,481.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 8,572,569,961.00</td><td>\$ 2,663,139,562.00</td><td>\$ 462,624,950,913.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Ajuste</td><td>Agosto 2021</td><td>\$ 88,354,885.00</td><td>\$ 258,268.00</td><td>\$ 88,613,153.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 8,483,956,808.00</td><td>\$ 2,751,752,715.00</td><td>\$ 462,536,337,760.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Obra</td><td>Septiembre 2021</td><td>\$ 1,629,017,284.00</td><td>\$ 4,762,293.00</td><td>\$ 1,633,779,577.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 6,850,177,231.00</td><td>\$ 4,385,532,292.00</td><td>\$ 460,902,558,183.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Ajuste</td><td>Septiembre 2021</td><td>\$ 75,998,178.00</td><td>\$ 222,149.00</td><td>\$ 76,220,327.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 6,773,956,904.00</td><td>\$ 4,461,752,619.00</td><td>\$ 460,826,337,856.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Obra</td><td>Octubre 2021</td><td>\$ 2,486,379,830.00</td><td>\$ 7,267,880.00</td><td>\$ 2,493,647,710.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 4,280,309,194.00</td><td>\$ 6,955,400,329.00</td><td>\$ 458,332,690,146.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Ajuste</td><td>Octubre 2021</td><td>\$ 124,273,332.00</td><td>\$ 363,261.00</td><td>\$ 124,636,593.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 4,155,672,601.00</td><td>\$ 7,080,036,922.00</td><td>\$ 458,208,053,553.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Obra</td><td>Noviembre 2021</td><td>\$ 1,467,772,666.00</td><td>\$ 4,290,412.00</td><td>\$ 1,472,063,078.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 2,683,609,523.00</td><td>\$ 8,552,100,000.00</td><td>\$ 456,735,990,475.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="15">TOTALES</td></tr></table>												Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.422021 De (24/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	SI	NO	1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,235,709,523.00	\$ -	\$ 465,288,090,475.00				1	Ajuste	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,235,709,523.00	\$ -	\$ 465,288,090,475.00				2	Obra	Julio 2021	\$ 856,064,031.00	\$ 76,582,689.00	\$ 932,646,720.00	\$ -	\$ -	\$ 10,303,062,803.00	\$ 932,646,720.00	\$ 464,355,443,755.00				2	Ajuste	Julio 2021	\$ 23,621,314.00	\$ 69,047.00	\$ 23,690,361.00	\$ -	\$ -	\$ 10,279,372,442.00	\$ 956,337,081.00	\$ 484,331,753,394.00				3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,826,111.00	\$ 4,976,370.00	\$ 1,706,802,481.00	\$ -	\$ -	\$ 8,572,569,961.00	\$ 2,663,139,562.00	\$ 462,624,950,913.00				3	Ajuste	Agosto 2021	\$ 88,354,885.00	\$ 258,268.00	\$ 88,613,153.00	\$ -	\$ -	\$ 8,483,956,808.00	\$ 2,751,752,715.00	\$ 462,536,337,760.00				4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284.00	\$ 4,762,293.00	\$ 1,633,779,577.00	\$ -	\$ -	\$ 6,850,177,231.00	\$ 4,385,532,292.00	\$ 460,902,558,183.00				4	Ajuste	Septiembre 2021	\$ 75,998,178.00	\$ 222,149.00	\$ 76,220,327.00	\$ -	\$ -	\$ 6,773,956,904.00	\$ 4,461,752,619.00	\$ 460,826,337,856.00				5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830.00	\$ 7,267,880.00	\$ 2,493,647,710.00	\$ -	\$ -	\$ 4,280,309,194.00	\$ 6,955,400,329.00	\$ 458,332,690,146.00				5	Ajuste	Octubre 2021	\$ 124,273,332.00	\$ 363,261.00	\$ 124,636,593.00	\$ -	\$ -	\$ 4,155,672,601.00	\$ 7,080,036,922.00	\$ 458,208,053,553.00				6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,666.00	\$ 4,290,412.00	\$ 1,472,063,078.00	\$ -	\$ -	\$ 2,683,609,523.00	\$ 8,552,100,000.00	\$ 456,735,990,475.00				TOTALES														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.422021 De (24/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS													Indicar pago según reporte SIIF			Observaciones																																																																																																																																																																										
												SI	NO																																																																																																																																																																																								
1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,235,709,523.00	\$ -	\$ 465,288,090,475.00																																																																																																																																																																																											
1	Ajuste	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,235,709,523.00	\$ -	\$ 465,288,090,475.00																																																																																																																																																																																											
2	Obra	Julio 2021	\$ 856,064,031.00	\$ 76,582,689.00	\$ 932,646,720.00	\$ -	\$ -	\$ 10,303,062,803.00	\$ 932,646,720.00	\$ 464,355,443,755.00																																																																																																																																																																																											
2	Ajuste	Julio 2021	\$ 23,621,314.00	\$ 69,047.00	\$ 23,690,361.00	\$ -	\$ -	\$ 10,279,372,442.00	\$ 956,337,081.00	\$ 484,331,753,394.00																																																																																																																																																																																											
3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,826,111.00	\$ 4,976,370.00	\$ 1,706,802,481.00	\$ -	\$ -	\$ 8,572,569,961.00	\$ 2,663,139,562.00	\$ 462,624,950,913.00																																																																																																																																																																																											
3	Ajuste	Agosto 2021	\$ 88,354,885.00	\$ 258,268.00	\$ 88,613,153.00	\$ -	\$ -	\$ 8,483,956,808.00	\$ 2,751,752,715.00	\$ 462,536,337,760.00																																																																																																																																																																																											
4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284.00	\$ 4,762,293.00	\$ 1,633,779,577.00	\$ -	\$ -	\$ 6,850,177,231.00	\$ 4,385,532,292.00	\$ 460,902,558,183.00																																																																																																																																																																																											
4	Ajuste	Septiembre 2021	\$ 75,998,178.00	\$ 222,149.00	\$ 76,220,327.00	\$ -	\$ -	\$ 6,773,956,904.00	\$ 4,461,752,619.00	\$ 460,826,337,856.00																																																																																																																																																																																											
5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830.00	\$ 7,267,880.00	\$ 2,493,647,710.00	\$ -	\$ -	\$ 4,280,309,194.00	\$ 6,955,400,329.00	\$ 458,332,690,146.00																																																																																																																																																																																											
5	Ajuste	Octubre 2021	\$ 124,273,332.00	\$ 363,261.00	\$ 124,636,593.00	\$ -	\$ -	\$ 4,155,672,601.00	\$ 7,080,036,922.00	\$ 458,208,053,553.00																																																																																																																																																																																											
6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,666.00	\$ 4,290,412.00	\$ 1,472,063,078.00	\$ -	\$ -	\$ 2,683,609,523.00	\$ 8,552,100,000.00	\$ 456,735,990,475.00																																																																																																																																																																																											
TOTALES																																																																																																																																																																																																					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																																																																																																																																																																																																					
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																																																																																																																																																																																																					
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL																																																																																																																																																																																																
OBRA	\$ 7,742,581,526.00		\$ 22,632,162.00		\$ 7,765,213,688.00																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA AJUSTES USO DE OPCION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 312,247,709.00		\$ 912,724.00		\$ 313,160,433.00																																																																																																																																																																																																
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -		\$ -		\$ -																																																																																																																																																																																																
AJUSTES	\$ -		\$ -		\$ -																																																																																																																																																																																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 396,000,000.00		\$ 75,240,000.00		\$ 471,240,000.00																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -		\$ -		\$ -																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 806,269.00		\$ 57,431.00		\$ 863,700.00																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -		\$ -		\$ -																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 1,575,313.00		\$ -		\$ 1,575,313.00																																																																																																																																																																																																
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 39,383.00		\$ 7,483.00		\$ 46,866.00																																																																																																																																																																																																
VALOR TOTAL	\$ 8,453,250,200.00		\$ 98,849,800.00		\$ 8,552,100,000.00																																																																																																																																																																																																
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																																																																																																																					
NOTAS:																																																																																																																																																																																																					
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																																																																																																																																																																																																					
 Firma Nombre: LUIS FRANCISCO PAEZ PAEZ Director de Obra Matrícula No.: 25202-36086 CND Firma Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula No.: 68202-16905 STDER																																																																																																																																																																																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																					
