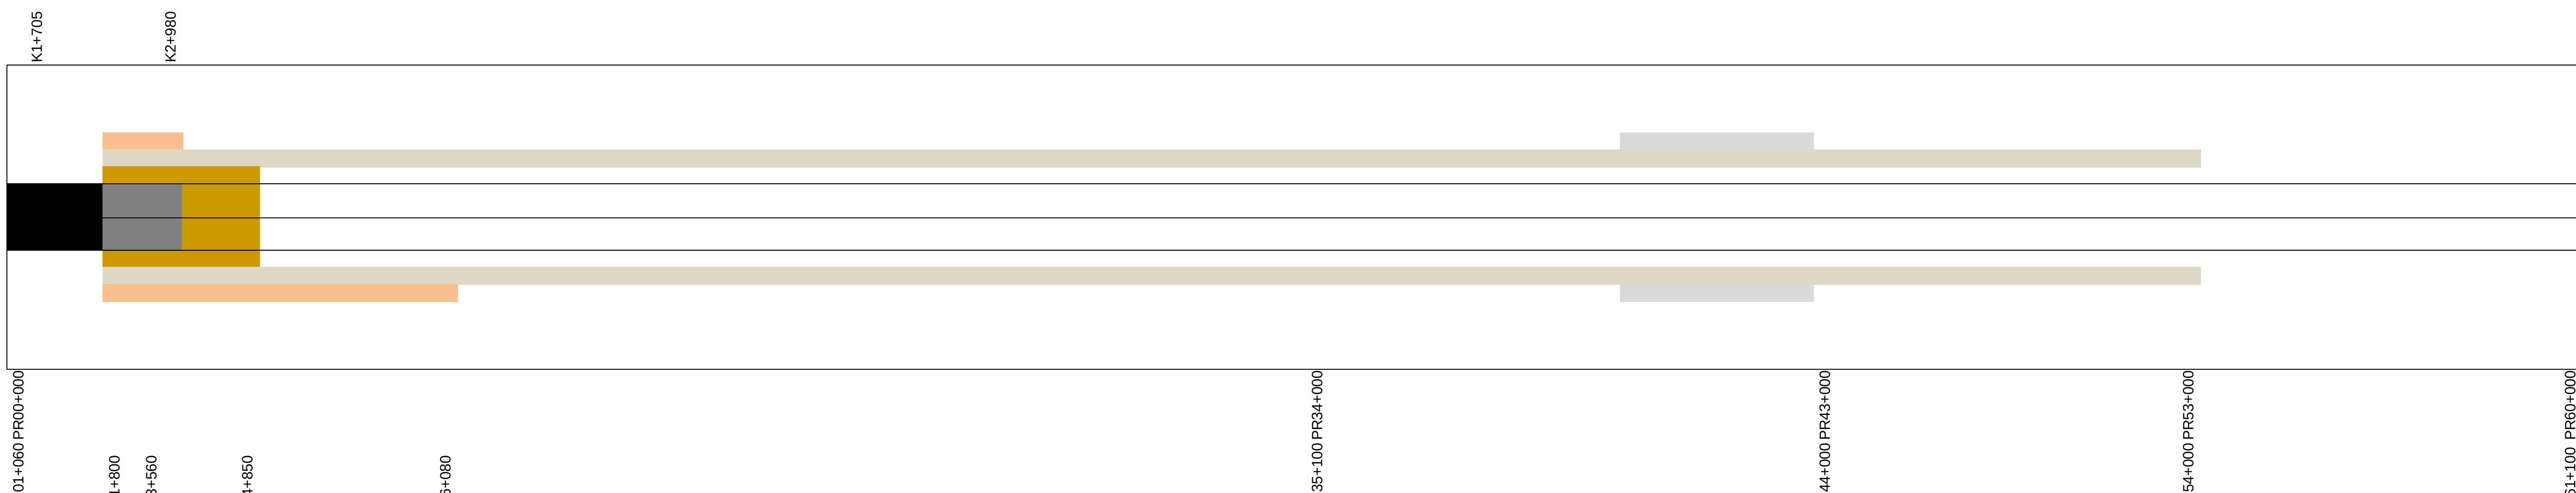


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPARI-15-FR-3 1 								
		FECHA	15/04/2022 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES									
SEMANA No.: 42 del 8/04/2022 al 14/04/2022 Último Informe Semanal SI											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.											
CONTRATO DE OBRA:											
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%		INTERVENIOR: INTEGRANTES: INTELISA - INPAOR - INDESA - LIDIMODA 90% CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC									
CONTRATO No. 974 DE 2021		CONTRATO No. 1095 DE 2021									
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030									
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00		VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00		VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00									
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -									
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
Se continuará con la estabilización con cal en espesores y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, los cuales deben ser recibidos por la Interventoría, para así proceder a instalar la base granular Continuar con la colocación y conformación de la base granular, para proteger el terraplén que se está construyendo. Participación en los diferentes comités y reuniones de carácter técnico, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo que se programen internos y externos.											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
											
CONVENCIONES											
<table><tr><td>MANTENIMIENTO</td><td>TERRAPLEN</td><td>PAVIMENTACIÓN</td><td>BASE GRANULAR</td><td>CANAL DE PRESTAMO</td><td>SECTOR LOS MANGOS</td><td>CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS</td><td>SEÑALIZACIÓN</td></tr></table>				MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN
MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MNI-RN-15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento en sitios críticos del sector de Los Mangos y alrededores. Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplén de la vía, y a los de construcción de la base granular, protección de la base granular y del terraplén. Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra Seguimiento al montaje definitivo de la planta de asfalto para verificar el cumplimiento de todos los requisitos y el funcionamiento acorde a las metas previstas		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		FIRMA: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 05202-37791 ANT.									
