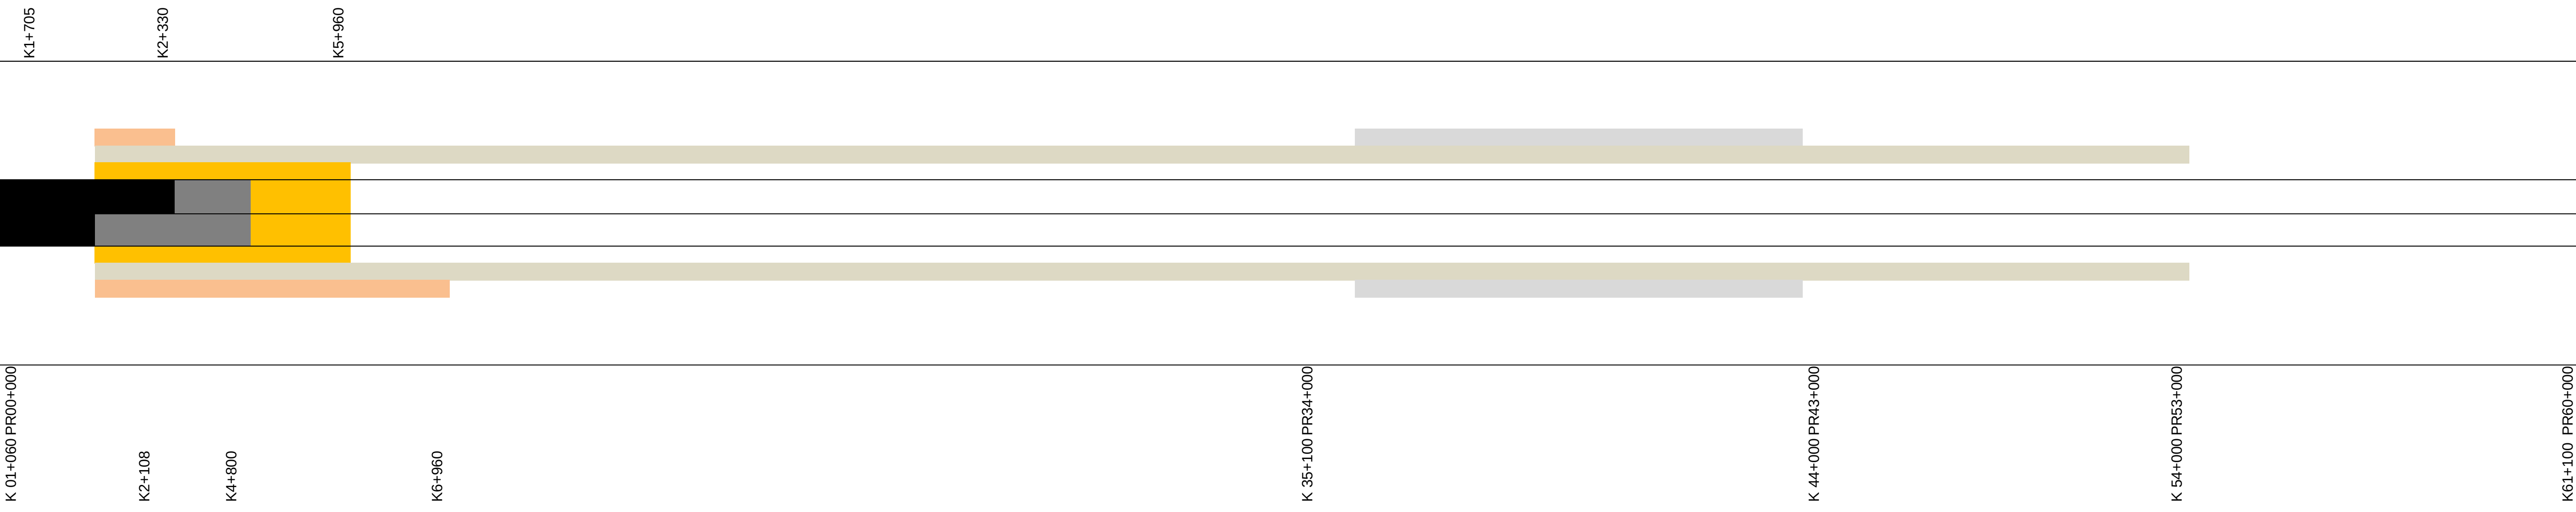


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	MEPI-MNL-01-15-FR-3 1 								
		FECHA	15/07/2022 (Del 14 al 21 de Julio)								
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		SEMANA No.: 55 del 8/07/2022 al 14/07/2022 Último Informe Semanal 51									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPÉ-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato). SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM. DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM. DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3,5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70% CONTRATO No.: 974 DE 2021 FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030		INTERVENTOR: INTEGRANTES: INTELSA - TRANS SUCURSAL COLOMBIA 40% CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30% CONTRATO No.: 1065 DE 2021 FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030									
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
SOCIAL: Recorrido al sector de Carimagua para revisión y supervisión de los buzones y el punto de información. Revisión documental de los informes para continuar con las correcciones a estos. Seguimiento al servicio de atención al usuario. Seguimiento al proceso correspondiente a la ejecución de la OPC de Carimagua.											
TECNICA: Construcción y ampliación de alcantarillas existentes. Se continuará con la estabilización con cal en espesores y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, se debe reorganizar las actividades para trabajar por carriles y tramos cortos hasta completar todo el proceso, de tal manera que se mejoren los rendimientos afectados por alta frecuencia de precipitaciones que se está dando. Continuar con la colocación y conformación de la base granular, para proteger el terraplén que se está construyendo. Participar en los diferentes comités y reuniones de carácter técnico, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo que se programen tanto internos como externos.											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
											
CONVENCIONES											
<table><tr><td>MANTENIMIENTO</td><td>TERRAPLEN</td><td>PAVIMENTACIÓN</td><td>BASE GRANULAR</td><td>CANAL DE PRESTAMO</td><td>SECTOR LOS MANGOS</td><td>CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS</td><td>SEÑALIZACIÓN</td></tr></table>				MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN
MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-01-15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
 13 Jul. 2022 4:06:54 p.m. Meta Altitud: 140,5m Velocidad: 0,0km/h K3+112 alcantarilla MD - MI  13 Jul. 2022 4:18:11 p.m. Meta Altitud: 140,5m Velocidad: 0,0km/h K3+112 alcantarilla MD - MI  13 Jul. 2022 4:18:35 p.m. Meta Altitud: 153,2m Velocidad: 1,3km/h K11+710 D=20 fallo											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
Seguimiento y control a los trabajos de: terraplén de la vía, construcción de la base granular, colocación de carpeta asfáltica, construcción de alcantarillas. Hacer los requerimientos y seguimiento para la entrega oportuna de los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento y atención de sitios críticos del sector de Los Mangos y hacia mayores Verificar cumplimiento de medidas ambientales en obra y seguimiento a la gestión de permisos ambientales. Realizar labores de verificación de todos los aspectos inherentes a comunicación con la comunidad y sus líderes para atender sus peticiones y reclamos. Realizar seguimiento a la situación presentada con el gremio de transportistas de Puerto Lopez que están bloqueando la salida de material granular para vías proyectos en ejecución en la región		FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 05202-37701-ANT									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											
