


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1							
													VERSIÓN	1						
													PÁGINA	1	DE	3				
													FECHA	31	8	2021				
														(Día)	(Mes)	(Año)				
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS				DIRECCIÓN TERRITORIAL		META		ACTA N°		3	VALOR BÁSICO ACTA: \$		246.656.800,00		MES		Agosto de 2021	
													ACTA FINAL SI ☐ NO ☒							
CONTRATO No : 974 - 2021													PLAZO INICIAL:		114 MESES		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; OBJEC T. JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”													FECHA DE INICIO:		28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030	
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA													FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021													VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$205.918.749.263,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ -	
													VALOR TOTAL ACUMULADO		\$205.918.749.263,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Condiciones Iniciales del Contrato		OBRA EJECUTADA								
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
					EXPLANACIONES				\$	-		\$	-		\$	-				
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$ 1.116.722	\$	142.940.416	128,00	\$ 142.940.416,00		-	-	\$ -				
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$ 110.694	\$	83.795.358	757,00	\$ 83.795.358,00		-	-	\$ -				
3	1	E	201-13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$ 66.811	\$	34.340.854	514,00	\$ 34.340.854,00		-	-	\$ -				
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.122.550,00	\$ 12.000	\$	13.470.600.000	1.122.550,00	\$ 13.470.600.000,00		-	-	\$ -				
5	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146.250,00	\$ 10.000	\$	1.462.500.000	146.250,00	\$ 1.462.500.000,00	4.057,00	40.570.000,00	7.057,00	\$ 70.570.000,00				
6	1	E	220.1		Terraplenes	m3	1.268.800,00	\$ 14.500	\$	18.397.600.000	1.268.800,00	\$ 18.397.600.000,00		-	-	\$ -				
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$	-		\$	-		\$	-				
7	2	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390.000,00	\$ 1.059	\$	413.010.000	390.000,00	\$ 413.010.000,00	35.200,00	37.276.800,00	110.300,00	\$ 116.807.700,00				
8	2	SB	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307.125,00	\$ 60.000	\$	18.427.500.000	307.125,00	\$ 18.427.500.000,00		-	-	\$ -				
9	2	SB	350-13		Cemento hidráulico para suelo cemento	kg	24.570.000,00	\$ 903	\$	22.186.710.000	24.570.000,00	\$ 22.186.710.000,00		-	-	\$ -				
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$	-		\$	-		\$	-				
10	8	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518.500,00	\$ 2.922	\$	1.515.057.000	518.500,00	\$ 1.515.057.000,00		-	-	\$ -				
11	8	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552.500,00	\$ 1.853	\$	1.023.782.500	552.500,00	\$ 1.023.782.500,00		-	-	\$ -				
12	8	P		440.3P	Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8.800,00	\$ 650.000	\$	5.720.000.000	8.800,00	\$ 5.720.000.000,00		-	-	\$ -				
13	8	P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45.900,00	\$ 1.087.727	\$	49.926.669.300	45.900,00	\$ 49.926.669.300,00		-	-	\$ -				
					ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES				\$	-		\$	-		\$	-				
14	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	38.777,00	\$ 22.899	\$	887.954.523	38.777,00	\$ 887.954.523,00		-	-	\$ -				
15	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15.511,00	\$ 51.716	\$	802.166.876	15.511,00	\$ 802.166.876,00		-	-	\$ -				
16	6	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.802,00	\$ 864.775	\$	7.611.749.550	8.802,00	\$ 7.611.749.550,00		-	-	\$ -				
17	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.282,00	\$ 764.935	\$	4.040.386.670	5.282,00	\$ 4.040.386.670,00		-	-	\$ -				
18	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153,00	\$ 620.504	\$	94.937.112	153,00	\$ 94.937.112,00		-	-	\$ -				
19	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	24,00	\$ 520.030	\$	12.480.720	24,00	\$ 12.480.720,00		-	-	\$ -				
20	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.282.133,00	\$ 5.644	\$	7.236.358.652	1.282.133,00	\$ 7.236.358.652,00		-	-	\$ -				
21	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.040,00	\$ 767.137	\$	1.564.959.480	2.040,00	\$ 1.564.959.480,00		-	-	\$ -				
					SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				\$	-		\$	-		\$	-				
22	8	SCT		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206.678,00	\$ 1.794	\$	370.780.332	206.678,00	\$ 370.780.332,00		-	-	\$ -				
23	8	SCT		2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$ 22.076	\$	13.510.512	612,00	\$ 13.510.512,00		-	-	\$ -				
24	8	SCT		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.400,00	\$ 8.346	\$	136.874.400	16.400,00	\$ 136.874.400,00		-	-	\$ -				
25	4	SCT		5P.	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6,00	\$ 403.237	\$	2.419.422	6,00	\$ 2.419.422,00		-	-	\$ -				

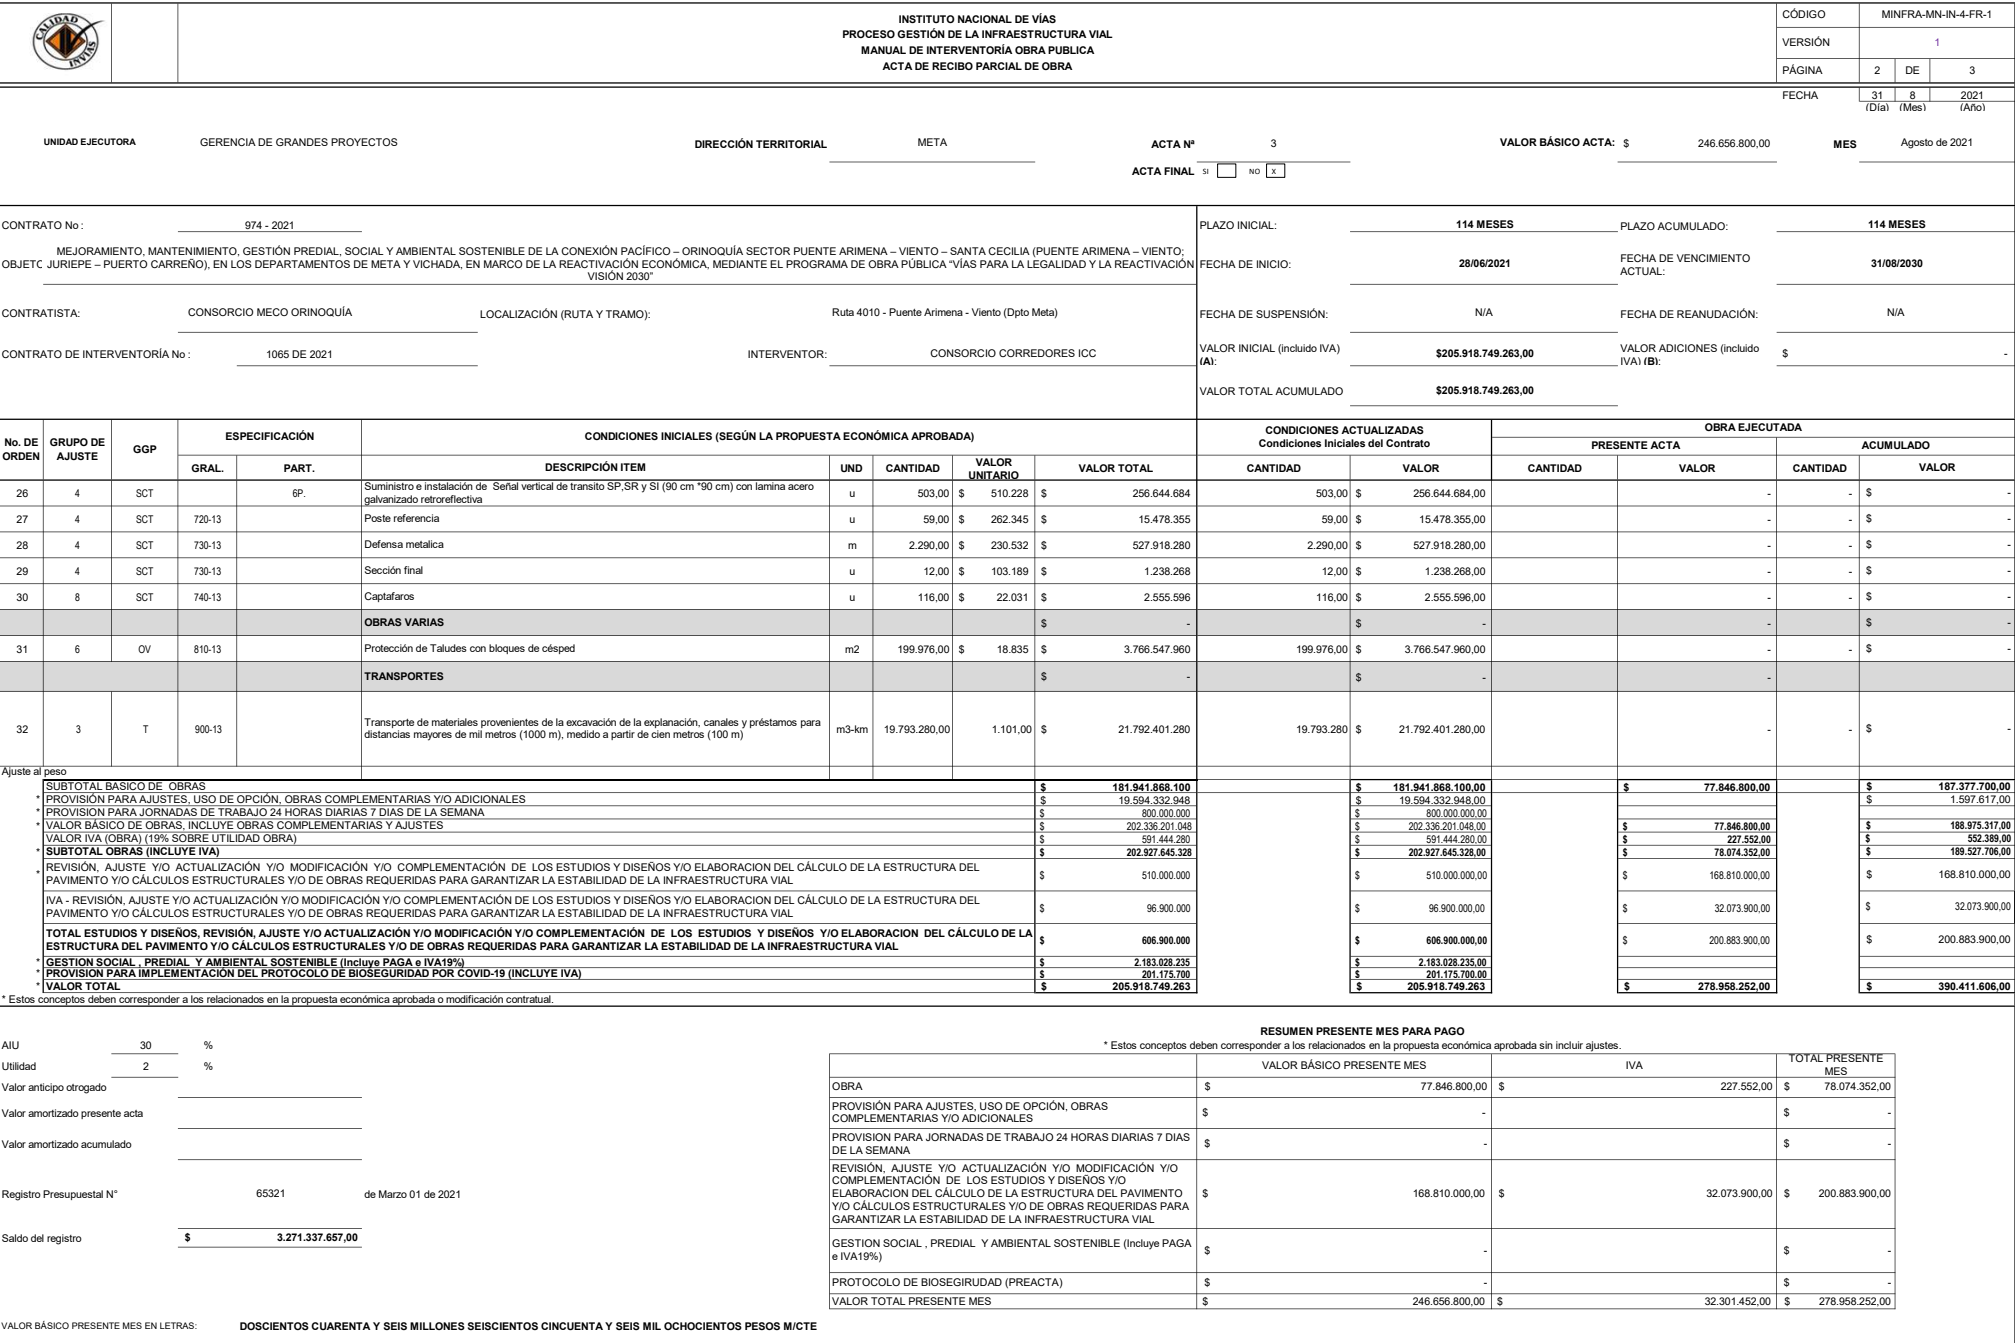

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA 3 DE 3				
												FECHA (Día) (Mes) (Año) 31 8 2021				
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL META		META		ACTA N° 3		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 246.656.800,00		MES Agosto de 2021						
						ACTA FINAL SI ☐ NO ☒										
CONTRATO No.: 974 - 2021												PLAZO INICIAL: 114 MESES		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES		
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; OBJETC JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”												FECHA DE INICIO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030		
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$205.918.749.263,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
												VALOR TOTAL ACUMULADO \$205.918.749.263,00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Condiciones Iniciales del Contrato		OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																
NOTAS: 1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. 2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría. 3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.																
Para constancia de lo anterior firman:																
Firma FRANCISCO EDUARDO BAUTISTA MOLLER REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No.: 25202-10083 CND Firma EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No. 05202 - 37791 ANT																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																
