



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11

Fecha 11/11/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 DE 11/11/2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 991,701,814.00

SEGUIMIENTO No. 13
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No. 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato original) (En meses según las órdenes sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,547,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528.230.00
(Según contrato original) (Según contrato original)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,432,964.666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37,290,981.185	11.142%	0.156%	% P	0.031%	0.037%	0.044%	0.044%	0.044%	0.044%	0.033%	0.022%	0.015%	0.009%	8.70%
	\$37,490,601.825	11.202%	\$624,448.474	% E	\$102,865.643	\$123,458.771	\$148,270.525	\$148,270.525	\$148,270.525	\$148,270.525	\$111,200.864	\$74,135.263	\$59,429.057	\$97,623.059	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	\$57,206,062.400	17.092%	0.478%	% P	0.008%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	\$61,188,792.400	18.282%	\$1,909,507.696	% E	\$174,127.551	\$208,563.061	\$250,743.673	\$250,743.673	\$250,743.673	\$250,743.673	\$189,057.755	\$126,371.837	\$93,581.224	\$165,092.586	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	\$149,004,224.264	44.520%	0.023%	% P	0.074%	0.149%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	
	\$153,227,521.859	45.782%	\$90,384.012	% E	\$463,902.628	\$544,883.151	\$653,619.782	\$653,619.782	\$653,619.782	\$653,619.782	\$499,214.836	\$326,869.891	\$217,873.261	\$430,350.958	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68,087,340.557	20.343%	0.091%	% P	0.058%	0.070%	0.084%	0.084%	0.084%	0.084%	0.063%	0.042%	0.028%	0.055%	7.05%
	\$68,087,340.557	20.343%	\$364,633.009	% E	\$195,126.678	\$234,152.013	\$280,982.416	\$280,982.416	\$280,982.416	\$280,982.416	\$210,736.812	\$140,491.208	\$93,660.805	\$185,092.130	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5,815,212.112	1.737%	0.047%	% P	0.001%	0.020%	0.086%	0.005%	0.005%	0.007%	0.005%	0.004%	0.002%	0.002%	
	\$5,815,212.112	1.737%	\$186,473.092	% E	\$11,367.126	\$13,640.892	\$166,473.092	\$16,368.952	\$16,368.952	\$24,643.369	\$18,482.527	\$12,321.686	\$5,214.456	\$16,728.484	
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	\$2,257,167.500	0.674%	0.000%	% P	0.002%	0.002%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.002%	0.001%	0.001%	0.002%	
	\$2,257,167.500	0.674%	\$0.000	% E	\$6,272.280	\$7,528.736	\$9,032.083	\$9,032.083	\$9,032.083	\$9,032.083	\$6,774.062	\$4,516.042	\$3,010.694	\$5,946.830	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	\$15,028,248.528	4.490%	0.062%	% P	0.012%	0.014%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.013%	0.008%	0.006%	0.011%	
	\$15,175,456.178	4.528%	\$248,910.012	% E	\$39,479.857	\$47,375.920	\$56,850.994	\$56,850.994	\$56,850.994	\$56,850.994	\$42,638.246	\$28,426.497	\$18,990.331	\$37,431.364	
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0.001%	0.008%	0.011%								5.41%
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334,689,236.546	100.000%	0.857%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 343,242,092.431	102.949%	\$ 3,424,356.295												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.29%	0.30%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.32%	0.21%	0.14%	0.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$983,241.781	\$1,179,890.113	\$1,415,868.135	\$1,415,868.135	\$1,415,868.135	\$1,415,868.135	\$1,454,142.842	\$1,068,167.132	\$712,071.421	\$474,714.281
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6.79%	6.95%	6.48%	6.90%	7.32%	7.75%	8.07%	8.28%	8.42%	8.79%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$19,677,769.719	\$26,267,696.822	\$21,673,518.989	\$23,089,387.093	\$24,895,266.228	\$26,929,398.071	\$26,987,688.202	\$27,709,676.623	\$28,184,290.804	\$29,121,963.319
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.89%	0.95%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$14,373.484	\$846,248.896	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338	\$990,424.338
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8.47%	0.73%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,687,683.861	\$2,433,931.997	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295	\$3,424,356.295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49,343,566.111	\$ 16,521.15	0.033%
	\$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 800,000.000	\$ -	0%
	\$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,812,239.712	\$ 25,144.874	0.894%
	\$ 2,883,956.030		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,845,000.000	\$ 1,397,449.900	75.743%
	\$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350,550.000	\$ 265,515.481	75.743%
	\$ 350,550.000		
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9,226,844.067	\$ -	0%
	\$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA)	\$ 500,000.000	\$ 8,534.42	1.707%
	\$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64,878,199.89	\$ 1,713,165.830	2.587%
	\$ 66,210,872.24		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399,567,436.436	\$ 5,137,522.125	1.286%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 409,452,964.666		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aproba Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

Representante legal o apoderado del Contratista

CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aproba Firma:


Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante legal o apoderado del Interventor

CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030

Matrícula No.: 25202-44184 CND

[illegible]

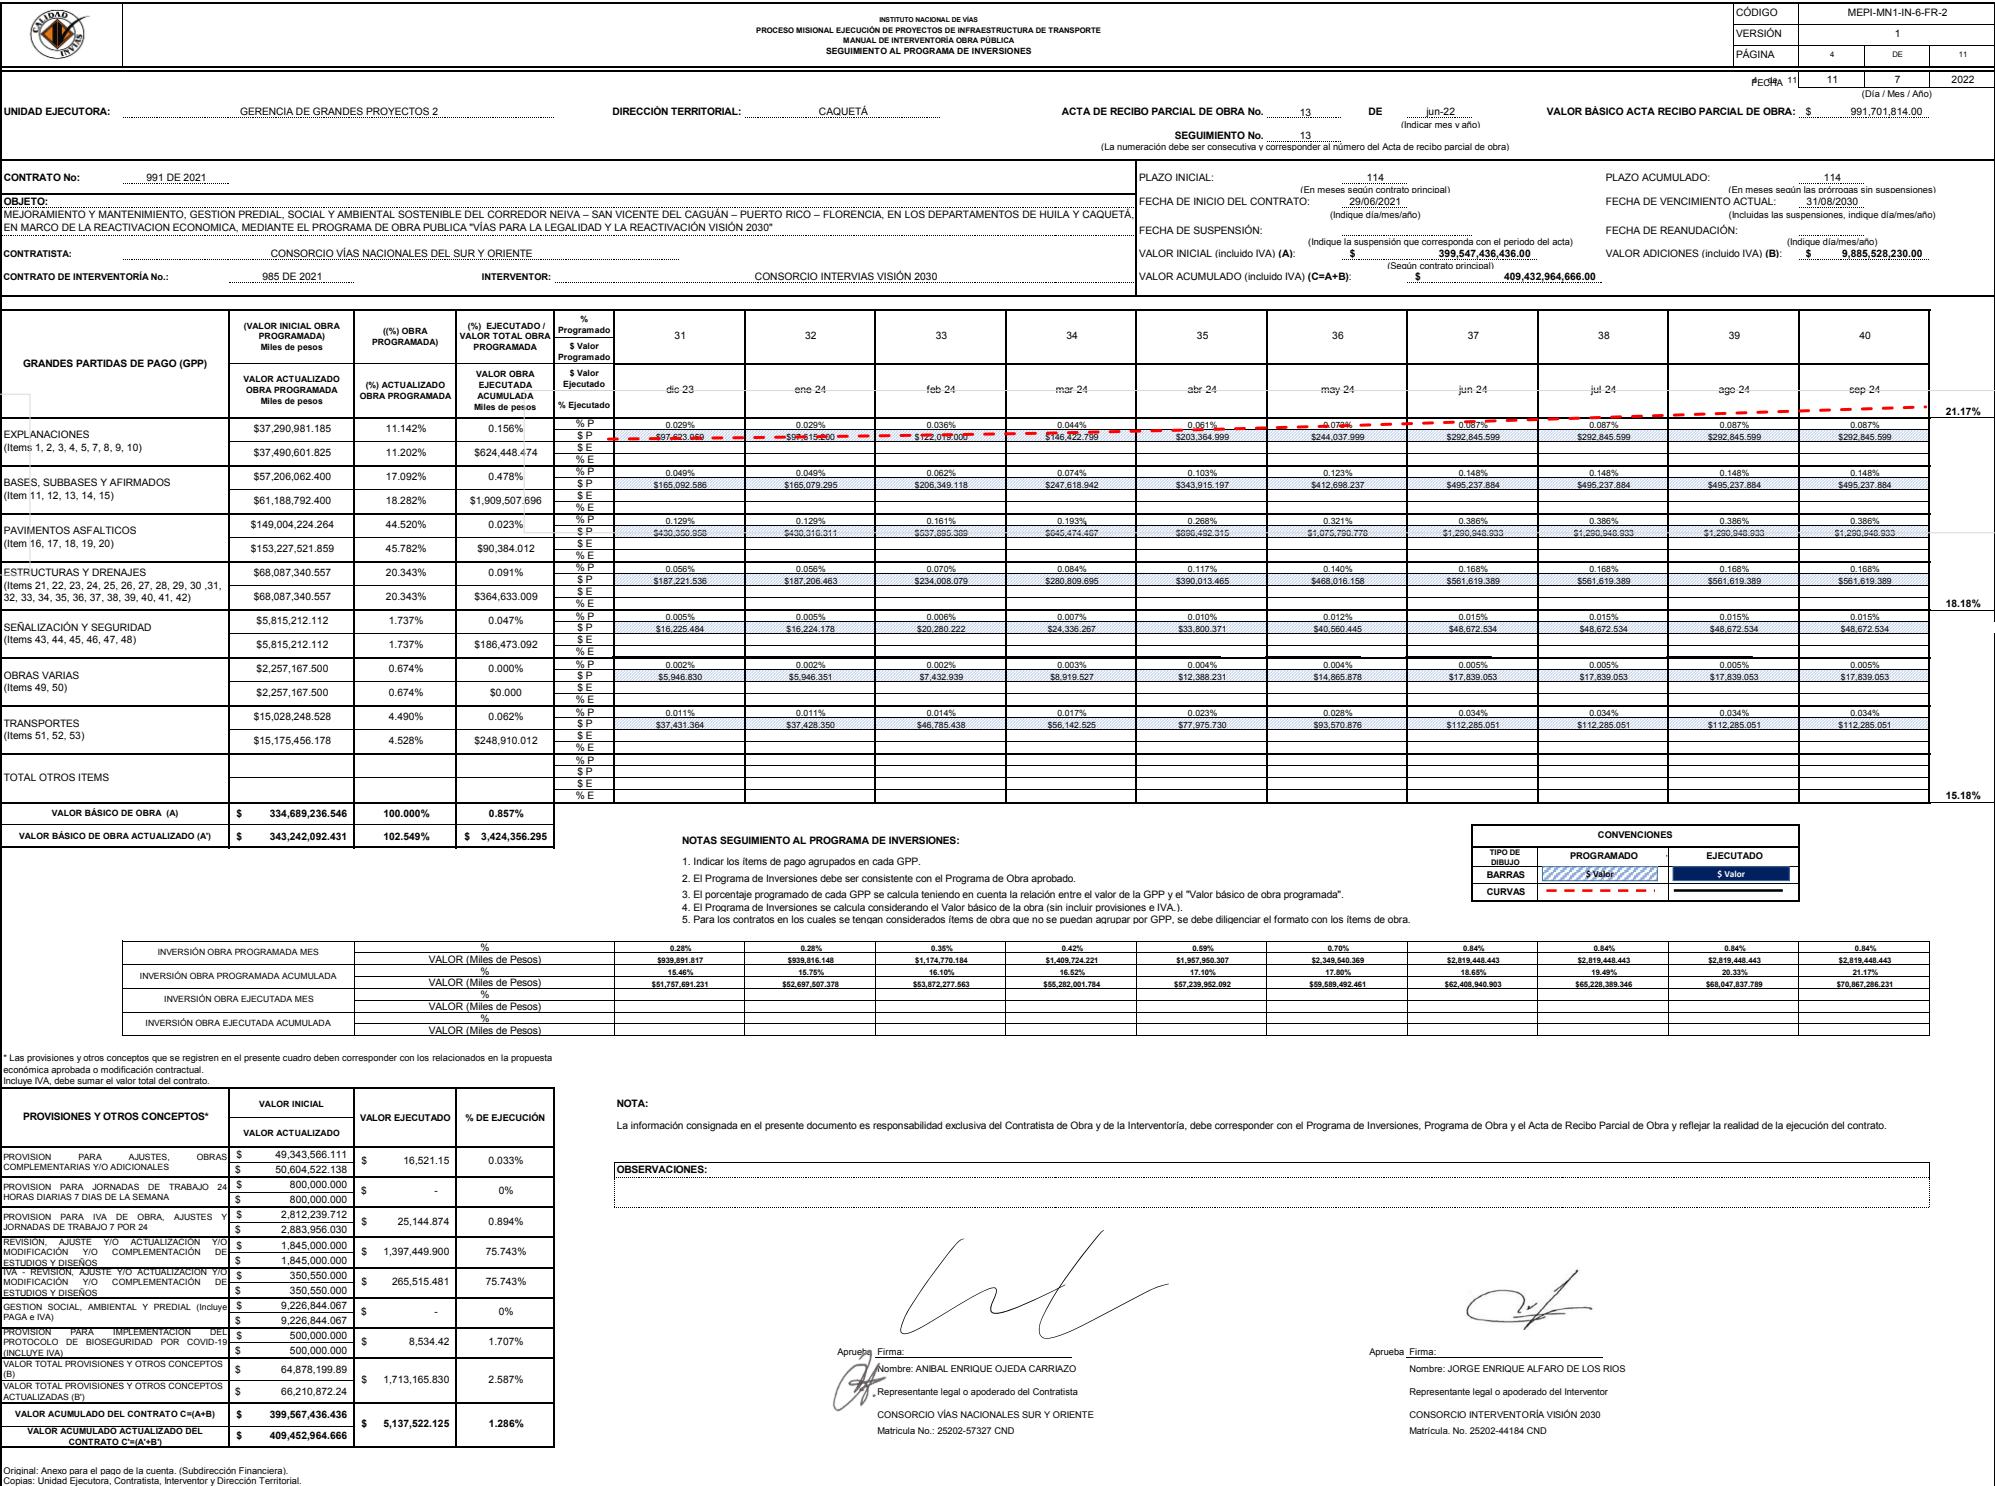

[illegible]

