

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. <u>1</u>		MES O PERIODO: <u>JUNIO</u>			
------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN				6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				7
2.1	Localización				7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				8
2.3	Características técnicas del proyecto				9
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA				10
3.1	Información general del contrato				10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA				12
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		21
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		23
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		24
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		25
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		26
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		27
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		29
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		31
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				14
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	14
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	14
	• Seguimiento Programa de Obra				14
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		X	14
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	14
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	14
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	14
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		19
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA				15
5.1	Información general del contrato				15
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				16
5.3	Informes especialistas				16
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				16
5.5	Información otros programas y aplicativos				16
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				16
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		33
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		34
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		35
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		36
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		37
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		39
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				17
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	17
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	17
7	Conclusiones y recomendaciones				17
8	Anexos				18
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				18
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				18

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INFORME MENSUAL N°1

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETA
2021**



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
OBJETO DEL CONTRATO	7
2.1. LOCALIZACIÓN	7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.	8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	9
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL.....	10
3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.	12
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.	12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	12
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	12
4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.	12
4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.	13
4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.....	13
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.	13
4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO.....	13
4.7. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	13
4.8. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.	13
4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.	14
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.	14
4.11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	14
4.12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA	14
4.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.	14
4.14 ACTA DE COMITÉ DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN	14
4.15 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORIA	14
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	15
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	15



5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	16
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS	16
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.	16
5.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.	16
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:.....	16
6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA.....	16
6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.	16
6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	17
6.4. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y SEGURIDAD SOCIAL	17
6.5. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	17
6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	17
6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	17
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
8. ANEXOS	18
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).....	18
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.	18
8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.	18



LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización	7
Ilustración 2 - Esquema de Localización	8
Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio	9
Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas	10



LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra.....	11
Tabla 2. Información del Contrato de Interventoría.....	15



1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 01 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 29 de Junio de al 30 de Junio de 2021, en desarrollo del Contrato de Obra No 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1. LOCALIZACIÓN

Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.


Ilustración 1 - Esquema de localización

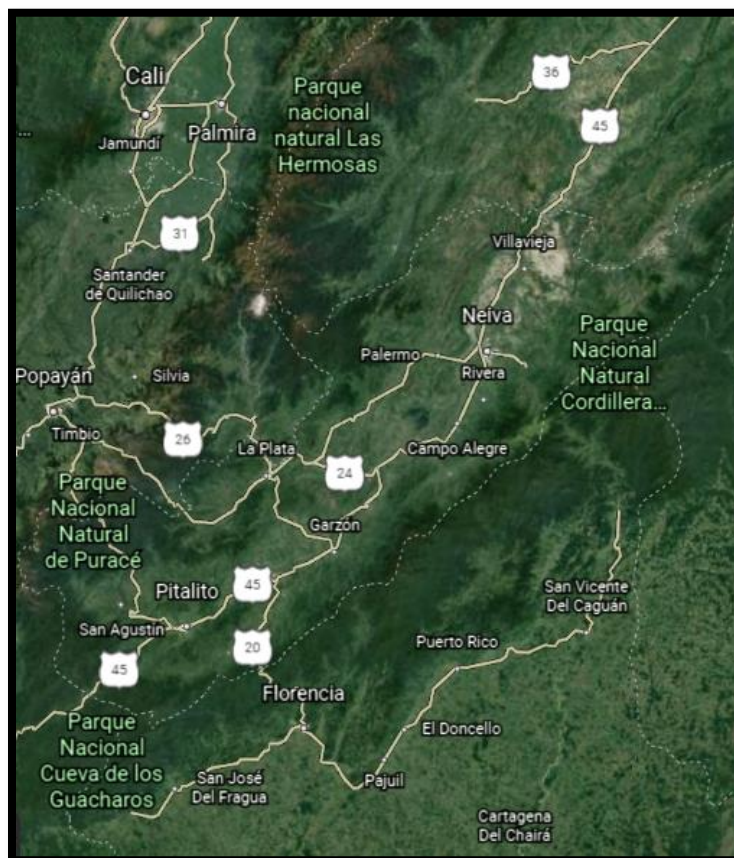

Fuente: Web Google Earth



Ilustración 2 - Esquema de Localización

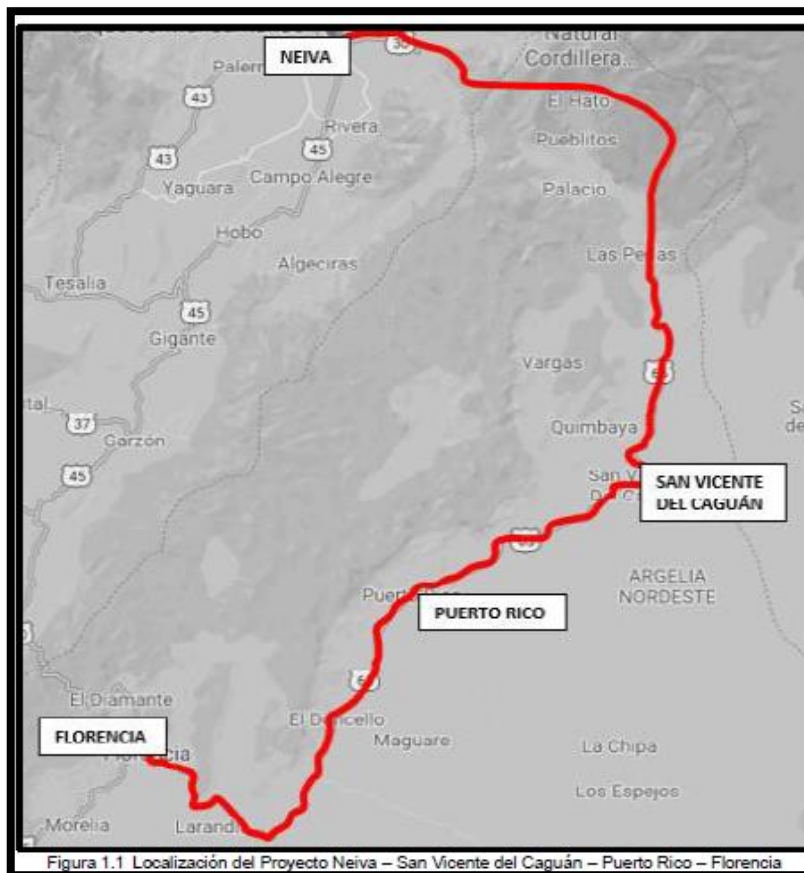

Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.



2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 343 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Alfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial “Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia” en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.
- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc...)

Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio

Municipio	Long.	%
NEIVA	47.91	13.97%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	47.91	13.97%
Municipio	Long.	%
FLORENCIA	18.45	5.38%
MONTAÑITA	23.45	6.84%
PAUJIL	14.85	4.33%
DONCELLO	18.28	5.33%
PUERTO RICO	50.23	14.65%
SAN VICENTE DEL CAGUAN	169.68	49.49%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	294.94	86.03%
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR	342.85	100.00%

Fuente: Elaboración Propia



Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA													
	RUTA 6504							RUTA 6503					
MINA BLANCA	SAN VICENTE	RIECITO	LA RASTRERA	PUERTO RICO	MONTECRISTO	ESMERALDA	DONCELLO	PAUJIL	CRUCE UNIÓN	MONTAÑITA	PTO ARANGO	FLORENCIA	
PR81+092	PR71+000	PR63+300	PR54+000	PR41+000	PR35+500	PR27+000	PR21+000	PR15+000	PR09+000	PR03+000	PR00+000	PR11+120	PR00+000
80,5							96,2						
Asfalto Natural: 80,5 km							Asfalto Natural: 72 km Afirrado: 24,2 km						
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR 343,022 kilómetros													

RUTA 3001				RUTA 3002			
NEIVA	BALSILLAS	GUAYABAL	SANTO DOMINGO	MORRAS	PTO. AMOR	ARENAL	MINA BLANCA
PR00+000	PR10+500	PR00+000 PR04+000	PR33+250 PR32+800	PR57+500 PR56+180	PR71+000	PR84+000 PR88+000 PR89+000 PR98+000	PR81+092 PR11+000
343,022	54	112,322					
	Flexible: 10,5 km Afirado: 43,5 km	Asfalto Natural: 55,27 km Afirado: 57,052 km					

Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021.



OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO.	\$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR	N/A



		ANTICIPO.	
VALOR ADICIONAL	N/A	VALOR TOTAL DEL CTO.	\$399.567.436.436 M/CTE

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades.

- Se impartió orden de inicio del contrato de obra N°991 de 2021, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ (Anexo).

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

No se han tramitado ni aprobado ítem no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

En este periodo no ha ejecutado ninguna actividad.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa los siguientes formatos suscritos por los responsables:

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3, adjuntó en el cual el Interventor registra de manera resumida el estado general de ejecución del contrato.

4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 adjunto el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verificar el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).



4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 adjunto en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal.

4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 adjunto en el cual se debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que con lleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 Adjunto en el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.

El Interventor debe diligenciar en observaciones, las aclaraciones y evidencias que mantengan indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación del Contratista.

Se debe anexar el Registro Pluviométrico del IDEAM actualizado, correspondiente a la Estación o estaciones más cercanas al sitio de las obras.

4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Adjunto el cual se registra los resultados de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

4.7. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 Adjunto en el cual se verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.8. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.

En el FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-14 Adjunto en el cual se realiza el seguimiento del avance físico – financiero del contrato.



4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15. Adjunto en el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. Adjunto cual se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de obra y exige al Contratista realizar las acciones necesarias para su cumplimiento.

4.11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1), se registra los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual (Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-2).

4.12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Se debe presentar el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

4.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2).

4.14 ACTA DE COMITÉ DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN

Se anexa copia de las Actas de comité de obra (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1) y Acta de reunión (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2).

4.15 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORIA

Se adjunta el documento original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes. (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2).



5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de interventoría:

Tabla 2. Información del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.		
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
NIT	901.481.479-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%).		
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.



FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	\$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	0,0
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	\$33.499.975.248

Fuente: Elaboración Propia

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades.

- Orden de Inicio Contrato de Interventoría No.985 del 2021. CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA. (Anexo).

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En este periodo no se desarrollaron actividades que requieran la participación de los especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó no se presentó este programa.

5.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.

En este periodo no se presentó.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Adjunto se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. Adjunto, en el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del



contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. Adjunto lleva el control financiero y presupuestal e indica las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

6.4. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y SEGURIDAD SOCIAL.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13. Se anexa copia de las planillas correspondientes al pago de parafiscales a fin de que el gestor Técnico del Contrato realice la revisión y verificación del pago de los aportes parafiscales y el pago a la seguridad social.

6.5. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Adjunto se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad

6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18. Adjunto se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

No se ha realizado el trámite para solicitud de anticipo por parte de la interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe programar la reunión inicial entre contratista e interventoría y la entidad para establecer los requerimientos iniciales del proyecto.
- Se debe realizar la visita previa al corredor para verificar el estado actual del corredor, identificar los puntos que requieren atención prioritaria y los tramos para la construcción de pavimento asfáltico.
- Se debe revisar el estado actual de la gestión predial y ambiental del corredor.
- Realizar la revisión preliminar de los estudios y diseños entregados por la entidad.



- Las demás acciones estipuladas en el pliego de condiciones y el Anexo Técnico N°1.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

En este periodo no se generó correspondencia entre contratista e interventor.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PEDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°.: 25202-44184 CND

cc. Archivo
Ing. Carlos Alberto Zambrano, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor)
Ing. Juan Carlos Díaz, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

COMITÉ DE OBRA CON CONTRATISTA, SUPERVISOR Y GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
VISITA TÉCNICA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000		PR N+0000
-----------	--	-----------

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

WILSON ANDRES PARRA
15202138865BYC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

30

6

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

PERIODO MES:

JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.:

991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

CIENTO CATORCE (114) MESES

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA MÓDULO 1 – VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

FECHA DE INICIACIÓN:

29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA):

\$ 3.995.674.364.360,00

VALOR ADICIONALES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

\$ -

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:							
Acumulado:							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:							
Interventor:							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra		

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES A CONTRATO DE OBRA (19-05-2021)

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°. : 25202-44184 CND

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
--------------------------	--	-------------------------------	---------

MES DEL INFORME MENSUAL:	JUNIO	CONTRATO No. 991 DE 2021	CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA
---------------------------------	-------	---------------------------------	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SECTOR:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA (Abscisas alcance del contrato)
---------------------	---	----------------	---

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Firma _____
Nombre: WILMER ALONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Chile
Matricula No.: 25202183499CND

Firma 

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°.: 25202-44184 CND

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
--------------------------	--	-------------------------------	---------

MES DEL INFORME MENSUAL:	JUNIO	CONTRATO No.	991 DE 2021	CARRETERA Y/O PROYECTO:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			SECTOR:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:	

Firma
Nombre: WILMER ALONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matricula No.: 25202183499CND

Firma _____

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°.: 25202-44184 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

SECTOR: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	399,567,436.436.00
-------------------------------	----	--------------------

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____
Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°: 25202-44184 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-10																														
			VERSIÓN																																
			FECHA		1		DE		1																										
				FECHA		30		6		2021																									
						(Día)		(Mes)		(Año)																									
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA																					
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		JUNIO DE 2021										CARRETERA Y/O PROYECTO:		CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																					
												SECTOR:		CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																					
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
Clase de tiempo		DÍAS DEL MES																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total		
Seco																																20	22	20	62
Lluvias moderadas																																2	2	4	8
Lluvias intensas																																2	0	0	2
Total																																24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																			
OBSERVACIONES:																																			
Firma Nombre: WILMER ALONSO BARRERA CASTAÑEDA Residente de Obra Matricula No.: 25202183499CND																Firma Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORÍA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matricula N°. : 25202-44184 CND																			
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)																																			
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																			

FECHA			
	(Día)	(Mes)	(Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

SECTOR: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

[illegible]

Firma _____
Nombre: SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
Director de Obra
Matricula No.: 25202-66672CND

Firma 
Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENIÓRIA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula N°: 25202-44184 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA DE ELABORACIÓN

30

6

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

ACTA No:

PERIODO MES:

JUNIO

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

-

CONTRATO DE OBRA No :

991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

CIENTO CATORCE (114) MESES.

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN:

29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

SECTOR:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) :

\$ 3,995,674,364,360.00

VALOR ADICIONALES:

RUTA:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

VALOR ACUMULADO:

\$ -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
991 de 2021	1		399,567,436,436.00	399,567,436,436.00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	\$ 10,884,103,103
Total	\$ 10,884,103,103

ANTICIPOS

Otorgado \$	0
Amortizado \$	0
Saldo \$	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

Inversión Programada (P)

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Obra (B)

Ajustes (A)

Total (C=A+B)

E/P

Costos de Intervent (I)

C/B

I/C

En el mes:

\$ -

\$ -

Acumulado:

\$ -

\$ -

E/V

Meses Ejecutados

Plazo Ejecutado/Total

Meses Faltantes

Saldo Contrato

Plazo Adicional Estimado

Presupuesto disponible

Valor Programado para los meses faltantes del año.

Contratista:

0.10

114

113.90

\$ 399,567,436,436

Interventor:

Características Técnicas

Sección	Metros
Corona:	-
Calzada:	-
Bermas:	-
Sub base:	-
Base:	-
Carpeta:	-

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES:

Programado:

Ejecutado:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

1

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR O	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
OBRAS VARIAS									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0
TRANSPORTES									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.

2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.

3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.

4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°. : 25202-44184 CND
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Firma

Nombre: SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
Director de Obra
Matricula No.: 25202-66672CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

			FECHA	30	6	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES)	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
-------------------	---	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	991 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
----------------------	-------------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA MODULO 1. "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030.
----------------------	---

FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 3.995.674.364.360,00
VALOR ACUMULADO:	\$ - (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
-------------------------------	-------------	--------------	---------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																				
Cumplimiento	10%	\$ 350.716.339,52	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2028</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2030</td> </tr> </table>	Desde			Hasta			13	5	2021	31	12	2025	-	-	-	-			13	5	2021	31	12	2028	31	12	2025	31	12	2030	31	12	2025	31	12	2030
Desde			Hasta																																				
13	5	2021	31	12	2025																																		
-	-	-	-																																				
13	5	2021	31	12	2028																																		
31	12	2025	31	12	2030																																		
31	12	2025	31	12	2030																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1.155.520.225,54																																					
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 23.065.906,93																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 1.134.804.552,80																																					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400033451
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 5.400.871.822,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> </table>	Desde			Hasta			15	1	2021	31	12	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Desde			Hasta																		
15	1	2021	31	12	Año																
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																
Otros																					

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	400033450	OTRAS PÓLIZAS No.	N/A
Certificado de modificación o anexo No.:	3		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS						
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde			Hasta
Cumplimiento	10%	\$ 350.716.339,52	13	5	2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1.155.520.225,54	13	5	2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 23.065.906,93	31	12	2025	31 12 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 1.134.804.552,80	31	12	2025	31 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033451

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS						
A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde			Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 5.400.871.822,00	15	1	2021	31 12 Año
Otros			Día	Mes	Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033450 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____ **POLIZAS DEL CONTRATO PRINCIPAL** _____

Firma 

Nombre.: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS**
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula N°. 25202-44184 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

			FECHA	30	6	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS) DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA MÓDULO 1. "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021 **PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES. **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: SAMUEL ENRIQUE MARTÍNEZ ARIAS
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-66672CND

Firma



Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula N°.: 25202-44184 CND

Firma



Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
--------------------------	--	-------------------------------	---------

MES DE INFORME:	JUNIO	CONTRATO No. 985 DE 2021	CARRETERA Y/O PROYECTO:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		SECTOR:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

[illegible]

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N°.: 25202-44184 CND

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-7233

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
--------------------------	--	-------------------------------	---------

MES DE INFORME:	<u>JUNIO</u>	CONTRATO No.	<u>985 DE 2021</u>	CARRETERA Y/O PROYECTO:	<u>CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA</u>
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			SECTOR:	<u>CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA</u>

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Nombre.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula N° : 25202-44184 CND

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-72334

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ENTREVISTAS VISIÓN 2030

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA

SECTOR: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre.: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS**
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORÍA.:
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula N°.: **25202-44184 CND**

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

SECTOR: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-72334 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-16																																																					
			VERSIÓN		1																																																					
			PÁGINA		1	DE	2																																																			
			FECHA		30	6	2021																																																			
					(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
IDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																										
OBJETO DEL CONTRATO:		INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 1.																																																								
FECHA DE INICIO:		29 DE JUNIO DE 2021																																																								
PLAZO INICIAL:		CIENTO CATORCE (114) MESES.																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31 DE AGOSTO DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL:		\$ 33.499.975.248,00																																																								
VALOR ACUMULADO:		\$ - (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		CARLOS A ZAMBRANO																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$1,019,997,524.70</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$2,252,303,164.80</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$2,039,995,049.40</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$3,059,992,574.10</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2030</td></tr></table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$1,019,997,524.70	12	5	2021	31	12	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$2,252,303,164.80	12	5	2021	31	12	2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$2,039,995,049.40	12	5	2021	31	12	2028	Calidad del servicio	30%	\$3,059,992,574.10	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
Cumplimiento	10%	\$1,019,997,524.70	12	5	2021	31	12	2025																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$2,252,303,164.80	12	5	2021	31	12	2025																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$2,039,995,049.40	12	5	2021	31	12	2028																																																		
Calidad del servicio	30%	\$3,059,992,574.10	31	12	2025	31	12	2030																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		21-44-101352030																																																								
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$1,019,997,524.70	12	5	2021	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$2,252,303,164.80	12	5	2021	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$2,039,995,049.40	12	5	2021	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	\$3,059,992,574.10	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101352030

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORÍA.: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula N°.: 25202-44184 CND

Firma _____

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matricula No. : 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	30	6	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS) DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021 **PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ N ☐ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1	DE 2

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula N°.: 25202-44184 CND

Firma _____

Nombre: _____
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: _____

Firma 

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-72334 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
