

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 45 de 35

3.3 CONTRATO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del presente informe, el equipo de la Interventoría ha realizado las actividades que se relacionan a continuación:

Actividades realizadas

- Revisión, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por el Contratista
- Se realizaron requerimientos al Contratista por medio de oficios, de manera verbal, a través de la bitácora y en los comités de obra sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.
- Se realizaron informes semanales discriminando las actividades realizadas.

Informe semanal	Periodo
48	1/08/2022 - 7/08/2022
49	8/08/2022 - 14/08/2022
50	15/08/2022 - 21/08/2022
51	22/08/2022 - 28/08/2022

Ver anexo No.1 Informes Semanales.

- Seguimiento al Contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con las normas técnicas de calidad y normas ambientales.
- Durante la ejecución de las actividades se proporcionaron oportunamente las sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad industrial y ambiental.
- Supervisión a las actividades de localización y replanteo
- Supervisión a actividades de hincado de pilotes en tierra
- Supervisión a actividades de instalación de tocones, riostras, vigas laminadas, viguetas, piso Deck y columnas.

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 46 de 35

- Supervisión a actividades de instalación de la plataforma en deck.
- Elaboración y presentación del informe de Interventoría correspondiente al periodo de agosto de 2022
- Elaboración del informe de Interventoría correspondiente al periodo de agosto de 2022
- Seguimiento al cronograma de obras y programa de inversiones de la prórroga No 2.
- Revisión y aprobación de acta parcial de obra.

4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.

A continuación se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el Contratista, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 3 de Abril de 2023.

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS		Código: IP-PM-01
			Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		Fecha: 12-03-2019
			Página 47 de 35

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	\$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	\$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	\$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	\$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	\$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	\$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	\$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	\$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			

Cuadro No. 35 Resumen de avance de obras ejecutadas.

• A la fecha del presente corte y según la programación entregada por el Contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas a la fecha es de **27%** vs obras programadas de **51%** presentándose un atraso del **24%**. Retraso que está debidamente justificado en las obras del carril de desaceleración y parqueadero que aún se encuentra en trámite del convenio para la intervención de la vía. Igualmente se empiezan a generar retrasos en el inicio de la construcción de algunas estructuras como son piso deck e instalación de riostras y vigas laminadas del módulo 15 al 23.

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS		Código: IP-PM-01
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		Versión: 02
			Fecha: 12-03-2019
			Página 48 de 35

- Durante el periodo se continua con la instalación de las vigas laminadas y viguetas procedentes del taller especializado en Bogotá.
- Durante el período se continua la instalación de la plataforma en Deck en el módulo 5, 6 y 7.
- Durante todo el periodo del informe Puerta de Oro, el Distrito, Edubar y el Contratista, han venido realizando ingentes esfuerzos para conseguir permisos ante la ANI para la intervención de la vía y poder iniciar la construcción del carril de desaceleración y Parquadero.
- Puerta de Oro entregó a Edubar los nuevos diseños del parqueadero, luego de la decisión de trasladar del sitio original y que ahora estará ubicado al lado de la Estación III. El Contratista realizó el replanteo en campo del nuevo diseño y la implantación, donde evidenció que hacía falta información de la versión anterior, por lo que remitió el plano con estas observaciones a EDUBAR. Igualmente, el contratista entregará para su revisión una nueva propuesta para la ubicación del tanque de agua potable.
- El Contratista continua con el trazado y replanteo del proyecto para la ubicación de los pilotes de cada módulo, esto con el fin de verificar el alineamiento y poder realizar los ajustes necesarios durante el proceso de hincado.
- A fecha de corte del presente informe se han hincado 615 pilotes en tierra (Estación III y modulo 12,13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40) y se finalizó el hincado 639 en agua correspondientes a los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.

5.0 CONTROL DEL PERSONAL.

5.1. CONTRATO DE OBRA.

El Contratista cuenta con el siguiente personal profesional aprobado, los cuales se relacionan a continuación:

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INGENIERÍA DE PROYECTOS		Código: IP-PM-01
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		Versión: 02
			Fecha: 12-03-2019
			Página 49 de 35

NOMBRE	CARGO
ADALBERTO VIVIERO	GERENTE DEL PROYECTO
JAVIER VELEZ	DIRECTOR DE OBRA
JHORVIS DE LUQUE	RESIDENTE DE OBRA
LUIS POLO	RESIDENTE DE OBRA
ANTONIO FRANCO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CARLOS DUSSAN	ESPECIALISTA AMBIENTAL
LAYTON GONZALEZ-RUBIO	ESPECIALISTA HIDRAULICO
COMISIÓN DE TOPOGRAFIA	2
OPERADORES CABRIA	4

Cuadro No. 85 Resumen Personal en obra.

NOMBRE	CARGO
AYUDANTES	23
VIGILANTE	3
SOLDADORES	1
DIANA DAZA	INSPECTORA/SISO
OPERADOR TELEHANDLER	1
OFICIOS VARIOS	3
INGENIERO AUXILIAR	1
ISABELLA MONTERROZA	PSICOLOGA SOCIAL
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	7
ALMACENISTA	1
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 86 Resumen Mano de Obra Calificada

5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El equipo de trabajo de la Interventoría en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2022 se relaciona a continuación:

No.	PERSONAL	CARGO
1	PEDRO GUTIERREZ B.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	FABIAN SUAREZ H.	GERENTE DE PROYECTO
3	CYNTHIA VILLEGAS A.	RESIDENTE INTERVENTORIA
4	LILIANA GALLARDO P.	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	JAIME CURVELO G.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
6	MARIELA VILORIA	PROFESIONAL SOCIAL

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS		Código: IP-PM-01
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		Versión: 02
			Fecha: 12-03-2019
			Página 50 de 35

No.	PERSONAL	CARGO
7	CRISTIAN BENAVIDES N.	RESIDENTE AMBIENTAL
8	HERNANDO GÓMEZ CASAS	ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Cuadro No. 36 Resumen Personal Interventoría.

NOMBRE	CARGO
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	1
INGENIERO AUXILIAR	2
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 37 Resumen mano de obra calificada.

6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

Entrega de planos.

A la fecha todos los planos y diseños definitivos de las plataformas y edificios de madera del proyecto han sido remitidos por la Entidad contratante. Está pendiente por remitir el ajuste final de los diseños del tanque y redes hidrosanitarias que sufrieron cambios por el traslado del parqueadero.

Análisis de precios unitarios y presupuesto.

El Contratista remitió el presupuesto y apus iniciales que fueron presentados en su oferta licitatoria, sin embargo, luego de la revisión de los diseños y los ajustes entregados por la entidad contratante, el Contratista deberá entregar un informe con el balance real del Contrato que incluye el presupuesto y apu actualizado para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la entidad contratante.

Trámites y Permisos

Durante el presente período Puerta de Oro, Edubar, el Distrito y el Contratista han venido realizando ingentes esfuerzos en lo que respecta a los trámites ante la ANI que permitan obtener el permiso de intervención de la vía que comunica a Barranquilla con

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 51 de 35

el corregimiento de la Playa y que es colindante con el proyecto, donde se construirá el carril de desaceleración, la cicloruta y el parqueadero.

Balance del Contrato

Dentro del primer mes de ejecución del Contratista debía realizar una revisión detallada del proyecto, por lo que esta Interventoría está a la espera que se presente un informe detallado que contenga el presupuesto detallado actualizado y análisis de precios unitarios acompañados de las respectivas especificaciones. A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría le remitió al Contratista debidamente aprobado el diseño eléctrico una vez cumplía con las normas de RETIE y RETILAP. Igualmente, se remitió el presupuesto de dicho componente eléctrico para que fuera tramitado su incorporación en el Contrato. Para incorporar este presupuesto, el contratista presentó el Acta de Modificación No 1 e igualmente realizó un balance de las cantidades reales a ejecutar en los pilotes, riostras, vigas y viguetas.

Plan de Compras

Es importante mencionar que dicho plan no se encuentra dentro de las obligaciones del Contrato de Obra e Interventoría. Sin embargo, debido a que gran parte de los materiales del proyecto no se producen en Colombia y vienen siendo importados desde Estados Unidos y China, la Interventoría está realizando un seguimiento a la compra e importación de la madera, para verificar que cumpla con todas las especificaciones y se garantice un suministro al proyecto que permita cumplir con los plazos programados.

7.0. EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo el contratista utilizó en obra los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 890 Y 1300 KG – En zona seca	1

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



INGENIERÍA DE PROYECTOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: IP-PM-01

Versión: 02

Fecha: 12-03-2019

Página 52 de 35

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 1300 KG – En zona húmeda	1
BOMBA	1
LANCHA	1
TELEHANDLER CAT TH103	1
PLANTA ELECTRICA	5
EQUIPO DE SOLDADURA	3
ESTACIÓN TOTAL	2
NIVEL AUTOMÁTICO	2
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 38 Equipo de Obra

Por parte de la Interventoría se contó con los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
DRON	1
COMPUTADORES	4
ESTACIÓN TOTAL	1
NIVEL	1
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 39 Equipo de Interventoría

8.0. ESTADO DEL TIEMPO.

A continuación se relaciona el estado del tiempo durante el periodo en curso.

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
1/08/2022	0			
2/08/2022	0			1
3/08/2022	2,1	1		1
4/08/2022	0			
5/08/2022	0			
6/08/2022	3	1		1
7/08/2022	0			
8/08/2022	0			
9/08/2022	0			
10/08/2022	0			
11/08/2022	1		1	

Elaboro: Interventoría.

Revisó: Subgerencia de Proyectos.

Aprobó: Subgerencia de Proyectos.

	INGENIERÍA DE PROYECTOS		Código: IP-PM-01
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		Versión: 02
			Fecha: 12-03-2019
			Página 53 de 35

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
12/08/2022	0,5	1		
13/08/2022	0			1
14/08/2022	0			
15/08/2022	0			1
16/08/2022	0			
17/08/2022	0			
18/08/2022	0			
19/08/2022	0			
20/08/2022	0			
21/08/2022	0			
22/08/2022	0			1
23/08/2022	0			
24/08/2022	0			
25/08/2022	0			
26/08/2022	0			
27/08/2022	0			1
28/08/2022	0			
29/08/2022	0			
30/08/2022	0			
31/08/2022	0			1

Cuadro No. 40 Estado del Tiempo

9.0 CONTROL DE CALIDAD.

La Interventoría realizó seguimiento y control a las actividades de topografía, hincado de pilotes, instalación de riostras, vigas, viguetas, plataforma del deck y columnas en cruz para garantizar la calidad de las obras.

10 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

A partir de las actividades ejecutadas en el presente periodo se pueden resaltar los siguientes aspectos:

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 54 de 35

- Aspectos Técnicos.

A la fecha Edubar S.A ha realizado la entrega completa de los diseños definitivos eléctricos y de los diseños estructurales de los módulos curvos y el módulo de avistamiento de aves.

Sin embargo, de acuerdo con la verificación de topografía realizada por el Contratista en conjunto con la Interventoría, se encontró que las riostras de la pasarela de 1,5 m de ancho están quedando enterradas por debajo del nivel del suelo si se construyen a la cota +1,96 establecida en el diseño, y por lo tanto no estarían cumpliendo con la función de apoyo estructural para la que fueron diseñadas. Es por ello que, Puerta de Oro entregó una versión a la cota +2,20 para las pasarelas de 1,5 y 6 m de ancho que garantiza no solo el empotramiento de los pilotes y niveles de seguridad de la estructura, sino que se respeta el diseño de mantener las pasarelas lo más cerca posible del agua. Para el caso de la Estación III se establece cota de plataforma de +2,72 y el módulo 15 sería donde se realizaría la transición entre la estación y las pasarelas.

En el caso de los módulos 36 y 37, debido a la cota que presentaba el terreno y al impacto que generaría sobre la vegetación existente en esta área, se decidió subir el nivel en estos módulos a la cota (+3.2), para lo cual se hará una transición en el módulo 35.

Para el diseño del parqueadero, tanque de agua potable y redes hidrosanitarias, Edubar S.A hizo entrega de la nueva posición donde fue reubicado el parqueadero, pero está pendiente por entregar la nueva posición del tanque de agua y el rediseño de las redes hidrosanitarias.

Con respecto a los permisos para la intervención de la vía es importante casi que imperativo obtener la viabilidad por parte de la ANI lo más pronto posible para permitir al Contratista iniciar los trabajos del carril de desaceleración, cicloruta, ampliación de

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 55 de 35

box coulvert y parqueadero. Igualmente se deben terminar de ajustar la nueva ubicación del parqueadero y el tanque de agua potable por parte de la entidad contratante, ya que al realizar la implantación de la nueva ubicación del parqueadero, se pudo evidenciar que no estaban todos los elementos que aparecen en la versión anterior.

El Contratista remitió el presupuesto del componente eléctrico teniendo en cuenta los diseños definitivos remitidos por la entidad contratante, la Interventoría realizó las respectivas observaciones y emitió su No objeción al ajuste del diseño y presupuesto, sin embargo, durante el presente periodo el contratista incorporó el presupuesto eléctrico dentro de la modificativa No 1 y realizó el respectivo balance de cantidades para los pilotes, riostras y vigas de las pasarelas.

Durante el mes de diciembre de 2021, la Interventoría dio trámite a la solicitud de prórroga No 1 tanto del Contrato de Obra como de Interventoría por 6 meses, por lo que la nueva fecha de finalización de los Contratos había quedado establecida para el 30 de junio de 2022.

Para el mes de mayo de 2022, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución que llevaba la obra en ese momento, y que en el tiempo restante del Contrato (un mes), no era posible culminar con el objeto contractual, el Contratista presentó una solicitud de prórroga No 2 donde la nueva fecha de terminación del Contrato sería para el 30 de abril de 2023. La Interventoría luego de analizar los documentos soportes y las justificaciones presentadas por el Contratista, remite a la Entidad Contratante recomendándole darle trámite a la solicitud. Esta solicitud recibe el aval de la entidad contratante con la aprobación de la prórroga No 2 el pasado 23 de junio de 2022 para los Contratos de Obra e Interventoría.

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 56 de 35

Durante el presente período el Contratista presentó el presupuesto desglosado para el componente del sistema de la red contraincendio y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. Para el caso del componente de voz y datos, el Contratista propuso a la entidad contratante y a la Interventoría implementar unos ajustes al diseño original buscando hacerlo más versátil, que permitiría al proyecto integrarse no solo con las demás unidades funcionales sino que además ir acorde con los proyectos que adelanta el distrito actualmente.

EDUBAR, como entidad contratante, manifestó que, basados en lo establecido en el contrato EDU-506-2021, solicita que el Contratista proceda a complementar y/o adicionar y/o modificar y/o ajustar lo correspondiente al componente de voz y datos, presentando a la Interventoría debidamente soportada la propuesta de optimizar dicho componente.

- Programación.

Se realizó control de la programación de la obra con corte al día 31 de agosto del 2022, teniendo en cuenta la programación entregada por el Contratista para la prórroga No 2, con un porcentaje programado de **51%** y ejecutado de **27%**, con una diferencia de atraso del **24%**. La derivación de los retrasos de estas actividades se presentan por temas pendientes en los trámites para la intervención de la vía, la entrega de la totalidad de los predios del proyecto y la entrega definitiva del diseño del tanque de agua potable y sistema hidrosanitario.

- Avance Presupuestal.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2022 el Contratista ejecutó obras por valor de \$3.201.796.207,74 incluido AIU equivalente a un 3,88% del valor contractual, con un valor acumulado de \$ 23.874.119.275,95 equivalentes al 28,95%.

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 57 de 35

- **Gestión Social**

El seguimiento a los documentos y gestión social del periodo se adjunta en el **Anexo No 8**

- **Gestión Ambiental**

El seguimiento a los documentos y gestión ambiental del periodo se adjunta en el **Anexo No 5**

- **Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.**

El seguimiento a los documentos y gestión SST del periodo se adjunta en el **Anexo No 11**

- **Bitácora de Obra.**

El Contratista inició actividades el día 3 de enero de 2022. Ver **Anexo No 10.**

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código: IP-PM-01
		Versión: 02
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Fecha: 12-03-2019
		Página 56 de 35

ANEXO No. 1
INFORMES SEMANALES

Elaboro: Interventoría.	Revisó: Subgerencia de Proyectos.	Aprobó: Subgerencia de Proyectos.
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



INGENIERÍA DE PROYECTOS

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

Código: IP-PM-01

Versión: 02

Fecha: 12-03-2019

Página 57 de 35

000070

ANEXO No. 2

OFICIOS RECIBIDOS

Elaboro: Interventoría.

Revisó: Subgerencia de
Proyectos.

Aprobó: Subgerencia de
Proyectos.



FP-35-00
(10/05/2013)

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA ☒ ENVIADA ☐

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/08/2022	CR-504-1119-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-08-04	ACTA PARCIAL OBRA NO. 07	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
29/08/2022	CR-504-1226-EDUBAR SA-2022-08-29	DEFINICION DE COLOR DE BARNIZ PARA LA PROTECCION DE LA MADERA DEL PROYECTO	EDUBAR SA	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Firma: 
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
GERENTE DE INTERVENTORIA Y/O DIRECTOR

000071

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 04 de agosto de 2022
JCO-080-2022

**INGENIERÍA DE
PROYECTOS**Asunto: JCO-080-2022 ACTA PARCIAL DE OBRA
07

Fecha: 04/08/2022 17:51:04

No Radicado: R-0001119-2022

Folios: 2

Destinatario: Daniela Rodríguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio
Gutiérrez Viehal

Señores

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Atn. Fabian Suarez Herrera

Calle 77B N° 57-103 Of 907 Ed. Green Towers

Barranquilla, Atlántico

**REF: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA. – REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS.**

Estimados señores:


Por medio de la presente se hace remisión del Acta parcial de obra N° 7 del contrato en referencia
con el siguiente contenido:

Documentos entregados en medio físico:

- Acta parcial de obra N° 7 debidamente firmada por contratista.
- Flujo de inversión del proyecto.
- Pre acta N° 7.
- Memoria de cantidades.

Documentos entregados en medio magnético:

- Documentos contractuales y otros.
- Informe de obra julio de 2022.
- Informe social julio de 2022.
- Informe ambiental julio de 2022.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo julio de 2022.



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

- Informe de seguimiento al Plan de Gerencia a julio de 2022.
- Certificado de calibración de equipos de topografía.
- Certificado de aportes a la seguridad social.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

DIP-00834

Barranquilla, agosto 23 de 2022

Señor

PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
REPRESENTANTE LEGAL

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS

Asunto: DIP-00834 DEFINICIÓN DE COLOR DE BARNIZ PARA LA PROTECCIÓN DE LA

Fecha: 29/08/2022 15:01:45

No Radicado: R-0001226-2022

Folios: 1

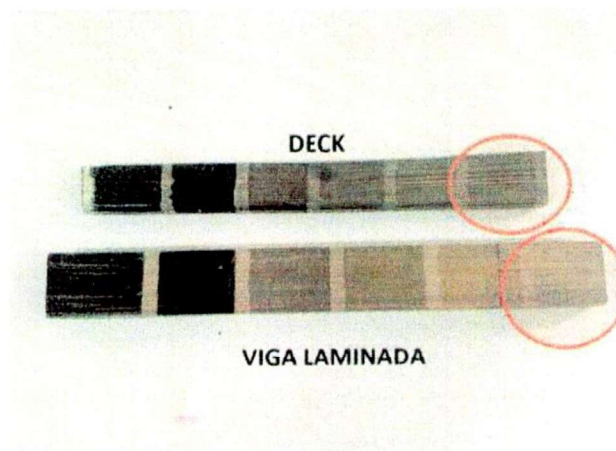
Destinatario: Daniela Alejandra Cabrera Cantillo, Daniela Martínez López, Daniela Rodríguez, Fabián Giovanni Suárez Herrera, Pedro Antonio Gutiérrez

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Asunto: Definición de color de barniz para la protección de la madera del proyecto.

Reciban un cordial saludo,

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger la madera de las condiciones ambientales a la que se encuentra expuesta la estructura, es necesaria la aplicación inmediata de un barniz protector, el cual tiene como función la protección y conservación de estos materiales. Esta supervisión aclara que el barniz aprobado es el denominado como "INCOLORO" dentro de la gama de colores presentada por el contratista. A continuación, se anexa el registro fotográfico del color seleccionado:



Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

Diego Rada Altafona

DIEGO RADA ALTAHONA
Subgerente de Desarrollo Urbano
EDUBAR S.A.

Proyecto: Ing. Iván López.

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Dirección web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT 800 091 140-4





INGENIERÍA DE PROYECTOS

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

000074
Código: IP-PM-01

Versión: 02

Fecha: 12-03-2019

Página 58 de 35

ANEXO No. 3 OFICIOS ENVIADOS

Elaboro: Interventoría.

Revisó: Subgerencia de
Proyectos.

Aprobó: Subgerencia de
Proyectos.



RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA

ENVIADA

X

FP-35-00
(10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDUJ-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/08/2022	CINP-504-126-3116	INFORME SEMANAL NO. 47	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
8/08/2022	CINP-504-127-3188	INFORME SEMANAL NO. 48	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
8/08/2022	CINP-504-128-3189	ACTA DE OBRA NO. 07	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
11/08/2022	CINP-504-129-3223	INFORME MENSUAL NO. 11	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
11/08/2022	CINP-504-130-3224	ACTA DE INTEVENTORIA NO. 06	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EBUDAR SA
16/08/2022	CINP-504-131-3291	INFORME SEMANAL NO. 49	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
18/08/2022	CINP-504-132-3350	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
22/08/2022	CINP-504-133-3388	INFORME SEMANAL NO. 50	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
29/08/2022	CINP-504-134-3479	INFORME SEMANAL NO. 51	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR

Firma:

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
GERENTE DE INTERVENTORIA Y/O DIRECTOR

000075



000076

Barranquilla, 3 de agosto de 2022

CINP - 504 - 126-3116

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,


Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 47 correspondiente al periodo 25 al 31 de julio de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN


FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH2208021802
20220803880
03-Ago-2022 16:34 PM

NOTAS:
• Para cualquier información consulte el Número del Radicado
• El recibo de la correspondencia NO significa la Aceptación
• Pro para su [2022/08]

Barranquilla, 8 de agosto de 2022

CINP – 504 – 127-3188

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 48 correspondiente al periodo 1 al 7 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN


FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

2208051737

RECEIVED

20220803936

09-Ago-2022 09:04 AM

NOTAS:
• Para cualquier información consulte el Número del Radicado.
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.
• Solo para su registro.



Barranquilla, 8 de agosto de 2022

CINP-504-128-3189

Señores

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Atn. Adalberto Vivero Coronell

Representante Legal

Cra 59 No 64-125

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:


Acusamos recibido de su comunicado JCO-080-2022 de fecha 4 de agosto de 2022 en el cual se remiten el Acta de obra No. 7 y sus soportes:

- Acta parcial de obra No. 7
- Preacta No. 7
- Memorias de obra acta No. 7
- Informe de obra julio 2022
- Programa de inversiones

En respuesta a los documentos enviados, se hace devolución debidamente firmada el acta y se notifica que la Interventoría una vez revisado los adjuntos emite la No objeción de los mismos.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN


FABIAN SUAREZ HERRERA

Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC: Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA

Aprobó: FSH





Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP – 504 – 129-3223

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

2208101727

20220804003

11-Ago-2022 14:22 PM

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Edubar

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe mensual en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe mensual No. 11 correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

F. Suarez H

FABIAN SUAREZ HERRERA

Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA

Aprobó: FSH





Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP – 504 – 130-3224

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
 Atn. Ing Diego Rada Altahona
 Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
 Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el Acta de Interventoría No 6 y sus anexos del Contrato de la Referencia.

1. Formato informe de gestión No 6
2. Acta de recibo parcial No 6
3. Acta de recibo parcial a satisfacción
4. Factura electrónica No 6
5. Copia de Resolución de la DIAN
6. RUT
7. Certificación Bancaria
8. Copia del Contrato y Prorroga No 1
9. Pago de planilla de seguridad social
10. Certificación de aportes
11. Copia CC Representante legal
12. Certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y CC contador.
13. Acta de obra/acta de recibo parcial
14. Copia de estampilla pagadas

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Fabian Suarez Herrera
FABIAN SUAREZ HERRERA

Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
 Aprobó: FSH



2208111733
 20220804010
 12-Ago-2022 11:15 AM
 Fecha
 Edubar S.A.
 NOTAS:
 • Para cualquier información con el Número del Documento
 • El recibo de la correspondencia No significa la aceptación
 sino por la su (CINP)

Barranquilla, 16 de agosto de 2022

CINP – 504 – 131–3291

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 49 correspondiente al periodo 8 al 14 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**FABIAN SUAREZ HERRERA**

Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: CVA
Aprobó: FSH

2208171733

20220804055

18-Ago-2022 15:35 PM

RECIBIDO

NOTAS:

- Para cualquier información usar el Número del Radicado.
- Si recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.
- No para su DESARROLLO.



Barranquilla, 18 de agosto de 2022

CINP – 504 – 132 – 3350

Señores

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Atn. Adalberto Vivero Coronell

Representante Legal

Cra 59 No 64-125

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

De acuerdo a lo evidenciado el pasado 11 de agosto de 2022, como es el retiro en obra de los lavamanos, se le recuerda al Contratista que el protocolo de bioseguridad se encuentra vigente de acuerdo a la Resolución 1238 de 2022.

A la espera que se mantengan las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19 y por consiguiente el cumplimiento al protocolo de bioseguridad para el contrato de la referencia.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA

Gerente de proyectos

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Ing. Pedro Miranda - Edubar

Elaboró: CBN

Aprobó: FSH





Barranquilla, 22 de agosto de 2022

CINP - 504 - 133-3388

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

2208230749

20220804107

23-Ago-2022 09:44 AM

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,


Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 50 correspondiente al periodo 15 al 21 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN


FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

NOTAS:

- Para cualquier información dirigirse al Número del Radicado.
- El recibo de la correspondencia NO significa la aceptación, sino para su registro.





Barranquilla, 29 de agosto de 2022

CINP – 504 – 134-3479

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Vía 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 51 correspondiente al periodo 22 al 28 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN


FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

