

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

INFORME DE ACTIVIDADES MES ABRIL

CONTRATO No. 139 de 2022

OBJETO DE CONTRATO:

“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS.”

**CONTRATISTA
CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE**

SANTIAGO DE CALI - MAYO 5 DE 2022

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	1
2.	ORGANIZACION DEL PROYECTO.....	2
3.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE ABRIL	3
3.1	COMPONENTE JURÍDICO	3
3.1.1	ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
3.1.2	SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGUROS.....	4
3.1.3	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	4
3.2	COMPONENTE TÉCNICO	6
3.2.1	Homologación de Especificaciones técnicas	6
3.2.1.1	Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Miraflores.....	6
3.2.1.2	Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Taraira	9
3.2.1.3	Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Puerto Cachicamo	11
3.2.2	Informe de replanteo Proyecto Taraira.....	13
3.2.3	Informe de replanteo Proyecto Miraflores	13
3.2.4	Informe de replanteo Proyecto Puerto Cachicamo	14
3.2.5	AVANCE DE OBRA CIVIL	15
3.2.5.1	Diseño de Estructura metálica proyecto Miraflores.....	15
3.2.5.2	Diseño de Estructura metálica proyecto Taraira.	18
3.2.6	Seguimiento de cronogramas	21
3.3	COMPONENTE SOCIAL	24
3.3.1	INFORME DE SOCIALIZACIÓN	24
3.3.2	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	25
3.3.3	CONTROL Y SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.....	26
3.4	COMPONENTE FINANCIERO	27
3.4.1	Seguimiento a las órdenes de compra a proveedores	27
3.4.2	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.....	44
3.4.2.1	FACTURACIÓN	44
3.4.3	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO... ..	46
3.5	COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	47
3.5.1	PERSONAL DE OBRA Y PLANILLAS DE AFILIACIONES	47
3.5.2	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – IPER	49
3.5.3	PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP.....	49
3.5.4	MEDICINA PREVENTIVA.....	50
3.5.5	CERTIFICADOS MÉDICOS.....	51
3.5.6	CAPACITACIÓN	51
3.5.7	TAREAS CRÍTICAS.....	52
3.5.8	MANUALES DE DESPLAZAMIENTO A ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS – ZNIA.....	52

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.5.9	SITEMA DE REGISTRO DE ACCIDENTES	54
3.5.10	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS	54
3.5.11	SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS	54
3.5.12	SEGUIMIENTO A RETROALIMENTACIÓN DE INFORMES DE OBRA	54
3.6	COMPONENTE AMBIENTAL	55
3.6.1	CRONOGRAMA ACTIVIDADES AMBIENTALES.....	55
3.6.2	CRONOGRAMA AMBIENTAL	55
3.6.3	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS IPER	56
3.6.4	PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL ZONA SAN VICTORINO	56
3.6.5	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CENTRAL DE GENERACIÓN TARAIRA	57
3.6.6	CONTROL DE EMISIONES.....	60
3.6.7	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS.....	60
3.6.8	USO DEL AGUA	60
3.6.9	GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.....	60
3.6.10	REGISTRO DISPOSICIÓN DE GRASAS	60
3.6.11	REGISTRO ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	60
3.6.12	PROTOCOLO RESPEL - REGISTRO DE SALIDA DE RESIDUOS RECICLABLES, PELIGROSOS Y ESPECIALES	61
4.	COMUNICACIÓN.....	61
4.1	CORRESPONDENCIA	61
4.1.1	CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	62
4.1.2	CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....	63
5.	NOVEDADES PRESENTADAS	64
6.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE MAYO	64
7.	CONCLUSIONES	65
8.	LISTADO DE ANEXOS	65

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

1. INTRODUCCION

Este informe describe las actividades más relevantes que ha desarrollado el contratista de obra CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE, para el período del mes de abril del año 2022, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción del contrato No. 139 de 2022, cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS”.

El presente informe tiene el fin de informar y notificar las actividades jurídicas, financieras, técnicas y demás actividades administrativas y de obra desarrolladas por el contratista CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2022, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

2. ORGANIZACION DEL PROYECTO

Para realizar las actividades programadas durante el mes de abril, se actualizó el Organigrama del proyecto No. 139 de 2022 - Etapa de Planeación mes de abril. El cual presentamos en la **Figura 1**.

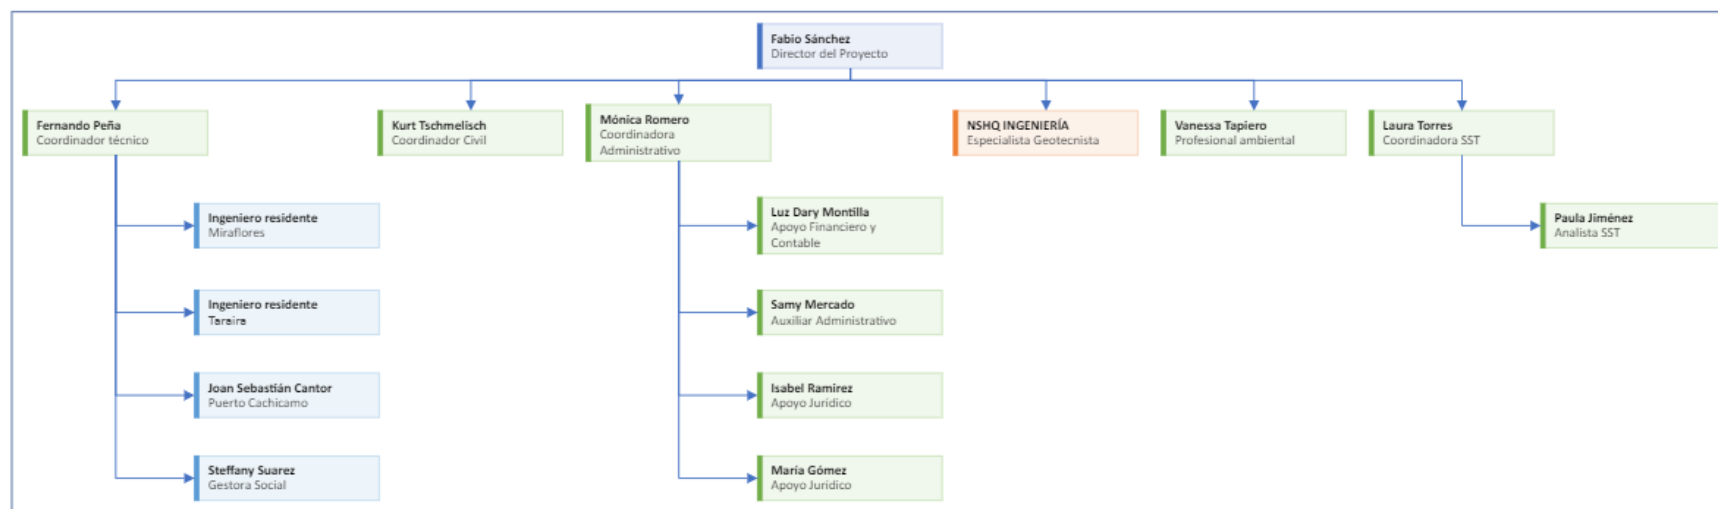


Figura 1. Organigrama Consorcio Guaviare Sostenible

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE ABRIL

3.1 COMPONENTE JURÍDICO

Se adelantaron durante el mes de abril las actividades correspondientes a la **Etap**a de **Planeación** del proyecto, donde se le da continuidad al contrato suscrito entre ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y el Consorcio Guaviare Sostenible.

3.1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	SOLAR HÍBRIDOS 139
CENTRO DE COSTOS	HÍBRIDOS ENERGUAVIARE
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS”.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, GUAVIARE, PUERTO CACHICAMO, GUAVIARE Y TARAIRA, VAUPÉS.
TIPO DE PROYECTO:	ENERGÍAS RENOVABLES
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER SOLAR 2022
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 139 DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 22.839.846.596,21
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DEL 2022
OTRO SI No. 1	NA
OTRO SI No. 2	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE – R.L. DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RÍOS

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.1.2 SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGUROS

CUADRO DE CONTROL DE LAS GARANTÍAS				
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO SA		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	\$4.567.969.319,24	11/02/2022	11/12/2022	SÍ
Buen manejo del Pago anticipado No.1	\$6.851.953.978,86	11/02/2022	11/12/2022	SÍ
Prestaciones sociales	\$1.141.992.329,81	11/02/2022	11/08/2025	SÍ
Estabilidad de la obra	\$2.283.984.659,62	11/02/2022	11/08/2023	SÍ
Correcto funcionamiento	\$2.283.984.659,62	11/08/2022	11/08/2027	SÍ
Predios, labores y operaciones	\$1.141.992.329,81	11/02/2022	11/08/2022	SÍ

3.1.3 SEGUIMIENTO DE CONTRATO

El 28 de abril de 2022, mediante oficio con Asunto “SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO 139 DE 2022” (Anexo 1) se envió a la Interventoría Consorcio Inter Solar 2022, la justificación respectiva de modificar la cláusula cuarta “Plazo de Ejecución” del Contrato de obra No. 139 de 2022, celebrado entre ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y el CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE, en esta cláusula especifica lo expuesto en la figura 2.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

CLAUSULA CUARTA. Plazo de Ejecución. - El plazo para la ejecución del presente contrato Será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. El acta de inicio del presente proceso se suscribirá una vez se expida el registro presupuestal y se realice la aprobación de las garantías por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. No obstante, las partes podrán convenir ampliar el tiempo, previa solicitud debidamente argumentada sin que eso afecte adición en valor superior al autorizado legalmente, su aprobación se dará por parte del INTERVENTOR con visto bueno del SUPERVISOR, la cual deberá ser solicitada con al menos diez (10) días hábiles de anticipación a su vencimiento, anexando la reprogramación respectiva. Será obligación del Contratista la modificación de las garantías y de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. la aprobación de estas, cuando se trate de cambios que afecten las condiciones inicialmente pactadas.

Figura 2. Cláusula cuarta contrato de obra No. 139 de 2022¹

De acuerdo a lo anterior el plazo de ejecución del contrato está estipulado en 6 meses luego de la firma del acta de inicio, la cual tiene fecha de inicio el 21 de febrero de 2022 y la fecha de terminación del contrato estaría para el día 20 de agosto de 2022.

Teniendo en cuenta esto, el Consorcio Guaviare Sostenible, en sus labores de planificación de compras con proveedores, y una vez agotadas todas las alternativas de suministro y canales de transporte posible con el fin de obtener mejores tiempos de respuesta, se obtuvieron los tiempos de suministro de los componentes para los sistemas híbridos, presentados en la Figura 3.

		TIEMPO DE ENTREGA
CONTROL	VIBRAN - Miraflores	14 semanas
	VIBRAN - Taraira	14 semanas
BATERIAS	DHYBRID - Miraflores 40%	26 semanas
	DHYBRID - Taraira 40%	26 semanas
PANELES	Paneles solares Miraflores 10% - LONGI	12 semanas
	Paneles solares Taraira 100% - Jinko	12 semanas
	Paneles solares Cachicamo 10% - LONGI	12 semanas
GENERADORES	Generadores Miraflores 20%	20 semanas
	Generadores Taraira 20%	20 semanas
	Generadores Cachicamo 20%	2 semanas
TRANSFORMADORES	Transformadore MAGNETRON 50%	22 semanas
ESTRUCTURAS	Estructura metalica Miraflores 50%	8 semanas
	Estructura metalica Taraira 50%	8 semanas
	Estructura metalica Cachicamo 50%	6 semanas
TABLEROS	TABLEROS Miraflores	13 semanas
	TABLEROS Taraira	13 semanas
	TABLEROS Cachicamo	13 semanas
MENORES	Materiales electricos	
INVERSORES HUAWEI	Inversores Miraflores - HUAWEI	12 semanas
	Inversores Taraira - HUAWEI	12 semanas
	Inversores Cachicamo - SCHNEIDER	8 semanas

Figura 3. Tiempos de suministro componentes de los proyectos

¹ Cláusula cuarta contrato No. 139 de 2022, imagen extraída del contrato.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Teniendo ese panorama de fechas, el pasado 18 de abril de 2022 en comité de obra, se le notificó a INTERVENTORÍA y CONTRATANTE, la propuesta de tiempos mínimos de fabricación y despacho de los distintos proveedores, con el fin de dar paso a una solicitud de prórroga en el contrato, según la posibilidad manifiesta en la misma cláusula cuarta, referente a: *“No obstante, las partes podrán convenir ampliar el tiempo, previa solicitud debidamente argumentada sin que eso afecte adición en valor superior al autorizado legalmente, su aprobación se dará por parte del INTERVENTOR con visto bueno del SUPERVISOR, la cual deberá ser solicitada con al menos diez (10) días hábiles de anticipación a su vencimiento...”*

El día 30 de abril de 2022 se obtuvo respuesta por parte de la Interventoría del proyecto mediante oficio CIS-ADM001-021 (Anexo 2) del envío de la solicitud de prórroga a la Supervisión de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. De lo anterior se espera pronta respuesta para la modificación de los cronogramas de cada uno de los proyectos y las respectivas modificaciones de las pólizas.

3.2 COMPONENTE TÉCNICO

3.2.1 Homologación de Especificaciones técnicas

El día 01 de abril de 2022, mediante acompañamiento por parte de la Interventoría Consorcio Intersolar 2022 se verificaron los diseños de estructuración, y las memorias de cálculo asociadas de los proyectos de Miraflores, Taraira y Puerto Cachicamo.

3.2.1.1 Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Miraflores

Mediante el Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas del proyecto Miraflores (Figura 4, y Figura 5), ver Anexo 3 Formato de aprobación de especificaciones Miraflores. Se realizó la homologación y aprobación por parte de la Interventoría de los equipos presentados, obteniendo algunas mejoras en potencia de inversores de inyección directa, potencia de paneles solares y capacidad de acumulación del clúster de baterías y grupos electrógenos.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

 El futuro es de todos		 Minenergía		VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°:		143 DE 2021			
OBJETO:		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDOS, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		137 DE 2022			
OBJETO:		CONSULTORÍA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS"		CONSORCIO INTERSOLAR 2022	
CONTRATO DE OBRA N°:		139 DE 2022			
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS		CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE	
PROYECTO MIRAFLORES - GUAVIARE					
ITEM	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS MÍNIMAS	REQUERIDAS PROYECTO APROBADO POR EL IPSE	RECOMENDADAS EN CONTRATO	OFERTADO	OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE
MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO					
1.1	FABRICANTE	-	-	LONGI	CUMPLE
1.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
1.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	-	-	LRS-72HPH-540M	CUMPLE
1.4	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA (W)	530	530	540	CUMPLE, mejora especificación por mayor potencia
1.5	EFICIENCIA	220,5%	-	21,1%	CUMPLE, mejora especificación por mayor eficiencia.
1.6	TOLERANCIA POSITIVA	3%	3%	0,93%	CUMPLE
1.7	NÚMERO DE CELDAS	144 media célula	144 media célula	144 media célula	CUMPLE
1.8	TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE LAS CELDAS	monocristalino perc	monocristalino perc	Monocristalino perc-media célula	CUMPLE
1.9	CAJA DE CONEXIONES EQUIPADA CON CABLES MC4, CON PROTECCIÓN IP65	IP 68	IP 68	IP 68	CUMPLE
1.10	PORTE DELANTERA CRISTAL TEMPLADO CON BAJO CONTENIDO EN HIERRO, BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	CUMPLE
1.11	DIODOS BYPASS	3	3	3	CUMPLE
1.12	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSION Voc	≥-0,27%/°C	≥-0,27%/°C	-0,27%/°C	CUMPLE
1.13	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE Isc	0,05%/°C	0,05%/°C	0,048%/°C	CUMPLE
1.14	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P	≥-0,35%	≥-0,35%	-0,35%/°C	CUMPLE
1.15	TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	CUMPLE
1.16	GARANTÍA DE 10 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 90%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 12 años de garantía y 91,2% año 10. mejora la especificación.
1.17	GARANTÍA DE 20 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 90%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 25 años de garantía y 87,7% año 20. mejora la especificación por atenuación de 0,55% /año.
1.18	GARANTÍA DE PRODUCTO DE MÍNIMO 10 AÑOS	Mínimo de 10 años	Mínimo de 10 años	12 AÑOS	CUMPLE, 12 años de garantía.
1.19	CERTIFICACIONES	IEC 61215	IEC 61215	IEC 61215	CUMPLE
		IEC 61730	IEC 61730	IEC 61730	CUMPLE
		-	-	UL1703	CUMPLE
1.20	CERTIFICACIÓN RETIE EN COLOMBIA	-	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	CUMPLE - Vigente hasta 6 de abril de 2024
1.21	DOCUMENTOS ANEXOS				Certificados IEC/UL Certificado RETIE Certificado de garantía Ficha técnica

Figura 4. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Miraflores

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL			CÓDIGO: FR-DC-016
				VERSIÓN: 1
				FECHA: 26/08/2020

2	INVERSOR				
2.1	FABRICANTE	-	-	HUAWEI	CUMPLE
2.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
2.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	-	-	SUN2000-215KTL-H0	CUMPLE
2.4	POTENCIA NOMINAL MINIMA (kW)	175	175	200	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requiere.
2.5	TENSION DEL LADO DC	500 V	500 V	1080 V	CUMPLE, mejora especificación.
2.6	TENSION DE SALIDA AC	800 V	800 V	800 V, 3F + T	CUMPLE
2.7	DISTORSION ARMONICA	≤5%	3% THD	<1% THD	CUMPLE, mejora especificación.
2.8	PROTECCIONES	- Protección anti isla - Sobrecorriente de AC externa - Protección de polaridad inversa DC	- Protección anti isla - Sobrecorriente de AC externa - Protección de polaridad inversa DC	- Desconexión a la entrada - Sobre carga - Polaridad inversa - Monitoreo de falla de strings - Descargador de sobretensiones - Detección resistencia de aislamiento DC - Monitoreo de corriente residual - protección anti-isla - Sobrecorriente AC	CUMPLE, cuenta con protecciones adicionales.
2.9	FRECUENCIA DE SALIDA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
2.1	CLASE PROTECTORA	≥ IP64	≥ IP64	IP65	CUMPLE, mejora la especificación
2.11	EFICIENCIA MINIMA	≥90%	≥90%	≥98.6%	CUMPLE, mejora la especificación
2.12	CERTIFICACIONES	UL1741 IEEE1547, IEEE1547.1, CSA-C22.2 No. 107.1-01, UL1998, UL 1699B, FCC 47 CFR Part 15B Class	CE	Certificación UL 1741 equivalente a la IEC 61727 y a la IEC 62109 alineados con el estándar IEEE 1547.	Certificación UL 1741 equivalente a la IEC 61727 y a la IEC 62109 alineados con el estándar IEEE 1547.
2.13	GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	
	DOCUMENTOS ANEXOS				Ficha tecnica Certificaciones de calidad Certificación de garantía

3	BATERÍAS				
3.1	FABRICANTE	-	-	DHYBRID	CUMPLE
3.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
3.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	Bateria de ion - Lito	Bateria de ion - Lito	Bateria de ion - Lito	CUMPLE
3.4	CAPACIDAD NOMINAL DE ALMACENAMIENTO kWh	201.6kWh x 4 = 806,4 kWh	201.6kWh x 4 = 806,4 kWh	876 kWh	CUMPLE, mejora autonomia
3.7	TIPO DE BATERIA	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	CUMPLE
3.8	APTA PARA SISTEMAS SOLARES	Si	Si	Si	CUMPLE
3.9	TENSION NOMINAL DC DEL SISTEMA	28 x 24 V = 672 V	28 x 24 V = 672 V	10 x 87.6 V = 876 V	CUMPLE
	TENSION NOMINAL DC DE BATERIA	24 V	24 V	10 x 87.6 V	CUMPLE
3.11	SELLADAS Y LIBRE DE MANTENIMIENTO	-	-	Si	CUMPLE
3.15	GARANTIA MINIMA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	2 años	2 años	36 meses	CUMPLE, mejora garantía
1.21	DOCUMENTOS ANEXOS				Ficha tecnica Certificaciones de calidad Certificación de garantía

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS					
4	GENERADORES				
4.1	FABRICANTE	-	-	CUMMINS	CUMPLE
4.2	PAIS	-	-	USA	CUMPLE
4.3	MODELO	-	-	C400D6	CUMPLE
4.4	POTENCIA NOMINAL	437 kVA	437 kVA	450 Kva	CUMPLE
4.5	POTENCIA EFECTIVA (CONTINUO)	350 kW	350 kW	350 kVA	CUMPLE
4.7	TENSION AC (L-L)	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	CUMPLE
4.8	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
4.9	FACTOR DE POTENCIA			0.8 para potencia continua	CUMPLE
5.1	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	CUMPLE
5.2	BATERIA	Si	Si	Si	CUMPLE
5.3	CARGADOR DE BATERIA	Si	Si	Si	CUMPLE
5.4	CABINA INZONORIZADA	Si	Si	Si	CUMPLE
5.5	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS	Si	Si	Si	CUMPLE
	GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	-	-	1 Año	CUMPLE
5.7	CERTIFICACIÓN	-	-	ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271, BS 5514.	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS					

Figura 5. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Miraflores

	CÓDIGO: FR-DC-016	
	INFORME MENSUAL	
	FECHA: 26/08/2020	

3.2.1.2 Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Taraira

Se anexa el formato del proyecto de Taraira ver Anexo 4. Formato aprobación de especificaciones Taraira (Figura 6, Figura 7, y Figura 8). Se realizó la homologación y aprobación por parte de la Interventoría de los equipos presentados, obteniendo algunas mejoras en potencia de inversores de inyección directa, potencia de paneles solares y capacidad de acumulación del clúster de baterías y grupos electrógenos.

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°:		140 DE 2021			
OBJETO:		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISPV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDOS, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE Y VAUPÉS.			ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		137 DE 2022			
OBJETO:		CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS.			CONSORCIO INTERSOLAR 2022
CONTRATO DE OBRA N°:		139 DE 2022			
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS.			CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE
PROYECTO TARAIRA - VAUPÉS					
ITEM	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS MÍNIMAS	REQUERIDAS PROYECTO APROBADO POR EL IPSE	RECOMENDADAS EN CONTRATO	OFERTADO	OBSERVACIONES
1					
MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO					
1.1	FABRICANTE	-	-	JINKO	CUMPLE
1.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
1.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	-	-	JKM40M-60HL4	CUMPLE
1.4	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA (W)	460	460	460	CUMPLE
1.5	EFICIENCIA	≥20.49%	-	21.32%	CUMPLE, mejora especificación por mayor eficiencia.
1.6	TOLERANCIA POSITIVA	3%	3%	3%	CUMPLE
1.7	NUMERO DE CELDAS	-	-	120 media celda	CUMPLE
1.8	TECNOLOGIA DE FABRICACIÓN DE LAS CELDAS	monocristalino perc	monocristalino perc	Monocristalino-media celda	CUMPLE
1.9	CAJA DE CONEXIONES EQUIPADA CON CABLES MCA CON PROTECCIÓN IP65	IP 68	IP 68	IP 68	CUMPLE
1.10	PARTE DELANTERA CRISTAL TEMPLADO CON BAJO CONTENIDO EN HIERRO, BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	CUMPLE
1.11	DIODOS BYPASS	3	3	3	CUMPLE
1.12	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSION Voc	≥-0.28%/°C	≥-0.28%/°C	-0.28%/°C	CUMPLE
1.13	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE Isc	0.048%/°C	0.048%/°C	0.048%/°C	CUMPLE
1.14	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P	≥-0.35%	≥-0.35%	-0.35%/°C	CUMPLE
1.15	TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	CUMPLE
1.16	GARANTIA DE 10 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 90%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 12 años de garantía.
1.17	GARANTIA DE 20 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 80%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 25 años de garantía y 87.7% año 20, mejora la especificación por atenuación de 0.55% año.
1.18	GARANTIA DE PRODUCTO DE MÍNIMO 10 AÑOS	Mínimo de 10 años	Mínimo de 10 años	12 AÑOS	CUMPLE, 12 años de garantía.
1.19	CERTIFICACIONES	IEC 61215 IEC 61730	IEC 61215 IEC 61730	IEC 61215 IEC 61730	CUMPLE CUMPLE
1.20	CERTIFICACIÓN RETIE EN COLOMBIA	-	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	CUMPLE - Vigente hasta 6 de abril de 2024
1.21	DOCUMENTOS ANEXOS	-	-	-	Certificados IECUL Certificado RETIE Certificado de garantía Ficha técnica
2					
INVERSOR					
2.1	FABRICANTE	-	-	HUAWEI	CUMPLE
2.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
2.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	-	-	SUN2000-215KTL-H0	CUMPLE
2.4	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA (kW)	175	175	200	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requieren.
2.5	TENSION DEL LADO DC	500 V	500 V	1080 V	CUMPLE, mejora especificación.
2.6	TENSION DE SALIDA AC	800 V	800 V	800 V, 3F + T	CUMPLE
2.7	DISTORSION ARMONICA	≤5%	3% THD	<1% THD	CUMPLE, mejora especificación.
2.8	PROTECCIONES	- Protección anti isla - Sobrecorriente de AC externa - Protección de potencia inversa DC	- Protección anti isla - Sobrecorriente de AC externa Protección de potencia inversa DC	- Desconexión a la entrada - Sobre carga - Polaridad inversa - Monitoreo de falla de strings - Descargador de sobretensiones - Detección resistencia de aislamiento DC - Monitoreo de corriente residual proteccion anti-Isa - Sobrecorriente AC	CUMPLE, cuenta con protecciones adicionales.
2.9	FRECUENCIA DE SALIDA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
2.10	CLASE PROTECTORA	≥ IP64	≥ IP64	IP66	CUMPLE, mejora la especificación
2.11	EFICIENCIA MÍNIMA	≥96%	≥95%	≥96.8%	CUMPLE, mejora la especificación
2.12	CERTIFICACIONES	CE	CE	EN50549	Certificación UL 1741 equivalente a la IEC 61727 y a
2.13	GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	Ficha técnica

Figura 6. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Taraira

 El futuro es de todos		Minenergía		VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	
3					
BATERÍAS					
3.1	FABRICANTE	-	-	DHYBRID	CUMPLE
3.2	PAIS	-	-	CHINA	CUMPLE
3.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	Batería de Ion - Lítio	Batería de Ion - Lítio	Batería de Ion - Lítio	CUMPLE
3.4	CAPACIDAD NOMINAL DE ALMACENAMIENTO	201.6 kWh	201.6 kWh	268 kWh	CUMPLE, mejora autonomía
3.5	TIPO DE BATERÍA	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	CUMPLE
3.6	APTA PARA SISTEMAS SOLARES	SI	SI	SI	CUMPLE
3.7	TENSIÓN NOMINAL DC DEL SISTEMA	28 x 24 V = 672 V	28 x 24 V = 672 V	10 x 87.6 V = 876 V	CUMPLE
3.8	TENSION NOMINAL DC DE BATERIA	24 V	24 V	10 x 8.76 V	CUMPLE
3.9	SELLADAS Y LIBRE DE MANTENIMIENTO	-	-	SI	CUMPLE
3.10	GARANTÍA MÍNIMA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	2 años	2 años	36 meses	CUMPLE, mejora garantía
3.11	DOCUMENTOS ANEXOS				Ficha técnica Certificaciones de calidad Certificación de garantía
4.1					
GENERADOR 1					
4.1.1	FABRICANTE	-	-	CUMMINS	CUMPLE
4.1.2	PAIS	-	-	USA	CUMPLE
4.1.3	MODELO	-	-	C300 D6	CUMPLE
4.1.4	POTENCIA STANDBY	225 kW	225 kW	300 kW	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requiere.
4.1.5	POTENCIA PRIME	-	-	275 kW	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requiere.
4.1.6	TENSION AC (L-L)	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	CUMPLE
4.1.7	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
4.1.8	FACTOR DE POTENCIA			0.8	CUMPLE
4.1.9	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	CUMPLE
4.1.10	BATERIA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.1.11	CARGADOR DE BATERIA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.1.12	CABINA INZONORIZADA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.1.13	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS	SI	SI	SI	CUMPLE
4.1.14	GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	-	-	1 Año	CUMPLE
4.1.15	CERTIFICACIÓN	-	-	ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271, BS 5514.	CUMPLE
4.2					
GENERADOR 2					
4.2.1	FABRICANTE	-	-	CUMMINS	CUMPLE
4.2.2	PAIS	-	-	USA	CUMPLE
4.2.3	MODELO	-	-	C175 D6	CUMPLE
4.2.4	POTENCIA NOMINAL	125 kW	125 kW	175 kW	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requiere.
4.2.5	POTENCIA PRIME	-	-	160 kW	CUMPLE, se entrega mas potencia para ampliaciones futuras, si se requiere.
4.2.6	TENSION AC (L-L)	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	440 V - 3F+T	CUMPLE
4.2.7	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
4.2.8	FACTOR DE POTENCIA			0.8	CUMPLE
4.2.9	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	CUMPLE
4.2.10	BATERIA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.2.11	CARGADOR DE BATERIA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.2.12	CABINA INZONORIZADA	SI	SI	SI	CUMPLE
4.2.13	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS	SI	SI	SI	CUMPLE
4.2.14	GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	-	-	1 Año	CUMPLE
4.2.15	CERTIFICACIÓN	-	-	ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271, BS 5514.	CUMPLE
5					
TRANSFORMADORES					
5.1					
TRANSFORMADOR - TR2					
5.1.1	FABRICANTE	-	-	MAGNETRON	CUMPLE
5.1.2	PAIS	-	-	COLOMBIA	CUMPLE
5.1.3	POTENCIA	225 kVA	225 kVA	225 kVA	CUMPLE
5.1.4	TIPO	SECO	SECO	SECO	CUMPLE
5.1.5	NORMA DE FABRICACIÓN	-	-	NTC	CUMPLE
5.1.6	GRUPO DE CONEXIÓN	Dyn5	Dyn5	Dyn5	CUMPLE
5.1.7	NÚMERO DE FASES	3	3	3	CUMPLE
5.1.8	TENSION PRIMARIA	800 V	800 V	800 V	CUMPLE
5.1.9	CONEXION DEL PRIMARIO	ESTRELLA	ESTRELLA	DELTA	CUMPLE
5.1.10	TENSION SECUNDARIA	440 V	440 V	440 V	CUMPLE
5.1.11	CONEXION DEL SECUNDARIO	ESTRELLA	ESTRELLA	ESTRELLA	CUMPLE
5.1.12	CAMBIADOR DE DERIVACIONES	-	-	NO APLICA	CUMPLE
5.1.13	CLASE	H	H	H	CUMPLE
5.1.14	TIPO DE REFRIGERACIÓN	AN	AN	AN	CUMPLE
5.1.15	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
5.1.16	CERTIFICACIÓN	SI	SI	SI	CUMPLE
5.2					
TRANSFORMADOR - TR3					
5.2.1	FABRICANTE	-	-	MAGNETRON	CUMPLE
5.2.2	PAIS	-	-	COLOMBIA	CUMPLE
5.2.3	POTENCIA	350 kVA	350 kVA	350 kVA	CUMPLE
5.2.4	TIPO	SECO	SECO	SECO	CUMPLE
5.2.5	NORMA DE FABRICACIÓN	-	-	NTC	CUMPLE
5.2.6	GRUPO DE CONEXIÓN	Ynyn0	Ynyn0	Dzn0	Recomendación proveedor de sistema de control
5.2.7	NÚMERO DE FASES	3	3	3	CUMPLE
5.2.8	TENSION PRIMARIA	440 V	440 V	440 V	CUMPLE
5.2.9	CONEXION DEL PRIMARIO	ESTRELLA	ESTRELLA	ESTRELLA	CUMPLE
5.2.10	TENSION SECUNDARIA	480 V	480 V	480 V	CUMPLE
5.2.11	CONEXION DEL SECUNDARIO	ESTRELLA	ESTRELLA	ESTRELLA	CUMPLE
5.2.12	CAMBIADOR DE DERIVACIONES	-	-	NO APLICA	CUMPLE
5.2.13	CLASE	H	H	H	CUMPLE
5.2.14	TIPO DE REFRIGERACIÓN	AN	AN	AN	CUMPLE
5.2.15	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	CUMPLE
5.2.16	CERTIFICACIÓN	SI	SI	SI	CUMPLE

Figura 7. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Taraira

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

  VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS					
6	TABLEROS				
6.1	FABRICANTE	-	-	CELCO	CUMPLE
6.2	PAIS	-	-	COLOMBIA	CUMPLE
6.3	MATERIAL	COLD ROLLED	Lámina galvanizada Cold Rolled con acabado en pintura electrostática, con tratamiento de anticorrosivo para resistencia a trópico (si es metálico)	Lámina galvanizada RAL 7032. Acabado en pintura electrostática con tratamiento de anticorrosivo para resistencia a trópico	CUMPLE
6.4	CALIBRE	16"	16"	16"	CUMPLE
6.5	TIPO	-	AUTO-SOPORTADO	AUTO-SOPORTADO	CUMPLE
6.6	GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	Nema 1. Incluye malla anti insecto en ranuras de ventilación. IP20 según Norma NTC 3279 (IED 60529)	NEMA 12	CUMPLE
6.7	CERTIFICACIÓN	-	- Para alojar equipos de control y protección en baja tensión, elementos eléctricos, electrónicos y baterías. - A prueba de ingreso de insectos y animales. - A prueba de corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las baterías. - A prueba de explosiones.	Certificación RETIE Tableros de baja tensión	CUMPLE
6.8	ÁNGULO APERTURA DE PUERTAS (LATERALMENTE)	-	> 120°	> 120°	CUMPLE
7	ESTRUCTURA METALICA				
7.1	FABRICANTE	-	-	OUTDOORS	CUMPLE
7.2	PAIS	-	-	COLOMBIA	CUMPLE
7.3	MATERIAL	ACERO	ACERO	ACERO	CUMPLE
7.4	LONGITUD APROXIMADA POR MESA	31 mt	31 mt	31 mt	CUMPLE
7.5	PARTES METÁLICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN	GALVANIZADO	GALVANIZADO	GALVANIZADO EN CALIENTE	CUMPLE
7.6	ANCLAJE	-	-	PERNADO EN SITIO	CUMPLE
7.7	COLUMNAS	-	-	PERLIN C 100x50x2.5 mm	CUMPLE
7.8	CORREAS LONGITUDINALES	-	-	PERLIN C 100x50x2.5 mm	CUMPLE
7.9	CORREAS TRANSVERSALES	-	-	PERLIN C 150x50x2.5 mm	CUMPLE
7.10	TORNILLERÍA	-	-	1/2"x1" EN ACERO GALV. EN CALIENTE	CUMPLE
7.11	CERTIFICACIÓN	-	-	-	CUMPLE

Figura 8. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Taraira

3.2.1.3 Homologación de Especificaciones técnicas proyecto Puerto Cachicamo

Se anexa el formato del proyecto de Puerto Cachicamo ver Anexo 5. Formato aprobación de especificaciones Cachicamo (Figura 9). Se realizó la homologación y aprobación por parte de la Interventoría de los equipos presentados, obteniendo algunas mejoras en potencia de paneles solares.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL		CÓDIGO: FR-DC-016
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 26/08/2020



El futuro
es de todos

Ministerio de Energía

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°:		143 DE 2021			
OBJETO:		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISPV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDOS, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.			ENERGUGUAVIARE S.A. E.S.P.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		137 DE 2022			
OBJETO:		CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS.			CONSORCIO INTERSOLAR 2022
CONTRATO DE OBRA N°:		139 DE 2022			
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS.			CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE
PROYECTO PUERTO CACHICAMO - GUAVIARE					
ITEM	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS MÍNIMAS	REQUERIDAS PROYECTO APROBADO POR EL IPSE	RECOMENDADAS EN CONTRATO	OFERTADO	OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE
1					
MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO					
1.1	FABRICANTE	-	-	LONGI	CUMPLE
1.2	PAÍS	-	-	CHINA	CUMPLE
1.3	TIPO - MODELO - REFERENCIA	-	-	LRS-54HPH-410M	CUMPLE
1.4	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA (W)	405	405	410	CUMPLE, mejora especificación por mayor potencia
1.5	EFICIENCIA	20%	-	21%	CUMPLE, mejora especificación por mayor eficiencia.
1.7	TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE LAS CELDAS	monocristalino	monocristalino	Monocristalino pero-media celda	CUMPLE
1.8	CAJA DE CONEXIONES EQUIPADA CON CABLES MCA, CON PROTECCIÓN IP68	-	-	IP 68	CUMPLE
1.9	PORTE DELANTERA CRISTAL TEMPLADO CON SAJO CONTENIDO EN HIERRO, BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO	-	-	BASTIDOR EN ALUMINIO ANODIZADO	CUMPLE
1.10	GRUPOS BYPASS	-	-	3	CUMPLE
1.11	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSION V_{oc}	-	-	-0.265%/°C	CUMPLE
1.12	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE I_{sc}	-	-	0.950%/°C	CUMPLE
1.13	COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P	-	-	-0.34%/°C	CUMPLE
1.14	TEMPERATURA DE TRABAJO	-	-	-40°C a +85°C	CUMPLE
1.15	GARANTÍA DE 10 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 90%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 12 años de garantía y 91,2% año 10. mejora la especificación.
1.16	GARANTÍA DE 20 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AL 80%	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	Evidenciable en la ficha técnica	CUMPLE 25 años de garantía y 87,7% año 20. mejora la especificación por atenuación de 0,55% /año.
1.17	GARANTÍA DE PRODUCTO DE MÍNIMO 10 AÑOS	Mínimo de 10 años	Mínimo de 10 años	12 AÑOS	CUMPLE, 12 años de garantía.
1.18	CERTIFICACIONES	IEC 61215	IEC 61215	IEC 61215	CUMPLE
		IEC 61730	IEC 61730	IEC 61730	CUMPLE
1.19	CERTIFICACIÓN RETIE EN COLOMBIA	-	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC	CUMPLE
		-	-	UL1730	CUMPLE
1.2	DOCUMENTOS ANEXOS				Certificados IEC/UL Certificado RETIE Certificado de garantía Ficha técnica
2					
ESTRUCTURA METÁLICA					
2.1	FABRICANTE	-	-	OUTDOORS	
2.2	PAÍS	-	-	COLOMBIA	
2.3	MATERIAL	ACERO	ACERO	ACERO	
2.4	LONGITUD APROXIMADA POR MESA	-	-	-	
2.5	PARTES METÁLICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN	GALVANIZADO	GALVANIZADO	GALVANIZADO EN CALIENTE	
2.6	ANCLAJE	-	-	PERNADO EN SITIO	
2.7	COLUMNAS	-	-	PERLIN C 100x50x2,5 mm	
2.8	CORREAS LONGITUDINALES	-	-	PERLIN C 100x50x2,5 mm	
2.9	CORREAS TRANSVERSALES	-	-	PERLIN C 100x50x2,5 mm	
2.10	TORNILLERÍA	-	-	1/2"x1" EN ACERO GALV. EN CALIENTE	
2.11	CERTIFICACIÓN	-	-	-	

Figura 9. Formato de verificación de especificaciones técnicas mínimas requeridas proyecto Puerto Cachicamo

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.2.2 Informe de replanteo Proyecto Taraira

El día 20 de abril 2022 fue remitido por correo electrónico a la Interventoría Consorcio Intersolar 2022, el informe de Replanteo del proyecto híbrido del municipio de Taraira, en este se describieron las consideraciones iniciales de Diseño y aspectos contractuales, el objetivo de este era contextualizar el proyecto con respecto a su ubicación, y la capacidad diseñada del proyecto. Se presentó la evidencia de trabajo en campo del grupo de replanteo, en este capítulo se detallaron las inspecciones técnicas realizadas, tanto civiles como eléctricas, los estudios de suelos y las reuniones realizadas con los Entes Territoriales.

Los Resultados del informe incluyeron los levantamientos arquitectónicos de las casetas de máquinas, las distribuciones del campo solar, las dimensiones de los tableros eléctricos a instalar, el diagrama unifilar final, la selección de los equipos producto del replanteo, los resultados de los estudios de suelos y las estructuras metálicas para soportar los paneles solares.

Se realizó el comparativo de costos generales del presupuesto, donde se analizó el costo inicial vs el costo estimado de replanteo, con el fin de evidenciar si el costo presupuestado era suficiente para ejecutar las labores contratadas, el presupuesto es suficiente para las labores contratadas.

El 21 de abril de 2022 mediante oficio de Interventoría CIS-ADM001-013 realizaron observaciones al informe presentado, y el día 26 de abril se respondió dicha solicitud con documento “1. Informe de Replanteo Contrato 139 de 2022 - Taraira - Vr2” donde se realizaron las modificaciones respectivas solicitadas. El día 30 de abril de 2022 mediante oficio CIS-ADM001-023 la interventoría aprueba el informe de replanteo final presentado en la fecha del 26 de abril de 2022.

3.2.3 Informe de replanteo Proyecto Miraflores

El día 20 de abril 2022 fue remitido por correo electrónico a la Interventoría Consorcio Intersolar 2022, el informe de Replanteo del proyecto híbrido del municipio de Miraflores, en este se describen:

- Consideraciones iniciales de Diseño y aspectos contractuales.
- Se presentó la evidencia del trabajo de campo, donde se incluyen las Actas de reuniones con los Entes Territoriales, y registros fotográficos.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

- Se construyeron los planos de la caseta de máquinas, plano de planta del campo solar, planos de las estructuras para los módulos solares, plano de distribución de paneles solares, se llevó a cabo el estudio Geotécnico.
- Se realizó el comparativo de costos generales del presupuesto, donde se analizó el costo inicial vs el costo estimado de replanteo, con el fin de evidenciar si el costo presupuestado era suficiente para ejecutar las labores contratadas, el presupuesto es suficiente para las labores contratadas.

El día 30 de abril de 2022 mediante oficio CIS-ADM001-023 la interventoría aprueba el informe de replanteo presentado.

3.2.4 Informe de replanteo Proyecto Puerto Cachicamo

El día 28 de abril 2022 fue remitido por correo electrónico a la Interventoría Consorcio Intersolar 2022, el informe de Replanteo del proyecto híbrido del corregimiento de Puerto Cachicamo, en este se describen:

- Consideraciones iniciales de Diseño y aspectos contractuales.
- Se presentó la evidencia del trabajo de campo, donde se incluyen las Actas de reuniones con los Entes Territoriales, y registros fotográficos.
- Se construyeron los planos de la caseta de máquinas, plano de planta del campo solar, plano unifilar, plano general de media tensión y baja tensión, y estudio Geotécnico.
- Se realizó el comparativo de costos generales del presupuesto, donde se analizó el costo inicial vs el costo estimado de replanteo, con el fin de evidenciar si el costo presupuestado era suficiente para ejecutar las labores contratadas.
- Se hará redistribución de los recursos presupuestales destinados a la solución del proyecto híbrido de Puerto Cachicamo, a fin de incrementar la potencia de salida para cubrir la mayor demanda que pasó de 99 usuarios a 130 usuarios, luego de este estudio de replanteo, el presupuesto es suficiente para las labores contratadas.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

El día 30 de abril de 2022 mediante oficio CIS-ADM001-023 la interventoría aprueba el informe de replanteo presentado.

3.2.5 AVANCE DE OBRA CIVIL

Se adelantó durante el mes de abril la ingeniería de detalle de las estructuras metálicas de soporte de los paneles solares. A continuación, se presentan los diseños realizados.

3.2.5.1 Diseño de Estructura metálica proyecto Miraflores.

En la Figura 10 y Figura 11 se presentan las estructuras metálicas a utilizar en la etapa de instalación del proyecto, las cuales serán las encargadas de soportar los paneles solares, la estructura presentada en la Figura 10 permitirá instalar 54 paneles solares sobre ella, mientras que la estructura presentada en la Figura 11 permitirá instalar 28 paneles solares sobre ella.

Para ejecutar el alcance contractual del proyecto se van a instalar en total 24 unidades de estructuras metálicas de 54 paneles, y se instalará una unidad de estructura metálica de 28 paneles.

A continuación, se muestran los diseños detallados de las estructuras:

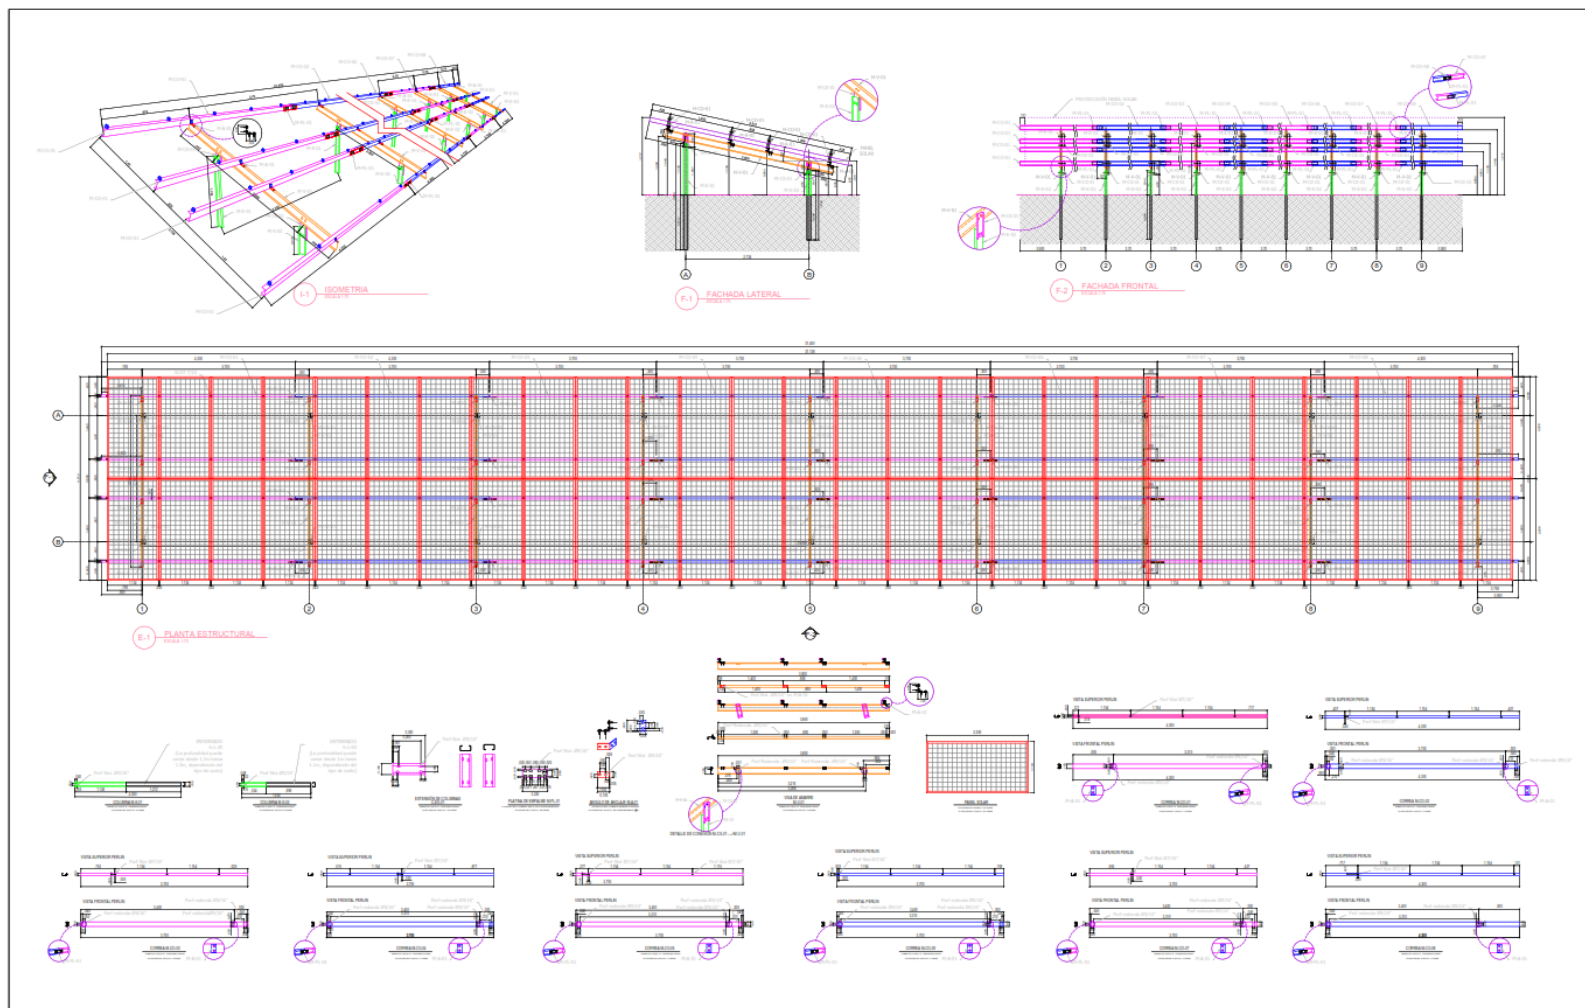


Figura 10. Diseño detallado estructura metálica para 54 paneles proyecto Miraflores

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.2.5.2 Diseño de Estructura metálica proyecto Taraira.

En la Figura 12 y Figura 13 se presentan las estructuras metálicas a utilizar en la etapa de instalación del proyecto, las cuales serán las encargadas de soportar los paneles solares, la estructura presentada en la Figura 12 permitirá instalar 52 paneles solares sobre ella, mientras que la estructura presentada en la Figura 13 permitirá instalar 14 paneles solares sobre ella.

Para ejecutar el alcance contractual del proyecto se van a instalar en total 8 unidades de estructuras metálicas de 52 paneles, y se instalarán dos unidades de estructuras metálicas de 14 paneles.

A continuación, se muestran los diseños detallados de las estructuras:

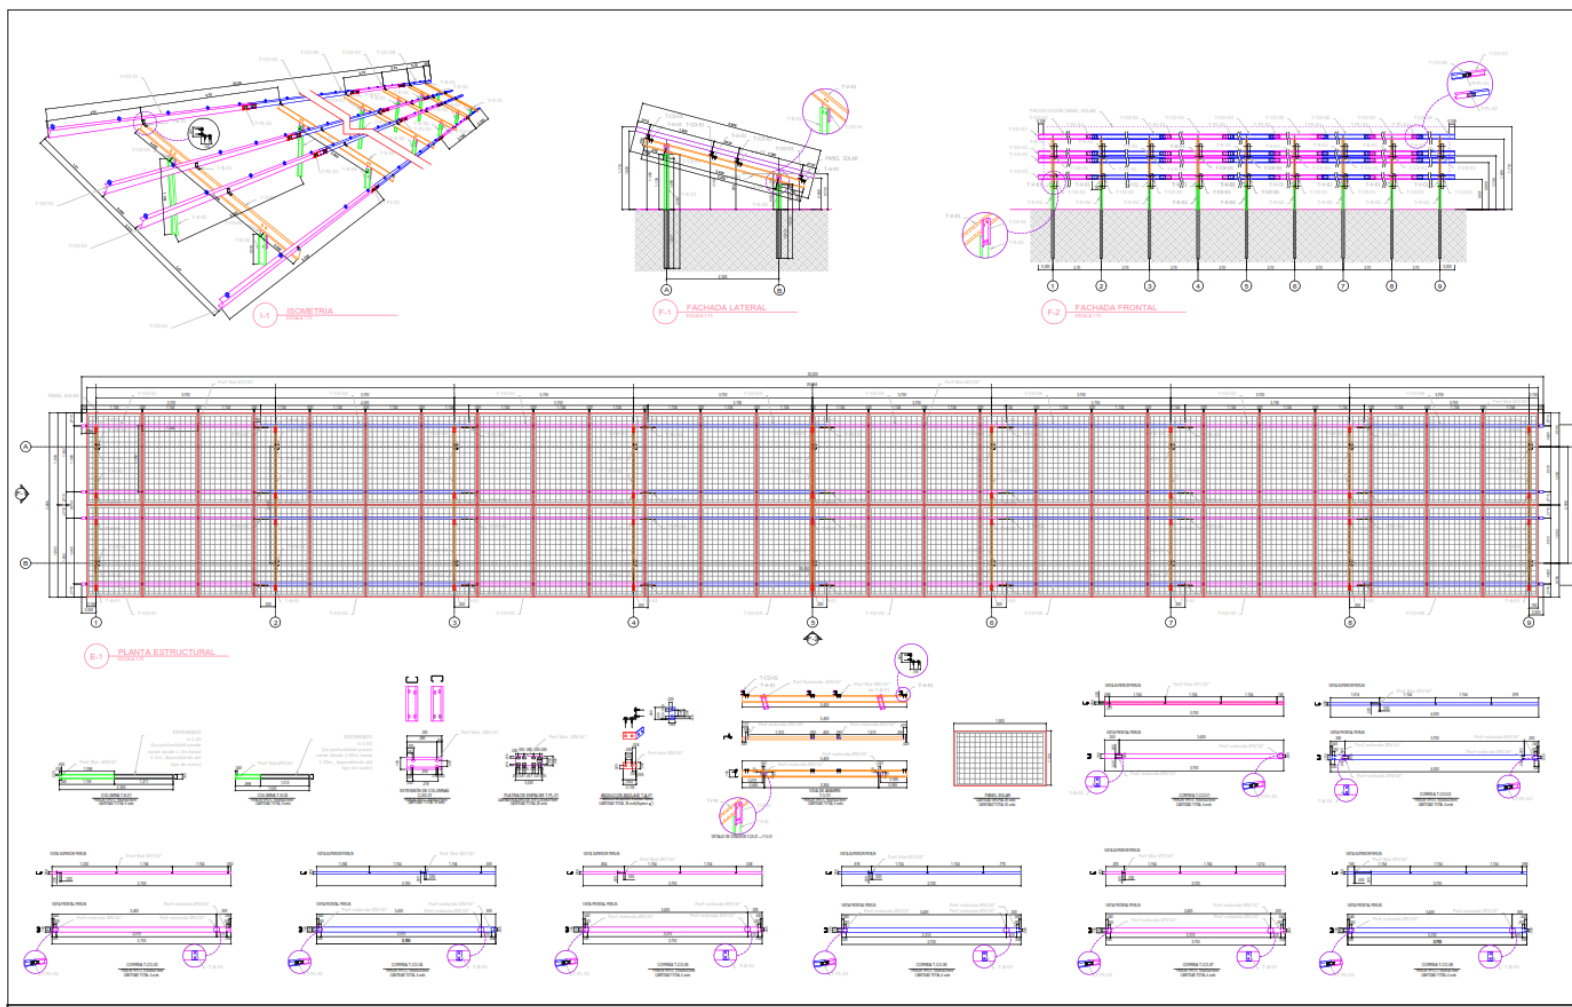


Figura 12. Diseño detallado estructura metálica para 52 paneles proyecto Taraira

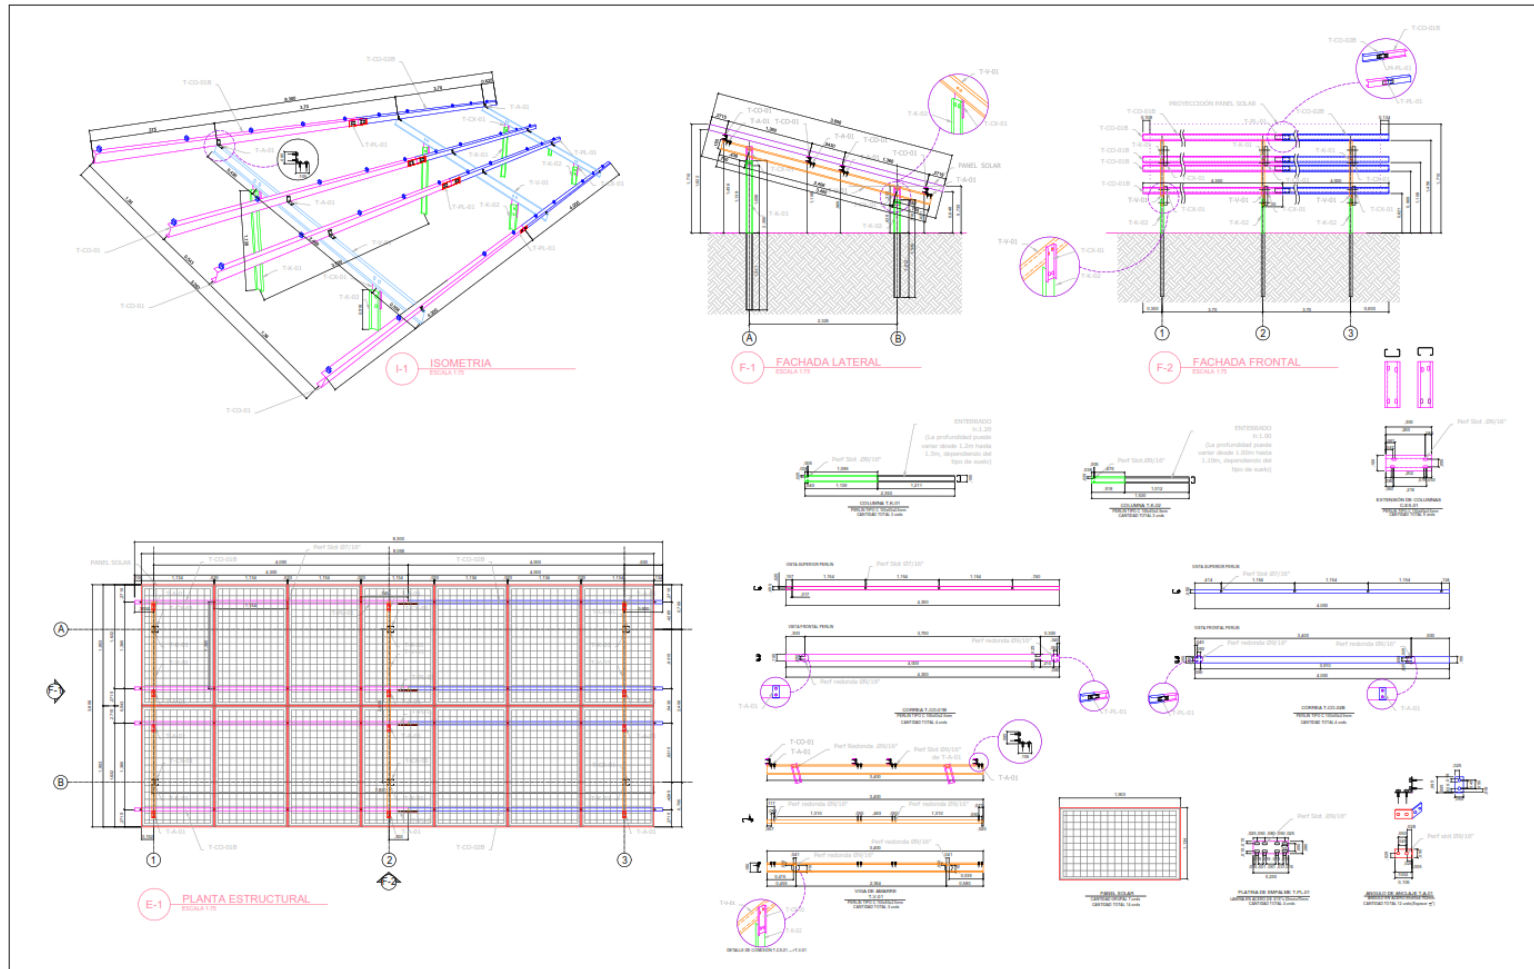


Figura 13. Diseño detallado estructura metálica para 14 paneles proyecto Taraira

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.2.6 Seguimiento de cronogramas

MIRAFLORES						
Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Responsable
1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDO MIRAFLORES	135 días	lun 21/02/22	vie 19/08/22	7%	C. Guaviare
2	Gerencia de Proyecto	135 días	lun 21/02/22	vie 19/08/22	68%	C. Guaviare
3	Inicio	7 días	lun 21/02/22	mar 22/02/22	100%	C. Guaviare
4	H: Firma de acta de inicio	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	
5	Elaboracion de acta de constitución	1 día	mar 22/02/22	mar 22/02/22	100%	
6	Planificación	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
7	Planificación de gestion del proyecto	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
8	Ajuste de cronograma	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
9	Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
10	Plan general de trabajo	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
11	E: plan general de trabajo	0 días	jue 24/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
12	Validación de metodología de Interventoria	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	Interventoria
13	H: Diseño, Validación y Aprobación Valla informativa del proyecto	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	Interventoria
14	Elaboración de valla informativa del proyecto	8 días	mar 22/03/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
15	Elaboración de formatos del proyecto	5 días	mar 22/03/22	lun 28/03/22	100%	C. Guaviare
16	H: Aprobación de Formatos del proyecto	0 días	lun 28/03/22	lun 28/03/22	100%	Interventoria
17	Monitoreo y control	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	C. Guaviare
18	Comité de avance de proyecto	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	NERGUAVIARI
31	Cierre	8 días	mié 10/08/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
36	Ingeniería de detalle	15 días	vie 25/02/22	jue 17/03/22	87%	C. Guaviare
37	Validar Fichas Técnicas	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	100%	C. Guaviare
38	Validación diseño de Gabinete	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	100%	C. Guaviare
39	Validación diseño del Mástil y su cimentación	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	100%	C. Guaviare
40	Validación diseño estructura campo fotovoltaico sistemas híbridos	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
41	Validación de diseño FV y Diagramas de conexiones	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
42	Validar Cantidades de obra	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	60%	C. Guaviare
43	Solicitud de aprobación de equipos	5 días	vie 4/03/22	jue 10/03/22	100%	C. Guaviare
44	E: Diseño de diagrama de conexiones	0 días	jue 10/03/22	jue 10/03/22	100%	C. Guaviare
45	H: Aprobación de equipos por interventoría	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	100%	Interventoria
46	E: solicitudes de compra de equipos	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	85%	C. Guaviare
47	E: solicitudes de compra de materiales	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	0%	C. Guaviare
48	Adquisiciones	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	16%	C. Guaviare
49	Contratistas	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	55%	C. Guaviare
50	Mano de Obra (replanteo)	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
51	Mano de Obra (Instalación)	5 días	mar 19/04/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
52	Capacitación al equipo replanteo	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
53	Recursos humanos	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	50%	C. Guaviare
54	Trabajador social	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
55	HSEQ	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
58	Equipo y Logística	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	4%	C. Guaviare
60	Compra de paneles	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
61	Orden de compra Paneles	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
64	Compra de inversores	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
68	Compra de cluster (batería, inversor bidireccional)	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
69	Orden de compra Cluster	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
72	Compra de sistema de control y sincronismo	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
73	Orden de compra Sistema de control	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
76	Compra de Tableros de potencia	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
80	Compra de estructuras tipo rack	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	11%	C. Guaviare
81	Orden de compra estructura	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
84	Compra de grupos electrogenos	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	11%	C. Guaviare
85	Orden de compra G. Electrogenos	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
88	Compra de materiales menores y redes BT/MT	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
92	Compra de materiales de obra civil	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
96	Compra de transformadores	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
100	Ejecución	111 días	vie 18/03/22	vie 19/08/22	1%	C. Guaviare
101	Hibrido Miraflores	111 días	vie 18/03/22	vie 19/08/22	3%	C. Guaviare
102	Replanteo	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
103	Replanteo y localización planta fotovoltaica	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
104	Replanteo y localización Redes B.T y M.T	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
105	Obra civil	63 días	jue 24/03/22	lun 20/06/22	0%	C. Guaviare
113	Obra Eléctrica	19 días	lun 18/04/22	vie 13/05/22	0%	C. Guaviare
123	Etapas 2 - Puesta en operación Grupos electrogenos, inyeccion directa.	75 días	mar 19/04/22	lun 1/08/22	0%	C. Guaviare
149	Etapas 3 - Puesta en operación cluster de baterías	84 días	mar 26/04/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
151	Capacitación	14 días	mar 2/08/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
156	Componente Social	100 días	jue 24/03/22	mié 10/08/22	17%	C. Guaviare
157	Jornadas de Socialización inicial	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	50%	C. Guaviare
158	Jornadas de Socialización intermedia	5 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22	0%	C. Guaviare
159	Jornadas de Socialización final	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	0%	C. Guaviare

Figura 14. Seguimiento cronograma Proyecto Miraflores

INFORME MENSUAL

CÓDIGO: FR-DC-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 26/08/2020

TARAIRA						
ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Responsable
1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDO DE TARAIRA	134,88 días	lun 21/02/22	vie 19/08/22	8%	C. Guaviare
8	H: Firma de acta de inicio	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	C. Guaviare
9	Elaboracion de acta de constitución	1 día	mar 22/02/22	mar 22/02/22	100%	C. Guaviare
10	Planificación	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
11	Planificacion de gestion del proyecto	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
12	Ajuste de cronograma	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
13	Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
14	Plan general de trabajo	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
15	E: plan general de trabajo	0 días	jue 24/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
16	Validación de metodología de Interventoría	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	Interventoría
17	H: Diseño, Validación y Aprobación Valla informativa del proyecto	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	C. Guaviare
18	Elaboración de valla informativa del proyecto	8 días	mar 22/03/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
19	Elaboración de formatos del proyecto	5 días	mar 22/03/22	lun 28/03/22	100%	C. Guaviare
20	H: Aprobación de Formatos del proyecto	0 días	lun 28/03/22	lun 28/03/22	100%	Interventoría
21	Monitoreo y control	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	C. Guaviare
22	Comité de avance de proyecto	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	C. Guaviare
35	Cierre	9 días	lun 8/08/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
40	Ingeniería de detalle	15 días	vie 25/02/22	jue 17/03/22	80%	C. Guaviare
41	Validar Fichas Técnicas	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	100%	C. Guaviare
42	Validación diseño de Gabinete	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
43	Validación diseño del Mástil y su cimentación	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
44	Validación diseño estructura campo fotovoltaico sistemas híbridos	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
45	Validación de diseño FV y Diagramas de conexiones	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	75%	C. Guaviare
46	Validar Cantidades de obra	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	60%	C. Guaviare
47	Solicitud de aprobación de equipos	5 días	vie 4/03/22	jue 10/03/22	100%	C. Guaviare
48	E: Diseño de diagrama de conexiones	0 días	jue 10/03/22	jue 10/03/22	100%	C. Guaviare
49	H: Aprobación de equipos por interventoría	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	100%	Interventoría
50	E: solicitudes de compra de equipos	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	85%	C. Guaviare
51	E: solicitudes de compra de materiales	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	0%	C. Guaviare
52	Adquisiciones	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	13%	C. Guaviare
53	Contratistas	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	55%	C. Guaviare
54	Mano de Obra (replanteo)	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
56	Capacitación al equipo replanteo	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
57	Recursos humanos	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	50%	C. Guaviare
58	Trabajador social	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
59	HSEQ	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
62	Equipo y Logística	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	5%	C. Guaviare
64	Compra de paneles	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
65	Orden de compra Paneles	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
68	Compra de inversores	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
72	Compra de cluster (batería, inversor bidireccional)	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
73	Orden de compra Cluster	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
76	Compra de sistema de control y sincronismo	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
77	Orden de compra Sistema de control	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
80	Compra de Tableros de potencia	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
84	Compra de estructuras tipo rack	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	11%	C. Guaviare
85	Orden de compra estructura	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
88	Compra de grupos electrogenos	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	11%	C. Guaviare
89	Orden de compra G. Electrogenos	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
92	Compra de materiales menores y redes BT/MT	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
96	Compra de materiales de obra civil	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
100	Compra de transformadores	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
104	Ejecución	110,88 días	vie 18/03/22	vie 19/08/22	1%	C. Guaviare
105	Hibrido Taraira	110,88 días	vie 18/03/22	vie 19/08/22	2%	C. Guaviare
106	Replanteo	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
107	Replanteo y localización planta fotovoltaica	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
108	Replanteo y localización Redes B.T y M.T	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
109	Obra civil	106,88 días	jue 24/03/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
117	Obra Eléctrica	5 días	lun 18/04/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
127	Etapas 2 - Puesta en operación Grupos electrogenos, inyección directa.	69,88 días	lun 16/05/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
153	Etapas 3 - Puesta en operación cluster de baterías	2,88 días	lun 16/05/22	mié 18/05/22	0%	C. Guaviare
155	Capacitación	11 días	jue 4/08/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
160	Componente Social	105,88 días	mié 23/03/22	mié 17/08/22	33%	C. Guaviare
161	Jornadas de Socialización inicial	1 día	mié 23/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
162	Jornadas de Socialización intermedia	5 días	jue 5/05/22	mié 11/05/22	0%	C. Guaviare
163	Jornadas de Socialización final	5 días	mié 10/08/22	mié 17/08/22	0%	C. Guaviare

Figura 15. Seguimiento cronograma Proyecto Taraira

INFORME MENSUAL

CÓDIGO: FR-DC-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 26/08/2020

CACHICAMO						
Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Responsable
ÍTEM	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDO DE CACHICAMO	134,88 días	lun 21/02/22	vie 19/08/22	6%	C. Guaviare
7	H: Firma de acta de inicio	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	C. Guaviare
8	Elaboracion de acta de constitución	1 día	mar 22/02/22	mar 22/02/22	100%	C. Guaviare
9	Planificación	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
10	Planificacion de gestion del proyecto	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
11	Ajuste de cronograma	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
12	Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
13	Plan general de trabajo	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
14	E: plan general de trabajo	0 días	jue 24/02/22	jue 24/02/22	100%	C. Guaviare
15	Validación de metodología de Interventoría	28 días	lun 21/02/22	jue 31/03/22	100%	Interventoría
16	H: Diseño, Validación y Aprobación Valla informativa del proyecto	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	100%	C. Guaviare
17	Elaboración de valla informativa del proyecto	8 días	mar 22/03/22	jue 31/03/22	100%	C. Guaviare
18	Elaboración de formatos del proyecto	5 días	mar 22/03/22	lun 28/03/22	100%	C. Guaviare
19	H: Aprobación de Formatos del proyecto	0 días	lun 28/03/22	lun 28/03/22	100%	Interventoría
20	Monitoreo y control	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	C. Guaviare
21	Comité de avance de proyecto	111 días	mar 1/03/22	mar 2/08/22	42%	C. Guaviare
34	Cierre	5 días	vie 12/08/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
39	Ingeniería de detalle	15 días	vie 25/02/22	jue 17/03/22	46%	C. Guaviare
40	Validar Fichas Técnicas	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
41	Validación diseño de Gabinete	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
42	Validación diseño del Mástil y su cimentación	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
43	Validación diseño estructura campo fotovoltaico sistemas híbridos	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
44	Validación de diseño FV y Diagramas de conexiones	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
45	Validar Cantidades de obra	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	50%	C. Guaviare
46	Solicitud de aprobación de equipos	5 días	vie 4/03/22	jue 10/03/22	20%	C. Guaviare
47	E: Diseño de diagrama de conexiones	0 días	jue 10/03/22	jue 10/03/22	30%	C. Guaviare
48	H: Aprobación de equipos por interventoría	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	20%	Interventoría
49	E: solicitudes de compra de equipos	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	20%	C. Guaviare
50	E: solicitudes de compra de materiales	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	0%	C. Guaviare
51	Adquisiciones	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	13%	C. Guaviare
52	Contratistas	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	55%	C. Guaviare
53	Mano de Obra (replanteo)	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
55	Capacitación al equipo replanteo	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
56	Recursos humanos	32 días	vie 11/03/22	lun 25/04/22	50%	C. Guaviare
57	Trabajador social	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
58	HSEQ	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	100%	C. Guaviare
61	Equipo y Logística	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	1%	C. Guaviare
63	Compra de paneles	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	11%	C. Guaviare
64	Orden de compra Paneles	1 día	vie 18/03/22	vie 18/03/22	100%	C. Guaviare
67	Compra de inversores	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
71	Compra de cluster (batería, inversor bidireccional)	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
75	Compra de sistema de control y sincronismo	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
79	Compra de Tableros de potencia	27 días	vie 18/03/22	lun 25/04/22	0%	C. Guaviare
83	Compra de estructuras tipo rack	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
87	Compra de grupos electrogenos	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
91	Compra de materiales menores y redes BT/MT	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
95	Compra de materiales de obra civil	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
99	Compra de transformadores	22 días	vie 18/03/22	lun 18/04/22	0%	C. Guaviare
103	Ejecución	129,88 días	lun 21/02/22	vie 19/08/22	1%	C. Guaviare
104	Híbrido San Jose - Cachicamo	110,88 días	vie 18/03/22	vie 19/08/22	2%	C. Guaviare
105	Replanteo	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
106	Replanteo y localización planta fotovoltaica	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
107	Replanteo y localización Redes B.T y M.T	4 días	vie 18/03/22	mié 23/03/22	100%	C. Guaviare
108	Obra civil	63 días	jue 24/03/22	lun 20/06/22	0%	C. Guaviare
116	Obra Eléctrica	53,88 días	lun 18/04/22	vie 1/07/22	0%	C. Guaviare
126	Etap 2 - Puesta en operación Grupos electrogenos, inyeccion directa.	88,88 días	mar 19/04/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
152	Etap 3 - Puesta en operación cluster de baterías	2,88 días	mar 26/04/22	jue 28/04/22	0%	C. Guaviare
154	Capacitación	81 días	jue 28/04/22	vie 19/08/22	0%	C. Guaviare
159	Componente Social	118,88 días	lun 21/02/22	jue 4/08/22	33%	C. Guaviare
160	Jornadas de Socialización inicial	5 días	lun 21/02/22	vie 25/02/22	100%	C. Guaviare
161	Jornadas de Socialización intermedia	5 días	mar 22/03/22	lun 28/03/22	0%	C. Guaviare
162	Jornadas de Socialización final	5 días	jue 28/07/22	jue 4/08/22	0%	C. Guaviare

Figura 16. Seguimiento cronograma Proyecto Cachicamo

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.3 COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el mes de abril referente al componente social.

3.3.1 INFORME DE SOCIALIZACIÓN

Durante el mes de abril se realizó el informe de socialización estipulado en el contrato CLÁUSULA SEXTA, luego de realizadas las visitas de socialización con la comunidad.

El informe presenta la caracterización sociodemográfica de cada una de las tres localidades del proyecto, Taraira, Miraflores y Puerto Cachicamo, se describen en el informe los aspectos generales de estos municipios. Dentro de lo que se presenta en inicialmente dentro del informe está el agrupamiento urbano, y el análisis poblacional, entre otros aspectos relacionados en el informe adjunto, Anexo 6. Informe de socialización - Contrato 139 de 2022.

Se presenta en el informe también el plan de socialización, la metodología de la comunicación y de divulgación.

Después de esto se presenta el desarrollo de la socialización inicial realizada en las localidades de Taraira y de Puerto Cachicamo con la comunidad, y en Miraflores con el Ente Territorial, de igual forma se presentan los temas a tratar durante la ejecución del proyecto.

Así mismo el informe contempla el análisis de la estrategia de convocatoria realizada en cada una de las tres localidades, Taraira, Miraflores y Puerto Cachicamo. Dentro del informe se realizó el análisis de la asistencia a la socialización para cada localidad. También se trataron las oportunidades de mejoras y la identificación de necesidades. Lo anterior se relaciona en el informe de socialización mediante el Anexo 6.1 Acta reunión socialización Taraira, y Anexo 6.3. Acta reunión socialización Cachicamo.

El informe también menciona la actividad realizada durante las socializaciones con respecto a la conformación de las veedurías ciudadanas para cada proyecto, ver Anexo 6.2. Acta de conformación de veeduría ciudadana Taraira y Anexo 6.4. Acta de conformación de veeduría ciudadana cachicamo.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.3.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.

El día jueves 28 de abril se envió por correo electrónico a la Interventoría Consorcio Intersolar 2022, el formato Anexo 7. Encuesta satisfacción socializaciones V.0, en respuesta a oficio “RETROALIMENTACION A INFORMES DE OBRA” de ENERGUAVIARE,

En dicho oficio solicitaban *“Allegar a la supervisión la encuesta de satisfacción diligenciada por la comunidad participante”*.

A lo que se respondió que se tiene contemplado la entrega de la encuesta de satisfacción de la comunidad participante a las socializaciones, a partir de la Socialización durante los trabajos, lo anterior teniendo presente que la socialización a la comunidad se debe realizar en tres momentos:

1. Socialización antes de iniciar la ejecución de las actividades.
2. Socialización durante los trabajos.
3. Socialización al finalizar los trabajos.

Debido a la complejidad de la implementación del sistema Híbrido, su funcionalidad y la percepción de este frente a la comunidad tendrá una data más confiable de la población a partir del segundo momento de socialización, en cuanto al sentido de satisfacción de la población.

Por lo mismo en esa respuesta se anexó el formato mencionado para validación y aprobación, de Interventoría y la Supervisión del Contrato.

Este formato se presenta a continuación en la Figura 17.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA SOCIALIZACIONES		CODIGO: FR-DC-026		
				VERSIÓN: 0		
				FECHA: 22/02/2022		
				PAGINA: 1 DE 1		
Fecha del evento		Nombre del evento				
Si pertenece a alguna organización o asociación social indiquenos el nombre						
Marque con una X, según considere						
Logística						
Se siente con la logística	Muy satisfecha (o)	Satisfecha (o)	Aceptable	Insatisfecha (o)	Muy insatisfecha (o)	No aplica
Hora de la capacitación						
Lugar de la capacitación						
Organización del evento						
Tiempo asignado a las presentaciones - información entrega						
Tiempo asignado al trabajo en grupo - dinámicas participativas						
Tiempo asignado preguntas y las respuesta						
Las presentaciones utilizadas						
Alimentación						
Sugerencias						

Figura 17. Formato de encuesta satisfacción socialización propuesto por el Consorcio Guaviare Sostenible

3.3.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

En el mes de abril no se presentaron solicitudes, quejas, reclamos, o consultas, sobre los proyectos a ejecutar en las localidades de Taraira, Miraflores y Puerto Cachicamo.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.4 COMPONENTE FINANCIERO

3.4.1 Seguimiento a las órdenes de compra a proveedores

En el mes de abril se realizaron pagos a diferentes proveedores del proyecto, entre ellos los proveedores de clúster de baterías (DHYBRID Power Systems GmbH), Paneles Solares (LONGI Solar Technology Co. Ltd.), Plantas generadoras (CUMMINS DE LOS ANDES S.A.), Sistema de Control (VIBRAN S.A.S.), Estructuras metálicas de soportes de paneles solares (OUTDOORS).

A continuación, se relacionan las órdenes de compra y la evidencia del pago realizado a cada proveedor mencionado anteriormente:

12/4/22, 8:57 Sucursal Virtual Empresas

Empresa: GUAVIARE SOSTENIBLE **Nit:** 901564277
Usuario: Martha Cecilia Zorrilla Zorrilla
12 de Abril de 2022 9:01:31 AM
Dirección IP: 190.158.115.217
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 11 de abril de 2022 - 4:40 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AM31935238
Fecha _ hora:	2022-04-12 08:47:24
Evento / transacción:	Envío de Transferencias Internacionales
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Motivo de la transacción:	Importación de Bienes
Cuenta a debitar:	81200005188 - Corriente
Nombre del ordenante:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE
Nombre del beneficiario:	dhybrid power systems gmbh
Código IBAN:	DE98700400410216267500
Código SWIFT banco beneficiario:	COBADEFFXXX
Monto y moneda:	EUR
Tasa:	\$3,730.00
Factor:	0.91066
Monto en pesos del valor a enviar:	
Gastos bancarios en el exterior:	OUR
Comisión de envío:	USD 29.00 \$108,581.00 +IVA
Monto total a debitar:	
Numeral cambiario y valor:	#2017-EUR 296736.00
Mensaje al beneficiario:	Anticipo de Guaviare Sostenible
Número declaración de cambio:	15002 - Con este número de comprobante podrá consultar en el Banco de la República.
Referencia de envío:	0000025065739934

[Regresar](#)

Figura 18. Comprobante de pago a proveedor baterías

	INFORME MENSUAL		CÓDIGO: FR-DC-016
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA		VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO TARAIRA	ORDEN No.	1

DATOS PROVEEDOR		DATOS FACTURACION		
PROVEEDOR:	DHYBRID	FECHA EMISION OC:	8	ABRIL 2022
NIT VAT Number	DE 288-484-805	FECHA DE ENTREGA:	7	OCTUBRE 2022
VENDEDOR:	Benedikt Böhm	FACTURAR A:	GENERCOL S.A.S. E.S.P.	
DIRECCION:	Str. 1a 82131 Gauting.	NIT:	901.374.690 -	
CIUDAD:	Gauting, Germany	FORMA DE PAGO:	40% de pago inicial en el pedido Pago del saldo del 60 % después de FAT, en la disponibilidad declarada para el envío EXW Alemania/UE para contenedor BESS, FOB China para baterías	
TELEFONO:	(+ 49 89 899 481-0)	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO	
CORREO:	b.boehm@dhybrid.de	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TARAIRA	PCS: 208 kVA MR Germany BAT: 268 kWh Lithium NO INCLUYE Container for PCS, BCP and BAT	UND	1		
2						\$
3						\$
4						\$
5						\$
6						\$
7						\$
8						\$
9						\$
10						\$
11						\$
12						\$
13						\$
14						\$
15						\$
16						\$
17						\$
18						\$
19						\$
20						\$
21						\$
22						\$
23						\$
24						\$

OBSERVACIONES:
GARANTIA: 24 months, batteries 36 months
Alcance de GENERCOL:
 Transporte de equipos al sitio.
 Instalación mecánica de Interfaces BESS y UPP e instalación de conexiones de cables
 Suministro e instalación de cables de FO, comunicación y cables fuera del contenedor BESS
 Provisión de conexión a Internet en el sitio, adecuada para la puesta en marcha remota
 Instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos, sistemas de generadores y controladores de generadores
 MDB y transformador

SUBTOTAL:	\$
% DESCUENTO	
IVA 19%	
TOTAL	\$

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos. Los cuales entrarán a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de GENERCOL.

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 19. Orden de Compra Baterías proyecto Taraíra

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos confirmó que programó el final de la producción y la prueba de aceptación en fábrica FAT para noviembre de 2022.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO MIRAFLORES	ORDEN No.	1		

DATOS PROVEEDOR		DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	DHYBRID	FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022
NIT VAT Number:	DE 288-484-805	FECHA DE ENTREGA:	7	OCTUBE	2022
VENDEDOR:	Benedikt Böhm	FACTURAR A:	GENERCOL S.A.S. E.S.P.		
DIRECCION:	Str. 1a 82131 Gauting,	NIT:	901.374.690 -		
CIUDAD:	Germany	FORMA DE PAGO:	40% de pago inicial en el pedido Pago del saldo del 60 % después de FAT, en la disponibilidad declarada para el envío EXW Alemania/UE para contenedor BESS, FOB China para baterías		
TELEFONO:	(+ 4989899481-0)	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO		
CORREO:	b.boehm@dhybrid.de	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BAT MIRAFLORES	PCS: 832 kVA (2x 416 kVA) MR Germany BAT: 876 kWh Lithium (2 x Container for PCS , BCP and BAT)	UND	1		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

OBSERVACIONES: GARANTIA: 24 months, batteries 36 months Alcance del cliente: Transporte de equipos al sitio. Instalación mecánica de Interfaces BESS y UPP e instalación de conexiones de cables Suministro e instalación de cables de FO, comunicación y cables fuera del contenedor BESS Provisión de conexión a Internet en el sitio, adecuada para la puesta en marcha remota Instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos, sistemas de generadores y controladores de generadores MDB y transformador	SUBTOTAL:
	% DESCUENTO
	IVA 19%
	TOTAL

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de GENERCOL.

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 20. Orden de Compra Baterías proyecto Miraflores

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos confirmó que programó el final de la producción y la prueba de aceptación en fábrica FAT para noviembre de 2022.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA		VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO MIRAFLORES	ORDEN No.	5

DATOS PROVEEDOR		DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	LONGI Solar Technology Co., Ltd.	FECHA EMISION OC:	19	ABRIL	2022
NIT VAT Number:	1777351008	FECHA DE ENTREGA:	1	JULIO	2022
VENDEDOR:	HUGO FERNANDEZ	FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE		
DIRECCION:	Citigroup Tower, No. 33 Hua Yun Shi Qiao Road, Lu Jia Zui, Shanghai 200120 China	NIT:	901564277-1		
CIUDAD:	SHANGHAI	FORMA DE PAGO:	10% ANTICIPO - 90 % PREVIO DESPACHO		
TELEFONO:	317 4291446	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO		
CORREO:	hugofernandez@longigroup.com	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LR5-72HPH-545M	MODULO FOTOVOLTAICO LONGI 545 Wp_ LR5-72HPH-545M	UND	1327	USD	USD
2						\$
3						\$
4						\$
5						\$
6						\$
7						\$
8						\$
9						\$
10						\$
11						\$
12						\$
13						\$
14						\$
15						\$
16						\$
17						\$
18						\$
19						\$
20						\$
21						\$
22						\$
23						\$
24						\$

OBSERVACIONES: FOB SHANGHAI	SUBTOTAL:	USD
	DESCUENTO	
	IVA 19%	
	TOTAL	USD

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ	AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO
------------------------------	-----------------------------------

Figura 21. Orden de Compra Paneles solares proyecto Miraflores

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

 Consorcio Guaviare Sostenible		ORDEN DE COMPRA		VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO PUERTO CACHICAMO	ORDEN No.	5_CACHICAMO

DATOS PROVEEDOR		DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	LONGI Solar Technology Co., Ltd.	FECHA EMISION OC:	19	ABRIL	2022
NIT VAT Number:	1777351008	FECHA DE ENTREGA:	01	JULIO	2022
VENDEDOR:	HUGO FERNANDEZ	FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE		
DIRECCION:	Citigroup Tower, No. 33 Hua Yun Shi Qiao Road, Lu Jia Zui, Shanghai 200120 China	NIT:	901564277-1		
CIUDAD:	SHANGHAI	FORMA DE PAGO:	10% ANTICIPO - 90 % PREVIO DESPACHO		
TELEFONO:	317 4291446	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO		
CORREO:	hugofernandez@longigroup.com	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		MODULO FOTOVOLTAICO 410W LONGI	UND	270	USD	USD
2						\$
3						\$
4						\$
5						\$
6						\$
7						\$
8						\$
9						\$
10						\$
11						\$
12						\$
13						\$
14						\$
15						\$
16						\$
17						\$
18						\$
19						\$
20						\$
21						\$
22						\$
23						\$
24						\$

OBSERVACIONES: FOB SHANGHAI	SUBTOTAL:	USD
	DESCUENTO	
	IVA 19%	
	TOTAL	USD

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido debera sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variacion o desviacion o excepcion de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ	AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO
------------------------------	-----------------------------------

Figura 22. Orden de Compra Paneles solares proyecto Puerto Cachicamo

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO TARAIRA	ORDEN No.	1	
DATOS PROVEEDOR		DATOS FACTURACION				
PROVEEDOR:	Jinko Solar Co., Ltd	FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022	
NIT VAT Number:	Unified Social Credit Code: 91361100794799028G	FECHA DE ENTREGA:	1	JULIO	2022	
VENDEDOR:	Camilo Navarrete	FACTURAR A:	GENERCOL S.A.S. E.S.P.			
DIRECCION:	Calle 122 # 47-43	NIT:	901.374.690 - 5			
CIUDAD:	Bogota DC	FORMA DE PAGO:	10% ANTICIPO - 90 % PREVIO DESPACHO			
TELEFONO:	3156167862	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO			
CORREO:	camilo.navarrete@jinkosolar.com	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		MODULO FOTOVOLTAICO 460W JINKO	UND	445		
2						\$
3						\$
4						\$
5						\$
6						\$
7						\$
8						\$
9						\$
10						\$
11						\$
12						\$
13						\$
14						\$
15						\$
16						\$
17						\$
18						\$
19						\$
20						\$
21						\$
22						\$
23						\$
24						\$
OBSERVACIONES: CIF BUENAVENTURA			SUBTOTAL:			
			% DESCUENTO			
			IVA 19%			
			TOTAL			

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de GENERCOL.

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 23. Orden de Compra Paneles solares proyecto Taraira

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Evento / transacción:	Envío de Transferencias Internacionales
Estado:	Ejecutada

Motivo de la transacción:		Importación de Bienes
Cuenta a debitar:		81200005188 - Corriente
Nombre del ordenante:		CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE
Nombre del beneficiario:		longi solar technology coltd
Cuenta del beneficiario:		8111714014300424313
Código SWIFT banco beneficiario:		CIBKCNBJ710
Monto y moneda:		
Tasa:		\$3,834.00
Monto en pesos del valor a enviar:		
Gastos bancarios en el exterior:		OUR
Comisión de envío:		USD 29.00 \$109,027.00 +IVA
Monto total a debitar:		
Numeral cambiario y valor:		#2017-USD
Mensaje al beneficiario:		Consorcio Guaviare Sostenible
Número declaración de cambio:		27613 - Con este número de comprobante podrá consultar en el Banco de la República.
Referencia de envío:		0000025065757034

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Figura 24. Comprobante de pago a proveedor paneles solares

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO MIRAFLORES		ORDEN No.	MF-3.1	
DATOS PROVEEDOR				DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	CUMMINS DE LOS ANDES S.A.		FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022	
NIT VAT Number:	8 0 0 7 1 6 1 7 -1		FECHA DE ENTREGA:	26	AGOSTO	2022	
VENDEDOR:	KELLY GOMEZ PINEDA		FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE			
DIRECCION:	AV TRONCAL DE OCCIDENTE 29 88 ESTE KM 2 5 VIA BOGOTA MOSQUERA		NIT:	9 0 1 5 6 4 2 7 7 -1			
CIUDAD:	BOGOTA DC		FORMA DE PAGO:	20% en calidad de anticipo al momento de la firma del contrato. • 10% contra BL • 20% a la nacionalización de los equipos. • 50% + IVA con pago a 30 días a la llegada de las plantas eléctricas a obra sin instalar			
TELEFONO:	3505288562		COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO			
CORREO:	kelly.gomez.pineda@equitel.com.co		SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	GRUPO ELEC.	PLANTA ELECTRICA CUMMINS POWER GENERATION DE 450KW NOMINALES (STANDBY) MODELO C450D6B, CERTIFICACION TIER II, INCLUYE EXCITACIÓN CON PMG, CON CONTROL PCC 2.3 CON ALARMA POR BAJO VOLTAJE DE BATERIA, SOBRE CORRIENTE, PARO POR SOBRE VOLTAJE- FILTROS, PRECALENTADOR DE CAMISAS, BREAKER ORIGINAL DE FABRICA DE 1600 AMP, FLEXIBLE Y ACOPLES PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, TANQUE EN LA BASE DE 145 GL. VOLTAJES DISPONIBLES PARA RECONEXIÓN 277/480 255/440 220/380 127/220	UND	2	USD	USD	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIONES: No se incluye la logística y transporte de los equipos a sitios de operación, la entrega de estos será en una de nuestras bodegas (a convenir con el cliente) Oferta de referencia la entregada el día 30 de marzo de 2022						SUBTOTAL: USD DESCUENTO IVA 19% USD TOTAL USD	

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERÁ ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 25. Orden de Compra Plantas generadoras proyecto Miraflores

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos relacionó las fechas estimadas de los grupos generadores adquiridos, fecha de entrega noviembre de 2022.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSION: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO MIRAFLORES		ORDEN No.	MF-3.2	
DATOS PROVEEDOR PROVEEDOR: CUMMINS DE LOS ANDES S.A. NIT VAT Number: 800071617-1		DATOS FACTURACION FECHA EMISION OC: 8 ABRIL 2022 FECHA DE ENTREGA: 26 AGOSTO 2022					
VENDEDOR: KELLY GOMEZ PINEDA DIRECCION: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 29 88 ESTE KM 2 5 VIA BOGOTA MOSQUERA		FACTURAR A: CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE NIT: 901564277-1					
CIUDAD: BOGOTA DC		FORMA DE PAGO: 20% en calidad de anticipo al momento de la firma del contrato. + 10% contra BL. + 20% a la nacionalización de los equipos. + 50% + IVA con pago a 30 días a la llegada de las plantas eléctricas a obra sin instalar					
TELEFONO: 350528562 CORREO: Kelly Johanna Gomez Pineda <kgomez@eguitel.com.co>		COMPRADOR: ANA MARIA MURILLO SOLICITANTE: FABIO SANCHEZ					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	CABINA	CABINA PARA PLANTA ELECTRICA CUMMINS C450D6 (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS). MEDIDAS. LARGO: 5.21M ANCHO: 1.51M ALTO: 2.52M (DESDE PISO) + TUBERIA DE ESCAPE. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN, LAMINA FIBERGLASS BLACK THEATER DE DENSIDAD MEDIA ESPESOR DE 4 PULGADAS, TRIPLE PUERTA POR CARA, INCLUYE: SISTEMA DE ESCAPE MONTADO	UND	2	\$ 00	\$.00	
2	ACCESORIOS	BATERIA	UND	4	\$	\$	
3	ACCESORIOS	CARGADOR DE BATERIAS	UND	2	\$	\$	
4	ACCESORIOS	AMORTIGUADOR (PATIN ANTIVIBRATORIO) PARA PLANTA ELECTRICA	UND	16	\$	\$	
5	ACCESORIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ANTIEXPLOSION PARA CABINA INSONORA	UND	2	\$	\$	
6	ESCAPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE CR-16 X 8"	ML	20	\$	\$	
7	M.O.	MONTAJE MECANICO PLANTAS ELECTRICAS DE 450 KW. INCLUYE PUESTA EN SITIO Y ANCLAJE, CONEXIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL A CERO METROS. ENCENDIDO INICIAL Y PRUEBAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE PLANTA A SITIO NI MONTACARGAS. NO INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTES DEL PERSONAL AL SITIO	GL	2	\$	\$	
8	M.O.	INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y	GL	1	\$	\$	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES:
 No se incluye la logística y transporte de los equipos a sitios de operación, la entrega de estos será en una de nuestras bodegas (a convenir con el cliente)

Oferta de referencia la entrega el día 30 de marzo de 2022

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace constar que cualquier variación o desviación de los requisitos anteriormente citados NO SERÁ ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE.

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

SUBTOTAL:	\$
DESCUENTO	\$
IVA 19%	\$
TOTAL	\$

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 26. Orden de Compra complementos plantas generadoras proyecto Miraflores

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos relacionó las fechas estimadas de los grupos generadores adquiridos, fecha de llegada estimada a bodega Cummins de lo andes noviembre de 2022.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO TARAIRA	ORDEN No.	TR-2.1		
DATOS PROVEEDOR PROVEEDOR: CUMMINS DE LOS ANDES S.A. NIT VAT Number: 8 0 0 0 7 1 6 1 7 -1 VENDEDOR: KELLY GOMEZ PINEDA DIRECCION: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 29 88 ESTE KM 2 5 VIA BOGOTA MOSQUERA CIUDAD: BOGOTA DC TELEFONO: 3505288562 CORREO: Kelly.Johanna.Gomez.Pineta.ckgomez@guaviar.com.co		DATOS FACTURACION FECHA EMISION OC: 8 ABRIL 2022 FECHA DE ENTREGA: 26 AGOSTO 2022 FACTURAR A: CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE NIT: 9 0 1 5 6 4 2 7 7 -1 FORMA DE PAGO: 20% en calidad de anticipo al momento de la firma del contrato. • 10% contra BL • 20% a la nacionalización de los equipos. • 50% + IVA con pago a 30 días a la llegada de las plantas eléctricas a obra sin instalar COMPRADOR: ANA MARIA MURILLO SOLICITANTE: FABIO SANCHEZ					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	GEN 1	PLANTA ELECTRICA CUMMINS POWER GENERATION DE 175KW NOMINALES (STANDBY) MODELO C175D6, EMISIONADO TIER III, INCLUYE FILTROS, GOVERNADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, INCLUYE FILTROS, TABLERO PCC1.2, PANTALLA LCD, CON ALARMA POR BAJO VOLTAJE DE BATERIA, PARO POR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE, PARO DE EMERGENCIA EXTERNO, BREAKER ORIGINAL DE FABRICA 630 AMP, FLEXIBLE Y ACOPLER PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, SILENCIADOR ORIGINAL DE FABRICA, TANQUE EN LA BASE DE 122 GL CON ALARMA POR BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, BATERIA, VOLTAJES DISPONIBLES PARA RECONEXION 120/208 127/220 132/230 139/240 220/380* 240/416 254/440 266/460 277/480	UND	1			
2	GEN 2	PLANTA ELECTRICA CUMMINS POWER GENERATION DE 300KW NOMINALES (STANDBY) MODELO C300D6, INCLUYE EXCITACION CON PMG, CON CONTROL PCC 1.1 -CON PARO POR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE, ALARMA DE BAJO VOLTAJE DE BATERIA, REGULADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, PARO DE EMERGENCIA EXTERNO, - PRECALENTADOR DE CAMISAS, BREAKER ORIGINAL DE FABRICA 1000 AMP, FLEXIBLE Y ACOPLER PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, TANQUE EN LA BASE DE 105 GL, FILTROS, VOLTAJES DISPONIBLES PARA RECONEXION 277/480 255/440 220/380* 240/416 139/240 127/220 120/208 115/200	UND	1			
3							\$
4							\$
5							\$
6							\$
7							\$
8							\$
9							\$
10							\$
11							\$
12							\$
13							\$
OBSERVACIONES: No se incluye la logística y transporte de los equipos a sitios de operación, la entrega de estos será en una de nuestras bodegas (a convenir con el cliente) Oferta de referencia la entrega el día 30 de marzo de 2022					SUBTOTAL: % DESCUENTO IVA 19% TOTAL		
IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra. El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en este orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anejos, los cuales serán a formar parte de esta OC. Se hace constar que cualquier variación o desviación de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE. ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO							

Figura 27. Orden de Compra Plantas generadoras proyecto Taraira

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos relacionó las fechas estimadas de los grupos generadores adquiridos, fecha de llegada estimada a bodega Cummins de lo andes noviembre de 2022.

	CÓDIGO: FR-DC-016	
	VERSIÓN: 1	
	FECHA: 26/08/2020	

INFORME MENSUAL

		ORDEN DE COMPRA		VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PAGINA 1 DE 1		
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO TARAIRA	ORDEN No.	TR-2.2	
DATOS PROVEEDOR			DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	CUMMINS DE LOS ANDES S.A.	FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022	
NIT VAT Number:	8 0 0 7 1 6 1 7 -1	FECHA DE ENTREGA:	26	AGOSTO	2022	
VENDEDOR:	KELLY GOMEZ PINEDA	FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE			
DIRECCION:	AV TRONCAL DE OCCIDENTE 29 88 ESTE KM 2 5 VIA BOGOTA MOSQUERA	NIT:	9 0 1 5 6 4 2 7 7 -1			
CIUDAD:	BOGOTA DC	FORMA DE PAGO:	20% en calidad de anticipo al momento de la firma del contrato. + 10% contra BL + 20% a la nacionalización de los equipos. + 50% + IVA con pago a 30 días a la llegada de las plantas eléctricas a obra sin instalar			
TELEFONO:	3505288562	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO			
CORREO:	Kelly.Johanna.Gomez.Pinada	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABINA	CABINA PARA PLANTA ELECTRICA CUMMINS C175D6a (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS). MEDIDAS: LARGO: 4.21M ANCHO: 1.37M ALTO: 2.17M (DESDE PISO) + TUBERIA DE ESCAPE. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN, LAMINA FIBERGLASS BLACK THEATER DE DENSIDAD MEDIA ESPESOR DE 4 PULGADAS, DOBLE PUERTA POR CARA, INCLUYE: SISTEMA DE ESCAPE MONTADO.	UND	1		
2	CABINA	CABINA PARA PLANTA ELECTRICA CUMMINS C300D6 (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA SUPERIOR (A CHASIS). MEDIDAS: LARGO: 4.36M ANCHO: 1.37M ALTO: 2.32M (DESDE PISO) + TUBERIA DE ESCAPE. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN, LAMINA FIBERGLASS BLACK THEATER DE DENSIDAD MEDIA ESPESOR DE 4 PULGADAS, DOBLE PUERTA POR CARA, INCLUYE: SISTEMA DE ESCAPE MONTADO.	UND	1		
3	ACCESORIOS G1 Y G2	BATERIA	UND	4		
4	ACCESORIOS G1 Y G2	CARGADOR DE BATERIAS	UND	2		
5	ACCESORIOS G1 Y G2	AMORTIGUADOR (PATIN ANTIVIBRATORIO) PARA PLANTA	UND	10		
6	ACCESORIOS G1 Y G2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	UND	2		
7	ESCAPE/ GEN 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE CR-16 X 8"	ML	10		
8	ESCAPE/ GEN 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE CR-16 X 8"	ML	10		
9	M.O. / GEN 1	MONTAJE MECANICO PLANTAS ELECTRICAS DE 175 KW. INCLUYE PUESTA EN SITIO Y ANCLAJE, CONEXIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL A CERO METROS. ENCENDIDO INICIAL Y PRUEBAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE PLANTA A SITIO NI MONTACARGAS. NO INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTES DEL PERSONAL AL SITIO	GL	1		
10	M.O. / GEN 1	INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DEL MONTAJE Y CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN LA OPERACION DE LAS MAQUINAS	GL	1		
11	M.O. / GEN 2	MONTAJE MECANICO PLANTAS ELECTRICAS DE 175 KW. INCLUYE PUESTA EN SITIO Y ANCLAJE, CONEXIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL A CERO METROS. ENCENDIDO INICIAL Y PRUEBAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE PLANTA A SITIO NI MONTACARGAS. NO INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTES DEL PERSONAL AL SITIO	GL	1		
12	M.O. / GEN 2	INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DEL MONTAJE Y CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN LA OPERACION DE LAS MAQUINAS	GL	1		
OBSERVACIONES: No se incluye la logística y transporte de los equipos a sitios de operación, la entrega de estos será en una de nuestras bodegas (a convenir con el cliente)			SUBTOTAL:			
Oferta de referencia la entregada el día 30 de marzo de 2022			% DESCUENTO			
			IVA 19%			
			TOTAL			
IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra. El monto del pedido deberá registrarse a todos los expedientes descritos en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace constar que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE. ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO						

Figura 28. Orden de Compra complementos plantas generadoras proyecto Taraia

Nota: De acuerdo a comunicado del proveedor de abril 25 de 2022, nos relacionó las fechas estimadas de los grupos generadores adquiridos, fecha de llegada estimada a bodega Cummins de lo andes noviembre de 2022.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 11 de abril de 2022 - 4:40 PM

12 de Abril de 2022 9:13:59 AM
Dirección IP: 190.158.115.217

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
Bancolombia NIT 890903938-8 GUAVIARE SOSTENIBLE NIT: 901564277 FECHA: 12/04/2022			
Entidad	BANCO DE BOGOTA		
Producto Beneficiario	18044024		
Identificación Beneficiario	800071617		
Tipo de Identificación	3		
Nombre del Beneficiario	cummis de los ande		
Tipo de Producto	Corriente		
Tipo de Transacción	27		
Valor			
Oficina de Entrega	0		
Referencia	CimminsAntiTarMiraCac		
Lugar de Pago			
Número de Celular			
Fecha Aplicación	2022/04/11		
E-mail			
Identificación del Autorizado			
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		

Figura 29. Comprobante de pago a proveedor plantas generadoras

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA		VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1		
ORDEN DE TRABAJO No.	C - 139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO TARAIRA	ORDEN No.	2.1	
DATOS PROVEEDOR			DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	VIBRAN SAS	FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022	
NIT VAT Number:	860402221-7	FECHA DE ENTREGA:	15	JULIO	2022	
VENDEDOR:	DIEGO PINZON	FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE			
DIRECCION:	CARRERA 45 A No. 101- 47	NIT:	901564277-1			
CIUDAD:	BOGOTA	FORMA DE PAGO:	Tableros de Sincronismo y de Control: 15% con la OC, 85% previo a la entrega Ingeniería de detalle: 100% con la entrega de la ingeniería Servicios de Comisionamiento: 10% con OC, 90% a la finalización del servicio.			
TELEFONO:	3106134470	COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO			
CORREO:	dpinzen@vibrant.com.co	SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ING	Ingeniería de Detalle	GLB	1	\$	\$
2	SINCR	2 Celdas de Sincronismo y Control para los motogeneradores. Accesorios y cableado interno, Pruebas FAT. Incluye 4 Easygens 3200XT INSTALADOS Y CABLEADOS	GLB	1	\$	\$
3	SAT	Pruebas SAT, Comisionamiento y Puesta en Marcha del Sistema de Sincronismo en Campo con Capacitación	GLB	1	\$	\$
4	COMM	Servicios main controller locales	GLB	1	\$	\$
7						\$
8						\$
9						\$
10						\$
11						\$
12						\$
13						\$
14						\$
15						\$
16						\$
17						\$
18						\$
19						\$
20						\$
21						\$
22						\$
23						\$
24						\$

OBSERVACIONES: Lugar de Entrega Equipos: Sistema de Sincronismo y Control DDP bodegas cliente Villavicencio Precios: • Sistema de Sincronismo y gerenciamiento de potencia. Son en pesos colombianos. Estos precios no incluyen el IVA, el cual se liquidará y adicionará según la ley vigente. • Main controller y Servicios especialista Dhybrid: Son en euros a ser liquidados a la trm de la fecha de la factura.	SUBTOTAL:	\$
	% DESCUENTO	
	IVA 19%	
	TOTAL	

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de GENERCOL.

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ

AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO

Figura 31. Orden de Compra sistema de control y sincronismo proyecto Taraira

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Empresa: GUAVIARE SOSTENIBLE Nit: 901564277
 Usuario: Martha Cecilia Zorrilla Zorrilla
 12 de Abril de 2022 9:10:11 AM
 Dirección IP: 190.158.115.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Lunes, 11 de abril de 2022 - 4:40 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
 GUAVIARE SOSTENIBLE
 NIT: 901564277
 FECHA: 12/04/2022

Entidad	BANCO BBVA
Producto Beneficiario	135000100017010
Identificación Beneficiario	860402221
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	vibran sas
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	
Oficina de Entrega	0
Referencia	VibraAntiTaraMiref
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/04/11
E-mail	administrativo@genercol.com.co
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

Figura 32. Comprobante de pago a proveedor Sistema de Control

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	HIBRIDO MIRAFLORES		ORDEN No.	8.1	
DATOS PROVEEDOR				DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	OUTDOORS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S			FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022
NIT VAT Number:	900377712-9			FECHA DE ENTREGA:	15	JUNIO	2022
VENDEDOR:	GERARDO VARGAS VIDAL			FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE		
DIRECCION:	CALLE 108 14 B 55 P3			NIT:	901564277-1		
CIUDAD:	Bogotá			FORMA DE PAGO:	50% ANTICIPO, 40 % CONTRA ENTREGA, Y SALDO A 30 DÍAS FECHA DE FACTURA		
TELEFONO:	3154122438			COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO		
CORREO:	gvargas@outdoorscolombia.com			SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1		Rack modular en acero estructural galvanizado en caliente de 31.40m de largo y 4.59m de ancho para 54 paneles solares. Diseño estructural indicado en el Plano Arq Anexo: columnas en Perlin C 100x50x2,5mm que permiten nivelar las diferentes alturas topográficas del terreno. Correas longitudinales en Perlin C 100x50x2,5mm moduladas a 4,3m y 3,7m y correas transversales en perlin C 150x50x2,5mm de 3,8m de largo. Todas las conexiones pernadas.	UND	1			
2		Kit de Tornilleria en Acero galvanizado en caliente Grado 8 de 1/2" x 1"	UND	1			
3							
4							
5							
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL: \$ -		
					% DESCUENTO		
					IVA 19% \$ -		
					TOTAL \$ -		

IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.

El suministro del pedido deberá sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variación o desviación o excepción de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ	AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO
------------------------------	-----------------------------------

Figura 33. Orden de Compra estructuras metálicas proyecto Miraflores

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

		ORDEN DE COMPRA				VERSIÓN: 1 FECHA: 05/08/2021 PÁGINA 1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO No.	C-139	NOMBRE DEL PROYECTO	IBRIDO TARAIRA		ORDEN No.	8.1	
DATOS PROVEEDOR				DATOS FACTURACION			
PROVEEDOR:	OUTDOORS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S		FECHA EMISION OC:	8	ABRIL	2022	
NIT VAT Number:	900377712-9		FECHA DE ENTREGA:	15	JUNIO	2022	
VENDEDOR:	GERARDO VARGAS VIDAL		FACTURAR A:	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE			
DIRECCION:	CALLE 108 14 B 55 P3		NIT:	901564277-1			
CIUDAD:	Bogotá		FORMA DE PAGO:	50% ANTICIPO, 40 % CONTRA ENTREGA, Y SALDO A 30 DÍAS FECHA DE FACTURA			
TELEFONO:	3154122438		COMPRADOR:	ANA MARIA MURILLO			
CORREO:	gvargas@outdoorscolombia.com		SOLICITANTE:	FABIO SANCHEZ			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1		Rack modular en acero estructural galvanizado en caliente de 30.20m de largo y 3.8m de ancho para 52 paneles solares. Diseño estructural indicado en el Plano Arq Anexo: columnas en Perlin C 100x50x2,5mm que permiten nivelar las diferentes alturas topográficas del terreno. Correas longitudinales en Perlin C 100x50x2,5mm moduladas a 4,3m y 3,7m y correas transversales en perlin C 150x50x2,5mm de 3,8m de largo. Todas las conexiones pernadas.	UND	1			
2		Rack modular en acero estructural galvanizado en caliente de 22.8m de largo y 3.8m de ancho para 38 paneles solares. Diseño estructural indicado en el Plano Arq Anexo: columnas en Perlin C 100x50x2,5mm que permiten nivelar las diferentes alturas topográficas del terreno. Correas longitudinales en Perlin C 100x50x2,5mm moduladas a 4,3m y 3,7m y correas transversales en perlin C 150x50x2,5mm de 3,8m de largo. Todas las conexiones pernadas.	UND	1			
3		Kit de Tornilleria en Acero galvanizado en caliente Grado 8 de 1/2" x 1" Mesa 52 paneles	UND	1			
4		Kit de Tornilleria en Acero galvanizado en caliente Grado 8 de 1/2" x 1" Mesa 38 paneles	UND	1			
5							
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL: \$ -		
					% DESCUENTO		
					IVA 19% \$ -		
					TOTAL \$ -		
IMPORTANTE: Presentar su factura indicando No. De esta orden de compra.							
El suministro del pedido debera sujetarse a todas las especificaciones descritas en esta orden de compra e igualmente a aquellos requerimientos expresados en los documentos anexos, los cuales entran a formar parte de esta OC. Se hace claridad que cualquier variacion o desviacion o excepcion de los requisitos anteriormente citados NO SERA ACEPTADA, a menos que sea autorizada de manera expresa y por escrito de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE							
ELABORADO POR: FABIO SANCHEZ				AUTORIZADO POR: ANA MARIA MURILLO			

Figura 34. Orden de Compra estructuras metálicas proyecto Taraíra

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
Bancolombia NIT 890903938-8 GUAVIARE SOSTENIBLE NIT: 901564277 FECHA: 12/04/2022			
	Entidad	BANCOLOMBIA	
	Producto Beneficiario	39671362539	
	Identificación Beneficiario	900377712	
	Tipo de Identificación	3	
	Nombre del Beneficiario	outdoors sas	
	Tipo de Producto	Corriente	
	Tipo de Transacción	27	
	Valor		
	Oficina de Entrega	0	
	Referencia	AntiTaraMiraf	
	Lugar de Pago		
	Número de Celular		
	Fecha Aplicación	2022/04/11	
	E-mail		
	Identificación del Autorizado		
	Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	
Regresar			

Figura 35. Comprobante de pago a proveedor Estructuras metálicas

3.4.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3.4.2.1 FACTURACIÓN

De acuerdo a la cláusula TERCERA del contrato, el porcentaje de pago anticipado es de 30% del total valor del contrato antes de IVA lo que corresponde al valor de \$ 6.801.307.986.41.

El pago anticipado fue girado, el día 07 de abril de 2022 a la cuenta corriente de Bancolombia del contratista por un total de \$ 5.664.990.982.86 (Valor girado), el cual se ha discriminado de la siguiente manera:

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

DESCRIPCIÓN DE PAGOS REALIZADOS MES DE ABRIL

MIRAFLORES

Pagos	%	Fecha de Factura	Factura No.	Sub-Total	Iva	Vr. Total Facturado	Retenciones	Vr.Total Pagado	Saldo por Pagar
Pago anticipado	30	23/03/2022	1	4,502,373,694	33,880,911	4,536,254,605	792,417,770	3,743,836,835	10,584,594,079

CACHICAMO

Pagos	%	Fecha de Factura	Factura No.	Sub-Total	Iva	Vr. Total Facturado	Retenciones	Vr.Total Pagado	Saldo por Pagar
Pago anticipado	30	23/03/2022	2	745,279,343	5,594,299	750,873,642	130,423,885	620,449,757	1,752,038,498

TARAIRA

Pagos	%	Fecha de Factura	Factura No.	Sub-Total	Iva	Vr Total Facturado	Retenciones	Vr.Total Pagado	Saldo por Pagar
Pago anticipado	30	23/03/2022	3	1,553,654,949.50	11,170,782.10	1,564,825,731.60	264,121,341.41	1,300,704,390.19	3,651,260,040

CONSOLIDADO CONTRATO 139 DE 2022 CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

Pagos	%	Fecha de Factura		Sub-Total	Iva	Vr Total Facturado	Retenciones	Vr.Total Pagado	Saldo por Pagar
Pago anticipado	30	23/03/2022		6,801,307,986.34	50,645,992.52	6,851,953,978.86	1,186,962,996.57	5,664,990,982.29	15,987,892,617

Figura 36. Facturación con corte al mes de abril 2022

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.4.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				EJECUCIÓN DEL ANTICIPO AL MES DE ABRIL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR (\$)	PORCENTAJE SOBRE TOTAL PAGO ANTICIPADO %	% EJECUTADO A ABRIL	EJECUCIÓN MES ABRIL (COP)	% MES ABRIL	NOMBRE PROVEEDOR
1	Anticipo Compra Paneles Solares	794,990,982.60	11.60%	50%	397,495,491	5.80%	LONGi Solar Technology Co., Ltd. - JINKO Solar Co Ltd.
2	Anticipo Compra Electronica de Potencia	196,341,432.38	2.87%	0%	-	0.00%	
3	Anticipo Clusters Baterias de Litio	1,625,344,011.51	23.72%	100%	1,625,344,012	23.72%	DHYBRID Power Systems GmbH
4	Anticipo Sistemas de Control, Sincronismo y Monitoreo	770,316,069.46	11.24%	100%	770,316,069	11.24%	VIBRAN S.A.S
5	Anticipo Mano de Obra y Materiales Obra Civil	329,814,116.88	4.81%	100%	329,814,117	4.81%	OUTDOORS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S
6	Anticipo Transformadores	169,765,383.00	2.48%	0%	-	0.00%	TESLA - INDUSTRIAS ELECTROMECHANICAS MAGNETRON S.A.S.
7	Anticipo Plantas Generadora	1,059,987,976.80	15.47%	50%	529,993,988	7.73%	CUMMINS DE LOS ANDES S.A.
8	Administración, Imprevistos, Estudios Previo, Socialización	1,470,150,886.00	21.46%	80%	1,176,120,709	17.16%	GENERCOL SAS ESP - HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
9	Tableros Electricos	384,597,127.37	5.61%	0%	-	0.00%	CELCO S.A.
10	Pago Impuesto de IVA y otros	50,645,992.86	0.74%	100%	75,000,000	1.09%	DIAN
	Valores Totales Netos del pago anticipado	\$ 6,851,953,978.86	100.00%		4,904,084,386	72%	
	Descuentos por Retenciones (ICA-Retefuente)	166,766,799					
	Contribucion Especial (5%)	340,065,399					
	Retegarantias (10%)	680,130,799					
	Total Neto recibido	\$ 5,664,990,982.29					
	Saldo por ejecutar del anticipo	\$ 760,906,595.94					

Figura 37. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.5 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.5.1 PERSONAL DE OBRA Y PLANILLAS DE AFILIACIONES

Para el mes de abril el Consorcio Guaviare Sostenible contó con 13 profesionales multidisciplinarios, los cuales se relacionan por medio de la Figura 38, de este grupo de profesionales 12 de ellos realizaron tareas administrativas, y uno realizó trabajo de campo, para realizar las labores del replanteo de usuarios en el corregimiento de Puerto Cachicamo.

Las actividades que se realizaron en el componente de Seguridad y Salud en el trabajo se llevaron a cabo cumpliendo lo estipulado en lo contenido en el ítem No 1 “Planillas de Afiliaciones de los colaboradores / validación nivel del riesgo según actividades desarrolladas” de la lista de chequeo y cumplimiento del contrato.

Con las certificaciones y las afiliaciones Anexo 8. Certificado de pagos parafiscales, seguridad social y planillas, se evidencia el cumplimiento de este ítem, de todos los profesionales referidos en la Figura 38.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020



Consorcio

Guaviare

Sostenible

CONTROL DE MANUAL DE REQUISITOS SST

CÓDIGO: FR-SI-73

FECHA: 02/03/2022

VERSIÓN: 0

PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO:		ITEMS A CONTROLAR														
NOMBRE DE TRABAJADORES	N° CEDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL				CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL	CONTE	EXAMEN OCUPACIONAL	ESQUEMA DE VACUNACIÓN			HOJA DE VIDA	REGISTRO ENTREGA EPP	REGISTRO DE INDUCCIÓN	OBSERVACIONES
			ARL	EPS	AFP	CCF				FIEBRE AMARILLA	TETANO	COVID 19				
KURT TSCHIELTSCH	522.143	COORD. CIVIL	SI	SI	SI	SI		N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EN PROCESO DE ACTUALIZACION
FABIO SANCHEZ	1,057,584,383	DIR.PROYECTO	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FERNANDO PEÑA	12,266,613	COORD. PROYECTO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EN PROCESO DE ACTUALIZACION
PAULA JIMENEZ	1,052,414,830	ANALISTA S.S.T.	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
STEFANNY SUAREZ	1,018,433,153	PROF. SOCIAL	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAURA TORRES	1,143,867,823	COORD.S.S.T	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
MONICA ROMERO	66,906,611	APOYO ADMINISTR	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	TAPABOCAS	SI	
LUZ DARY MONTILLA	66,877,406	APOYO ADMINISTR	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	TAPABOCAS	SI	
SAMMY MERCADO	16,760,954	AUX. ADMINISTR	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	TAPABOCAS	SI	
JOAN SEBASTIAN CANTOR	1,057,274,294	ING. RESIDENTE	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	EN PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI	
VANESSA TAPIERO	1,143,830,748	PROF. AMBIENTAL	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ISABEL CRISTINA RAMIREZ	1,107,513,776	APOYO ADMINISTR	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI	N/A	SI	
MARIA PAMELA GOMEZ	43,221,476	APOYO ADMINISTR	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI	N/A	SI	

Figura 38. Control de personal Consorcio Guaviare Sostenible

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – IPER

Durante el mes de abril se dio cumplimiento al ítem No 2 de la lista de chequeo y cumplimiento del contrato, por medio de la actualización de la matriz IPER, la cual explica las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto, los riesgos y controles que se pueden contemplar, e identifica los peligros, evaluación, control, seguimiento, y comunicación de los riesgos evaluados durante las actividades a ejecutar.

Esto se realizó para cada una de las tres localidades, Miraflores, Taraira y Puerto Cachicamo, donde se desarrollarán los proyectos híbridos. Como evidencia de lo anterior se adjunta a este informe el Anexo 9 MATRIZ IPER Identificación peligros, evaluación y control de riesgos.

3.5.3 PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

En el mes de abril se realizaron tareas administrativas a excepción de un profesional que realizó el viaje al corregimiento de Puerto Cachicamo, para realizar el replanteo de usuarios.

Para esta actividad de replanteo se realizó la entrega de elementos de protección personal y el kit de prevención de Covid-19 (Figura 39), para el resto del personal se realizó entrega de tapabocas desechable.

Se ubicó punto de desinfección Figura 40 en el área administrativa dando cumplimiento al protocolo de actuación frente al Covid-19.

Con esto se dio cumplimiento al ítem No 3 de la lista de chequeo y cumplimiento del contrato, para evidencia de lo mencionado se adjunta a este informe el Anexo 10. Entrega de EPP, el cual muestra mes a mes, qué elementos de protección se le entregan al personal, dependiendo de la actividad que desarrollen y el uso de dichos elementos.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020



Figura 39. Kit de desinfección



Figura 40. Punto de desinfección, prevención Covid-19

3.5.4 MEDICINA PREVENTIVA

Se adjunta a este informe, cuadro de Excel referente a la medicina preventiva (Anexo 11. Control de vacunas), donde se relacionó todo el personal del Consorcio Guaviare Sostenible que se vinculó al proyecto durante el mes de abril, y para cada uno de estos se presenta además de sus datos personales, cargo desempeñado dentro del Consorcio, fecha de aplicación de vacunas, fabricante de la vacuna y dosis aplicadas.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.5.5 CERTIFICADOS MÉDICOS

Se adjunta a este informe, cuadro de Excel referente a los certificados médicos (Anexo 12. Exámenes médicos), donde se relacionó todo el personal del Consorcio Guaviare Sostenible que se vinculó al proyecto durante el mes de abril. Dicho anexo contiene los exámenes médicos, recomendaciones médicas, recomendaciones ocupacionales, hábitos y estilos de vida saludable, y restricciones laborales.

3.5.6 CAPACITACIÓN

En el mes de abril se realizaron tres (3) capacitaciones, conforme a las actividades realizadas del mismo mes, las cuales se evidencian en el plan de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 13. PLAN DE CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), este documento evidencia las capacitaciones planeadas y ejecutadas, número de trabajadores programados, números de trabajadores que asistieron, porcentaje de cumplimiento y calificación de la capacitación, dando así cumplimiento al ítem No 6 de la lista de chequeo.

Como evidencia de lo anterior se adjunta a este informe el registro de asistencia de las capacitaciones realizadas durante el mes de abril (Anexo 15. Registro de Capacitaciones). A continuación, se presenta el cuadro consolidado de las capacitaciones realizadas en el mes de abril.

Tema de Capacitación	Seguridad y salud en el trabajo	Fecha
Riesgo salud pública (prevención de contagio de COVID).	x	18/04/2022
Manejo integral de residuos y conservación ambiental.		15/04/2022
Riesgo biomecánico higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares.	x	11/04/2022
Socialización manual del viajero seguro. (Esta solo se le realizo al Ingeniero Residente, el cual realizo actividad de replanteo)	x	07/04/2022

Tabla 1. Consolidado de capacitaciones del mes de abril

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

También se presenta como evidencia de las actividades realizadas de las capacitaciones la imagen de la Figura 41 registro fotográfico de la capacitación impartida al personal del Consorcio Guaviare Sostenible.

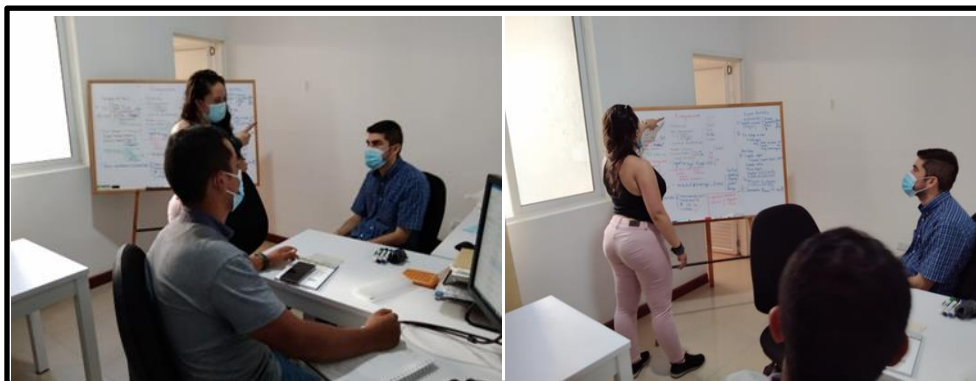


Figura 41. Capacitaciones realizadas mes abril, riesgo

3.5.7 TAREAS CRÍTICAS

Para dar respuesta al ítem No 7 de la lista de chequeo, Tareas Críticas / Coordinador de trabajo en alturas, se adjunta a este informe Certificación por parte del Consorcio Guaviare Sostenible (Anexo 16. Certificación), donde se evidencia que durante el mes de abril no se ejecutaron actividades de alto riesgo.

3.5.8 MANUALES DE DESPLAZAMIENTO A ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS – ZNIA

El día 22 de abril del presente año se solicitó vía correo electrónico a la Interventoría del proyecto, colaboración para solicitarle el Manual de Desplazamiento ZNI al IPSE. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al ítem No 8 de la lista de chequeo, referente a Manual de Desplazamiento Zonas no Interconectadas del País.

De igual forma para realizarle la capacitación al Ingeniero Residente, vinculado al replanteo de usuarios en Puerto Cachicamo, fue necesario hacer uso del Manual del Viajero seguro de HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, para socializarle como tema de capacitación la prevención de riesgos durante el desplazamiento al corregimiento de Puerto Cachicamo.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Como evidencia de lo anterior se adjunta la lista de asistencia de la capacitación del manual del viajero, Anexo 17. Registro asistencia manual del viajero.

En la imagen de la Figura 42 se muestra la portada del manual del viajero utilizado para la capacitación.



Figura 42. Manual del viajero²

² Manual del viajero, imagen propia, manual del viajero seguro proyectado por la empresa HG Ingeniería y Construcciones SAS.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.5.9 SISTEMA DE REGISTRO DE ACCIDENTES

En el mes de abril no se presentaron registros de accidentes, ya que no ocurrió ninguno. Igualmente, se aclara que en el informe del mes de febrero se envió la documentación que se tiene establecida para hacer uso de ella, en caso de que ocurra un accidente.

3.5.10 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS

En el informe del mes de marzo se envió como evidencia, la inspección del botiquín de emergencias, y de la camilla, también se realizó inspección de HSEQ, con lo anterior se dio cumplimiento al programa de inspecciones.

De acuerdo al programa de inspecciones se volverán a realizar las inspecciones en el próximo mes de mayo.

3.5.11 SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS

Previo al inicio de las actividades en Obra de los proyectos, se hará la socialización de este procedimiento.

3.5.12 SEGUIMIENTO A RETROALIMENTACIÓN DE INFORMES DE OBRA

En el mes de abril se recibió mediante oficio “01. Retroalimentación informes y solicitud documentos” comunicado por parte de ENERGUAVIARE para mejora de los documentos relacionados para el componente de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social, de acuerdo a lo anterior se realizó oficio de respuesta, donde se atendieron cada una de las observaciones planteadas, esto se referencia en el oficio enviado para revisión identificado con nombre “OF-SI-01 Respuesta oficio Consorcio Guaviare Sostenible”, enviado en primera instancia al Consorcio Inter Solar 2022, vía correo electrónico el día jueves 28 de abril de 2022.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.6.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS IPER

Se actualizó la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y control de Riesgos - IPER, a la cual se le incluyó en la clasificación de las amenazas los fenómenos naturales: Incendios, Vendavales y Tormentas Eléctricas. Ver Anexo 9 MATRIZ IPER Identificación peligros, evaluación y control de riesgos.

3.6.4 PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL ZONA SAN VICTORINO

No se realizará el aprovechamiento forestal para la red de baja tensión de la zona de San Victorino debido a que el cable a utilizar en la extensión de la red secundaria, es un cable de baja tensión, el cual tiene todos sus conductores aislados, para evidencia de esto se muestra en la figura 46 la ficha técnica del típico del cable a utilizar, en esta se resalta la especificación que referencia el fabricante del nivel de aislamiento del cable de 600 Volts de corriente alterna a una temperatura de 90 grados centígrados, mientras que en nuestra aplicación ese cable trabajará a 220 Volts de corriente alterna a una temperatura ambiente de máximo 40 grados centígrados, lo que evidencia que el cable presenta una protección de 3 veces al nivel de corriente y dos veces al nivel de temperatura , lo que traduce protección tanto para las personas como para la flora presente en la zona de San Victorino.

Adicional alo anterior se aclara que los postes que se instalarán para la extensión de la red de baja tensión tendrán en cuenta la topología del terreno y nos adecuaremos al terreno para no afectar la flora.

A continuación, en la Figura 44 se muestra la ficha técnica del cable:

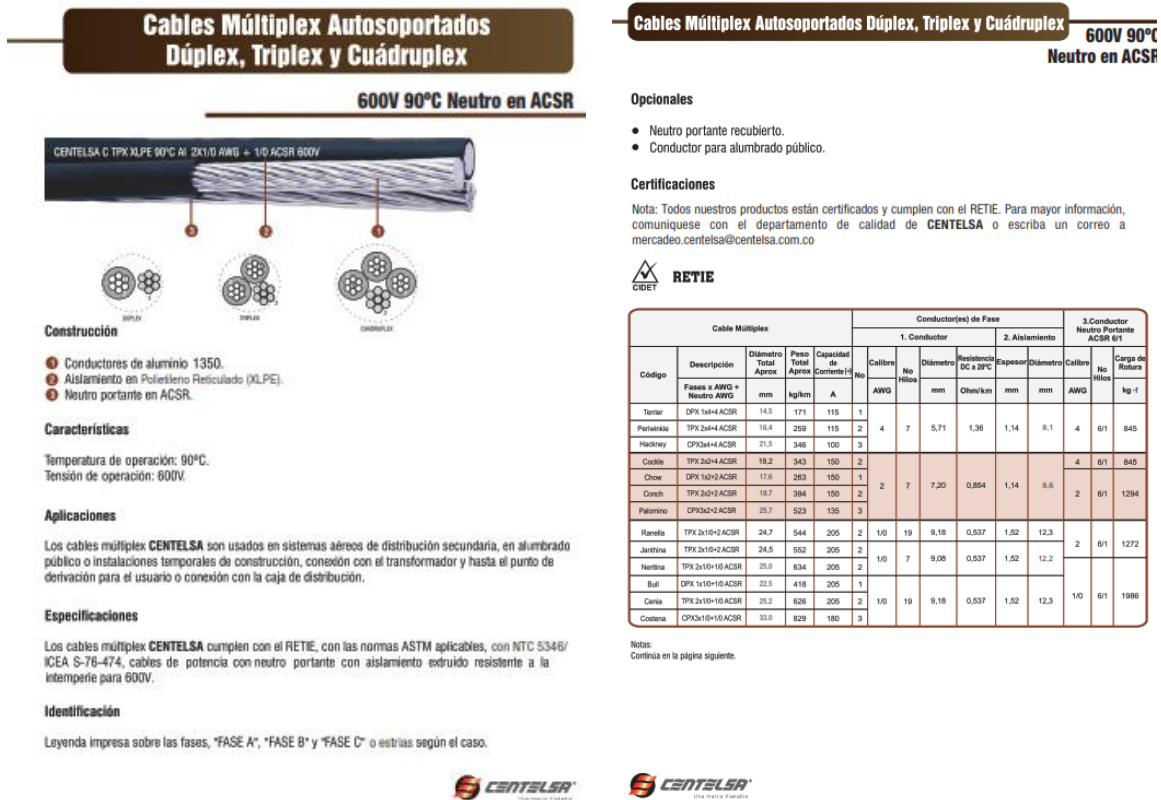



Figura 44. Ficha técnica del cable de baja tensión³

3.6.5 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CENTRAL DE GENERACIÓN TARAIRA

No se va a realizar aprovechamiento forestal para la central de generación Taraira, debido a que la Administración Municipal de Taraira es la que suministra el área donde se dispondrán los paneles solares del campo solar, como lo expresa la certificación del municipio contenida en los documentos de la estructuración del proyecto Figura 45.

³ Ficha técnica del cable de baja tensión, imagen extraída de la ficha técnica del fabricante Centelsa.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA VAUPES**

CERTIFICA:

Que el predio denominado Sub-Estacion electrica Municipal ubicado en la zona norte del casco urbano Municipal, cuenta con un area aproximada de 8.000 metros cuadrados, relacionados en area de expansion urbana excluida del area de reserva forestal y dispuesta para ser utilizada en proyectos de inversion municipal.

Enmarcada dentro de la Matricula Inmobiliaria No. 520-56381 que cubija todos los predios de propiedad del Municipio de Tairaira.

La presente certificacion se expide a los 01 dias del mes de Octubre de 2021.


ELIUD REYES BARRERA
 Secretario de Planeación Municipal




Figura 45. Certificación del predio campo solar municipio de Tairaira⁴

Adicional a lo anterior se solicitó al Ente Territorial validar la Certificación del predio mediante oficio ING-2022-TARAIRA-001, ver Figura 46.

⁴ Certificado del predio municipio de Tairaira, extraído de los documentos de la estructuración del proyecto.

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020



ING-2022-TARAIRA-001

Taraira, marzo 10 de 2022

Señores

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TARAIRA
Atn. Señor ELIUB REYES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE TARAIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIRA

FOLIO: 355

CONSORCIO Guaviare Sostenible
 Soc. Planeación e Infraestructura
 Eliub Reyes Boscana

3

ANEXOS: 8:48

RECIBO: 01-03-2022

Recibe: Emilen Boscana

Ref CONTRATO No. 139 DE 2022 "OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS".

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ENTE TERRITORIAL

Cordial saludo,

Estimado Señor Eliub, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato en referencia, el cual se encuentra en proceso de ejecución, y con el fin de precisar la solicitud manifestada en el asunto, exponemos lo encontrado en la visita de reconocimiento a la Planta de Generación del municipio los días 9 y 10 de marzo de 2022.

- Se revisó la cubierta de la edificación, y los 42 paneles que estaban previstos en la Estructuración, en esa área, se conservan.
- Con respecto a los paneles que estaban en el interior del cerramiento existente, el señor Julio Quintero jefe del área de servicios públicos, considera pertinente la reubicación, ya que la administración municipal tiene previsto la construcción de un hangar para la instalación de maquinaria de la alcaldía, e igualmente dejar un área adecuada cubierta, para la instalación de las dos plantas que son retiradas del sistema de generación.


Cra 64A #5-30 Cali, Valle del Cauca


consorcioguaviareostenible@gmail.com

Figura 46. Oficio solicitud certificación del Ente Territorial Taraira

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

3.6.6 CONTROL DE EMISIONES

Para realizar el control de emisiones se tendrá como requisito en la solicitud de documentos de contratación de servicios logísticos o de transporte que los vehículos que se utilicen en las actividades de obra cuenten con la revisión técnico mecánica vigente y certificado de emisiones. Adicional se relacionará el listado de los vehículos automotores del proyecto con las respectivas licencias de tránsito y revisión técnico mecánica vigente.

3.6.7 ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS

Para la adquisición de los materiales pétreos, los relacionaremos cuando demos comienzo a las actividades operativas, más sin embargo se tiene contemplado que se realizarán las compras en establecimientos comerciales que cuenten con los permisos de explotación minera acordes a la normatividad vigente.

3.6.8 USO DEL AGUA

Se hará recolección de aguas lluvias para la fabricación de concretos debido a que las cantidades de agua a usar son muy pocas, se está trabajando en la ingeniería de detalle de los proyectos para determinar la cantidad de metros cúbicos de agua a requerir para cada caso, se entregará el dato de la cantidad requerida en el informe del mes de mayo. El Consorcio Guaviare Sostenible tiene como compromiso implementar controles de ahorro de agua inherentes a la actividad.

3.6.9 GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Durante los trabajos a realizar en obra se hará uso de las instalaciones sanitarias existentes en cada central de generación, para la generación de aguas residuales.

3.6.10 REGISTRO DISPOSICIÓN DE GRASAS

Cuando se de inicio a las actividades de ejecución de obra blanca y adecuaciones locativas civiles, se entregarán las cantidades y las características de los elementos con el registro de salida del formato Registro de salida de residuos reciclables, peligrosos y especiales – RESPEL, que se adjunta a este informe como el Anexo 20. Registro de Salida de RESPEL Ver.0,

3.6.11 REGISTRO ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS

A partir del periodo de ejecución de obra, por medio del formato de registro de salida de residuos reciclables, peligrosos y especiales – RESPEL, que se adjunta a este

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

informe como el Anexo 20. Registro de Salidas de RESPEL Ver.0, se relacionarán las cantidades de residuos generados.

3.6.12 PROTOCOLO RESPEL - REGISTRO DE SALIDA DE RESIDUOS RECICLABLES, PELIGROSOS Y ESPECIALES

Se envía por medio del Anexo 21. PROTOCOLO RESPEL Consorcio Guaviare Sostenible, el documento guía para el manejo y disposición final de los residuos sólidos y peligrosos.

4. COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación que existirán dentro de la obra, con oficina central y con el cliente serán por correo electrónico, correo escrito, whatsapp corporativo o llamadas telefónicas.

CONTACTO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Fabio Alexander Sanchez	Director del Proyecto	3104153720	fabio.sanchez@genercol.com.co
Fernando Peña	Coordinador del Proyecto	3165144666	f.pena@genercol.com.co

Tabla 3 .Líneas de contacto Consorcio Guaviare Sostenible

4.1 CORRESPONDENCIA

Durante el mes de abril se realizaron comunicaciones por parte de la interventoría y el contratista, a continuación, se relacionan clasificadas en correspondencia enviada y Recibida.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

4.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO A	FECHA
1	INFORME DE MARZO SST-MA PARA CONSORCIO GUAVIARE	Consortio Intersolar 2022	07/04/2022
2	Informe mes marzo contrato 139 de 2022	Consortio Intersolar 2022	08/04/2022
3	DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS	Consortio Intersolar 2022	08/04/2022
4	Matriz de partes Interesadas Proyecto No. 139 de 2022	Energuaviare	16/04/2022
5	RE: Informe mes marzo contrato 139 de 2022	Consortio Intersolar 2022	19/04/2022
6	OC_Miraflores Guaviare	Energuaviare	19/04/2022
7	C-139_Ordenes de Compra TARAIRA	Energuaviare	19/04/2022
8	C-139_OC_Cachicamo	Energuaviare	19/04/2022
9	RE: Reunión seguimiento quincenal, mesa técnica- compromisos 18-04-22	Energuaviare	19/04/2022
10	Respuesta a solicitud informe formato de Excel	Energuaviare	20/04/2022
11	RV: Informe de Replanteo Proyecto Híbrido Taraira (Para revisión)	Consortio Intersolar 2022	21/04/2022
12	RV: Informe de Replanteo Proyecto Híbrido Puerto Cachicamo (Para revisión)	Consortio Intersolar 2022	21/04/2022
13	Manuales de Desplazamiento ZNI	Consortio Intersolar 2022	22/04/2022
14	Documentos anexos Informe de Replanteo	Consortio Intersolar 2022	25/04/2022

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

	Proyecto Híbrido Puerto Cachicamo		
15	Informe de Replanteo Taraira v2	Consorcio Intersolar 2022	25/04/2022
16	Respuesta a oficio ENERGUAVIARE retroalimentación de informes	Consorcio Intersolar 2022	28/04/2022
117	Solicitud de Prórroga Contrato 139 de 2022	Consorcio Intersolar 2022	28/04/2022
18	Informe de Replanteo Cachicamo Vr3	Consorcio Intersolar 2022	29/04/2022

Tabla 4. Correspondencia enviada mes abril

4.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO A	FECHA
1	Reunión seguimiento quincenal, mesa técnica-compromisos 18-04-22	Consorcio Guaviare Sostenible	19/04/2022
2	RE: Informe mes marzo contrato 139 de 2022	Consorcio Guaviare Sostenible	19/04/2022
3	Informe mensual - marzo contrato 139&137- matriz excel	Consorcio Guaviare Sostenible	19/04/2022
4	Observaciones del informe de replanteo del Híbrido de Taraira	Consorcio Guaviare Sostenible	21/04/2022
5	oficio 001- Retroalimentación informes y solicitud documentos	Consorcio Guaviare Sostenible	22/04/2022
6	Fwd: Observaciones del informe de Replanteo del Híbrido de Cachicamo	Consorcio Guaviare Sostenible	22/04/2022
7	Fwd: Aclaración - Replanteo Taraira	Consorcio Guaviare Sostenible	25/04/2022

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

8	RV: Observaciones del Informe del híbrido de Miraflores	Consortio Guaviare Sostenible	25/04/2022
9	Informe de Replanteo Miraflores v2	Consortio Guaviare Sostenible	26/04/2022
10	Oficio No.CIS-ADM001-018 FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA	Consortio Guaviare Sostenible	28/04/2022
11	Oficio No.CIS-ADM001-020 solicitud de prórroga	Consortio Guaviare Sostenible	29/04/2022

Tabla 5. Correspondencia recibida mes abril

5. NOVEDADES PRESENTADAS

NOVEDAD PRESENTADA	PLAN DE RESPUESTA IMPLEMENTADO
Tiempo de suministro del clúster de baterías de más de 30 semanas.	Se expone la causa de fuerza mayor en comité de obra del 18 de abril de 2022, y se presenta solicitud de prórroga al contrato el día 28 de abril de 2022.
Tiempo de suministro de los generadores de más de 30 semanas.	Se expone la causa de fuerza mayor en comité de obra del 18 de abril de 2022, y se presenta solicitud de prórroga al contrato el día 28 de abril de 2022.

Tabla 6. Cuadro de novedades mes de abril

6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE MAYO

Las actividades programadas para el mes de mayo son:

1. Entrega de los planos de la ingeniería de detalle del proyecto híbrido Miraflores.
2. Entrega de los planos de la ingeniería de detalle del proyecto híbrido Taraira.
3. Entrega de los planos de la ingeniería de detalle del proyecto híbrido Puerto Cachicamo.
4. Inicio alistamiento obra civil en campo, para los proyectos de Miraflores, Taraira y Puerto Cachicamo.

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

7. CONCLUSIONES

- Se presentó solicitud de prórroga ante la Interventoría del contrato, para solicitar aprobación ante la supervisión del contrato, para poder ampliar el plazo de ejecución del proyecto, debido a la causa de fuerza mayor por la contingencia de los tiempos de entrega de los equipos de importación.
- Se presentaron las características técnicas de los equipos para aprobación de la Interventoría del proyecto.
- Fueron aprobados por parte de la Interventoría del proyecto las características técnicas de los equipos presentados.
- Se recibió el pago anticipado el día 07 de abril de 2022.
- Se realizaron las órdenes de compra de los equipos de importación.
- Se realizaron los anticipos de los equipos de importación.
- Se presentaron y fueron aprobados los informes de replanteo de los proyectos híbridos de Miraflores, Taraira y Puerto Cachicamo por parte de la Interventoría del proyecto.
- Se realizó el informe de socialización del proyecto, de acuerdo a lo solicitado en el alcance del contrato.
- Se actualizó y se presentó la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER.
- Se realizaron las capacitaciones programadas al personal del Consorcio Guaviare sostenible, durante el mes de abril.
- Se realizó seguimiento y control a las actividades programadas en el cronograma del componente ambiental durante el mes de abril.

8. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 139 de 2022

Anexo 2. CIS-ADM001-021

Anexo 3. Formato de aprobación de especificaciones Miraflores

Anexo 4. Formato aprobación de especificaciones Taraira - Vr2

Anexo 5. Formato aprobación de especificaciones Cachicamo - Vr1

Anexo 6. Informe de socialización - Contrato 139 de 2022

Anexo 6.1 Acta reunión socialización Taraira

Anexo 6.2. Acta de conformación de veeduría ciudadana Taraira

Anexo 6.3. Acta reunión socialización Cachicamo

Anexo 6.4. Acta de conformación de veeduría ciudadana cachicamo

	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Anexo 7. Encuesta satisfacción socializaciones V.0

Anexo 8. Certificado de pagos parafiscales, seguridad social y planillas

Anexo 9 MATRIZ IPER Identificación peligros, evaluación y control de riesgos

Anexo 10. Entrega de EPP

Anexo 11. Control de vacunas

Anexo 12. Exámenes médicos

Anexo 13. PLAN DE CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo 14. PLAN DE CAPACITACIONES MEDIO AMBIENTE

Anexo 15. Registro de Capacitaciones

Anexo 16. Certificación

Anexo 17. Registro asistencia manual del viajero

Anexo 18. Registro asistencia manejo ambiental de residuos


Anexo 19. Cronograma Actividades Componente Ambiental Consorcio Guaviare Sostenible

Anexo 20. Registro de Salud de RESPEL Ver.0

Anexo 21. PROTOCOLO RESPEL Consorcio Guaviare Sostenible

 Consorcio Guaviare Sostenible	INFORME MENSUAL	CÓDIGO: FR-DC-016
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 26/08/2020

Cordialmente,



DIDIER SNEYDER VILLAMIL RIOS

Representante Legal

CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE

Proyecto	Elaboró	Revisó	No. de páginas	Anexos
Fernando Peña	Fernando Peña	Fabio Sanchez	(67)	(21)
