

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	
			FECHA	02/07/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA		PERIODO MES: jun-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 (Indique el número del acta)			ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)
			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,005,706,095		
			FIRMA		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-jul-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO MONROY		13-jul-2022. Ajuste al formato seguimiento programa inversión y soportes preacta de obra.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-jul-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE E. SANTOS		19-jul-2022 El contratista presenta el acta de obra con los ajustes solicitados.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-jul-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO MONROY		19-jul-2022 Interventoría devuelve el acta de obra por la cantidad presentada en el ítem 630.3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26-jul-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GERMAN GÓMEZ T.		26-jul-2022 El contratista retorna el acta de obra con el ajuste solicitado.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17-ago-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO FERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18-ago-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18-ago-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ILLICH BRICEÑO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE OBRA No.: 978 DE 2021					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES NIT. 901.474.028-8					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS NACIONALES					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1,035,226,739 VALOR EN LETRAS: MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: de Recibo Parcial de Obra No. 13 DEL PERIODO JUNIO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)					
Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO		Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO		Firma Firmado digitalmente por ILLICH BRICEÑO MARTINEZ	
Nombre: Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: Ing. Ilich Ignacio Briceño Martínez Matrícula profesional No.: 25202-117205 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	
Firma Nombre: Arq. Liliana Ivonne Orjuela Díaz Matrícula Profesional No.: 68700-63803 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:					
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					



CONSORCIO VIAS NACIONALES

NIT 901474028 - 8

Responsable de Iva
Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE
6939255

CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

ncamargo@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO: VENCIMIENTO: 2022-08-24

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-07-25 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-978 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 13- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN-SOACHA-SACAMA-LA CABUYA-PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RE	1	\$ 397,104,688.00	0	0	\$ 397,104,688.00	\$ 397,104,688.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 79,420,937.00	0	0	\$ 79,420,937.00	\$ 79,420,937.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 19,855,235.00	0	0	\$ 19,855,235.00	\$ 19,855,235.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 19,855,235.00	19	0	\$ 19,855,235.00	\$ 23,627,730.00
5	05	76	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS- AVANCE: 47,12%	1	\$ 489,470,000.00	19	0	\$ 489,470,000.00	\$ 582,469,300.00

Cantidad de líneas: 5

Notas de la factura

PERIODO: JUNIO 2022

AMORTIZACION ANTICIPO 6,10% \$67,251,151

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00; 978 DE 2021; lorjuela@invias.gov.co #

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES

NIT: 901.474.028-8

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98461

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL:	\$ 1,005,706,095.00
IVA:	\$ 96,771,795.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 67,251,151.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,035,226,739.00

SON: UN MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 96,771,795.00



Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

1

1DE3

FECHA

2/07/2022

Día/Mes/Año

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL

BOYACA

ACTA N°

13

VALOR BÁSICO ACTA: \$

1,005,706,095.00

MES

jun-22

ACTA FINAL

CONTRATO No:

978 DE 2021

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABAÑA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES

RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABAÑA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABAÑA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1038 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL:

102 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

98 MESES Y 1 SEMANA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$

322,790,128,920.00


VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$


20,059,840,972.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

*/

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 de fecha 31/12/2021		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES															
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4.00	\$ 1,816,892.00	\$ 7,267,568.00	4.00	\$ 7,267,568.00		\$ -			
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13.00	\$ 1,187,326.00	\$ 15,435,238.00	13.00	\$ 15,435,238.00		\$ -			
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	8,042.00	\$ 113,989.00	\$ 916,699,538.00	8,042.00	\$ 916,699,538.00	15.00	\$ 1,709,835.00	120.00	\$ 13,678,680.00	
4	1	201-13		Remoción de canchales	m	1,254.00	\$ 69,636.00	\$ 87,323,544.00	1,254.00	\$ 87,323,544.00	16.00	\$ 1,114,176.00	59.00	\$ 4,108,524.00	
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8,000.00	\$ 4,475.00	\$ 35,800,000.00	8,000.00	\$ 35,800,000.00					
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90,504.00	\$ 12,579.00	\$ 1,138,449,816.00	90,504.00	\$ 1,138,449,816.00					
7	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	21,312.00	\$ 62,892.00	\$ 1,340,354,304.00	21,312.00	\$ 1,340,354,304.00		\$ -			
8	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,051,379.00	\$ 10,387.00	\$ 10,920,673,673.00	1,051,379.00	\$ 10,920,673,673.00	258.00	\$ 2,679,846.00	1,258.00	\$ 13,066,846.00	
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15,000.00	\$ 9,747.00	\$ 146,205,000.00	15,000.00	\$ 146,205,000.00		\$ -	2,064.00	\$ 20,117,808.00	
10	1	220-1		Terraplenes	m3	301,680.00	\$ 12,804.00	\$ 3,862,710,720.00	301,680.00	\$ 3,862,710,720.00		\$ -			
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	1,376.00	\$ 18,609.00	\$ 25,605,984.00	1,376.00	\$ 25,605,984.00		\$ -			
12	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48,500.00	\$ 7,521.00	\$ 364,768,500.00	48,500.00	\$ 364,768,500.00					
Subtotal									\$ 18,861,293,885.00		\$ 18,861,293,885.00		\$ 5,503,857.00		\$ 50,971,858.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309,750.00	\$ 927.00	\$ 287,138,250.00	459,750.00	\$ 426,188,250.00	35,323.00	\$ 32,744,421.00	356,800.00	\$ 330,753,600.00	
14	2	311-13		Afirmado	m3	32,928.00	\$ 129,940.00	\$ 4,278,664,320.00	48,928.00	\$ 6,357,704,320.00	853.00	\$ 110,838,820.00	3,098.00	\$ 402,554,120.00	
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	53,487.00	\$ 150,000.00	\$ 8,023,050,000.00	66,487.00	\$ 9,973,050,000.00					
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	130,475.00	\$ 170,000.00	\$ 22,180,750,000.00	146,475.00	\$ 24,900,750,000.00		\$ -		\$ -	
17	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6,300.00	\$ 216,357.00	\$ 1,363,049,100.00	6,300.00	\$ 1,363,049,100.00					
18	2	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13,071.00	\$ 217,561.00	\$ 2,843,739,831.00	13,071.00	\$ 2,843,739,831.00					
Subtotal									\$ 45,864,481,501.00		\$ 45,864,481,501.00		\$ 143,583,241.00		\$ 733,307,720.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
19	8	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392,145.00	\$ 2,406.00	\$ 943,500,870.00	392,145.00	\$ 943,500,870.00					
20	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740,556.00	\$ 2,848.00	\$ 2,109,103,488.00	920,556.00	\$ 2,621,743,488.00		\$ -		\$ -	
21	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118,832.00	\$ 1,849.00	\$ 219,720,368.00	178,918.00	\$ 330,819,382.00	2,373.00	\$ 4,387,677.00	92,881.00	\$ 171,736,969.00	
22	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67,863.00	\$ 800,000.00	\$ 54,290,400,000.00	72,863.00	\$ 58,290,400,000.00	231.10	\$ 184,880,000.00	9,297.20	\$ 7,437,760,000.00	
23	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2,835.00	\$ 844,484.00	\$ 2,394,112,140.00	4,235.00	\$ 3,576,389,740.00		\$ -			
24	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,575.00	\$ 72,822.00	\$ 114,694,650.00	4,575.00	\$ 333,160,650.00	388.10	\$ 28,262,218.20	8,528.00	\$ 621,026,016.00	
25	1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3,150.00	\$ 78,894.00	\$ 248,516,100.00	3,150.00	\$ 248,516,100.00					
26	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1,142.00	\$ 4,342.00	\$ 4,958,564.00	1,142.00	\$ 4,958,564.00		\$ -			
Subtotal									\$ 60,325,006,180.00		\$ 66,349,488,794.00		\$ 217,529,895.00		\$ 8,230,522,985.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
27	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105,596.00	\$ 31,883.00	\$ 3,366,717,268.00	131,596.00	\$ 4,195,675,268.00	203.80	\$ 6,497,755.40	1,196.20	\$ 38,138,445.00	
28	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21,312.00	\$ 79,917.00	\$ 1,703,191,104.00	26,312.00	\$ 2,102,776,104.00	17.40	\$ 1,390,555.80	17.40	\$ 1,390,556.00	
29	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,679.00	\$ 44,832.00	\$ 1,420,232,928.00	31,679.00	\$ 1,420,232,928.00				\$ -	
30	2	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	59,447.00	\$ 111,264.00	\$ 6,614,311,008.00	68,447.00	\$ 7,615,687,008.00	235.60	\$ 26,213,798.40	235.60	\$ 26,213,799.00	
31	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	434.00	\$ 3,064,921.00	\$ 1,330,175,714.00	834.00	\$ 2,556,144,114.00		\$ -		\$ -	
32	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,441.00	\$ 850,001.00	\$ 6,324,857,441.00	8,441.00	\$ 7,174,858,441.00		\$ -		\$ -	
33	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21,805.00	\$ 703,582.00	\$ 15,341,605,510.00	21,805.00	\$ 15,341,605,510.00	39.80	\$ 28,002,563.60	39.80	\$ 28,002,563.60	
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6,331.00	\$ 533,062.00	\$ 3,374,815,522.00	7,331.00	\$ 3,907,877,522.00					
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	698.00	\$ 491,194.00	\$ 342,853,412.00	698.00	\$ 342,853,412.00					
36	6		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	5,000.00	\$ 676,111.00	\$ 3,380,555,000.00	5,000.00	\$ 3,380,555,000.00					
37	5	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,572,492.00	\$ 5,378.00	\$ 13,834,861,976.00	2,744,492.00	\$ 14,759,877,976.00	3,685.30	\$ 19,819,543.40	3,685.30	\$ 19,819,544.00	
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de	m	2,731.00	\$ 609,158.00	\$ 1,663,610,498.00	2,731.00	\$ 1,663,610,498.00	55.00	\$ 33,503,690.00	81.00	\$ 49,341,798.00	

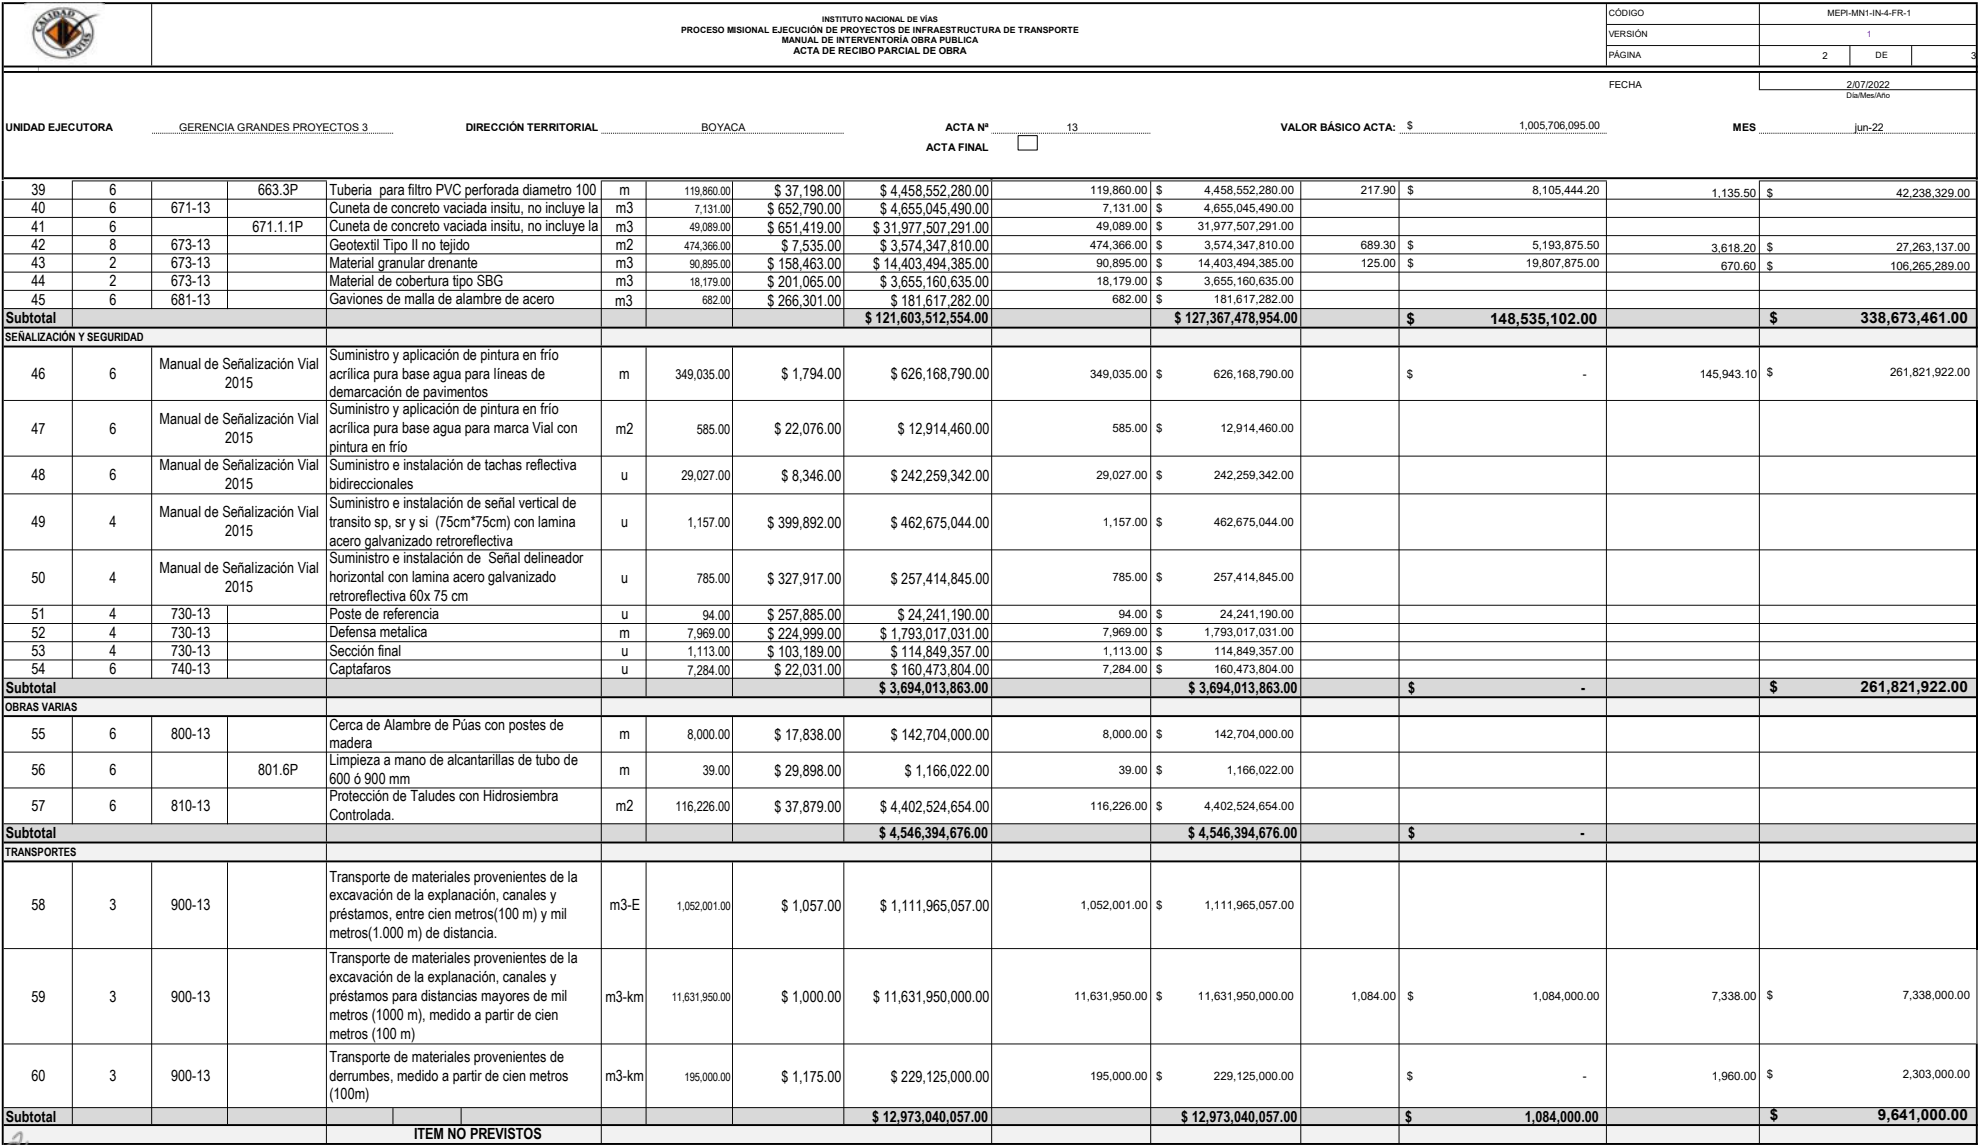

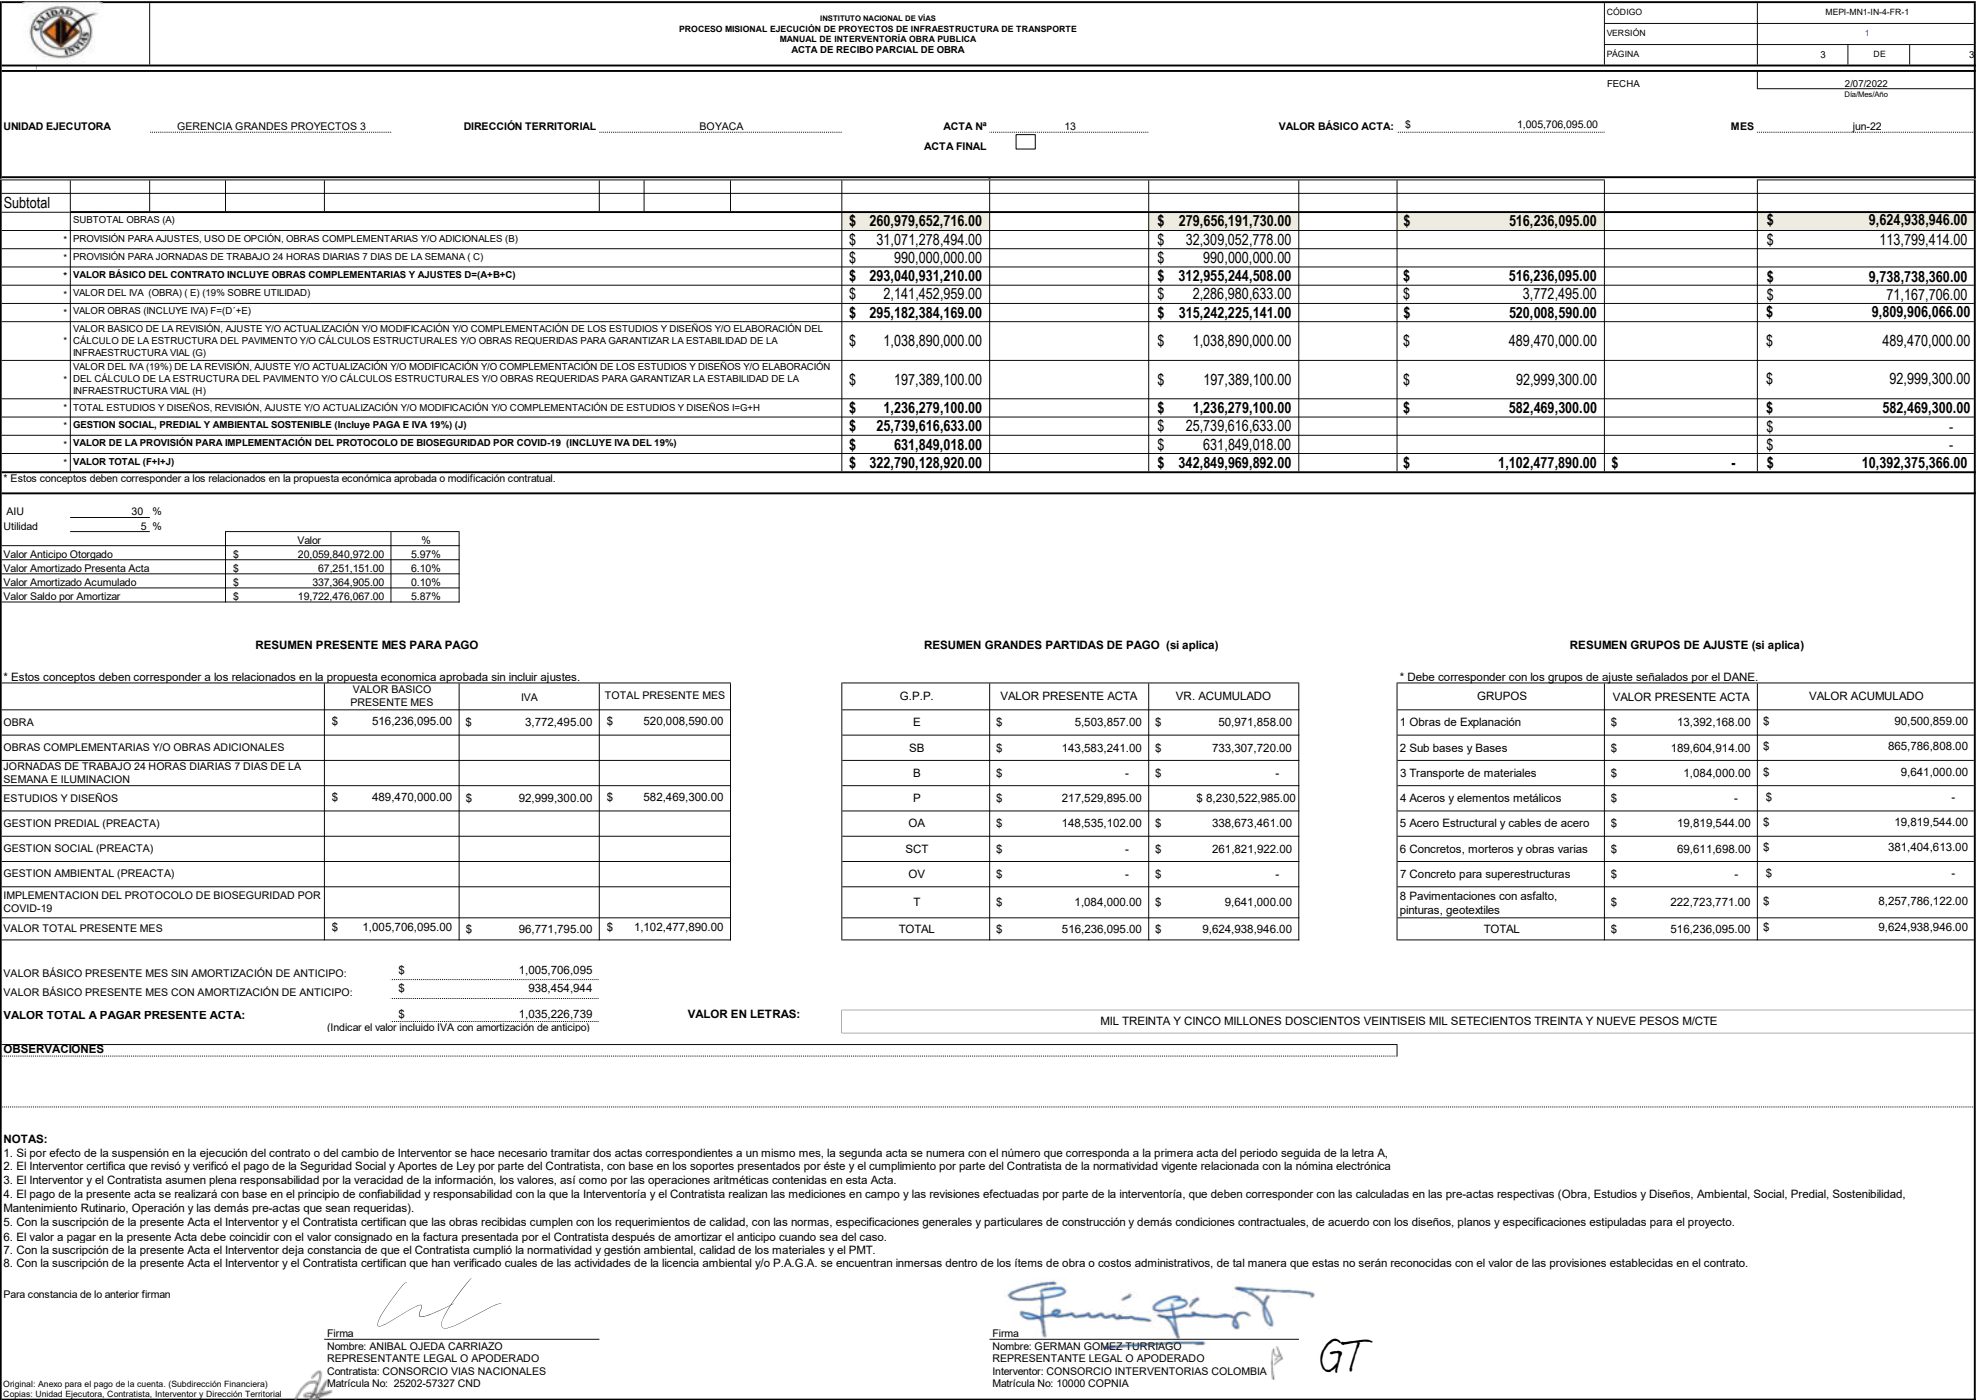



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA	☒	13	jun-22
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 288,477,066.00
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 746,749,673.00
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL ACTA							1,035,226,739.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NIÑO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula No. 1521917469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.

978 DE 2021

Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4

Acta No.

13

Valor basico

\$ 1,005,706,095.00

Período:

jun-22

Valor incluido el Iva:

\$ 1,102,477,890.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	BELEN-SOCHA-SACAMA	\$ 103,587,070.00	\$ 355,306,273.00	\$ 363,711,968.00	\$ 822,605,311.00
2	6405	SACAMA - LA CABUYA	\$ -	\$ 227,163,027.00	\$ 52,709,552.00	\$ 279,872,579.00
3	6514	PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 103,587,070.00	\$ 582,469,300.00	\$ 416,421,520.00	\$ 1,102,477,890.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	\$ 219,119,536.54	\$ 217,529,895.00
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	\$ -	
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	\$ 52,669,479.08	\$ 52,287,379.00
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	\$ 416,848,356.13	\$ 380,090,260.00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA	\$ 133,967,939.00	\$ 112,578,100.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			\$ 822,605,311.00	\$ 762,485,634.00

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	\$ -	\$ -
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	\$ 166,291,065.29	\$ 147,773,811.00
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	\$ 113,581,513.50	\$ 95,446,650.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			\$ 279,872,579.00	\$ 243,220,461.00

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	\$ -	\$ -
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO		
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			\$ -	\$ -

TOTAL			\$ 1,102,477,890.00	\$ 1,005,706,095.00
-------	--	--	---------------------	---------------------

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No: 25202-57327 CND

GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No: 10000 COPNIA



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA

7137612

FECHA DE EXPEDICIÓN

14/07/2022

FECHA DE VENCIMIENTO

31/12/2022

Pagar en:

Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
CONSORCIO VIAS NACIONALES	90147402 8	a_marrugo@kma.com.co

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 8,151,000.00	\$ 8,151,000.00
SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL PESOS.		TOTAL \$ 8,151,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

NOTA:

Se hace la aclaración de que por error involuntario se realizó un pago de más para el acta No. 13 correspondiente al mes de Junio de 2022. El excedente corresponde a la suma de Quinientos veintiseis mil pesos. (\$526.000); los cuales serán descontados en el acta No. 14 del mes de Julio de 2022.



CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Suplente, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácamá - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 1° y el 30 de junio de 2022 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022.

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA

GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO

Representante Suplente

GT

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002


Contrato: **978 de 2021**

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Junio de 2022.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de Julio de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Junio de 2022. Para constancia se firma a los 05 días del mes de Julio de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,


ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S CON
NIT. 830.094.920-5**

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de junio de 2022.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los siete (7) días de julio de 2022, en el marco del contrato No. **CTO-978 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 05 de Julio de 2022

A QUIEN INTERESE


Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Junio del 2022.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO

REVISOR FISCAL

C.C.NO. 1.128.053.618

T.P.NO. 164951-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B 0 A 8 7 1 B 1 2 0 4 7 0 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
