



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

3



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA														
Contrato N°:		078 DE 2022		1 de agosto de 2022		a		31 de agosto de 2022		Contratista:		HUGO FERRIEL DIAZ PLAZAS		
Periodo:										Interventor:		SINCO LTDA.		
Director de obra:										Director de Interventoría:		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		Valor Total	CANTIDADES		VALORES		SALDOS				
			Cantidad	Valor unitario		Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor				
10 OBRAS EXTERIORES														
10.01	Suministro e instalación de grama	M2	52,33	\$ 12,046,00	\$ 630,367,18								\$ 365,358,376,93	
10.02	Suministro e instalación sanitaria prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	60,78	\$ 63,303,00	\$ 3,847,558,34								\$ 630,367,18	\$ 630,367,18
10.03	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	M2	52,33	\$ 12,922,00	\$ 676,208,26								\$ 3,847,558,34	\$ 3,847,558,34
10.04	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración, textos y logo simbólicos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x257mm	UND	71,00	\$ 28,799,00	\$ 2,044,729,00								\$ 676,208,26	\$ 676,208,26
			SUBTOTAL		\$ 7,198,860,78								\$ 2,044,729,00	\$ 2,044,729,00
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS														
11.01	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapado de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	66,08	\$ 8,476,00	\$ 560,094,08								\$ 7,198,860,78	\$ 7,198,860,78
11.02	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 1". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapado de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	97,55	\$ 13,912,00	\$ 1,357,115,60								\$ 560,094,08	\$ 560,094,08
11.03	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	29,00	\$ 56,357,00	\$ 1,634,643,00								\$ 1,357,115,60	\$ 1,357,115,60
11.04	Acornada hidráulica 1/2". Incluye collar de demarcación, el registro de incorporación, manguera de demarcación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	1,00	\$ 644,359,00	\$ 644,359,00								\$ 1,634,643,00	\$ 1,634,643,00
11.05	Acornada hidráulica 1". Incluye collar de demarcación, el registro de incorporación, manguera de demarcación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	4,00	\$ 957,353,00	\$ 3,829,412,00								\$ 644,359,00	\$ 644,359,00
11.06	Suministro e instalación tanque A.P. plástico de 2.000 L incluye accesorios	UND	1,00	\$ 1,838,435,00	\$ 1,838,435,00								\$ 3,829,412,00	\$ 3,829,412,00
11.07	Suministro e instalación tanque A.P. plástico de 1.000 L incluye accesorios	UND	1,00	\$ 691,135,00	\$ 691,135,00								\$ 1,838,435,00	\$ 1,838,435,00
11.08	Suministro e instalación tanque A.P. plástico de 500 L incluye accesorios	UND	2,00	\$ 446,686,00	\$ 893,372,00								\$ 691,135,00	\$ 691,135,00
			SUBTOTAL		\$ 11,448,844,68								\$ 893,372,00	\$ 893,372,00
12 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LUVIAS														
12.01	Construcción de caja domiciliar para acanalillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formateo, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	\$ 419,738,00	\$ 2,098,690,00								\$ 11,448,844,68	\$ 11,448,844,68
12.02	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formateo, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	\$ 689,971,00	\$ 3,449,855,00								\$ 2,098,690,00	\$ 2,098,690,00
12.03	Construcción de caja domiciliar para acanalillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formateo, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	4	\$ 920,162,00	\$ 3,680,728,00								\$ 3,449,855,00	\$ 3,449,855,00
12.04	Construcción de trampa de grasas para acanalillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formateo, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	1	\$ 1,102,035,00	\$ 1,102,035,00								\$ 3,680,728,00	\$ 3,680,728,00
12.05	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	46,3	\$ 26,198,00	\$ 1,212,967,40								\$ 1,102,035,00	\$ 1,102,035,00
12.06	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	10,25	\$ 35,193,00	\$ 360,728,25								\$ 1,212,967,40	\$ 1,212,967,40
12.07	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	133,33	\$ 47,230,00	\$ 6,297,175,90								\$ 360,728,25	\$ 360,728,25
12.08	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 5", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	65,62	\$ 94,627,00	\$ 6,209,423,74								\$ 6,297,175,90	\$ 6,297,175,90



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

3



Contrato N°:		078 DE 2022		1 de agosto de 2022		31 de agosto de 2022		HUGO FERNEL DIAZ PLAZAS		SINCO LTDA.		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	
Periodo:													
Director de obra:													
BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA													
ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES		VALORES		SALDOS				
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado este mes	Acumulado total			
14.16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	UND	9,00	\$ 120,149	\$ 1.153.341,00							9,00	\$ 1.153.341,00
14.17	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	UND	11,00	\$ 262,094	\$ 2.883.034,00							11,00	\$ 2.883.034,00
14.18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	UND	11,00	\$ 89,164	\$ 980.804,00							11,00	\$ 980.804,00
14.19	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	UND	11,00	\$ 383,109	\$ 4.214.190,00							11,00	\$ 4.214.190,00
14.2	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UND	1,00	\$ 2.959,847	\$ 2.959.847,00							1,00	\$ 2.959.847,00
14.21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopol 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	28,00	\$ 155,602	\$ 4.356.856,00							28,00	\$ 4.356.856,00
14.22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopol 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	7,00	\$ 155,602	\$ 1.089.214,00							7,00	\$ 1.089.214,00
OTROS													
14.23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UND	1,00	\$ 2.606,686	\$ 2.606.686,00							1,00	\$ 2.606.686,00
14.24	Canalización	ML	60,00	\$ 24,759	\$ 1.487.940,00							60,00	\$ 1.487.940,00
14.25	Desmonte e instalación de fierros existentes	UND	6,00	\$ 85,320	\$ 511.920,00							6,00	\$ 511.920,00
			SUBTOTAL		\$ 98.610.435,00								\$ 98.610.435,00
15	VIARIOS												
15.01	Aseo general de obra	M2	910,38	\$ 1.706,00	\$ 1.553.108,28							910,38	\$ 1.553.108,28
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA			SUBTOTAL		\$ 1.553.108,28								\$ 1.553.108,28
			ADMINISTRACION		\$ 1.152.385.032,04								\$ 1.152.385.032,04
			IMPREVISTOS		\$ 265.043.957,37								\$ 265.043.957,37
			UTILIDAD		\$ 23.047.300,64								\$ 23.047.300,64
			TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		\$ 57.618.251,60								\$ 57.618.251,60
			TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		\$ 1.481.074.541,65								\$ 1.481.074.541,65
			TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA		\$ 5.000.000,00								\$ 5.000.000,00
			RETE		\$ 6.000.000,00								\$ 6.000.000,00
			PGO (SST - Biosseguridad- RMA-PMI)		\$ 10.303.130,00								\$ 10.303.130,00
			TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO		\$ 1.519.487.671,65								\$ 1.519.487.671,65
RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA													
VIR INICIAL CONTRATO:			\$		1.519.487.671,65		VIR ANTICIPO:		\$		455.840.301,50		
VIR ADICIONES:			\$				% ANTICIPO:				30%		
VIR ACTUAL CONTRATO:			\$		1.519.487.671,65		% RETEGARANTIA:						
N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO			
TOTAL				\$		\$	\$	\$	\$				
RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA													
VIR INICIAL CONTRATO:			\$		120.761.962,00		VIR ANTICIPO:		\$		36.228.588,60		
VIR ADICIONES:			\$				% ANTICIPO:				30%		
VIR ACTUAL CONTRATO:			\$		120.761.962,00		% RETEGARANTIA:						
N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO			
TOTAL				\$		\$	\$	\$	\$				



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	2	Periodo comprendido entre el:		1 de julio de 2022	y el:	31 de julio de 2022			
CONTRATO DE INTERVENTORIA							CONTRATO DE OBRA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA						CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
Contrato N°:	080 DE 2022						078 DE 2022		
Contratista:	SINCO LTDA.						HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES						OCHO (8) MESES		
Fecha de Inicio:	31 de mayo de 2022						31 de mayo de 2022		
Fecha de Terminación:									
Fecha de Suspensión:									
Fecha de Reinicio:									
Valor Inicial:	\$	120.761.962,00				\$	1.519.467.671,65		
Valor adicional:	\$	-				\$	-		
Valor total:	\$	120.761.962,00				\$	1.519.467.671,65		
Valor pagado:	\$	-				\$	-		
Valor por pagar:	\$	120.761.962,00				\$	1.519.467.671,65		
Nombre Supervisor:							SINCO LTDA.		
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA							CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)			VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA	DESDE			HASTA			
Cumplimiento		23/03/2022	11/08/2023	\$ 12.076.197,00	Cumplimiento del contrato	31/05/2022	27/07/2023	\$ 151.946.767,20	
Anticipo		23/03/2022	11/08/2023	\$ 36.228.589,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	31/05/2022	27/07/2023	\$ 455.840.302,00	
Prestaciones sociales		23/03/2022	11/02/2026	\$ 24.152.393,00	Pago de salarios, prestaciones soc. e ind.	31/05/2022	27/06/2026	\$ 75.973.384,00	
Calidad del servicio		3/12/2022	11/02/2028	\$ 24.152.393,00	Calidad de elementos, bienes y equipos que entregue el contratista	31-02-22	21/01/2024	\$ 303.893.535,00	
Responsabilidad Civil Extracontractual					Estabilidad y calidad de la obra	26/01/2023	27/01/2028	\$ 303.893.535,00	

Rev.
14-sept-2022
Pollack



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2



RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago anticipo interventoría	17/06/2022	\$ 36.228.588,60	Pago anticipo construcción galería municipal.	29/06/2022	\$ 455.840.301,50
		\$ 36.228.588,60			\$ 455.840.301,50

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	1,42%	7,66%	9,10%	% Programado	\$ 21.646,63	\$ 138.231,14	\$ 159.877,77	9,10%
% Ejecutado	1,89%	9,88%	11,77%	% Ejecutado	\$ 28.654,79	\$ 152.598,43	\$ 181.243,22	11,77%
Diferencia	0,46%	2,20%	2,66%	Diferencia	\$ 7.008,16	\$ 14.357,29	\$ 21.365,45	2,66%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante este período se figura acero para los cimientos y estructura.

El contratista realiza actividades diarias relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN	
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL
PROFESIONAL	2		0,00%	66,67%	PROFESIONAL		3	0,00%	18,75%
TÉCNICO	1		0,00%	33,33%	TÉCNICO	2		12,50%	0,00%
M.O.N.C.			0,00%	0,00%	M.O.N.C.	11		66,75%	0,00%
TOTAL	0	3	0,00%	100,00%	TOTAL	13	3	81,25%	18,75%
TOTALES	3		100,00%		TOTALES	16		100,00%	




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2




TIPO DE EMPLEO




■ PROFESIONAL ■ TÉCNICO ■ M.O.N.C.

GENERACIÓN DE EMPLEO




■ LOCAL ■ NO LOCAL

TIPO DE EMPLEO




■ PROFESIONAL ■ TÉCNICO ■ M.O.N.C.

GENERACIÓN DE EMPLEO



■ LOCAL ■ NO LOCAL

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

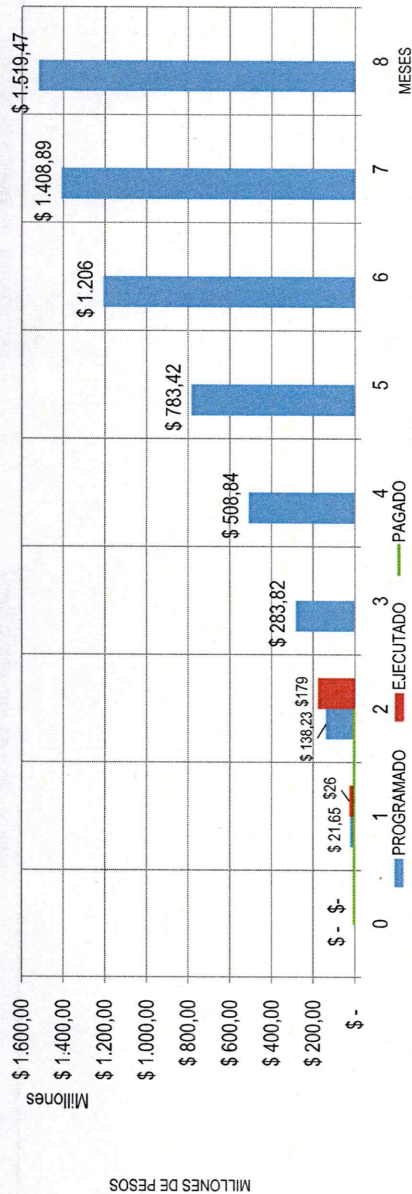

MILLONES DE PESOS

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

2





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Los escombros producto de la demolición de muros y estructura existente, aún siguen en sitio de obra. Una vez se tenga el sitio autorización para la disposición final de este material se realizara el retiro.

Conforme a el replanteo de los ejes del proyecto se evidenció que hay diferencias en lo contemplado en los planos y lo existente, por tanto, se realizó ajuste a la distribución con el fin de quede acorde con el área disponible en campo.

Se esta trabajando en balance presupuestal para presentar a la supervisión.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Angela Matilde Zambrano Cargo: Profesional de apoyo Interventoria	Nombre: Jairo Garcia Ramirez Cargo: Residente de Interventoria	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoria



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA															
Contrato N°:		078 DE 2022		Contratista:		HUGO FERNEL DIAZ PLAZAS									
Periodo:		1 de julio de 2022		Inventor:		SINCO LTDA.									
Director de obra:		a		Director de interventoría:		CARLOS ARTURO QUIZA CANACHO									
ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		Valor Total	CANTIDADES			VALORES		SALDOS				
			Cantidad	Valor unitario		Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor		
6,03	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de venturaz, frutas y bodega.	M2	734,05	\$	26.534,00	\$	19.477.548,04				\$	-	734,06	\$	19.477.548,04
6,04	Suministro e instalación de guardaesoba recto (Incluye boquilla y mortero de pega).	ML	577,37	\$	76.624,00	\$	44.240.398,88				\$	-	577,37	\$	44.240.398,88
6,05	Suministro e instalación de guardaesoba recto (Incluye boquilla y mortero de pega).	M2	244,16	\$	15.619,00	\$	3.813.535,04				\$	-	244,16	\$	3.813.535,04
6,06	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla.	ML	43,57	\$	47.775,00	\$	2.081.556,75				\$	-	43,57	\$	2.081.556,75
6,07	Suministro e instalación de guardaesoba recto para piso cerámico beige (Incluye boquilla y mortero de pega).	M2	56,15	\$	15.619,00	\$	877.066,85				\$	-	56,15	\$	877.066,85
6,08	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL. Enmallado 45,6 x 45,6 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla.	ML	64,48	\$	48.693,00	\$	3.134.308,32				\$	-	64,48	\$	3.134.308,32
6,09	Suministro e instalación de guardaesoba recto para piso beige GL. Enmallado (Incluye boquilla y mortero de pega)	M2	19,28	\$	15.619,00	\$	301.134,32				\$	-	19,28	\$	301.134,32
6,1	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33,8 x 33,8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla.	M2	48,64	\$	51.590,00	\$	2.508.851,20				\$	-	48,64	\$	2.508.851,20
6,11	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24,5 x 49 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1,80 cm	M2	129,46	\$	51.916,00	\$	6.721.046,36				\$	-	129,46	\$	6.721.046,36
6,12	Suministro e instalación de enchape para pared color blanco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1,80 cm.	M2	62,71	\$	51.446,00	\$	3.226.178,65				\$	-	62,71	\$	3.226.178,65
6,13	Suministro e instalación de guardaesoba media caña en granito para camions, cocina y cafetería, color blanco.	ML	70,38	\$	51.330,00	\$	3.612.695,40				\$	-	70,38	\$	3.612.695,40
7	ESTUCCO Y PINTURA				SUBTOTAL	\$	148.748.377,48								
7,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura veño tipo I, para oficinas (tres manos).	M2	244,13	\$	25.400,00	\$	6.200.902,00				\$	-	244,13	\$	6.200.902,00
7,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos).	M2	1.368,10	\$	17.689,00	\$	24.164.942,90				\$	-	1.368,10	\$	24.164.942,90
8	JACABADOS				SUBTOTAL	\$	30.365.844,90								
8,01	Mecón en granito pulido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos.	ML	21,82	\$	206.002,00	\$	4.494.963,64				\$	-	21,82	\$	4.494.963,64
8,02	Suministro e instalación de mecón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	4,00	\$	1.761.635,00	\$	7.046.540,00				\$	-	4,00	\$	7.046.540,00
8,03	Suministro e instalación de góndolas.	UND	4,00	\$	10.390.000,00	\$	41.560.000,00				\$	-	4,00	\$	41.560.000,00
8,04	Suministro e instalación de puestra tipo lavapiéso baja h= 60 cm.	UND	3,00	\$	302.459,00	\$	907.377,00				\$	-	3,00	\$	907.377,00
8,05	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	162,40	\$	68.314,00	\$	11.094.193,00				\$	-	162,40	\$	11.094.193,00
9	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA				SUBTOTAL	\$	65.103.074,24				\$	-			
9,01	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anilco y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	48,72	\$	250.443,00	\$	12.201.592,56				\$	-	48,72	\$	12.201.592,56
9,02	Suministro e instalación de puertas enrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anilco y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	20,21	\$	258.357,00	\$	5.160.974,97				\$	-	20,21	\$	5.160.974,97
9,03	Suministro e instalación de ventanitas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anilco y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	23,95	\$	278.887,00	\$	6.679.343,65				\$	-	23,95	\$	6.679.343,65
9,04	Suministro e instalación de leja de barro tipo liviana	M2	734,93	\$	64.680,00	\$	47.535.272,40				\$	-	734,93	\$	47.535.272,40
9,05	Suministro e instalación de superboard firm impermeabilizado S&Acho	M2	792,14	\$	44.390,00	\$	35.091.802,00				\$	-	792,14	\$	35.091.802,00
9,06	Suministro e instalación de masilla estucada y primada	M2	734,93	\$	18.257,00	\$	13.417.617,01				\$	-	734,93	\$	13.417.617,01
9,07	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1,1 mm	KG	6.182,12	\$	17.902,00	\$	110.672.312,24				\$	-	6.182,12	\$	110.672.312,24
9,08	Suministro e instalación de cercho perfil 2C	KG	5.973,91	\$	19.942,00	\$	119.131.713,22				\$	-	5.973,91	\$	119.131.713,22
9,09	Suministro e instalación de canal ALL en ianma h= 40 x 22	ML	117,04	\$	131.587,00	\$	15.447.758,48				\$	-	117,04	\$	15.447.758,48



2



1

100

•

--	--

1	2
---	---

[illegible]

•



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

2



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°: 078 DE 2022		Contratista: HUGO FERNELI OJAZ PLAZAS									
Periodo: 1 de julio de 2022		Interventor: SINGO LTDA.									
Director de obra: al		Director de Interventoría: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO									
ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	VALORES		Cantidad	Valor
			Cantidad	Valor unitario				Acumulado Anterior	Acumulado este mes		
12.09	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	12	\$ 174.134,00	\$ 2.089.608,00			\$ -	\$ -	12,00	\$ 2.089.608,00
12.10	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 1 1/4", incluye accesorios, plancha galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y armadura horizontal y vertical.	ML	80,00	\$ 38.791,00	\$ 2.943.200,00			\$ -	\$ -	80,00	\$ 2.943.200,00
12.11	Acornillada sanitaria en tubería PVC de 8". Incluye retira y reposición de pavimento, excavación, relleno en techo común, cailla de inspección, alta y baja sanitaria PVC en 12", drenaje de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	\$ 4.110.133,00	\$ 8.220.266,00			\$ -	\$ -	2,00	\$ 8.220.266,00
12.12	Punto sanitario PVC 2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	21,00	\$ 52.373,00	\$ 1.099.833,00			\$ -	\$ -	21,00	\$ 1.099.833,00
12.13	Punto sanitario PVC 3". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	8,00	\$ 69.495,00	\$ 555.980,00			\$ -	\$ -	8,00	\$ 555.980,00
12.14	Punto sanitario PVC 4". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	11,00	\$ 95.941,00	\$ 1.055.351,00			\$ -	\$ -	11,00	\$ 1.055.351,00
				SUBTOTAL \$	40.375.901,29			\$ -	\$ -		\$ 40.375.901,29
13	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS										
13.01	Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	7	\$ 310.657,00	\$ 2.170.399,00			\$ -	\$ -	7,00	\$ 2.170.399,00
13.02	Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	\$ 307.747,00	\$ 615.494,00			\$ -	\$ -	2,00	\$ 615.494,00
13.03	Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10,00	\$ 161.640,00	\$ 1.616.400,00			\$ -	\$ -	10,00	\$ 1.616.400,00
13.04	Juego de barras para batería de baño de discapacitados.	UND	1	\$ 353.746,00	\$ 353.746,00			\$ -	\$ -	1,00	\$ 353.746,00
13.05	Suministro e instalación de estufa a gas en acero inoxidable de 4 parrillas.	UND	2	\$ 2.208.176,00	\$ 4.416.352,00			\$ -	\$ -	2,00	\$ 4.416.352,00
				SUBTOTAL \$	9.172.391,00			\$ -	\$ -		\$ 9.172.391,00
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
	REDES ELÉCTRICAS										
14.01	Llena de media tensión	UND	1,00	\$ 6.951.664,00	\$ 6.951.664,00			\$ -	\$ -	1,00	\$ 6.951.664,00
14.02	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal óvalo blando (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	\$ 599.524,00	\$ 1.199.048,00			\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.199.048,00
14.03	Montaje de estructura de alineamiento de disposición semibarrera, circuito trifásico máximo 400V (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 490.365,00	\$ 490.365,00			\$ -	\$ -	1,00	\$ 490.365,00
14.04	Suministro e instalación de línea de media tensión 2 x 1/0 ACSSR	ML	10,00	\$ 11.686,00	\$ 116.860,00			\$ -	\$ -	10,00	\$ 116.860,00
14.05	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12M x 750kg. Incluye: hincada, planada y pisonada. Red de media tensión	UND	2,00	\$ 1.486.160,00	\$ 2.972.320,00			\$ -	\$ -	2,00	\$ 2.972.320,00
14.06	ACORNILLADA EN BAJA TENSION			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -
14.06	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BTI 0.6 x 0.6 mts	UND	10,00	\$ 519.401,00	\$ 5.194.010,00			\$ -	\$ -	10,00	\$ 5.194.010,00
14.07	Suministro e instalación de acornillada trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de transformador.	UND	1,00	\$ 3.190.775,00	\$ 3.190.775,00			\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.190.775,00
14.08	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye localizador y barraje	UND	1,00	\$ 15.644.374,00	\$ 15.644.374,00			\$ -	\$ -	1,00	\$ 15.644.374,00
14.09	Acornillada Tablero Medida T.M.D. a 1 abieros monofásicos de 4 circuitos	ML	500,00	\$ 27.375,00	\$ 13.687.500,00			\$ -	\$ -	500,00	\$ 13.687.500,00
	TABLEROS			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -
14.10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	22,00	\$ 314.824,00	\$ 6.926.128,00			\$ -	\$ -	22,00	\$ 6.926.128,00
	SALIDAS			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -
14.11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UND	13,00	\$ 313.951,00	\$ 4.081.363,00			\$ -	\$ -	13,00	\$ 4.081.363,00
14.12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UND	30,00	\$ 194.701,00	\$ 5.841.030,00			\$ -	\$ -	30,00	\$ 5.841.030,00
14.13	Suministro e instalación de lámpara LED Apilaje 20 w	UND	32,00	\$ 123.063,00	\$ 3.938.016,00			\$ -	\$ -	32,00	\$ 3.938.016,00
14.14	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HP-FR-C7-LS	UND	37,00	\$ 126.360,00	\$ 4.675.320,00			\$ -	\$ -	37,00	\$ 4.675.320,00
14.15	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	UND	9,00	\$ 159.758,00	\$ 1.437.822,00			\$ -	\$ -	9,00	\$ 1.437.822,00



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

2



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°:	078 DE 2022	Interventista:	HUGO FERNEL DIAZ PLAZAS
Período:	1 de julio de 2022	Interventor:	SINDO LTDA.
Director de obra:		Director de Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
14.16	Suministro e instalación de iluminación 220 V	UND	9,00	\$ 128.149	\$ 1.153.341,00				\$ -	\$ -	\$ -	9,00	\$ 1.153.341,00
14.17	Suministro e instalación de luminaria de emergencia	UND	11,00	\$ 262.094	\$ 2.883.034,00				\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 2.883.034,00
14.18	Suministro e instalación de salita 1 empujador Regulado	UND	11,00	\$ 89.164	\$ 980.824,00				\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 980.824,00
14.19	Suministro e instalación de salita para voz y datos.	UND	11,00	\$ 383.109	\$ 4.214.199,00				\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 4.214.199,00
14.2	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UND	1,00	\$ 2.969.847	\$ 2.969.847,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.969.847,00
14.21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo, incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, libreta EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	28,00	\$ 155.602	\$ 4.356.856,00				\$ -	\$ -	\$ -	28,00	\$ 4.356.856,00
14.22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble, incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, libreta EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	7,00	\$ 155.602	\$ 1.089.214,00				\$ -	\$ -	\$ -	7,00	\$ 1.089.214,00
OTROS													
14.23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UND	1,00	\$ 2.605.686	\$ 2.605.686,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.605.686,00
14.24	Canalización	ML	60,00	\$ 24.799	\$ 1.487.940,00				\$ -	\$ -	\$ -	60,00	\$ 1.487.940,00
14.25	Desarrollo e instalación de lindes existentes	UND	6,00	\$ 85.320	\$ 511.920,00				\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 511.920,00
			SUBTOTAL		\$ 94.610.434,00				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 94.610.434,00
15	VARIOS												
15.01	Aseo general de obra	M2	910,36	\$ 1.705,00	\$ 1.553.108,28				\$ -	\$ -	\$ -	910,36	\$ 1.553.108,28
			SUBTOTAL		\$ 1.553.108,28				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.553.108,28
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA													
			ADMINISTRACION		\$ 1.152.345.027,04				\$ 19.214.206,68	\$ -	\$ -		\$ 1.161.559.233,72
			IMPUESTOS		\$ 23%				\$ 4.419.267,54	\$ 26.765.567,18	\$ 31.184.834,72		\$ 233.833.132,45
			UTILIDAD		\$ 2%				\$ 304.284,13	\$ 2.327.627,58	\$ 2.711.611,71		\$ 20.533.448,93
			TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		\$ 57.618.251,60				\$ 980.270,33	\$ 5.814.143,53	\$ 6.779.529,28		\$ 50.833.222,32
			TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRICIDAD DE LA HOULA		\$ 1.488.074.541,65				\$ 24.917.488,08	\$ 151.238.283,77	\$ 176.557.761,45		\$ 1.321.806.216,20
			REITE		\$ 3.000.000,00				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.000.000,00
			PAGO SST - Biosseguridad- PMA-PMT		\$ 6.000.000,00				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6.000.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO		\$ 1.519.467.671,65				\$ 26.277.693,93	\$ 152.288.434,02	\$ 171.856.043,95		\$ 1.340.601.627,70
RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA													
			VIR INICIAL CONTRATO:		\$ 1.519.467.671,65				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 455.840.301,50
			VIR ADICIONES:										
			VIR ACTUAL CONTRATO:		\$ 1.519.467.671,65								
			VIR ANTICIPO:						\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30%
			% ANTICIPO:										
			% RETEGARANTIA:										
RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA													
			VIR INICIAL CONTRATO:		\$ 120.761.962,00								\$ 36.228.588,60
			VIR ADICIONES:										
			VIR ACTUAL CONTRATO:		\$ 120.761.962,00								\$ 30%
			VIR ANTICIPO:						\$ -	\$ -	\$ -		
			% ANTICIPO:										
			% RETEGARANTIA:										
DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO													
Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VIR FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL				\$ -				\$ -	\$ -				



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1



RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago anticipo interventoria	17/06/2022	\$ 36.228.588,60	Pago anticipo construcción galería municipal.	29/06/2022	\$ 455.840.301,50
		\$ 36.228.588,60			\$ 455.840.301,50

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	1,42%	1,42%	% Programado	\$ -	\$ 21.646,63	\$ 21.646,63
% Ejecutado	0,00%	1,73%	1,73%	% Ejecutado	\$ -	\$ 26.277,61	\$ 26.277,61
Diferencia	0,00%	0,30%	0,30%	Diferencia	\$ -	\$ 4.630,98	\$ 4.630,98


DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante este periodo se ejecuto el 88% de las actividades PRELIMINARES tales como:

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTO: actividad que consistió en la localización precisa de todos los elementos constitutivos del proyecto, para dicha actividad se conto con la presencia de un equipo de topografía por parte del contratista.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL : se realizo la ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra con los materiales establecidos en el contrato.
- DEMOLICIÓN CON RETROEXCAVADORA, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, CIMENTACIÓN PLACAS, MAMPPOSTERIA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO: se llevo a cabo la demolición con equipo mecánico.
- DESMONTES Y LIMPIEZA TEJA DE BARRO: se realizo el desmonte y limpieza de las tejas de barro las cuales fueron aplastadas en un lugar seguro y autorizado por el municipio de Pailon.

2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA				
PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL	PERSONAL	LOCAL		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL			SI	NO	
PROFESIONAL		2	0,00%	66,67%	2	PROFESIONAL		3	3
TÉCNICO		1	0,00%	33,33%	1	TÉCNICO		2	2
M.O.N.C.			0,00%	0,00%	0	M.O.N.C.		0	13
TOTAL	0	3	0,00%	100,00%	3	TOTAL	15	3	18
TOTALES	3		100,00%			TOTALES	18		100,00%

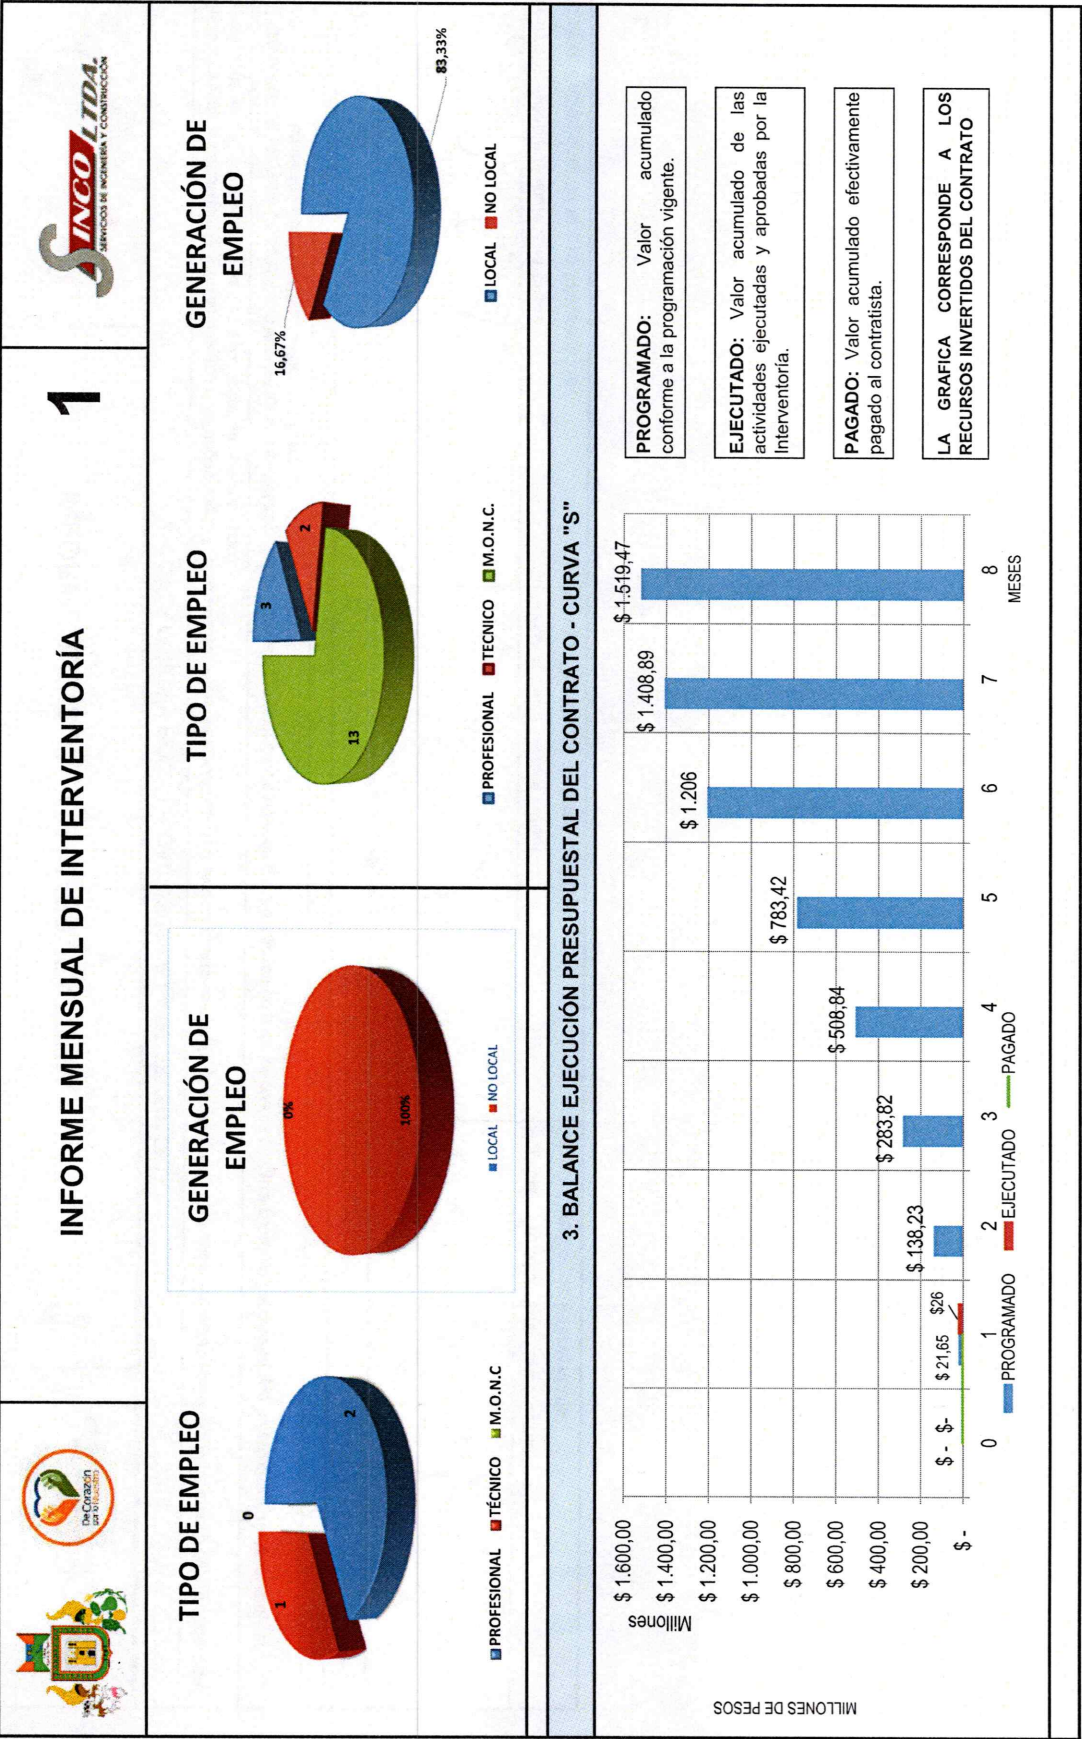



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1




4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se recomienda al contratista la ejecución de las actividades según lo programado, para la disposición final de escombros se solicita al residente de obra documento que acredite el permiso o autorización para terminar de ejecutar dicha actividad. Los escombros se tienen en obra.

Al tratarse de un proyecto de conservación y patrimonio se solicita cuidado con el desmonte de las tejas de barro y protección para los muros de tapia pisada o bahareque que fueran encontrados durante el proceso de la demolición y que fueran parte de la fachada que se debe conservar.

Se realiza seguimiento de los parámetros de SST, Calidad y ambiental de la obra.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Angela Matilde Zambrano Cargo: Profesional de apoyo Interventoría	Nombre: Jairo García Ramírez Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA



1

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA													
Contrato N°: 078 DE 2022		31 de mayo de 2022		al		30 de junio de 2022		Contratista: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		Interventor: SINCRO LTDA.			
Director de obra:		Director de Interventoría: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO											
ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1 PRELIMINARES													
1.01	Localización y replanteo	M2	910,38	\$ 2.902,00	\$ 2.641.922,76		910,38	910,38	\$ -	\$ 2.641.922,76	\$ 2.641.922,76		\$ -
1.02	Carreramiento provisional	ML	63,78	\$ 10.964,00	\$ 699.283,92		63,78	63,78		\$ 699.283,92	\$ 699.283,92		\$ -
1.03	Demolicion con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentación placas, manposteria, incluye retiro y disposicion final en sitio autorizado.	M2	910,38	\$ 18.286	\$ 16.647.208,68		650,00	650,00	\$ 11.885.900,00	\$ 11.885.900,00	\$ 11.885.900,00	260,38	\$ 4.761.308,68
1.04	Desmonte y limpieza laja de barro	M2	650,00	\$ 6.134,00	\$ 3.987.100,00		650,00	650,00	\$ 3.987.100,00	\$ 3.987.100,00	\$ 3.987.100,00		\$ -
					SUBTOTAL \$ 23.975.515,36				\$ -	\$ 19.214.206,68	\$ 19.214.206,68		\$ 4.761.308,68
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS													
2.01	Excavación mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	M3	228	\$ 23.845,00	\$ 5.436.680,00				\$ -	\$ -	\$ -	228,00	\$ 5.436.680,00
2.02	Excavacion manual sin clasificar - incluye: todo tipo de labor y disposicion final del material en	M3	74,54	\$ 43.813	\$ 3.265.821,02				\$ -	\$ -	\$ -	74,54	\$ 3.265.821,02
2.03	Relevo en medio compactado mecanicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	168,58	\$ 91.346	\$ 15.399.108,68				\$ -	\$ -	\$ -	168,58	\$ 15.399.108,68
					SUBTOTAL \$ 24.101.589,70				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 24.101.589,70
3 CIMENTOS													
3.01	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	M3	38,52	\$ 843.280,00	\$ 27.003.225,60				\$ -	\$ -	\$ -	38,52	\$ 27.003.225,60
3.02	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	M2	213,27	\$ 26.089,00	\$ 5.564.001,03				\$ -	\$ -	\$ -	213,27	\$ 5.564.001,03
3.03	Viga de cimentación y viga zapata en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta.	M3	53,59	\$ 770.580,00	\$ 41.295.382,20				\$ -	\$ -	\$ -	53,59	\$ 41.295.382,20
3.04	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado, incluye transporte, descarga, corte, figurado, amarra, alambre de amarra y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	7.701,04	\$ 7.105,00	\$ 55.331.972,40				\$ -	\$ -	\$ -	7.701,04	\$ 55.331.972,40
					SUBTOTAL \$ 129.194.881,23				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 129.194.881,23
4 ESTRUCTURA													
4.01	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye mérsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	34,45	\$ 837.293,00	\$ 28.844.743,85				\$ -	\$ -	\$ -	34,45	\$ 28.844.743,85
4.02	Viga alba en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	29,81	\$ 873.928,00	\$ 26.051.793,68				\$ -	\$ -	\$ -	29,81	\$ 26.051.793,68
4.03	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado, incluye transporte, descarga, corte, figurado, amarra, alambre de amarra y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	8.496,09	\$ 7.185,00	\$ 61.044.406,65				\$ -	\$ -	\$ -	8.496,09	\$ 61.044.406,65
4.04	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	3,29	\$ 890.606,00	\$ 2.930.033,74				\$ -	\$ -	\$ -	3,29	\$ 2.930.033,74
					SUBTOTAL \$ 118.871.037,92				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 118.871.037,92
5 MANPOSTERIA Y PÁNELES													
5.01	Muro en ladrillo hueco No.5	M2	754,95	\$ 47.703,00	\$ 36.013.379,85				\$ -	\$ -	\$ -	754,95	\$ 36.013.379,85
5.02	Panela muros 1'-4', incluye filos, carteras y dilataciones	M2	1.802,40	\$ 24.224,00	\$ 43.661.337,60				\$ -	\$ -	\$ -	1.802,40	\$ 43.661.337,60
5.03	Alfaja en concreto de 3000 psi, para jardinera	ML	14,30	\$ 42.843,00	\$ 612.654,90				\$ -	\$ -	\$ -	14,30	\$ 612.654,90
					SUBTOTAL \$ 80.287.372,35				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80.287.372,35
6 PISOS Y ENCHAPES													
6.01	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0,10m, acabado liso para interior de la plaza. Incluye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M2	86,14	\$ 95.605,00	\$ 8.235.414,70				\$ -	\$ -	\$ -	86,14	\$ 8.235.414,70
6.02	Afijado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m.	M2	621,98	\$ 78.007,00	\$ 48.518.793,68				\$ -	\$ -	\$ -	621,98	\$ 48.518.793,68



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°: 078 DE 2022

31 de mayo de 2022

d

30 de junio de 2022

Contratista:

HUGO FERNÁNDEZ PLAZAS

Interventor:

SINCO LTDA.

Director de obra:

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		Acumulado Anterior	CANTIDADES		Acumulado Anterior	VALORES		SALDOS
			Cantidad	Valor unitario		Acumulado este mes	Acumulado total		Acumulado este mes	Acumulado total	
6.03	Suministro e instalación de cerámica vitelco pesado para circulación, locales de ventanar, lavas y bodega.	M2	734.06	\$ 26.534,00	\$ 19.477.540,04			\$ -	\$ -	\$ 19.477.540,04	
6.04	Suministro e instalación de guardacochas recto (finlaye boquilla y mortero de pegaj).	M2	577.37	\$ 76.624,00	\$ 44.240.398,88			\$ -	\$ -	\$ 44.240.398,88	
6.05	Suministro e instalación de guardacochas recto (finlaye boquilla y mortero de pegaj).	M2	244.16	\$ 15.619,00	\$ 3.813.535,04			\$ -	\$ -	\$ 3.813.535,04	
6.06	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pegaj para piso y boquilla.	M2	43.57	\$ 47.775,00	\$ 2.081.556,75			\$ -	\$ -	\$ 2.081.556,75	
6.07	Suministro e instalación de guardacochas recto para piso cerámico beige (finlaye boquilla y mortero de pegaj).	M2	56.15	\$ 15.619,00	\$ 877.006,65			\$ -	\$ -	\$ 877.006,65	
6.08	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL. Enmaltado 45.3 x 45.3 cm para restaurantes y cocinas. Incluye pegaj para piso y boquilla.	M2	64.48	\$ 48.009,00	\$ 3.134.308,32			\$ -	\$ -	\$ 3.134.308,32	
6.09	Suministro e instalación de guardacochas recto para piso beige GL. Enmaltado (finlaye boquilla y mortero de pegaj).	M2	19.28	\$ 15.619,00	\$ 301.134,32			\$ -	\$ -	\$ 301.134,32	
6.1	Suministro e instalación de enchipe para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pegaj para enchipe y boquilla.	M2	48.64	\$ 51.580,00	\$ 2.508.851,20			\$ -	\$ -	\$ 2.508.851,20	
6.11	Suministro e instalación de enchipe para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pegaj para enchipe y boquilla. In= 1.80 cm	M2	129.46	\$ 51.916,00	\$ 6.721.045,36			\$ -	\$ -	\$ 6.721.045,36	
6.12	Suministro e instalación de enchipe para pared color blanco 25 x 25 cm. Incluye pegaj para enchipe y boquilla. In= 1.80 cm	M2	62.71	\$ 51.446,00	\$ 3.226.178,66			\$ -	\$ -	\$ 3.226.178,66	
6.13	Suministro e instalación de guardacochas media caña en granito para cambios, cocinas y cafetería, color blanco.	M2	70.38	\$ 51.330,00	\$ 3.612.005,40			\$ -	\$ -	\$ 3.612.005,40	
SUBTOTAL					\$ 146.748.377,38			\$ -	\$ -	\$ 146.748.377,38	
7. ESTUCO Y PINTURA											
7.01	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo 1, para oficinas (tres manos).	M2	244.13	\$ 25.400,00	\$ 6.200.902,00			\$ -	\$ -	\$ 6.200.902,00	
7.02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1, (tres manos).	M2	1.386.10	\$ 17.680,00	\$ 24.164.942,90			\$ -	\$ -	\$ 24.164.942,90	
SUBTOTAL					\$ 30.365.844,90			\$ -	\$ -	\$ 30.365.844,90	
8. ACABADOS											
8.01	Módulo en granito pulido color natural para aberturas, cocina, restaurante y lavamanos.	M2	21.82	\$ 206.000,00	\$ 4.494.593,64			\$ -	\$ -	\$ 4.494.593,64	
8.02	Suministro e instalación de muestro en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNO	4.00	\$ 1.761.635,00	\$ 7.046.540,00			\$ -	\$ -	\$ 7.046.540,00	
8.03	Suministro e instalación de pordolas.	UNO	4.00	\$ 10.390.000,00	\$ 41.560.000,00			\$ -	\$ -	\$ 41.560.000,00	
8.04	Suministro e instalación de poceta tipo lavaplatos tipo In= 60 cm.	UNO	3.00	\$ 302.485,00	\$ 907.377,00			\$ -	\$ -	\$ 907.377,00	
8.05	Suministro e instalación de codo rojo en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	162.40	\$ 68.314,00	\$ 11.094.193,60			\$ -	\$ -	\$ 11.094.193,60	
SUBTOTAL					\$ 65.103.074,24			\$ -	\$ -	\$ 65.103.074,24	
9. ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA											
9.01	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño. Incluye cerradura, mano, pintura anticorrosivo, color antracita y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	48.72	\$ 250.443,00	\$ 12.201.582,96			\$ -	\$ -	\$ 12.201.582,96	
9.02	Suministro e instalación de puertas enrollables según diseño. Incluye cerradura, mano, pintura anticorrosivo, color antracita y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	20.21	\$ 256.357,00	\$ 5.180.974,97			\$ -	\$ -	\$ 5.180.974,97	
9.03	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, mano, pintura anticorrosivo, color antracita y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	23.95	\$ 278.887,00	\$ 6.679.343,65			\$ -	\$ -	\$ 6.679.343,65	
9.04	Suministro e instalación de rija de baño tipo blanca	M2	734.93	\$ 64.880,00	\$ 47.535.272,40			\$ -	\$ -	\$ 47.535.272,40	
9.05	Suministro e instalación de superpuerta term. Impermeabilizadora. Slatelcho	M2	792.14	\$ 44.300,00	\$ 35.091.802,00			\$ -	\$ -	\$ 35.091.802,00	
9.06	Suministro e instalación de malla esticada y gelatina	M2	734.93	\$ 18.257,00	\$ 13.417.617,01			\$ -	\$ -	\$ 13.417.617,01	
9.07	Suministro e instalación de cortinas perfil 40 x 60 x 1.1 mm	KG	6.182.12	\$ 17.907,00	\$ 110.672.312,24			\$ -	\$ -	\$ 110.672.312,24	
9.08	Suministro e instalación de cortina perfil 20	KG	5.973.91	\$ 19.942,00	\$ 119.131.713,22			\$ -	\$ -	\$ 119.131.713,22	
9.09	Suministro e instalación de canal ALL en tubería hq cal 22	M.	117.04	\$ 131.987,00	\$ 15.447.786,48			\$ -	\$ -	\$ 15.447.786,48	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA												
Contrato N°:		078 DE 2022		31 de mayo de 2022		al		30 de junio de 2022		JULIO FERNELI DIAZ PLAZAS		
Periodo:										SINCO LTDA.		
Director de obra:										CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
Director de interventoría:												
ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES		VALORES			SALDOS		
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado este mes	Cantidad	Valor	
OBRAS EXTERIORES												
10	Suministro e instalación de grama	M2	52,33	\$	12.045,00	\$	630.367,18				\$	365.358.376,95
10.01	Suministro e instalación anteval prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	60,78	\$	63.303,00	\$	3.847.556,34				\$	630.367,18
10.02	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0,10m	M2	52,33	\$	12.922,00	\$	676.208,26				\$	3.847.556,34
10.03	Suministro e instalación de señal en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble taz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración, todos y logo símbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x25mm	UND	71,00	\$	20.750,00	\$	2.044.725,00				\$	676.208,26
11	INSTALACIONES HIDRÁULICAS					\$	7.198.880,78				\$	2.044.725,00
11.01	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, lapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	66,08	\$	4.475,00	\$	560.094,08				\$	7.198.880,78
11.02	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 1", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, lapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	97,55	\$	13.912,00	\$	1.357.115,00				\$	560.094,08
11.03	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	29,00	\$	55.367,00	\$	1.634.643,00				\$	1.357.115,00
11.04	Acornada hidráulica 1/2", incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	1,00	\$	644.358,00	\$	644.358,00				\$	1.634.643,00
11.05	Acornada hidráulica 1", incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	4,00	\$	857.353,00	\$	3.829.412,00				\$	644.358,00
11.06	Suministro e instalación linaque A.P. plástico de 2.000 lt, incluye accesorios	UND	1,00	\$	1.838.435,00	\$	1.838.435,00				\$	3.829.412,00
11.07	Suministro e instalación linaque A.P. plástico de 1.000 lt, incluye accesorios	UND	1,00	\$	691.135,00	\$	691.135,00				\$	1.838.435,00
11.08	Suministro e instalación linaque A.P. plástico de 500 lt, incluye accesorios	UND	2,00	\$	446.660,00	\$	893.322,00				\$	691.135,00
					SUBTOTAL	\$	11.448.594,68				\$	893.322,00
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS												
12.01	Construcción de caja domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.8x0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hieno 30' separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	\$	419.738,00	\$	2.098.690,00				\$	11.448.594,68
12.02	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hieno 30' separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	\$	689.971,00	\$	3.449.855,00				\$	2.098.690,00
12.03	Construcción de caja domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m), incluye Tapa en concreto reforzado en hieno 30' separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	4	\$	920.182,00	\$	3.680.728,00				\$	3.449.855,00
12.04	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.5x0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hieno 30' separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desmoldado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	1	\$	1.102.095,00	\$	1.102.095,00				\$	3.680.728,00
12.05	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	46,3	\$	26.198,00	\$	1.212.957,40				\$	1.102.095,00
12.06	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	10,25	\$	35.193,00	\$	360.728,25				\$	1.212.957,40
12.07	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	133,33	\$	47.220,00	\$	6.297.175,90				\$	360.728,25
12.08	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavación y tapado.	ML	65,62	\$	94.627,00	\$	6.209.423,74				\$	6.297.175,90



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1



BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contado N°:	078 DE 2022	31 de mayo de 2022	30 de junio de 2022	Contratista:	JULIO FERRIEL DIAZ PLAYAS
Periodo:				Interventor:	SINCO LTDA
Director de obra:				Director de Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGUN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			Acumulado Anterior	CANTIDADES Acumulado este mes	Acumulado total	VALORES			Cantidad	Valor
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total				Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total		
	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavación y legrado.	ML	12	\$ 174.134,00	\$ 2.089.604,00				\$ -	\$ -	\$ -	12,00	\$ 2.089.604,00
12.09	Reajuste aguas lluvias en tubería PVC UL 4", incluye accesorios, planilla galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y aceros horizontal y vertical.	ML	80,00	\$ 36.791,00	\$ 2.943.280,00				\$ -	\$ -	\$ -	80,00	\$ 2.943.280,00
12.10	Acabado sanitario en tubería PVC de 8", incluye tubería y reposición de pavimento, excavación, relleno en roble común, ceglla de inspección, silla sanitaria PVC en 12", derecho de consulto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	\$ 4.110.133,00	\$ 8.220.266,00				\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 8.220.266,00
12.11	Punto sanitario PVC 2", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	21,00	\$ 52.373,00	\$ 1.099.833,00				\$ -	\$ -	\$ -	21,00	\$ 1.099.833,00
12.12	Punto sanitario PVC 3", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	8,00	\$ 68.455,00	\$ 555.590,00				\$ -	\$ -	\$ -	8,00	\$ 555.590,00
12.13	Punto sanitario PVC 4", incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	11,00	\$ 95.941,00	\$ 1.055.351,00				\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 1.055.351,00
12.14					\$ 40.375.901,29				\$ -	\$ -	\$ -		
	SUBTOTAL				\$ 40.375.901,29								
13	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS												
13.01	Sanitario línea blanca económica en porcelana, incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	7	\$ 310.057,00	\$ 2.170.399,00				\$ -	\$ -	\$ -	7,00	\$ 2.170.399,00
13.02	Orinal línea blanca económica en porcelana, incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	\$ 307.747,00	\$ 615.494,00				\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 615.494,00
13.03	Lavamanos línea blanca económica en porcelana, incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10,00	\$ 161.640,00	\$ 1.616.400,00				\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 1.616.400,00
13.04	Luz de barra para baño de baño de discapacitados.	UND	1	\$ 353.746,00	\$ 353.746,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 353.746,00
13.05	Suministro e instalación de estufa a gas en acero inoxidable de 4 puertas.	UND	2	\$ 2.208.176,00	\$ 4.416.352,00				\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 4.416.352,00
				\$ 2.208.176,00	\$ 4.416.352,00				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 9.172.391,00
	SUBTOTAL				\$ 9.172.391,00				\$ -	\$ -	\$ -		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
	REDES ELÉCTRICAS												
	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN												
14.01	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 6.361.654,00	\$ 6.361.654,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 6.361.654,00
14.02	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal círculo blasono (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	\$ 599.524,00	\$ 1.199.048,00				\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.199.048,00
14.03	Montaje de estructura de alineamiento de disposición semiblanca, círculo blasono máximo ancho 5" (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 490.365,00	\$ 490.365,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 490.365,00
14.04	Suministro e instalación de línea de media tensión 2 x 10 ACSR	ML	10,00	\$ 11.880,00	\$ 118.800,00				\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 118.800,00
14.05	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12x4 x 75Kg, incluye: Incendio, planchado y pintura, todo de media tensión	UND	2,00	\$ 1.406.160,00	\$ 2.812.320,00				\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 2.812.320,00
14.06	ACOTACIÓN EN BAJA TENSIÓN	UND	10,00	\$ 519.401,00	\$ 5.194.010,00				\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 5.194.010,00
14.07	Suministro e instalación de acomoda trifásica en cobre, 3x10 AWG para lasas + 140 Healtro	UND	1,00	\$ 3.190.775,00	\$ 3.190.775,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.190.775,00
14.08	* 4 AWG Tira de alambre Maderosa hacia bornas de transformador.	UND	1,00	\$ 15.644.374,00	\$ 15.644.374,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 15.644.374,00
14.09	Suministro e instalación de tablero de modulos incluye: tablero y barraje	UND	1,00	\$ 13.687.500,00	\$ 13.687.500,00				\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 13.687.500,00
14.10	Acabado de tubería Media T.M.D. a Tableros monofásicos de 4 circuitos	ML	500,00	\$ 27.375,00	\$ 13.687.500,00				\$ -	\$ -	\$ -	500,00	\$ 13.687.500,00
	TABLEROS								\$ -	\$ -	\$ -		
14.10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	22,00	\$ 314.824,00	\$ 6.926.128,00				\$ -	\$ -	\$ -	22,00	\$ 6.926.128,00
	SALDOS								\$ -	\$ -	\$ -		
14.11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UND	13,00	\$ 313.951,00	\$ 4.081.353,00				\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 4.081.353,00
14.12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UND	30,00	\$ 194.701,00	\$ 5.841.030,00				\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 5.841.030,00
14.13	Suministro e instalación de lámpara LED Aplica 20 w	UND	32,00	\$ 123.053,00	\$ 3.938.016,00				\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 3.938.016,00
14.14	Suministro e instalación de salida luminosa normal con polo a tierra 110 V - incluye conductor referente a la línea EXCELENT HF-RFC7-S	UND	37,00	\$ 126.350,00	\$ 4.675.320,00				\$ -	\$ -	\$ -	37,00	\$ 4.675.320,00
14.15	Suministro e instalación de salida luminosa EXCELENT HF-RFC7-S	UND	9,00	\$ 159.736,00	\$ 1.437.622,00				\$ -	\$ -	\$ -	9,00	\$ 1.437.622,00

[illegible]

PÓLIZAS

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5606865730

PÓLIZA No: 560-47-994000151911 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA	COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
DIA 01 MES 06 AÑO 2022	DIA 01 MES 06 AÑO 2022
FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: SINCO LTDA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.195.924-9
DIRECCIÓN: CARRERA 8 C 34 05 BARRIO LOS MOLINOS	CIUDAD: NEIVA, HUILA
	TELÉFONO: (8) 8757000

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAICOL	IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.194-4
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PAICOL	IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.194-4

AMPAROS				
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA				
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
CONTRATO				
CUMPLIMIENTO	23/03/2022	11/08/2023	12,076,197.00	
ANTICIPO	23/03/2022	11/08/2023	36,228,589.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/03/2022	11/02/2026	24,152,393.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/12/2022	11/02/2028	24,152,393.00	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

BENEFICIARIOS
NIT 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 31-5-2022, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 080 DE 2022 DE FECHA 23-03-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****96,609,572.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	CLAVE 2119	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000560686573

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207E060EF9795A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000151911 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SINCO LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.195.924-9

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAICOL

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.194-4

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PAICOL

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.194-4

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA

CLIENTE

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Aprobado por Sharon Lorena Valenzuela Gonzalez 08-06-2022 12:22

Id de la garantía CO1.WRT.9296326

Referencia de la garantía

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia

Número de póliza 560-47-99-4000151911

Tomador Sinco Ltda.

Beneficiario Municipio de Paicol

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	36.228.589,00 COP	11/08/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	12.076.197,00 COP	11/08/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ 01-04-2022 10:10

Id de la garantía CO1.WRT.8982716

Referencia de la garantía

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Número de póliza 56047994000151911

Tomador SINCO LTDA

Beneficiario MUNICIPIO DE PAICOL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	36.228.589,00 COP	2/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	12.076.197,00 COP	2/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA 2 MAYO 2022 No. 23451056

PROFESIONAL	CARGO
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
HUMBERTO QUIZA CAMACHO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
JULIAN DAVID SEGURA MORENO	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ✓
JAIME COLONIA ALVAREZ	CONDUCTOR ✓
YAMILETH CALDERON MONTEALEGRE	SECRETARIA ✓

PLANILLA 1 MAYO 2022 No. 23549416

PROFESIONAL	CARGO
JAIRO RAMIREZ GARCÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SINCO LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800195924	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8 C 34 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@SINCOLT DA.COM	TELÉFONO	8623333
FAX	8667064	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	actualizada
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79142300	PRIMER APELLIDO	QUIZA
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	ARTURO
		SEGUNDO APELLIDO	CAMACHO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
10		\$17.615.501		23451056	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o COT	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-6530826	01	No	No	No	41	1	FiJo	COLONIA ALVAREZ JAIME		\$1.100.000	
CC-49609707	01	No	No	No	41	1	FiJo	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED		\$1.250.000	
CC-55113957	01	No	No	No	41	1	FiJo	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH		\$1.826.000	
CC-1077874747	01	No	No	No	41	1	FiJo	ORTIZ DUSSAN JUAN DANIEL		\$1.500.000	
CC-79844756	01	No	No	No	41	20	FiJo	PINTO MARIN SIMEON		\$1.800.000	
CC-79142300	01	No	No	No	41	1	FiJo	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO		\$3.000.000	
CC-12123533	01	No	No	No	41	1	FiJo	QUIZA CAMACHO HUMBERTO		\$1.432.000	
CC-55168488	01	No	No	No	41	1	FiJo	RAMOS VILLADA ANGELA MARIA		\$1.407.500	
CC-12193648	01	No	No	No	41	298	FiJo	TOVAR RIVERA ADOLFO		\$1.500.000	
CC-1077843795	01	No	No	No	41	1	FiJo	ZAMBRANO CAVIEDES ANGELA MATILDE		\$3.000.000	

NOVEDADES																								
Identificación	I N G	R E T	T T D A D E P P	T T V S L S	V T S L S	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E	Fecha I G E
CC - 6530826																								
CC - 49609707																								
CC - 55113957																								
CC - 1077874747																								
CC - 1077874747																								
CC - 79844756																								
CC - 79142300																								
CC - 12123533																								
CC - 12123533																								
CC - 12123533																								
CC - 12123533																								
CC - 55168488																								
CC - 12193648																								
CC - 1077843795																								

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo			
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret		
CC - 6530826	PORVENIR	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0		
											\$0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci a	Vlr no ret
CC - 49609707	PORVENIR	30	\$1.250.000	0.1600000	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55113957	COLPENSIONES	30	\$1.826.000	0.1600000	\$292.200	\$0	\$0	\$292.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1077874747	COLPENSIONES	26	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1077874747	COLPENSIONES	4	\$133.334	0.1600000	\$21.400	\$0	\$0	\$21.400	\$0	\$0	\$0
CC - 79844756	COLFONDOS	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79142300	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	6	\$286.400	0.1600000	\$45.900	\$0	\$0	\$45.900	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	1	\$47.734	0.1600000	\$7.700	\$0	\$0	\$7.700	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	8	\$381.867	0.1600000	\$61.100	\$0	\$0	\$61.100	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	15	\$716.000	0.1600000	\$114.600	\$0	\$0	\$114.600	\$0	\$0	\$0
CC - 55168488	COLFONDOS	30	\$1.407.500	0.1600000	\$225.200	\$0	\$0	\$225.200	\$0	\$0	\$0
CC - 12193648	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1077843795	PORVENIR	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor Eg	Núm Aut Lic	Valor Lic	Cot Obl
CC - 6530826	SANITAS	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$76.600
CC - 49609707	SANITAS	30	\$1.250.000	0.0400000	\$50.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$87.000
CC - 55113957	SANITAS	30	\$1.826.000	0.0400000	\$73.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$9.600
CC - 1077874747	SANITAS	26	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$90.500
CC - 1077874747	SANITAS	4	\$133.334	0.0400000	\$5.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
CC - 79844756	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.300
CC - 79142300	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$15.700
CC - 12123533	SANITAS	6	\$286.400	0.0400000	\$11.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$20.000
CC - 12123533	SANITAS	1	\$47.734	0.0400000	\$2.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
CC - 12123533	SANITAS	8	\$381.867	0.0400000	\$15.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
CC - 12123533	SANITAS	15	\$716.000	0.0400000	\$28.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55168488	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.407.500	0.0400000	\$56.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.407.500	1	0.0052200	\$7.400
CC - 12193648	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	2	0.0696000	\$104.400
CC - 1077843795	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	2	0.0696000	\$208.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6530826	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.100.00 0	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-49609707	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.250.00 0	0.0400000	\$50.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55113957	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.826.00 0	0.0400000	\$73.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077874747	CONFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077874747	CONFAMILIAR DEL HUILA	4	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79844756	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79142300	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$3.000.00 0	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	CONFAMILIAR DEL HUILA	6	\$286.400	0.0400000	\$11.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	CONFAMILIAR DEL HUILA	1	\$47.734	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	CONFAMILIAR DEL HUILA	8	\$381.867	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	CONFAMILIAR DEL HUILA	15	\$716.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55168488	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.407.50 0	0.0400000	\$56.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12193648	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077843795	CONFAMILIAR DEL HUILA	30	\$3.000.00 0	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$1.096.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.096.000
COLFONDOS	3	\$742.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$742.500
COLPENSIONES	3	\$1.001.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.001.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC IMA	VLR APOORTE LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACION AUTOLIQÜITACION ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	8	\$582.00	\$0	\$0	0	\$0	\$582.00	0	\$0	\$0	\$582.00	\$0	0	\$0	\$0	\$582.00	\$0	\$0	\$582.00
NUUEVA E.P.S. S.A.	2	\$128.300	\$0	\$0	0	\$0	\$128.300	0	\$0	\$0	\$128.300	\$0	0	\$0	\$0	\$128.300	\$0	\$0	\$128.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APOORTE COT	NÚM RAD AUTOLIQÜITACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	10	\$745.300	0	\$0	\$0	\$745.300	0	\$0	\$745.300	0	\$0	\$7.453	\$745.300

TOTAL APORTES PARA FISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$658.900	0	\$0	\$658.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$710.300
PENSIONES	3	\$2.840.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$745.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$658.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.954.600

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SINCO LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800195924	D. V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8 C 34 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7112	CORREO ELECTRONICO	GERENCIA@SINCOLT DA.COM	TELÉFONO	8623333
FAX	8623333	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATISTAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		79142300	PRIMER APELLIDO		QUIZA
PRIMER NOMBRE		CARLOS	SEGUNDO NOMBRE		ARTURO
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022		Mes: 05		Año: 2022	Mes: 06
Nro. DE TRABAJADORES			Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5			\$11.563.334		23549416

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1032415933	01	No	No	No	41	1	FiJo	CASTRO TORRES GABRIEL EDGARDO		\$1.350.000
CC-12113602	01	No	No	No	41	1	FiJo	GARCIA RAMIREZ JAIRO		\$3.000.000
CC-3226596	01	3	No	No	41	1	FiJo	JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO		\$2.000.000
CC-12123891	01	No	No	No	41	1	FiJo	FARRA OLAYA WILLIAM		\$2.700.000
CC-12192272	01	No	No	No	41	1	FiJo	VARGAS CADENA NELSON		\$2.600.000

NOVEDADES																											
Identificación	I N G	R E T	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E	T T D A D E E
CC - 1032415933																											
CC - 12113602																											
CC - 3226596																											
CC - 12123891																											
CC - 12192272	X																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1032415933	COLPENSIONES	30	\$1.350.000	0.1600000	\$216.000	\$0	\$0	\$216.000	\$0	\$0	\$0
CC - 12113602	COLFONDOS	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0
CC - 3226596	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	\$2.700.000	0.1600000	\$432.000	\$0	\$0	\$432.000	\$0	\$0	\$0
CC - 12192272	COLPENSIONES	29	\$2.513.334	0.1600000	\$402.200	\$0	\$0	\$402.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1032415933	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.350.00 0	0.0400000	\$54.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.350.00 0	5	0.0696000	\$94.000	
CC - 12113602	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$3.000.00 0	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.00 0	5	0.0696000	\$208.800	

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a Co Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 3226596	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.000.00 ₀	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	5	0.0636000	\$139.200
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.700.00 ₀	0.0400000	\$108.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	5	0.0636000	\$188.000
CC - 12192272	SANTAS	29	\$2.513.33 ₄	0.0400000	\$100.600	\$0	0	\$0	0	\$0	29	5	0.0636000	\$175.000

APORTES PARA FISCIALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1032415933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.350.00 0	0.0400000	\$54.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12113602	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$3.000.00 0	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-3226596	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123891	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.700.00 0	0.0400000	\$108.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12192272	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	\$2.513.33 4	0.0400000	\$100.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05														
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
COLPENSIONES	3	\$1.050.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.050.200			
SINAF	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0			
COLFONDOS	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000			

PLANILLA 2 JUNIO 2022 No. 23697398

PROFESIONAL	CARGO
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
HUMBERTO QUIZA CAMACHO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
JULIAN DAVID SEGURA MORENO	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ✓
JAIME COLONIA ALVAREZ	CONDUCTOR ✓
YAMILETH CALDERON MONTEALEGRE	SECRETARIA ✓

PLANILLA 1 JUNIO 2022 No. 23748964

PROFESIONAL	CARGO
JAIRO RAMIREZ GARCÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ✓

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SINCO LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800195924	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8 C 34 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@SINCOLT DA.COM	TELÉFONO	8623333
FAX	8667064	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	actualizada
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		79142300	PRIMER APELLIDO	QUIZA	SEGUNDO APELLIDO	CAMACHO
PRIMER NOMBRE		CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	ARTURO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022		Mes: 06	Año: 2022		Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES			Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
12			\$18.497.585		23697398	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancial	Vlr no ret
CC - 6530826	PORVENIR	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0
CC - 49609707	PORVENIR	30	\$1.250.000	0.1600000	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55113957	COLPENSIONES	30	\$1.826.000	0.1600000	\$292.200	\$0	\$0	\$292.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1020742526	PORVENIR	17	\$2.266.667	0.1600000	\$362.700	\$0	\$0	\$362.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1077874747	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 34328834	COLPENSIONES	3	\$250.000	0.1600000	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79844756	COLFONDOS	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79142300	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	26	\$1.241.067	0.1600000	\$198.600	\$0	\$0	\$198.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12123533	COLFONDOS	4	\$190.934	0.1600000	\$30.600	\$0	\$0	\$30.600	\$0	\$0	\$0
CC - 55168488	COLFONDOS	25	\$1.172.917	0.1600000	\$187.700	\$0	\$0	\$187.700	\$0	\$0	\$0
CC - 12193648	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1077843795	PORVENIR	14	\$1.400.000	0.1600000	\$224.000	\$0	\$0	\$224.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados
CC - 6530826	SANITAS	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 49609707	SANITAS	30	\$1.250.000	0.0400000	\$50.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 55113957	SANITAS	30	\$1.826.000	0.0400000	\$73.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 1020742526	SANITAS	17	\$2.266.667	0.0400000	\$90.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17
CC - 1077874747	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 34328834	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$250.000	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 79844756	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 79142300	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 12123533	SANITAS	26	\$1.241.067	0.0400000	\$49.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 12123533	SANITAS	4	\$190.934	0.0400000	\$7.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$190.934	2	0.0000000	\$0				
CC - 55168488	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$1.172.917	0.0400000	\$47.000	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.172.917	1	0.0052200	\$6.200				
CC - 12193648	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	2	0.0696000	\$104.400				
CC - 1077843795	SANITAS	14	\$1.400.000	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$1.400.000	2	0.0696000	\$97.500				

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6530826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-49609707	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.250.000	0.0400000	\$50.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55113957	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.826.000	0.0400000	\$73.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1020742526	COMFAMILIAR DEL HUILA	17	\$2.266.667	0.0400000	\$90.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077874747	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-34328834	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$250.000	0.0400000	\$10.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79844756	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79142300	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.241.067	0.0400000	\$49.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123533	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	\$190.934	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55168488	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	\$1.172.917	0.0400000	\$47.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12193648	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077843795	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$1.400.000	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	3	\$704.900	\$0	\$0	\$0	\$0	11	\$6.600	\$0	\$0	\$711.500
POVENIR	5	\$1.202.700	\$0	\$0	\$0	\$0	11	\$11.300	\$0	\$0	\$1.214.000
COLPENSIONES	4	\$1.052.200	\$0	\$0	\$0	\$0	11	\$9.900	\$0	\$0	\$1.062.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANTITAS	9	\$611.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$611.200	11	\$5.800	\$0	\$617.000	\$0	0	\$0	\$0	\$617.000	\$0	\$0	\$617.000
NUOVA E.P.S.S.A.	3	\$129.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$129.000	11	\$1.300	\$0	\$130.300	\$0	0	\$0	\$0	\$130.300	\$0	\$0	\$130.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	\$888.300	0	\$0	\$0	\$888.300	11	\$8.300	\$896.600	0	\$0	\$8.966	\$896.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$732.500	11	\$6.900	\$739.400
SENA	0	\$0	11	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	11	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	11	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	11	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$747.300
PENSIONES	3	\$2.987.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$896.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$739.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$5.370.900

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SINCO LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800195924	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8 C 34 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@SINCOLT DA.COM	TELÉFONO	86233333
FAX	86233333	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATISTAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79142300	PRIMER APELLIDO	QUIZA	SEGUNDO APELLIDO	CAMACHO
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	ARTURO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 06	Año: 2022	Mes: 07	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
5		\$11.650.000		23748964	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1032415933	01	No	No	No	41	1	Fijo	CASTRO TORRES GABRIEL EDGARDO		\$1.350.000
CC-12113602	01	No	No	No	41	1	Fijo	GARCIA RAMIREZ JAIRO		\$3.000.000
CC-3226596	01	3	No	No	41	1	Fijo	JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO		\$2.000.000
CC-12123891	01	No	No	No	41	1	Fijo	PARRA OLAYA WILLIAM		\$2.700.000
CC-12192272	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS CADENA NELSON		\$2.600.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T V S	V E T N	Fecha Sln	Fecha Sln Fin	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	Fecha V C Inicio	Fecha V C Fin	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	Fecha A V P T	Fecha V C T Inicio	Fecha V C T Fin
CC - 1032415933																			
CC - 12113602																			
CC - 3226596																			
CC - 12123891																			
CC - 12192272																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1032415933	COLPENSIONES	30	\$1.350.000	0.1600000	\$216.000	\$0	\$0	\$216.000	\$0
CC - 12113602	COLFONDOS	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0
CC - 3226596	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	\$2.700.000	0.1600000	\$432.000	\$0	\$0	\$432.000	\$0
CC - 12192272	COLPENSIONES	30	\$2.600.000	0.1600000	\$416.000	\$0	\$0	\$416.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1032415933	NUEVA E.P.S. S.A.	\$1.350.000	0.0400000	\$54.000	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 12113602	NUEVA E.P.S. S.A.	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot Co Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 3226596	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	5	0.0636000	\$139.200
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.700.000	0.0400000	\$108.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	5	0.0636000	\$188.000
CC - 12192272	SANTAS	30	\$2.600.000	0.0400000	\$104.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	5	0.0636000	\$181.000

APORTES PARA FISCALIAES													
Identificación	CCF	Días Cct a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1032415933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.350.00 0	0.0400000	\$54.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12113602	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$3.000.00 0	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-3226596	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12123891	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.700.00 0	0.0400000	\$108.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12192272	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.600.00 0	0.0400000	\$104.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06														
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
SINAFI	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	26	\$0	\$0	\$0	\$0			
COFONDOS	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	26	\$10.700	\$0	\$0	\$490.700			
COMPENSACIONES	3	\$1.064.000	\$0	\$0	\$0	\$0	26	\$23.600	\$0	\$0	\$1.087.600			

PLANILLA 2 JULIO 2022 No. 23996038

PROFESIONAL	CARGO
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
HUMBERTO QUIZA CAMACHO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA ✓
JULIAN DAVID SEGURA MORENO	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ✓
JAIME COLONIA ALVAREZ	CONDUCTOR ✓
YAMILETH CALDERON MONTEALEGRE	SECRETARIA ✓

PLANILLA 1 JULIO 2022 No. 24066631

PROFESIONAL	CARGO
JAIRO RAMIREZ GARCÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
