

ORDEN DE VENTA

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha:	03/03/2022
Dirección:	TV 45 26 60	Forma de Pago:	CREDITO A 30 DÍAS
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Moneda:	COP
Teléfono:	7056000	Vendedor:	JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$2.804.040.443,00	\$0,00		\$2.804.040.443,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$560.808.089,00	\$0,00		\$560.808.089,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$140.202.022,00	\$0,00		\$140.202.022,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$140.202.022,00	\$26.638.384,00		\$166.840.406,00
CS0018	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,0000	\$273.000.000,00	\$51.870.000,00		\$324.870.000,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$231.000,00	\$43.890,00		\$274.890,00
VS0022	ENAJENACIÓN PREDIOS VOLUNTARIA SIN IVA	1,0000	\$47.654.316,00	\$0,00		\$47.654.316,00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1,0000	\$190.617,00	\$0,00		\$190.617,00
VS0057	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,0000	\$1.191.358,00	\$226.358,00		\$1.417.716,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$1.093.575.773,00	-\$1.093.575.773,00


TOTALES	\$3.967.519.867,00	\$78.778.632,00	-\$1.093.575.773,00	\$2.952.722.726,00
---------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------

Notas
#\$24-02-00;1684-2020;dangarita@invias.gov.co#\$ ACTA DE OBRA 11 DEL CONTRATO 1684 DE 2020 IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30% PERIODO ENERO 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-2		
			VERSIÓN 1		
			PÁGINA		
			FECHA 31 01 2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)			
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)			
		PERIODO MES: 1 ENE 22 - 31 ENE 22			
		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.967.519.867			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	01 / 03 / 2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cesar A. Higuera P.	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	02 / 03 / 2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Cesar A. Higuera P.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8/03/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8/03/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08/03/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego Osorio Gamboa		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09/03/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana K. Angarita Castro		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.952.722.726.00 VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL PERIODO 1 ENE 22 - 31 ENE 22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.					
Firma:  Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez Matricula No 68202090549 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma:  Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez Matricula No 68202090549 DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma:  Nombre: Diego Osorio Gamboa Matricula No 68202-243884 STD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	
Firma:  Nombre: Diana Karina Angarita Castro Matricula No 142786 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		Firma:  Nombre: Diana Karina Angarita Castro Matricula No 142786 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN		1							
												PÁGINA		1	DE	3					
														FECHA		30	01	22			
														(Día)		(Mes)		(Año)			
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3				DIRECCIÓN TERRITORIAL				SANTANDER		ACTA N°		11		VALOR BÁSICO ACTA: \$		3.967.519.867,00		MES 1 ENE 22 - 31 ENE 22	
												ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒						(Indicar con una X)	
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.467.978.735,00 (Según contrato principal)									
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 166.479.857.834,00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 01-12-21		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
I- EXPLANACIONES																					
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	\$ 1.324.813,00	\$ 6.624.065,00	5,00	\$ 6.624.065,00	0,30	\$ 397.444,00	0,60	\$ 794.888,00							
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 121.488,00	\$ 33.409.200,00	600,00	\$ 72.892.800,00			318,00	\$ 38.633.184,00							
3	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 76.340,00	\$ 3.435.300,00	1.679,00	\$ 128.174.860,00				\$ -							
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	81.011,00	\$ 1.011.017.280,00				\$ -							
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	\$ 49.241,00	\$ 1.612.445.786,00	10.400,00	\$ 512.106.400,00			2.763,00	\$ 136.052.883,00							
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	\$ 6.968,00	\$ 2.392.846.040,00	172.074,00	\$ 1.199.011.632,00	5.066,00	\$ 35.299.888,00	14.314,00	\$ 99.739.952,00							
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	\$ 9.626,00	\$ 288.780.000,00	38.000,00	\$ 365.788.000,00			38.000,00	\$ 365.788.000,00							
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	\$ 13.009,00	\$ 379.082.260,00	45.918,00	\$ 597.347.262,00			4.799,00	\$ 62.430.191,00							
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	\$ 10.295,00	\$ 592.775.805,00	80.525,00	\$ 829.004.875,00	812,00	\$ 8.359.540,00	5.371,00	\$ 55.294.445,00							
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 7.380,00	\$ 590.400.000,00	66.257,00	\$ 488.976.660,00				\$ -							
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																					
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	\$ 843,00	\$ 29.505.000,00	207.855,00	\$ 175.221.765,00	22.965,00	\$ 19.359.495,00	179.139,00	\$ 151.014.177,00							
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	\$ 99.742,00	\$ 2.633.188.800,00	50.353,00	\$ 5.022.308.926,00			569,00	\$ 56.753.198,00							
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 140.088,00	\$ 4.499.626.560,00	60.423,00	\$ 8.464.537.224,00			6.473,00	\$ 906.789.624,00							
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	\$ 161.475,00	\$ 7.524.250.575,00	49.985,00	\$ 8.071.327.875,00			5.902,00	\$ 953.025.450,00							
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	\$ 192.768,00	\$ 269.875.200,00	8.886,00	\$ 1.712.936.448,00				\$ -							
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS																					
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	\$ 2.834,00	\$ 536.620.734,00	343.073,00	\$ 972.268.882,00	12.660,00	\$ 35.878.440,00	47.512,00	\$ 134.649.008,00							
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	\$ 1.765,00	\$ 334.204.515,00	192.494,00	\$ 339.751.910,00	40.561,00	\$ 71.590.165,00	92.590,00	\$ 163.421.350,00							
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	\$ 802.053,00	\$ 3.480.910.020,00	25.235,00	\$ 20.239.807.455,00	3.205,10	\$ 2.570.660.070,00	11.655,10	\$ 9.348.007.921,00							
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	\$ 957.754,00	\$ 536.342.240,00	31.024,00	\$ 29.713.360.096,00			5.300,90	\$ 5.076.958.179,00							
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	16.820,00	\$ 1.410.979.340,00			10.663,20	\$ 894.503.859,00							
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subvacantes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.557.690,00	6.550,00	\$ 515.242.650,00			167,10	\$ 13.144.588,00							
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO																					
22	8	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	\$ 696.518,00	\$ 31.105.797.362,00	7.165,00	\$ 4.990.551.470,00	113,00	\$ 78.706.534,00		\$ 1.631.593.416,00							
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	\$ 32.493,00	\$ 1.198.179.375,00	36.875,00	\$ 1.198.179.375,00	2.323,60	\$ 75.500.735,00	11.191,90	\$ 363.658.408,00							
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	\$ 54.918,00	\$ 1.826.902.188,00	33.667,00	\$ 1.848.924.306,00			675,80	\$ 37.113.584,00							
25	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	\$ 43.718,00	\$ 413.309.972,00	38.667,00	\$ 1.690.443.906,00	90,00	\$ 3.934.620,00	762,30	\$ 33.326.232,00							
26	2	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	14.183,00	\$ 95.040,00	\$ 1.347.952.320,00	18.081,00	\$ 1.718.418.240,00	526,80	\$ 50.067.072,00	2.885,10	\$ 274.199.904,00							
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	444,00	\$ 1.043.582.484,00				\$ -							
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	4.010,00	\$ 3.127.800.000,00				\$ -							
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	\$ 318.427,00	\$ 1.618.564.441,00	800,00	\$ 254.741.600,00				\$ -							
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	\$ 391.615,00	\$ 1.194.425.750,00	121,00	\$ 47.385.415,00				\$ -							
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 750.000,00	\$ 10.496.250.000,00	6.906,00	\$ 5.179.500.000,00	109,60	\$ 82.200.000,00	187,40	\$ 140.550.000,00							
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	\$ 664.980,00	\$ 10.631.700.240,00	7.500,00	\$ 4.987.350.000,00	123,40	\$ 82.058.532,00	970,00	\$ 645.030.600,00							
33	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa)	m3	754,00	\$ 1.314.607,00	\$ 991.213.678,00	652,00	\$ 857.123.764,00				\$ -							
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	\$ 546.793,00	\$ 361.430.173,00	1.284,00	\$ 702.082.212,00	2,00	\$ 1.093.586,00	39,80	\$ 21.762.362,00							
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.144,00	\$ 415.902,00	\$ 475.791.888,00	3.501,00	\$ 1.456.072.902,00	442,70	\$ 184.119.815,00	1.012,70	\$ 421.183.955,00							
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	715.607,00	\$ 3.363.352.900,00	20.796,80	\$ 97.744.960,00	63.449,60	\$ 298.213.120,00							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1			
VERSIÓN 1														
PÁGINA 1 DE 3														
FECHA 300122 (Día)(Mes)(Año)														
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA N° 11 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.967.519.867,00 MES 1 ENE 22 - 31 ENE 22														
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)														
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 OBJETO: VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 88,5 + CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Indique día/mes/año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.467.978.735,00 (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 166.479.857.834,00														
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	58.597,00	\$ 4.963,00	\$ 290.816.911,00	7.320,00	\$ 36.329.160,00		\$ -	\$ -	
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	\$ 634.703,00	\$ 386.534.127,00	1.299,00	\$ 824.479.197,00	2,00	\$ 1.269.406,00	79,60	\$ 50.522.359,00
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	\$ 24.918,00	\$ 1.173.288.948,00	46.111,00	\$ 1.148.993.898,00	1.020,10	\$ 25.418.852,00	9.989,10	\$ 248.908.394,00
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.782.301.120,00	6.058,00	\$ 3.671.984.004,00		\$ -		\$ -
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	\$ 73.550,00	\$ 1.125.315.000,00	20,00	\$ 1.471.000,00		\$ -	20,00	\$ 1.471.000,00
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	\$ 8.833,00	\$ 638.449.240,00	109.722,00	\$ 969.174.426,00	4.179,20	\$ 36.914.874,00	39.584,10	\$ 349.646.355,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	\$ 109.573,00	\$ 3.880.746.941,00	23.694,00	\$ 2.596.222.662,00	707,50	\$ 77.522.898,00	6.454,40	\$ 707.227.972,00
44	6		673.3P	Geodren	m	11.368,00	\$ 109.918,00	\$ 1.249.547.824,00	2.128,00	\$ 233.905.504,00		\$ -		\$ -
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	\$ 117.162,00	\$ 1.982.966.850,00	3.516,00	\$ 411.941.592,00		\$ -		\$ -
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	\$ 240.205,00	\$ 310.344.860,00	4.015,00	\$ 964.423.075,00	150,00	\$ 36.030.750,00	1.108,00	\$ 266.147.140,00
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
47	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	\$ 1.804,00	\$ 186.757.296,00	600.000,00	\$ 1.082.400.000,00		\$ -	369.484,00	\$ 666.549.136,00
48	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	350,00	\$ 7.929.950,00		\$ -	243,00	\$ 5.505.651,00
49	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	\$ 8.328,00	\$ 13.691.232,00	1.644,00	\$ 13.691.232,00		\$ -		\$ -
50	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	196,00	\$ 77.062.888,00		\$ -		\$ -
51	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	50,00	\$ 16.145.050,00		\$ -		\$ -
52	8	720-13		Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	27,00	\$ 6.799.707,00		\$ -		\$ -
53	8	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	\$ 228.676,00	\$ 937.571.600,00	3.048,00	\$ 687.004.448,00		\$ -		\$ -
54	8	730-13		Sección final	u	100,00	\$ 102.870,00	\$ 10.287.000,00	160,00	\$ 16.459.200,00		\$ -		\$ -
55	8	740-13		Captafaros	u	1.039,00	\$ 21.965,00	\$ 22.821.635,00	800,00	\$ 17.572.000,00		\$ -		\$ -
VII - OBRAS VARIAS									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	31.500,00	\$ 546.619.500,00		\$ -		\$ -
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33.469,00	\$ 5.020.350,00	20,00	\$ 669.380,00		\$ -		\$ -
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	\$ 18.372,00	\$ 296.156.640,00	16.120,00	\$ 296.156.640,00		\$ -		\$ -
VIII - TRANSPORTES									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	4.744.797,00	\$ 5.219.276.700,00	28.393,00	\$ 31.232.300,00	81.406,00	\$ 89.546.600,00
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	570.000,00	\$ 627.000.000,00	36.266,00	\$ 39.892.600,00	509.200,00	\$ 560.120.000,00
Ajuste el Peso										734,00				
ITEM NO PREVISTOS														
										\$ -		\$ -		\$ -

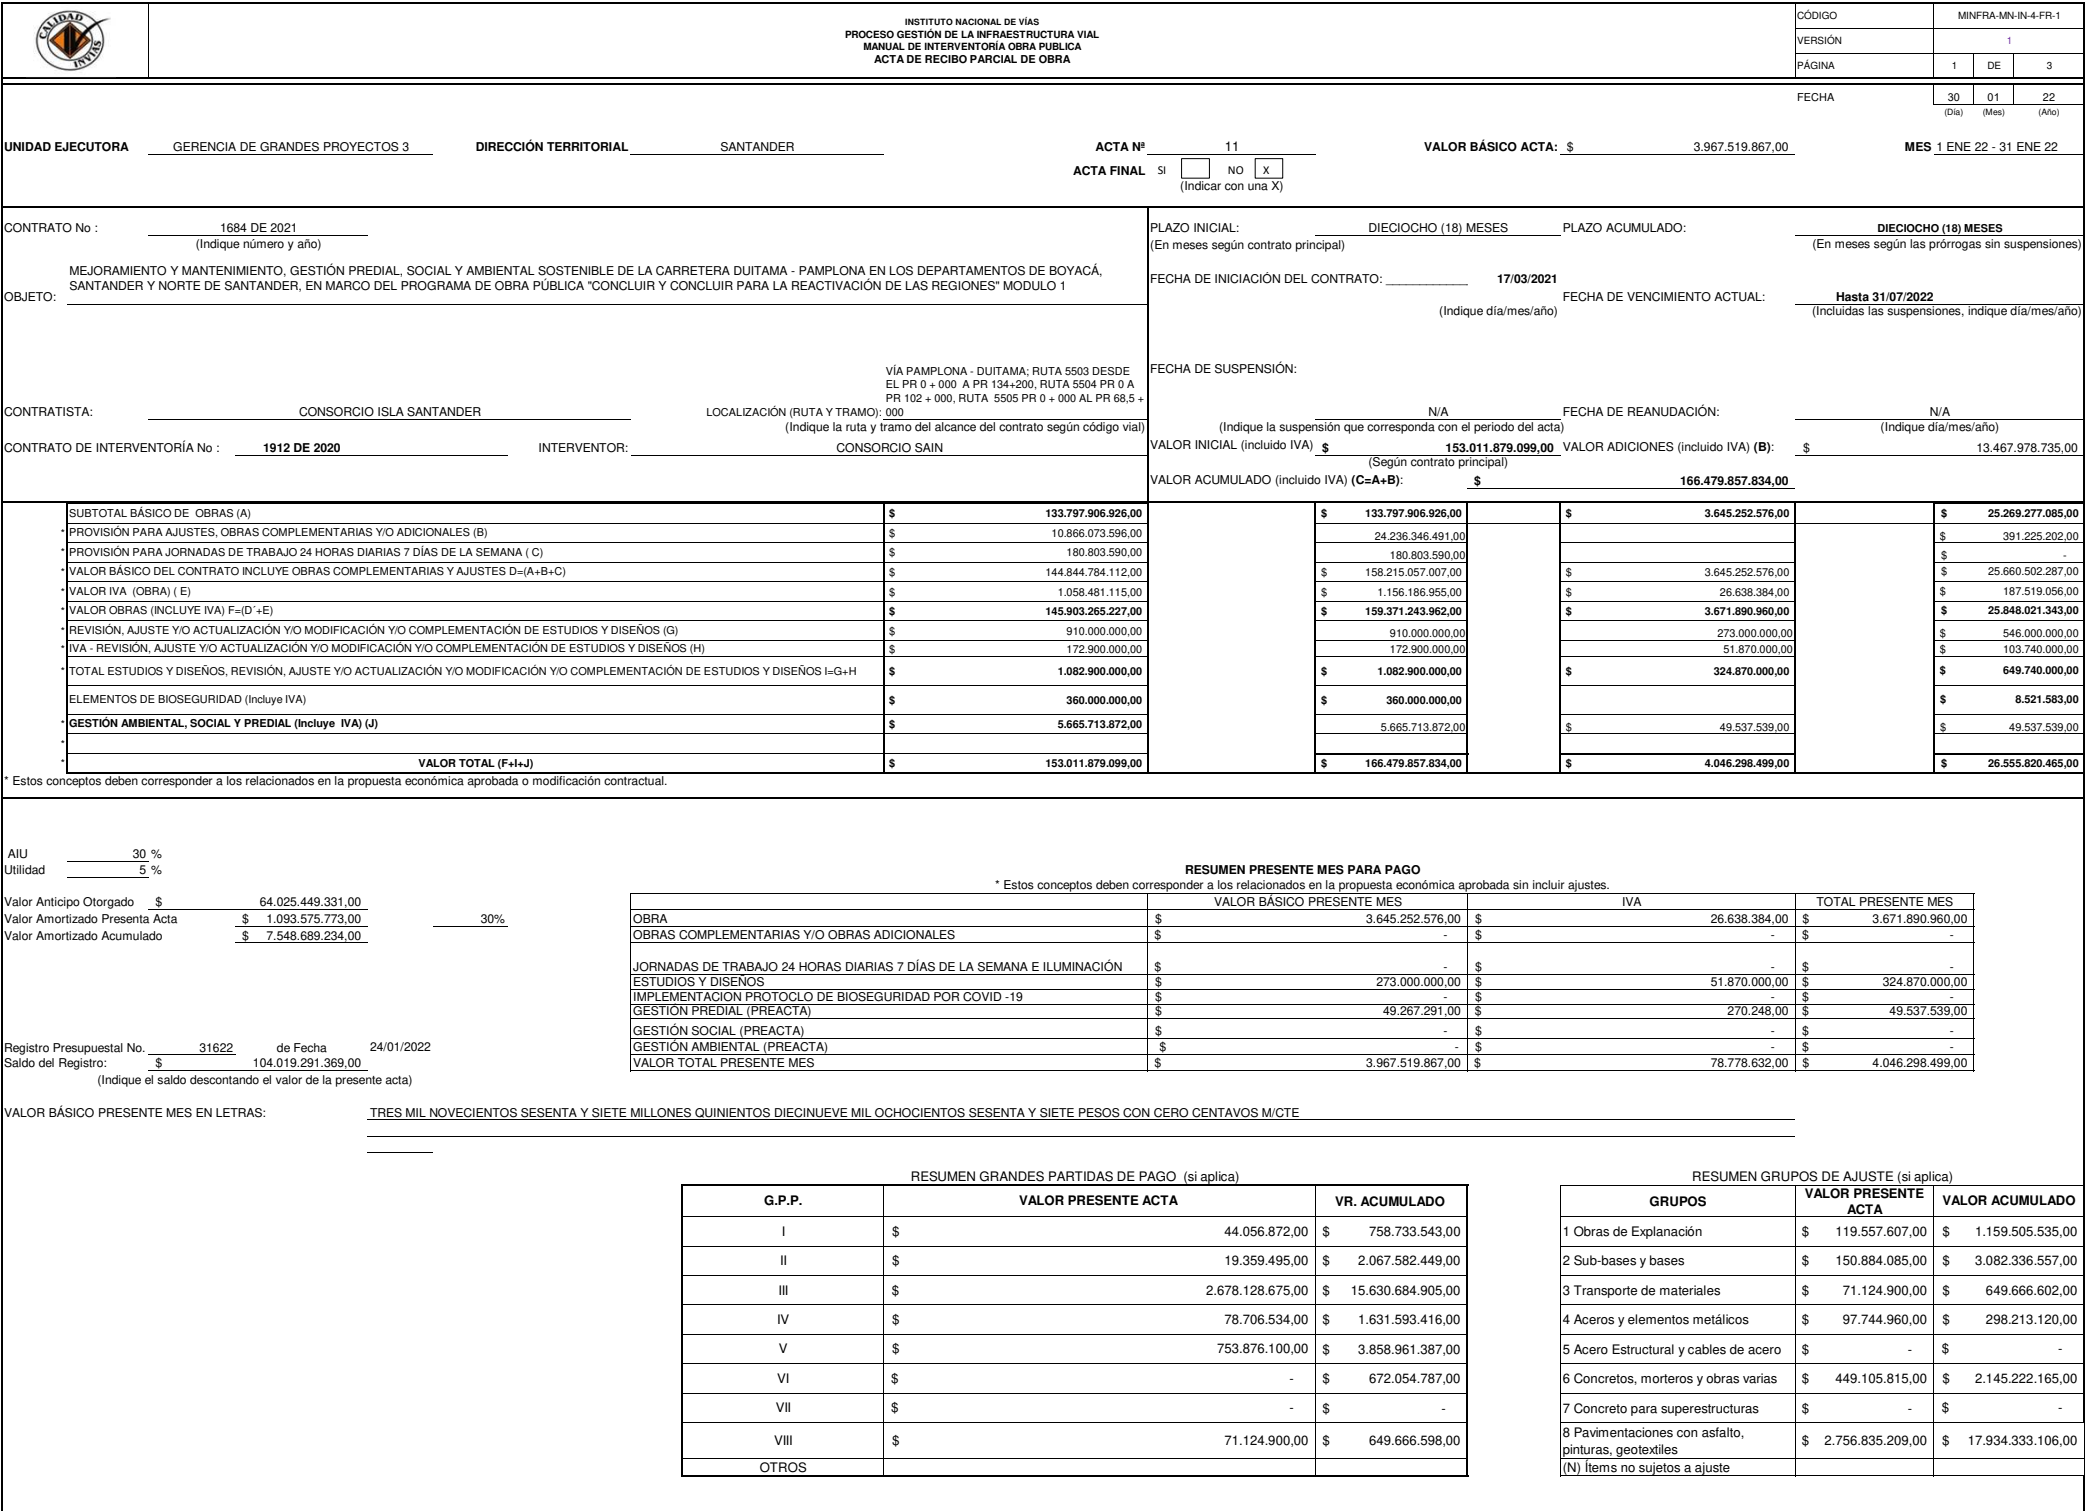

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	3
			FECHA	30	01	22
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SANTANDER	ACTA N°	11	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.967.519.867,00
			ACTA FINAL	SI ☐ NO ☒	(Indicar con una X)	
			MES 1 ENE 22 - 31 ENE 22			
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1			FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)			FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN			VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.467.978.735,00 (Según contrato principal)			
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 166.479.857.834,00			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.						
NOTAS: 1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. 2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental). 3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. 4. El valor basico del acta es \$ 3,967,519,867.00 y la amortización es \$ 1.093.575.773 equivalente al 30 %, el valor de IVA es \$ 78,778.632.00. la factura es \$ 2,952,722,726.00 5. El valor del acta basico es \$ 3,967,519,867.00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a \$ 1.093.575.773						
Para constancia de lo anterior firman						
Firma Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No: 05202-66520 ANT			Firma Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No: 25202-40972 CND			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial						



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ DEF. No 11	1 ENE 22 - 31 ENE 22
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>89922</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-86-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>2.952.722.726</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>2.952.722.726</u>

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE
Mantrícula N°

NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.					
Acta Obra N° 11	Valor básico	\$	3.967.519.867	Período	1 ENE 22 - 31 ENE 22	
Valor Incluido Iva	\$		4.046.298.499			

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 + 000	\$ 1.632.375.478,00	\$ 196.015.272,00		\$ 1.828.390.750,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 + 000	\$ -			\$ -
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ -			\$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ -			\$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ 436.919.854,00	\$ 38.656.418,00		\$ 475.576.272,00
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ -			\$ -
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	\$ -			\$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 1.652.133.169,00	\$ 90.198.309,00		\$ 1.742.331.478,00
12	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ -			\$ -
						\$ -
TOTALES			\$ 3.721.428.501,0	\$ 324.870.000,0	0	\$ 4.046.298.499,0

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ 1.142.662.835	\$ 1.120.415.980
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	BELÉN	\$ 489.712.643	\$ 480.178.277
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	\$ -	
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE		
	MUNICIPIO 7	SUSACON		
	MUNICIPIO 8	SOATA		
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE		
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA		
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		\$ 1.632.375.478	\$ 1.600.594.257

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 724.176.906	\$ 710.077.683
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 1.689.746.115	\$ 1.656.847.927
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 2.413.923.021	\$ 2.366.925.610

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ -	
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ -	
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -

TOTAL		\$ 4.046.298.499	\$ 3.967.519.867
--------------	--	-------------------------	-------------------------

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	 SANTIAGO PAEZ TALERO CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		30/01/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES			
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.	9	MES: ENERO	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA No.	1684 DE 2020 (Indicar número y año)		
CONTRATO DE FIDUCIA No.	N/A DE N/A	ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA	
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)			
CUENTA BANCARIA No.	29100002138 BANCO BANCOLOMBIA (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)		
ANTICIPO OTORGADO:	43 %		
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$ 64.025.449.329,00 (M/CTE)		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
 El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)	
1	MANO DE OBRA	\$ 18.063.563.742,00	\$ 5.073.637.281,00	\$ -	\$ 5.073.637.281,00	\$ 12.989.926.461,00	
2	MATERIALES	\$ 28.559.543.916,00	\$ 12.239.860.826,00	\$ -	\$ 12.239.860.826,00	\$ 16.319.683.090,00	
3	EQUIPOS	\$ 6.518.015.285,00	\$ 6.029.293.167,00	\$ -	\$ 6.029.293.167,00	\$ 488.722.118,00	
4	TRANSPORTES	\$ 5.762.290.439,00	\$ 2.910.926.798,00	\$ -	\$ 2.910.926.798,00	\$ 2.851.363.641,00	
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SENALIZACIÓN	\$ 5.013.402.359,00	\$ 2.755.780.124,00	\$ -	\$ 2.755.780.124,00	\$ 2.257.622.235,00	
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 108.633.588,00	\$ 65.142.761,00	\$ -	\$ 65.142.761,00	\$ 43.490.827,00	
TOTALES		\$ 64.025.449.329,00	\$ 29.074.640.957,00	\$ -	\$ 29.074.640.957,00	\$ 34.950.808.372,00	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ENERO) : \$ 22.206.406,40
 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 165.239.403,53
 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	\$ 3.557.338,36		may-21	4/06/2021	\$ 3.557.338,36
67	\$ 25.845.790,86		jun-21	8/07/2021	\$ 29.403.129,22
121	\$ 24.622.790,58		jul-21	6/08/2021	\$ 54.025.919,80
199	\$ 23.477.199,85		ago-21	8/09/2021	\$ 77.503.119,65
243	\$ 20.341.196,53		sep-21	8/10/2021	\$ 97.844.316,18
369	\$ 18.413.242,65		oct-21	9/11/2021	\$ 116.257.558,83
450	\$ 14.823.049,87		nov-21	9/12/2021	\$ 131.080.608,70
522	\$ 11.952.388,43		dic-21	7/01/2022	\$ 143.032.997,13
561	\$ 22.206.406,40		ene-22	9/02/2022	\$ 165.239.403,53

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
 Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal o Delegado Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER Matrícula Profesional No.: 05202-66620 ANT	Firma:  Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal o Delegado Interventor: CONSORCIO SAIN Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
											VERSION	1		
											PÁGINA	1	DE	1

										FECHA	30 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------	-------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3										DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER		
-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------	--	--

CONTRATO DE OBRA No:	1684 DE 2020										CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA SANTANDER		
MES INFORME MENSUAL:	01 DE ENERO A 30 DE ENERO DE 2022										CARRETERA Y/O PROYECTO:	VÍA PAMPLONA - DUITAMA		
RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR SECTOR: 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68.5 + 000														

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02	54	Nación	1684 de 2020	\$ 61.868.235.264,00
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	\$ 4.743.643.835,00
2021	243721	C-2401-0600-86-0-2401023-02	20	Nación	1684 de 2020	\$ 13.467.978.735,00
2022	89922	C-2401-0600-86		Nación	1684 de 2020	\$ 86.400.000.000,00
TOTAL						166.479.857.834,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	166.479.857.834,00
-------------------------------	----	--------------------

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 237921 De 2021-03-11	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
												SI	NO	
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02														
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X		
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X		
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 115.461.914,00	\$ 843.760,00	\$ 116.305.674,00			\$ 61.751.929.590,00	\$ 116.305.674,00	\$ 166.363.552.160,00	65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 1.994.102,00	\$ 14.572,00	\$ 2.008.674,00			\$ 61.749.920.916,00	\$ 118.314.348,00	\$ 166.361.543.486,00	65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligacion No 1121321								\$ 43.453.435.235,00						
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 270.575.952,00	\$ 1.954.608,00	\$ 272.530.560,00	\$ 81.172.786,00	\$ 43.372.262.449,00	\$ 18.105.127.907,00	\$ 390.844.908,00	\$ 166.089.012.926,00	66834/2021-447-IDP-2465	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
3D	Ajuste Definitivo	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 2.830.666,00	\$ 20.686,00	\$ 2.851.352,00		\$ 43.372.262.449,00	\$ 18.102.276.555,00	\$ 393.696.260,00	\$ 166.086.161.574,00	68973/2021-447-IDP-2534	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 1.226.838.001,00	\$ 8.965.355,00	\$ 1.235.803.356,00	\$ 368.051.400,00	\$ 43.004.211.049,00	\$ 17.234.524.599,00	\$ 1.629.499.616,00	\$ 164.850.358.218,00	70645/2021-447-IDP-2588	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
4D	Ajuste Definitivo	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 29.438.382,00	\$ 215.127,00	\$ 29.653.509,00		\$ 43.004.211.049,00	\$ 17.204.871.090,00	\$ 1.659.153.125,00	\$ 164.820.704.709,00	71763/2021-447-IDP-2634	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
5	Acta Obra	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 1.327.780.057,00	\$ 9.703.008,00	\$ 1.337.483.065,00	\$ 398.334.017,00	\$ 42.605.877.032,00	\$ 16.265.722.042,00	\$ 2.996.636.190,00	\$ 163.483.221.644,00	73438/2021-447-IDP-2703	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
5D	Ajuste Definitivo	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 36.347.830,00	\$ 265.619,00	\$ 36.613.449,00		\$ 42.605.877.032,00	\$ 16.229.108.593,00	\$ 3.033.249.639,00	\$ 163.446.608.195,00	81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
6	Acta Obra	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 1.275.762.847,00	\$ 9.322.882,00	\$ 1.285.085.729,00	\$ 382.728.854,00	\$ 42.223.148.178,00	\$ 15.326.751.718,00	\$ 4.318.335.368,00	\$ 162.161.522.466,00	81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
6D	Ajuste Definitivo	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 31.786.627,00	\$ 232.287,00	\$ 32.018.914,00		\$ 42.223.148.178,00	\$ 15.294.732.804,00	\$ 4.350.354.282,00	\$ 162.129.503.552,00	103170/ 2021-447-IDP-3555	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
7	Acta Obra	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 2.978.974.171,00	\$ 21.769.427,00	\$ 3.000.743.598,00	\$ 893.692.251,00	\$ 41.329.455.927,00	\$ 13.187.681.457,00	\$ 7.351.097.880,00	\$ 159.128.759.954,00	102532/2021-447-IDP-3537	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
7D	Ajuste Definitivo	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 82.725.933,00	\$ 604.536,00	\$ 83.330.469,00		\$ 41.329.455.927,00	\$ 13.104.350.988,00	\$ 7.434.428.349,00	\$ 159.045.429.485,00	112365/2021-447-IDP-3745	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
8	Acta Obra	1 Octubre a 30 Octubre 2021	\$ 3.813.139.263,00	\$ 77.740.248,00	\$ 3.890.879.511,00	\$ 1.062.041.779,00	\$ 40.267.414.148,00	\$ 10.275.513.256,00	\$ 11.325.307.860,00	\$ 155.154.549.974,00	116797/2021-447-IDP-3797	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
8D	Ajuste Definitivo	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 94.107.155,00	\$ 687.706,00	\$ 94.794.861,00		\$ 40.267.414.148,00	\$ 10.180.718.395,00	\$ 11.420.102.721,00	\$ 155.059.755.113,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
9	Acta Obra	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	\$ 4.770.499.890,00	\$ 34.861.345,00	\$ 4.805.361.235,00	\$ 1.431.149.967,00	\$ 38.836.264.181,00	\$ 6.806.507.127,00	\$ 16.225.463.956,00	\$ 150.254.393.878,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
9D	Ajuste Definitivo	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	\$ 111.994.507,00	\$ 818.421,00	\$ 112.812.928,00		\$ 38.836.264.181,00	\$ 6.693.694.199,00	\$ 16.338.276.884,00	\$ 150.141.580.950,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02								\$ 4.743.643.835,00						
Adición CDP No: 234621 de 09 de Diciembre de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02								\$ 13.467.978.735,00						
10	Acta Obra	1 Diciembre a 30 Diciembre 2021	\$ 6.126.474.689,00	\$ 44.770.392,00	\$ 6.171.245.081,00	\$ 1.837.942.407,00	\$ 36.998.321.774,00	\$ 20.572.014.095,00	\$ 22.509.521.965,00	\$ 143.970.335.869,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401023-02
Anticipo No 392061221 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176421								\$ 10.459.978.735,00	\$ 31.031.992.830,00					
Anticipo No 382064521 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176521								\$ 3.008.000.000,00	\$ 34.039.992.830,00					
Anticipo No 382046621 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176321								\$ 7.104.035.361,00	\$ 41.144.028.191,00					
CDP: 31622 de 24 de Enero de 2022, registro presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02								\$ 86.400.000.000,00						



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

											FECHA		
											30	01	2022
											(Día)	(Mes)	(Año)
11	Acta Obra	1 Enero a 30 Enero 2022	\$ 3.967.519.867,00	\$ 78.778.632,00	\$ 4.046.298.499,00	\$ 1.093.575.773,00	\$ 56.476.760.097,00	\$ 124.591.305.465,00	\$ 26.555.820.464,00	\$ 139.924.037.370,00			
TOTALES			\$ 26.264.251.853,00	\$ 291.568.612,00	\$ 26.555.820.465,00	\$ 7.548.689.234,00	\$ 56.476.760.097,00	\$ 124.591.305.465,00	\$ 26.555.820.465,00	\$ 139.924.037.370,00			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 25.269.277.085,00	\$ 184.660.102,00	\$ 25.453.937.187,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -		\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -		\$ -
AJUSTES	\$ 391.225.202,00	\$ 2.858.954,00	\$ 394.084.156,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 546.000.000,00	\$ 103.740.000,00	\$ 649.740.000,00
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 49.267.291,00	\$ 270.248,00	\$ 49.537.539,00
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -		\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -		\$ -
BIOSEGURIDAD	\$ 8.482.275,00	\$ 39.308,00	\$ 8.521.583,00
VALOR TOTAL	\$ 26.264.251.853,00	\$ 291.568.612,00	\$ 26.555.820.465,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula No: 05202-66520 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALLERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula No: 25202-40972 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
--------	---------------------

VERSIÓN	
---------	--

PÁGINA	1	DE	2
--------	---	----	---

FECHA		1	2
	(Día)	(Mes)	(Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

(Indicare con una X)

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO ACUMULADO: 18 meses

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

153.011.879.099,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 13.467.978.735,0
-------------------------------------	---------------------

INTERVENTOR: Consorcio SAIN

[illegible]

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	0,00%	0,15%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,85%	18,14%
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$158.995	\$633.165	\$1.489.763	\$2.709.210	\$2.886.227	\$3.103.963	\$7.848.761	\$7.830.485	\$24.274.749
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	14,07%	19,93%	38,07%
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$158.995	\$792.160	\$2.281.923	\$4.991.133	\$7.677.360	\$10.981.322	\$18.829.083	\$26.660.568	\$50.935.317
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%	0,00%	0,02%	0,92%	2,20%	0,90%	0,57%	2,65%	5,75%	11,59%	
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$115.442	\$1.327.780	\$1.276.763	\$2.978.974	\$2.978.974	\$3.540.139	\$5.540.139	\$6.126.475	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%	0,00%	0,08%	0,29%	1,20%	3,15%	5,37%	8,02%	11,59%		
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$115.442	\$1.443.222	\$2.720.005	\$4.991.805	\$7.968.779	\$11.508.918	\$17.049.057	\$23.175.532	

Reprogramación 1 (Cantidades)

Reprogramación
(Cantidades)Reprogramación
(Cantidades)

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 10.666.074	\$ -
	\$ 10.666.074	\$ 165.124
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 28 HORAS DIARIAS Y 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 180.804	\$ -
	\$ 180.804	\$ -
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y REVISIONES DE TRABAJO Y POR 24	\$ -	\$ 26.638
	\$ 610.000	\$ 291.569
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 610.000	\$ 546.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 172.800	\$ -
	\$ 172.800	\$ 103.740
GESTIÓN SOCIAL, PRECIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	\$ 5.665.714	\$ -
	\$ 5.665.714	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	\$ 360.000	\$ -
	\$ 360.000	\$ 8.522
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 18.155.491	\$ 26.638
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B)	\$ 18.155.491	\$ 26.638
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 151.953.398	\$ 26.655.820
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 151.953.398	\$ 26.655.820

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		
Reprogramación 2		
Reprogramación 3		

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-5		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	30 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)
--	-------	-------------	-------------	---------------

ACTA Parcial No. 2

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☒ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☒ REVISIÓN ☐

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Teniendo en cuenta el informe de revisión de diseños entregado por el CONSORCIO ISLA Santander, a través de comunicado 17594 del 17 de abril de 2021. Se identificó la necesidad de revisar, ajustar, actualizar, modificar y complementar, los volúmenes I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, con el fin de dar continuidad a la obras requeridas dentro del objeto contractual para el corredor vial de la Troncal Central del Norte. En cumplimiento con las obligaciones del contrato 1684 de 2020 el Consorcio Isla Santander elaboró y presentó los volúmenes parcialmente elaborados mencionados, los cuales fueron presentados en el transcurso de la ejecución del contrato y que a la fecha no cuentan con la aprobación total de la interventoría.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ETAPA DE ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

VOLUMEN I - Estudio de Tránsito
VOLUMEN II - Estudio de trazado, diseño geométrico y señalización
VOLUMEN III - Geología para Ingeniería y Geotecnia
VOLUMEN IV - Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención
VOLUMEN V - Estudio de estabilidad y estabilización de taludes
VOLUMEN VI - Estudio Geotécnico para el diseño del pavimento
VOLUMEN VII - Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación
VOLUMEN VIII - Estudios y diseños de estructuras

CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 17 (Día) DE 3 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2022 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN CONTRATO No. 1912 de 2020

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1684	22/12/2020	18 MESES	\$ 166.479.857.834,00	\$ 166.479.857.834,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

CARRETERA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (RUTA 55)

TRAMO DUITAMA - PAMPLONA (RUTAS 5503 - 5504 - 5505)

SECTOR Departamentos de Boyacá; Santander y Norte de Santander.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

TOMO	DESCRIPCIÓN		%	VALOR	CONDICIONES INICIALES		AVANCE ACTA No. 2	
					PARTICIPACIÓN	VALOR	EJECUTADO	VALOR
VOLUMEN I	ESTUDIO DE TRÁNSITO	Informe	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	50,0%	\$ 56.875.000,0
		Aforos						
VOLUMEN II	ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN VIAL	Levantamiento T.	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	80,0%	\$ 91.000.000,0
		Diseño Geométrico y Señalización						
		Informe y Planos						
VOLUMEN III	GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	Estudios	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	70,0%	\$ 79.625.000,0
		Informe						
		Planos						
VOLUMEN IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	Campaña Geot.	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	20,0%	\$ 22.750.000,0
		Diseños						
		Informe						
VOLUMEN V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	Campaña Geot.	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	70,0%	\$ 79.625.000,0
		Diseños						
		Informe						
VOLUMEN VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS	Estudio de Suelos	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	80,0%	\$ 91.000.000,0
		Diseños						
		Informe						
VOLUMEN VII	ESTUDIO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	Estudio	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	70,0%	\$ 79.625.000,0
		Diseños						
		Planos						
VOLUMEN VIII	ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	Informe	12,5%	\$ 113.750.000,0	100,0%	\$ 113.750.000,0	40,0%	\$ 45.500.000,0
		Diseños						
		Planos						

SUB-TOTAL		\$ 910.000.000		\$ 910.000.000		\$ 546.000.000
IVA	19%	\$ 172.900.000	19%	\$ 172.900.000	19%	\$ 103.740.000
TOTAL		\$ 1.082.900.000		\$ 1.082.900.000		\$ 649.740.000

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	% AVANCE
ACTA 1	\$ 273.000.000,00	\$ 51.870.000,00	\$ 324.870.000,00	30%
ACTA 2	\$ 273.000.000,00	\$ 51.870.000,00	\$ 324.870.000,00	30%
TOTAL	\$ 546.000.000,00	\$ 103.740.000,00	\$ 649.740.000,00	60%

OBSERVACIONES:

Documentos: El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha venido realizando entregas parciales de los volúmenes descritos sin que hasta el momento la Interventoría haya realizado la aprobación final total de los Estudios y Diseños.

La Interventoría realizó la estimación porcentual dadas las entregas parciales realizadas por el Consorcio Constructor que de acuerdo a la modalidad de pago del contrato de obra permite el pago parcial de la actividades realizadas por el Consorcio Constructor.

Se hace claridad que tal como se indica en el cuadro adjunto, el contratista no ha entregado la totalidad de la documentación requerida según el anexo técnico numerales 4.1.1 al 4.1.5 y lo solicitado en el Apéndice B del Pliego de Condiciones; Especificaciones Particulares para la Revisión, ajuste, y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños y/o elaboración del calculo de la estructura del Pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la Infraestructura Vial.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

QUIEN ENTREGA:

Firma
Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ AMROYAVE
Representante legal o apoderado
Contratista Consorcio ISLA Santander

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma
Nombre SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante legal o apoderado
Interventoría CONSORCIO SAIN

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO

MSOAMB-MN-IN-1-FR-7

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SANTANDER

PREACTA No.

11

PERIODO:

1 al 30 de Enero de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

11

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA:

30

01

22

(Día)

(Mes)

(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

N.A

Resolución N°

N.A

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

X

CONTRATISTA

CONSORCIO ISLA SANTANDER

INTERVENTORIA

CONSORCIO SAIN

OBJETO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA- PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

N° CONTRATO

1684 de 2020

FECHA DE INICIO

17/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN

31/07/2022

N° CONTRATO

1912 de 2020

FECHA DE INICIO

17/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN

31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO

\$ 153.011.879.099

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

\$ 5.665.713.872

Vr. Adicional de Obra N° 1

\$ 13.467.978.715

Vr. Adicional Provisión Social N°

\$ 0.00

Vr. Adicional de Obra N°

\$ 0

Vr. Adicional Provisión Social N°

\$ 0.00

Vr. Adicional de Obra N°

\$ 0

Vr. Adicional Provisión Social N°

\$ 0.00

Vr. Adicional Final

166.479.857.814

Vr. Total Provisión Social

\$ 5.665.713.872

Vr. Provisión Social ejecutado acumulado

\$ 0

Vr. Provisión Social ejecutado en el mes

\$ 0

Vr. Provisión Social por ejecutar

\$ 0

ABU %:

30%

LI %:

5%

VALOR DEL CONTRATO

\$ 7.199.841.492

Vr. Adicional N° 1

\$ 0

Vr. Adicional N°

\$ 0

Vr. Adicional N°

\$ 0

Vr. Adicional Final

\$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CÓDIGO FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha 30/03/2021						EJECUTADO MES			VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES							
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) (\$)	VR. BASE GRAVABLE (\$)	% IVA	IVA (\$)		VALOR UNITARIO + IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES (\$)	IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)			VR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	VR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO (\$)	CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)	
														OBRA	OTRO															
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A					0,00	0,00	0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		A la fecha de esta preacta, el Plan de Inversión Social no se ha presentado para aprobación de la Interventoría
														\$	-	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -							
VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL SOCIAL												\$ 0.00																		
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL												\$ 0.00																		
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL												\$ 0.00																		

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER

Matrícula No. : 05202-66520-ANT

Firma

SANTIAGO PAEZ TALERO

Representante Legal o Apoderado

Interventoría Consorcio SAIN

Matrícula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

Profesional Social

Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER

Matrícula No. : 111794 COLPSIC

Vo. Bo. Firma

DORY SMITH CARO JIMÉNEZ


Profesional Social

Interventoría: Consorcio SAIN

Matrícula No. : Resolución 9522/05

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

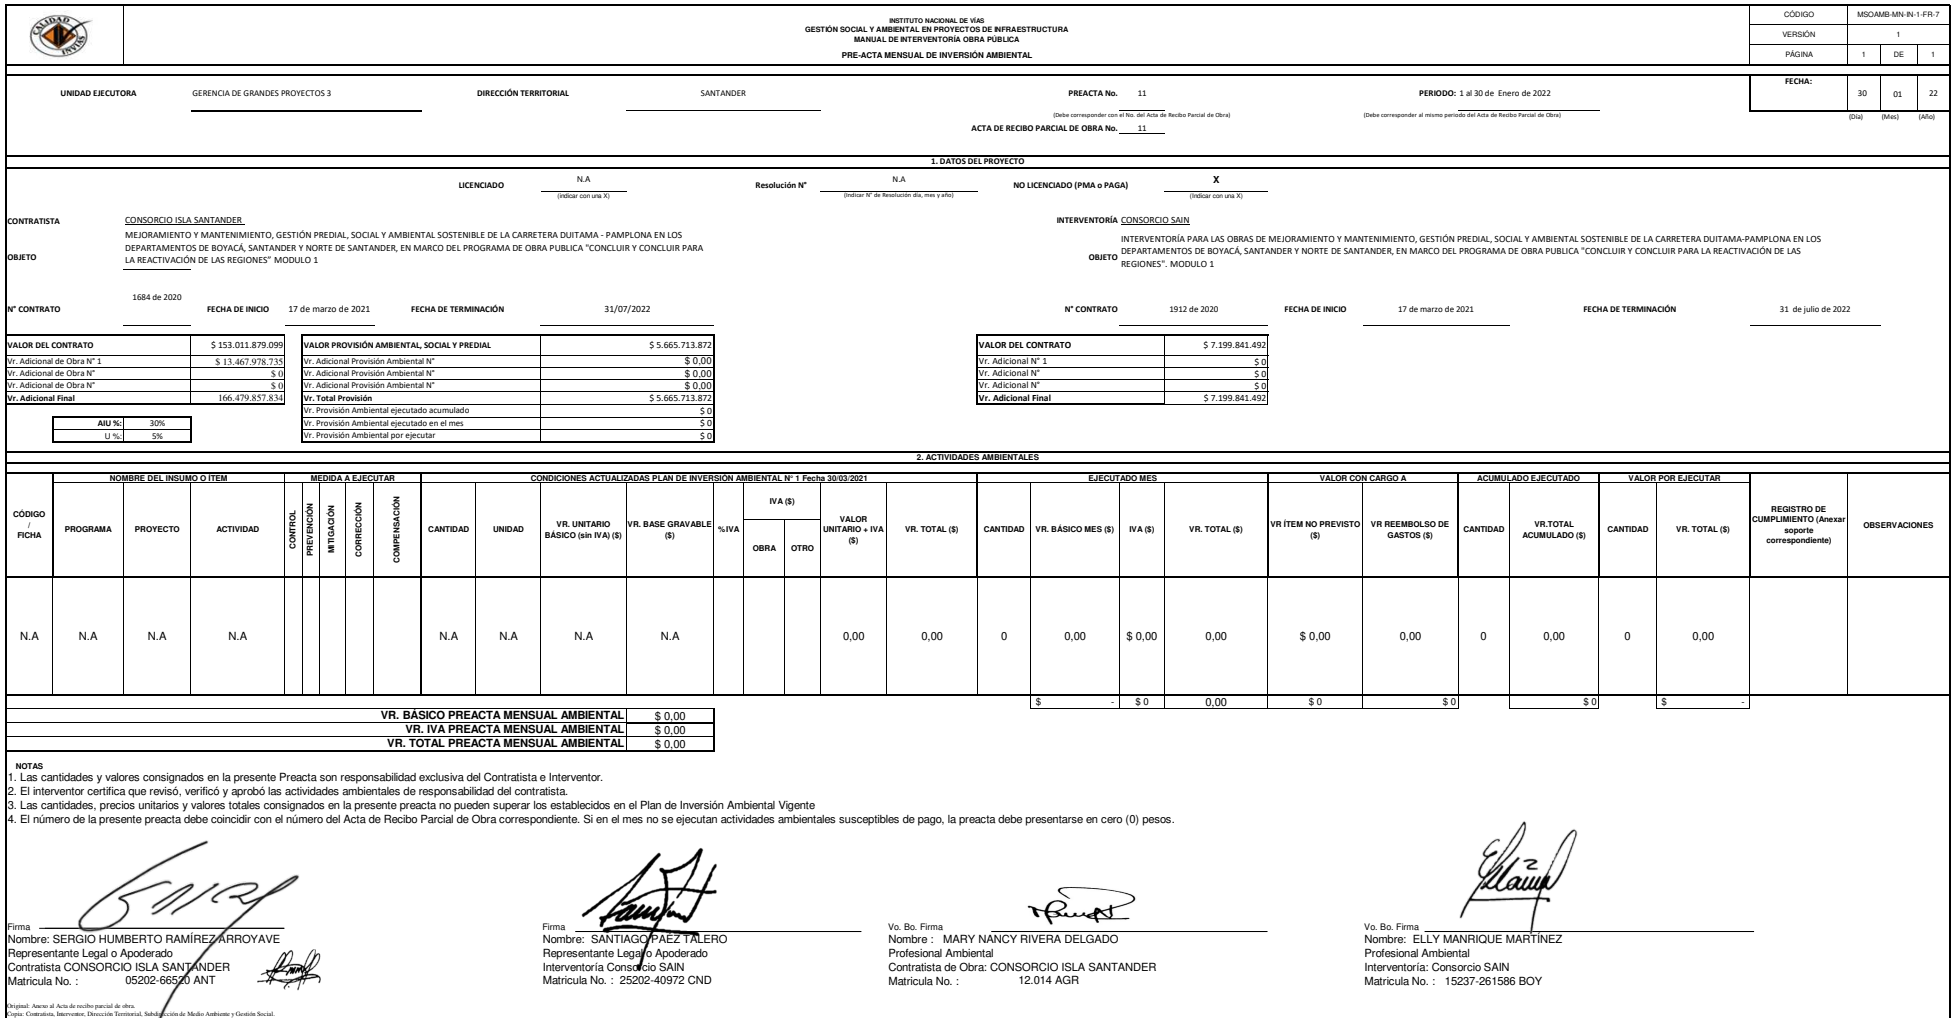

[illegible]


[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ADQUISICIÓN PREDIAL					CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-4-FR-2	
						VERSIÓN		1	
						PÁGINA		1	DE

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	PRE ACTA PREDIAL No:	11
DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	PERIODO - MES:	ENERO DE 2022
		FECHA ELABORACION:	30/01/2022

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
CONTRATO DE OBRA No:	1684 de 2020	PLAZO ACUMULADO:	DIECIOCHO (18) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA SANTANDER	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)	VALOR ADICIÓN No 1:	\$ 13.467.978.735,00
		VALOR ADICIÓN No 2:	\$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1912 de 2020	VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 13.467.978.735,00

2. DESCRIPCIÓN								
Comprobante	Fecha	Predio	Área	Beneficiario	Valor Avalúo	Valor adquisición predial No.		OBSERVACIONES
						Por Predio	Total	
Transferencia bancaria bancoBANCOLOMBIA	29/10/2021	CA 035-F1	GP	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS	\$ 23.827.158,00	\$ 23.827.158,00	\$ 23.827.158,00	PAGO DEL 50% ORDENADO POR SENTENCIA 05-02-2021 DEL JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE MÁLAGA
				GRACIELA BALLESTEROS CENTENO	\$ 23.827.158,00	\$ 23.827.158,00	\$ 23.827.158,00	PAGO DEL 50% ORDENADO POR SENTENCIA 05-02-2021 DEL JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE MÁLAGA
						\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	
TOTAL						\$	47.654.316,00	


Firma  Nombre : MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO Profesional Predial Contratista: Isla Santander Matricula No. : 01112-10627 CPITVC Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.	 Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ Profesional Predial Interventor Matricula No. : 25335144832 CND
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-4-FR-3	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		1	DE

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER		
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------	--	--

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1				
CONTRATO DE OBRA No	1684 de 2020	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1912 de 2020		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA SANTANDER	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO SAIN		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)				

2. DESCRIPCIÓN						
PREDIO	Cedula Ciudadanía/NIT	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
CA 035-F1	890.207.840 28.052.034	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	KM 8+367 D	KM 8+460 D	\$ 47.654.316,00	PREACTA 11



Firma

Nombre : MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO

Profesional Predial Contratista: Isla Santander

Matricula No. : 01112-10627 CPITVC



Firma

Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

Profesional Predial Interventor

Matricula No. : 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA 11 MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO MICHAB-189-B4-P14
				VERSIÓN 2
				PÁGINA 3 DE 5
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		PERIODO - MES: ENERO DE 2022 FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2022
CONTRATO DE OBRA No: 1884 de 2020		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES		VR. INICIAL (INC IVA): \$ 153.011.879.099
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA QUITANA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIACIÓN: 17/03/2021		VR. ANTICIPO: \$ -
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		VR. ADICIÓN No 1: 13.467.978.736.00
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarrachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)		PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES		VR. ADICIÓN No 2: \$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		VR. TOTAL ADICIONES: \$ 13.467.978.736.00
INTERVENTOR: CONSORCIO SAN		FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022		VR. TOTAL ACUM: \$ 166.479.857.834.00
TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL		VR. DE LA GESTIÓN: \$ 5.665.713.872.00		VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: \$ 5.665.713.872.00

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)											
CONCEPTO	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL				
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2884/2016)	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR AVALUO	AVALUO DE MEJORAS SUPERIORES A 2 SMMLV	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR AVALUO SUPERIORES A 2 SMMLV
Valor Unitario	\$ 1.384.000,00	\$ 2.788.000,00	\$ 1.045.000,00	\$ 348.500,00	\$ 754.000,00	\$ 377.000,00	\$ 1.340.000,00	\$ 2.680.000,00	\$ 670.000,00	\$ 860.000,00	\$ 430.000,00
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario	\$ 348.500,00	\$ 231.000,00	\$ 348.500,00	\$ 231.000,00	\$ 115.500,00	\$ 115.500,00	\$ 462.000,00	\$ 231.000,00	\$ 231.000,00
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.000,00	\$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario	\$ 321.000,00	\$ 321.000,00	\$ 107.000,00	\$ 748.000,00	\$ 642.000,00
Cantidad	0	0	0	0	0
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.3. COMPRADE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA A COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00		
Cantidad	0	0	0	0	0	0
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	\$ 640.000,00
Cantidad	0
Valor Total	\$ 0,00

NOTA: ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE FORMATO

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORA	MODIFICAR Y ACTUALIZAR SIN TRABAJO DE CAMPO	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TÍTULOS PARA MEJORAS	DECLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	SOLICITUD ANTE IGAC DE ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	LEVANTAMIENTO O TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE
Valor Unitario (sin IVA)	\$ 1.074.000,00	\$ 805.500,00	\$ 268.500,00	\$ 377.000,00	\$ 320.000,00	\$ 217.000,00	\$ 217.000,00
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	\$ 231.000,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL	\$ 231.000,00
IVA	\$ 43.890,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	\$ 274.890,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES DEL PAGO
1	CA 035-F1	KM 8+387 D	KM 8+460 D	SOLEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS	\$ 23.827.188,00	PAGO DEL 80% ORDENADO POR SENTENCIA 05-02-2021 DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MALAGA
				GRACIELA BALLESTEROS CENTENO	\$ 23.827.188,00	PAGO DEL 80% ORDENADO POR SENTENCIA 05-02-2021 DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MALAGA
TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS (A)					\$ 47.654.376,00	

Subtotal Reembolso por Pago de Adquisición de Predios (2)	\$ 47.654.316,0
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios	\$ 190.617,0
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	\$ 1.191.358,0
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%)	\$ 228.358,0
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$ 49.262.649,0

VR. TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA	\$ 49.267.291,0
IVA PRESENTE PREACTA	\$ 270.248,0
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$ 49.537.539,0

VR. GESTIÓN PREDIAL	\$ 5.665.713.872,0
---------------------	--------------------

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	\$ 0,0
GESTIÓN PREDIAL	\$ 231.000,0
DESEMBOLOS PREDIALES	\$ 47.654.316,0
OTROS	\$ 1.381.975,0
IVA	\$ 270.248,0
VR. TOTAL ACUMULADO	\$ 49.537.539,0

SALDO POR EJECUTAR	\$ 5.616.176.333,0
--------------------	--------------------

- NOTAS
- Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventor.
 - El Interventor certifica que realizó, realizó y realizará las actividades de supervisión y control de la ejecución de la obra pública.
 - Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente Preacta no pueden superar el valor de la prestación predial vigente.
 - El número de la presente preacta debe coincidir con el número de la Preacta de Obra correspondiente. Si en el caso de ser múltiples actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la presente debe presentarse en caso (50) pesos.
 - Se aprueba los campos correspondientes a los trámites administrativos de la gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la presente debe presentarse en caso (50) pesos.
 - Se aprueba los campos correspondientes a los trámites administrativos de la gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la presente debe presentarse en caso (50) pesos.

Firma
Nombre: HUBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matrícula No: 05200-46520 ANT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado: Interventoría Consorcio SAN
Matrícula No: 25202-40972 CHD



BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C, N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7


Bogotá, 30 de Enero de 2022

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Enero de 2022, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

73. Fecha

2 0 2 0 1 1 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 0 1 1 1 0

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV	4	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV	1	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social ISMOCOL S.A.								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7			2 3 8 1 3 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLARO	JAIME		EDUARDO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 0 1 1 1 0				

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 9 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 2 0

4

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 17 / 15 : 32: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 0 2, 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO	107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 4 5 6 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATAÑO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 9, 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 4 3 2 0 9 1 1 4	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 1 0 1 4 2 5 T
	140. Primer apellido CARVAJAL	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre MARIBEL	143. Otros nombres CRISTINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 1 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424			
166. Número de matrícula mercantil	2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono	4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14671263034



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4

1

Impuestos de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

0 9 1 0

1 9 8 2 1 0 1 8

4 2 1 0

2 0 1 8 0 9 2 5

4 3 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 3 7 4 2 4 8

03- Impuesto al patrimonio

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 11 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de febrero de 2022, a las 11:15:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741220201111504

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de febrero de 2022, a las 11:14:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800220201111454

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189284862



WEB

11:14:04

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189284909



WEB

11:14:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de febrero de 2022, a las 11:47:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814220211114706

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de febrero de 2022, a las 11:46:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	71714292220211114644

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190152574



WEB

11:51:31

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190152512



WEB

11:51:08

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.
