

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000043

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 29/07/2022
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$6.775.376.258,00	\$0,00		\$6.775.376.258,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$1.355.075.252,00	\$0,00		\$1.355.075.252,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$338.768.813,00	\$0,00		\$338.768.813,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$338.768.813,00	\$64.366.074,00		\$403.134.887,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$184.649.500,00	\$35.083.405,00		\$219.732.905,00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1,0000	\$4.314.078,00	\$0,00		\$4.314.078,00
VS0057	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,0000	\$107.852,00	\$20.492,00		\$128.344,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$2.642.396.741,00	-\$2.642.396.741,00

TOTALES	\$8.997.060.566,00	\$99.469.971,00	-\$2.642.396.741,00	\$6.454.133.796,00
---------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------


Notas

#\$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 16 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JUNIO 2022

601M

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO	MEPI/MN1-IN-4-FR-1		
								VERSION	1		
								PÁGINA			
								FECHA	29	7	2022
								(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER		ACTA No.	16	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 8.997.060.566,00		MES 1 JUN 22 - 30 JUN 22
								ACTA FINAL			
CONTRATO No.:		1684 DE 2021				PLAZO INICIAL:		DIECIOCHO (18) MESES		PLAZO ACUMULADO:	
		(Indique número y año)						(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		17/03/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		Hasta 31/12/2022	
						(Indique día/mes/año)				(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA SANTANDER				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 153.011.879.099,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1912 DE 2020		INTERVENTOR:	CONSORCIO SAIN				(Según contrato principal)		\$ 61.967.978.735,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):										\$ 214.979.857.834,00	
VI.-SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
47	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	\$ 1.804,00	\$ 186.757.296,00	1.500.000,00	\$ 2.706.000.000,00	165.440,00	\$ 298.453.760,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	10.350,00	\$ 234.499.950,00	1.036,20	\$ 23.477.183,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	\$ 8.308,00	\$ 13.691.232,00	15.644,00	\$ 130.283.232,00	0,00	\$ -
50	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	196,00	\$ 77.062.888,00	0,00	\$ -
51	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	50,00	\$ 16.145.050,00	0,00	\$ -
52	8	720-13	Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	27,00	\$ 6.799.707,00	0,00	\$ -
53	8	730-13	Defensa metálica	m	4.100,00	\$ 228.676,00	\$ 937.571.600,00	3.048,00	\$ 697.004.448,00	0,00	\$ -
54	8	730-13	Sección final	u	100,00	\$ 102.870,00	\$ 10.287.000,00	160,00	\$ 16.459.200,00	0,00	\$ -
55	8	740-13	Capitulares	u	1.039,00	\$ 21.955,00	\$ 22.821.635,00	800,00	\$ 17.572.000,00	0,00	\$ -
VII.- OBRAS VARIAS											
56	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	31.500,00	\$ 546.619.500,00	0,00	\$ -
57	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33.489,00	\$ 5.020.350,00	20,00	\$ 669.380,00	0,00	\$ -
58	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de cispag	m2	16.120,00	\$ 18.372,00	\$ 296.156.640,00	16.120,00	\$ 296.156.640,00	0,00	\$ -
VIII.- TRANSPORTES											
59	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	1.741.874,00	\$ 1.916.061.400,00	7.424,00	\$ 8.166.400,00
60	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	3.263.580,00	\$ 3.589.938.000,00	424.669,00	\$ 467.135.900,00
Ajuste el Peso											
ITEM NO PREVISTOS											
61	8	700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		\$ 1.443,00		262.494,00	\$ 378.778.842,00	76.118,00	\$ 109.838.274,00
62	8	700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		\$ 19.052,00		207,00	\$ 3.943.764,00	0,00	\$ -
63	8	461.1.P	Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3		\$ 57.011,00		40.995,00	\$ 2.337.165.945,00	1.925,20	\$ 109.757.577,00
64	6	663.1.1	Tubería de plástico tipo Novofort de 30"	m		\$ 1.575.074,00		400,00	\$ 630.229.600,00	122,10	\$ 450,00
65	8	450.1.P	Mezcla Densa en Caliente MDC-25	m3		\$ 901.420,00		17.469,00	\$ 14.000.005.980,00	0,00	\$ -
66	8	7P	Suministro e instalación de resalto de plástico	m		\$ 361.131,00		80,00	\$ 28.890.480,00	0,00	\$ -
67	6	8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m	m2		\$ 31.539,00		4.316,00	\$ 136.122.324,00	0,00	\$ -
68	6	9P	Contenedor en geotextil de políester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio	und		\$ 1.771.103,00		446,00	\$ 789.911.938,00	0,00	\$ -
69	6	10P	Geotextil tejido de políester de 650 kn/m.	m2		\$ 19.549,00		2.200,00	\$ 43.007.800,00	0,00	\$ -
70	2	230-2P	Material de mejoramiento para subrasante	m3		\$ 58.891,00		10.000,00	\$ 588.910.000,00	1.069,00	\$ 62.954.479,00
71	2	230.3P	Material clasificado para relleno de geoceldas	m3		\$ 24.577,00		12.000,00	\$ 294.924.000,00	0,00	\$ -
72	2	11P	Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.	m2		\$ 81.678,00		120.000,00	\$ 9.801.360.000,00	10.793,00	\$ 881.550.654,00
73	2	12P	Geodren Triplanar	m2		\$ 70.056,00		120.000,00	\$ 8.406.720.000,00	10.788,00	\$ 755.764.128,00
74	8	450.10P	Mezcla densa en caliente tipo mdo-19 para parcheo	m3		\$ 934.237,00		21.277,00	\$ 19.877.760.649,00	2.042,30	\$ 1.907.992.225,00
75	2	310-13.1P	Conformación de jarrillón para encauce de río	m3		\$ 34.803,00		38.000,00	\$ 1.322.514.000,00	0,00	\$ -
Ajuste el Peso											
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)						\$ 133.797.906.926,00		\$ 160.174.004.673,00		\$ 8.807.989.136,00	\$ 66.973.037.564,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						\$ 10.866.073.596,00		\$ 24.236.346.491,00		\$ -	\$ 1.480.472.753,00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)						\$ 180.803.590,00		\$ 180.803.590,00		\$ -	\$ -
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						\$ 144.844.784.112,00		\$ 204.591.154.754,00		\$ 8.807.989.136,00	\$ 68.453.510.317,00
* VALOR IVA (OBRA) (E)						\$ 1.058.481.115,00		\$ 1.485.089.208,00		\$ 64.366.074,00	\$ 500.237.191,00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)						\$ 145.903.265.227,00		\$ 206.086.243.962,00		\$ 8.872.355.210,00	\$ 68.953.747.508,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						\$ 910.000.000,00		\$ 910.000.000,00		\$ -	\$ 546.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						\$ 172.900.000,00		\$ 172.900.000,00		\$ -	\$ 103.740.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H						\$ 1.082.900.000,00		\$ 1.082.900.000,00		\$ -	\$ 649.740.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES								\$ 1.500.000.000,00		\$ -	\$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES								\$ 285.000.000,00		\$ -	\$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES								\$ 1.785.000.000,00		\$ -	\$ -
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)						\$ 360.000.000,00		\$ 360.000.000,00		\$ 4.442.422,00	\$ 12.964.005,00
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)						\$ 5.665.713.872,00		\$ 5.665.713.872,00		\$ 219.732.905,00	\$ 269.270.444,00
* VALOR TOTAL						\$ 153.011.879.099,00		\$ 214.979.857.834,00		\$ 9.096.530.537,00	\$ 69.885.721.957,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.											


Contra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEPI/MN1-IN-4-FR-1																																																																																																							
VERSION 1		PÁGINA																																																																																																								
FECHA 29 7 2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER																																																																																																							
ACTA No.	16	VALOR BÁSICO ACTA: \$	8.997.060.566,00																																																																																																							
ACTA FINAL	□	MES	1 JUN 22 - 30 JUN 22																																																																																																							
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las promesas sin suspensiones)																																																																																																							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código via)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00																																																																																																							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 214.979.857.834,00																																																																																																										
AIU 30,0 % Utilidad 5,0 %																																																																																																										
Valor Anticipo Otorgado \$ 64.025.449.331,00 35,54% Valor Amortizado Presenta Acta \$ 2.642.395.741,00 30% Valor Amortizado Acumulado \$ 23.042.040.453,00 36% Valor Saldo por Amortizar \$ 40.983.408.878,00 64%																																																																																																										
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO		RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																																																																								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.		RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																																																																																								
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>\$ 8.807.989.136,00</td><td>\$ 64.366.074,00</td><td>\$ 8.872.355.210</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19</td><td>\$ 4.421.930,00</td><td>\$ 20.492,00</td><td>\$ 4.442.422</td></tr><tr><td>GESTION PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 184.649.500,00</td><td>\$ 35.083.405,00</td><td>\$ 219.732.905</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 8.997.060.566,00</td><td>\$ 99.469.971,00</td><td>\$ 9.096.530.537</td></tr></tbody></table>			VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 8.807.989.136,00	\$ 64.366.074,00	\$ 8.872.355.210	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	\$ 4.421.930,00	\$ 20.492,00	\$ 4.442.422	GESTION PREDIAL (PREACTA)	\$ 184.649.500,00	\$ 35.083.405,00	\$ 219.732.905	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 8.997.060.566,00	\$ 99.469.971,00	\$ 9.096.530.537	<table><thead><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>\$ 249.623.685</td><td>\$ 1.577.395.772</td></tr><tr><td>II</td><td>\$ 220.019.319</td><td>\$ 4.687.257.857</td></tr><tr><td>III</td><td>\$ 862.921.941</td><td>\$ 17.344.219.634</td></tr><tr><td>IV</td><td>\$ 315.592.306</td><td>\$ 3.072.758.810</td></tr><tr><td>V</td><td>\$ 2.342.363.720</td><td>\$ 11.089.807.280</td></tr><tr><td>VI</td><td>\$ 321.930.943</td><td>\$ 1.578.473.688</td></tr><tr><td>VII</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VIII</td><td>\$ 475.302.300</td><td>\$ 2.143.906.598</td></tr><tr><td>IX</td><td>\$ 4.020.234.922</td><td>\$ 25.479.217.925</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 8.807.989.136</td><td>\$ 66.973.037.564</td></tr></tbody></table>	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	I	\$ 249.623.685	\$ 1.577.395.772	II	\$ 220.019.319	\$ 4.687.257.857	III	\$ 862.921.941	\$ 17.344.219.634	IV	\$ 315.592.306	\$ 3.072.758.810	V	\$ 2.342.363.720	\$ 11.089.807.280	VI	\$ 321.930.943	\$ 1.578.473.688	VII	\$ -	\$ -	VIII	\$ 475.302.300	\$ 2.143.906.598	IX	\$ 4.020.234.922	\$ 25.479.217.925	TOTAL	\$ 8.807.989.136	\$ 66.973.037.564	<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 701.240.643,00</td><td>\$ 3.401.237.691</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 2.894.581.063,00</td><td>\$ 15.148.398.796</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 475.302.300</td><td>\$ 2.143.906.602</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 103.204.950</td><td>\$ 832.345.090</td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 1.005.626.914</td><td>\$ 5.802.742.014</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 3.628.033.266</td><td>\$ 39.646.407.371</td></tr><tr><td>(N) Items no sujetos a ajuste</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Explanación	\$ 701.240.643,00	\$ 3.401.237.691	2 Sub-bases y bases	\$ 2.894.581.063,00	\$ 15.148.398.796	3 Transporte de materiales	\$ 475.302.300	\$ 2.143.906.602	4 Aceros y elementos metálicos	\$ 103.204.950	\$ 832.345.090	5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1.005.626.914	\$ 5.802.742.014	7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 3.628.033.266	\$ 39.646.407.371	(N) Items no sujetos a ajuste		
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																																																																							
OBRA	\$ 8.807.989.136,00	\$ 64.366.074,00	\$ 8.872.355.210																																																																																																							
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																							
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	\$ 4.421.930,00	\$ 20.492,00	\$ 4.442.422																																																																																																							
GESTION PREDIAL (PREACTA)	\$ 184.649.500,00	\$ 35.083.405,00	\$ 219.732.905																																																																																																							
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																							
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 8.997.060.566,00	\$ 99.469.971,00	\$ 9.096.530.537																																																																																																							
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																																																																								
I	\$ 249.623.685	\$ 1.577.395.772																																																																																																								
II	\$ 220.019.319	\$ 4.687.257.857																																																																																																								
III	\$ 862.921.941	\$ 17.344.219.634																																																																																																								
IV	\$ 315.592.306	\$ 3.072.758.810																																																																																																								
V	\$ 2.342.363.720	\$ 11.089.807.280																																																																																																								
VI	\$ 321.930.943	\$ 1.578.473.688																																																																																																								
VII	\$ -	\$ -																																																																																																								
VIII	\$ 475.302.300	\$ 2.143.906.598																																																																																																								
IX	\$ 4.020.234.922	\$ 25.479.217.925																																																																																																								
TOTAL	\$ 8.807.989.136	\$ 66.973.037.564																																																																																																								
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																																																								
1 Obras de Explanación	\$ 701.240.643,00	\$ 3.401.237.691																																																																																																								
2 Sub-bases y bases	\$ 2.894.581.063,00	\$ 15.148.398.796																																																																																																								
3 Transporte de materiales	\$ 475.302.300	\$ 2.143.906.602																																																																																																								
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 103.204.950	\$ 832.345.090																																																																																																								
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -																																																																																																								
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1.005.626.914	\$ 5.802.742.014																																																																																																								
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -																																																																																																								
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 3.628.033.266	\$ 39.646.407.371																																																																																																								
(N) Items no sujetos a ajuste																																																																																																										
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 8.997.060.566 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 6.354.663.825		VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE																																																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 6.454.133.796 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																																										
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																										
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normalidad vigente relacionada con la norma electrónica. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 9. El valor básico del acta es \$ 8.997.060.566,00 y la amortización es \$ 5.135.018,531, equivalente al 48 %, el valor de IVA es \$ 99.469.971,00, la factura es \$ 6.454.133.796,00* 5. El valor del acta básico es \$ 8.997.060.566,00, la amortización es 48% que corresponde en la presente acta a \$5.135,018,531																																																																																																										
Para constancia de lo anterior firman																																																																																																										
 Firma: _____ Nombre: HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula No: 65203-66520 ANT		 Firma: _____ Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal o Apoderado Interventor Matrícula No: 25202-40972 CND																																																																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN- IN-4-FR-2
			VERSION 1
			PÁGINA DE
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3			FECHA 29 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 16 (Indique el número del acta)		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)	PERIODO MES: 1 JUN 22 - 30 JUN 22 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 8.997.060.566

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	02/08/2022	Pedro Nel Sarmiento		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	03/08/2022	Pedro Nel Sarmiento		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8/08/2022	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08/08/2022	DIEGO OSORIO GAMBOA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020	NIT. 901.441.547-7
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1	
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 6.454.133.796.00	VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL PERIODO 1 JUN 22 - 30 JUN 22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
 Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez Matrícula No 66202090949 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: Diego Osorio Gamboa Matrícula No 66202090949 GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
 Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: Liliana Ivonne Orjuela Diaz Matrícula No 66700 63603 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☒ DEF. No 16	1 JUN 22 - 30 JUN 22
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐	
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
			OTRO	☐	
			CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>89922</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-86-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>6.454.133.796</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>6.454.133.796</u>

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

NOMBRE
Mantrícula N°

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER				
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.						
Acta Obra N° 16	Valor básico	\$	8.997.060.566	Período	1 JUN 22 - 30 JUN 22		
Valor Incluido Iva	\$	9.096.530.537					

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ 1.446.882.918,56	\$ -		\$ 1.446.882.919,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	\$ 1.231.242.070,37	\$ -		\$ 1.231.242.070,37
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ -			\$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ -			\$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ 782.907.783,61	\$ -		\$ 782.907.783,61
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ 6.596.331,07	\$ -		\$ 6.596.331,07
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	\$ -			\$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 4.785.405.377,00	\$ -		\$ 4.785.405.377,00
12	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ 843.496.056,39	\$ -		\$ 843.496.056,39
						\$ -
TOTALES			\$ 9.096.530.537	\$ -	0	\$ 9.096.530.537

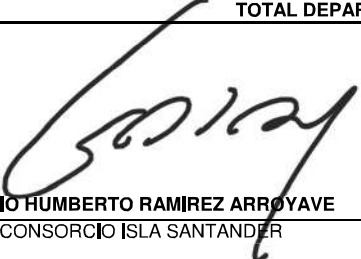
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ 39.004.560	\$ 38.578.048
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 89.345.269	\$ 88.368.284
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	BELEN	\$ 1.318.533.089	\$ 1.304.115.016
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 7	SUSACON	\$ 1.095.754.152	\$ 1.083.772.152
	MUNICIPIO 8	SOATA	\$ 88.853.321	\$ 87.881.715
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	\$ 46.634.598	\$ 46.124.651
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		\$ 2.678.124.989	\$ 2.648.839.866

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 782.907.784	\$ 774.346.738
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ 6.596.331	\$ 6.524.201
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 4.785.405.377	\$ 4.733.077.280
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 5.574.909.492	\$ 5.513.948.218

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ 843.496.056	\$ 834.272.482
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ 843.496.056	\$ 834.272.482

TOTAL		\$ 9.096.530.537	\$ 8.997.060.566
--------------	--	-------------------------	-------------------------

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	 Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERÓ CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	--

Empresa: CONSORCIO ISLA SANTA
NIT: 901441547
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ESTAMPI-LLA-OV-43-SD
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 81400001138

Fecha: 05-08-2022 **Hora:** 14:51:03
Fecha de Generación: 05-08-2022

Fecha de envío del pago: 04-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2022

Impreso por: Ec9103097

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$26,489,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$26,489,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000616461240	Corriente	891800330	UPTC ESTAMPILLAS	26,489,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2022


Bogotá, 1 de Julio de 2022

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Junio de 2022, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER

