

INFORME SEMANAL

CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 28 de noviembre al 03 de diciembre de 2022 - Semana 21


1. AVANCES:

SEMANA	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
17	65,56%	16,39%	47,40%	0,00%
18	69,44%	17,36%	50,74%	0,00%
19	73,33%	18,32%	52,36%	0,00%
20	77,22%	19,29%	55,03%	0,00%
21	81,11%	20,26%	58,16%	0,00%
22				
23				
24				

AVANCE FÍSICO

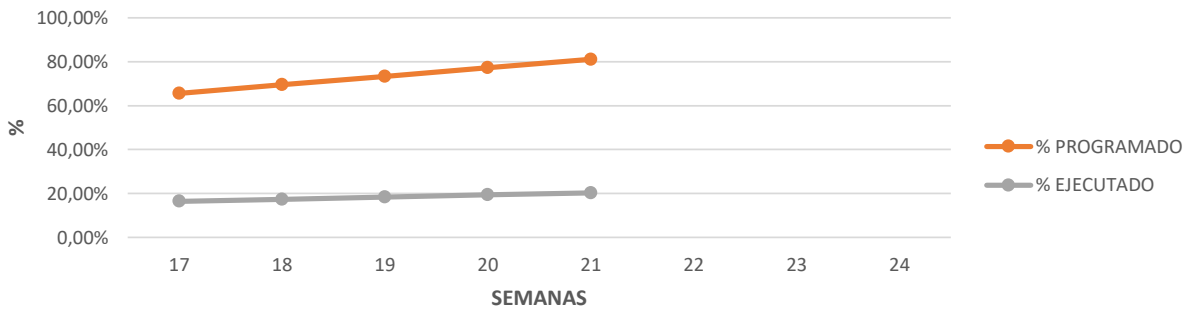

AVANCE FINANCIERO

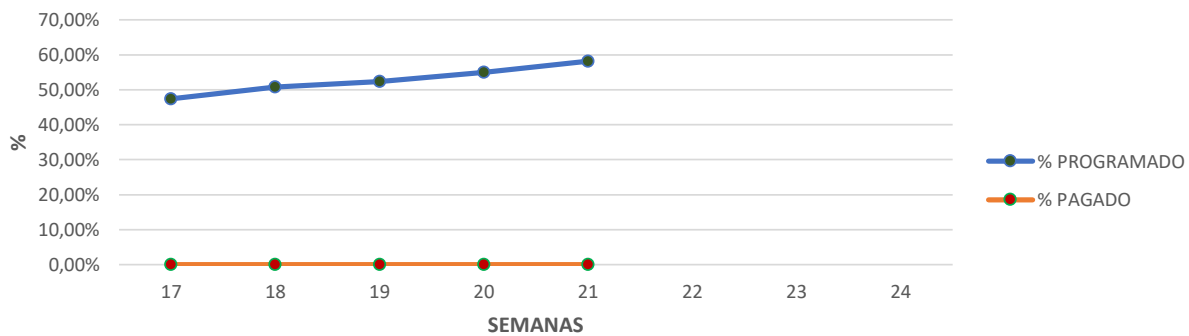

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se sigue ejecutando el balance financiero por parte del contratista de obra, se están consiguiendo los soportes de los ítems que no figuran en el ICCU.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoría nublado tuvo un total de 25 horas, seco 14 horas y tiempo lluvioso 11 horas.
Las lluvias han disminuido considerablemente, pero han sido fuertes.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
No se trabajó en obra.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
No se trabajó en obra.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
En la semana del 28 de noviembre al 03 de diciembre no se realizó ninguna actividad en obra.
Se envió un llamado de atención al contratista el pasado 25 de noviembre, el cual no se ha recibido ninguna respuesta a esta.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
