



PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

IDU · 1712 · 2020 · PATIOLAREFORMA · CLB · 20221223



CONTRATO 1712 de 2020

ID	Ignore Resource Calendar	Task Calendar	WBS	Nombre de tarea	Plazo	Start	Finish	Cost	Predecessors	Successors	
0	No	None	0	1.IDU-1712-2020-PATIOLAREFORMA-CLB-20221223	765 d	Mon 21-02-08	Wed 23-06-07	\$ 148,121,592,031			
1	Yes	IDU1712	1	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	765 d	Mon 21-02-08	Wed 23-06-07	\$ 148,121,592,031			
2	Yes	IDU1712	1.1	Acta de Inicio	0 d	Mon 21-02-08	Mon 21-02-08	\$ 0		4FS+1 d	
3	Yes	IDU1712	1.2	FASE DE PRELIMINARES	116 d	Mon 21-02-08	Thu 21-07-29	\$ 236,669,471			
214	Yes	IDU1712	1.3	FASE PRELIMINARES - OBRA	41 d	Mon 21-02-08	Fri 21-04-09	\$ 96,983,404			
219	Yes	IDU1712	1.4	FASE DE EJECUCIÓN	717 d	Tue 21-04-20	Wed 23-06-07	\$ 147,787,939,156			
220	Yes	IDU1712	1.4.1	OBRA (Civiles, redes, AIU, componentes, ajustes, compensaciones e implementación de protocolos de Bioseguridad)	714 d	Tue 21-04-20	Sun 23-06-04	\$ 147,787,939,156			
221	Yes	IDU1712	1.4.1.1	Inicio Fase de Ejecución	0 d	Tue 21-04-20	Tue 21-04-20	\$ 0 213FS-68 d,218		238,277FS+95 d,296FS+2	
222	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.2		Entrega Licencia de Construcción	0 d	Tue 22-01-25	Tue 22-01-25	\$ 0 221FS+281 d		223FS-24 d,261,262,263	
223	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.3		Ajuste Diseño Redes Externas y Gestión ante la EAAB	150 d	Sun 22-01-02	Tue 22-05-31	\$ 43,473,550 222FS-24 d		252,280FS-80 d,225FS+3	
224	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.4		Ajuste Auditorio Edif. Administrativo	30 d	Sat 22-05-07	Sun 22-06-05	\$ 0 223FS-25 d		474	
225	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.5		Aprobación Diseño Redes Externas (EAAB)	31 d	Fri 22-07-01	Sun 22-07-31	\$ 0 223FS+30 d		474,252	
226	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.6		Seguimiento de Ajustes y Diseños	106 d	Wed 21-07-21	Thu 21-11-04	\$ 0			
235	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7		FASE I - EJECUCIÓN ACTUAL	746 d	Tue 21-04-20	Fri 23-05-05	\$ 78,100,513,420			
236	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.1		0.Actividades Preliminares Lote	256 d	Tue 21-04-20	Fri 21-12-31	\$ 17,136,618,067			
244	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.2		1.Patio Taller	498 d	Tue 21-08-31	Tue 23-01-10	\$ 17,797,461,385			
258	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.3		2.Construccion Edificio Administrativo	280 d	Sat 22-07-30	Fri 23-05-05	\$ 2,263,041,463			
265	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.4		4.Construccion Edificio Ambiental	211 d	Fri 22-06-03	Sat 22-12-31	\$ 431,265,370			
272	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.5		10.Deprimido	527 d	Fri 21-07-23	Sun 23-01-01	\$ 7,084,111,742			
283	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.6		12.Cubierta Carcamos	198 d	Sat 22-03-26	Mon 22-10-10	\$ 4,534,026,322			
294	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.7		13.Muro Cerramiento	216 d	Wed 22-06-08	Tue 23-01-10	\$ 343,156,865			
301	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.8		14.1 Muro Contención	570 d	Sat 21-06-19	Tue 23-01-10	\$ 2,633,116,849			
311	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.9		14.2 Estabilización Talud Sur-Oriental	145 d	Fri 22-07-29	Wed 22-12-21	\$ 19,004,367,251			
317	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.10		15.Muro Convencional	387 d	Fri 21-07-30	Sun 22-08-21	\$ 5,970,821,565			
325	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.7.11		16.Tanques	80 d	Sat 22-04-30	Tue 22-07-19	\$ 902,526,541			
334	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8		FASE II -	155 d	Sat 22-12-31	Sun 23-06-04	\$ 69,643,952,186			
335	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.1		1.Patio Taller	155 d	Sun 23-01-01	Sun 23-06-04	\$ 11,989,614,202			
344	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.2		2.Construccion Edificio Administrativo -FASE II	155 d	Sun 23-01-01	Sun 23-06-04	\$ 3,570,019,145			
350	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.3		4.Construccion Edificio Ambiental - FASE II	140 d	Sat 22-12-31	Sat 23-05-20	\$ 707,558,767			
356	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.4		3.Construccion Porteria de Servicios	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 44,775,988			
366	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.5		5.Construccion Edificio Carcamos	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 228,276,569			
376	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.6		6.Construccion Edificio Bienestar	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 34,770,532			
386	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.7		7.Construccion Edificio Electrico	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 692,813,743			
396	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.8		8.Construccion Edificio de Lavado	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 94,625,364			
406	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.9		9.Construccion Bicicparquadero	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 46,497,137			
415	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.10		10.Deprimido -FASE II	155 d	Sun 23-01-01	Sun 23-06-04	\$ 4,108,022,110			
421	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.11		11.Cerchas	10 d	Mon 23-03-20	Wed 23-03-29	\$ 52,556,009			
428	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.12		14.1 Fase II-Muro de Contención	77 d	Mon 23-03-20	Sun 23-06-04	\$ 5,861,002,902			
432	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.13		14.2 Estabilización Talud Sur-Oriental FASE II	138 d	Tue 23-01-17	Sun 23-06-04	\$ 38,836,929,625			
440	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.14		17.Cicloruta	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 268,690			
449	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.15		18.Carril Intercambiador Yomasa-Patio	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 1,476,626,161			
460	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.16		19.Espacio Público	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 330,102,006			
464	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.8.17		20.Muro Mecanicamente Estabilizado	10 d	Fri 23-05-26	Sun 23-06-04	\$ 1,569,493,236			
472	Yes	IDU-1712-Ob 1.4.1.9		Fin Fase de Ejecución	0 d	Sun 23-06-04	Sun 23-06-04	\$ 0 364,374,384,394,404474,475			
473	Yes	IDU1712	1.4.2	RECIBO DE LA OBRA	3 d	Mon 23-06-05	Wed 23-06-07	\$ 0			
474	Yes	IDU1712	1.4.2.1	Recibo de la Obra	3 d	Mon 23-06-05	Wed 23-06-07	\$ 0 472,225,224		475	
475	Yes	IDU1712	1.5	FIN CONTRATO	0 d	Wed 23-06-07	Wed 23-06-07	\$ 0 472,474			


Proyecto: PDT CTO IDU 1712-2
Fecha: mar 29/06/2021

Tarea
División
Hito

	Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		Progreso
	Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual

ING. FERNANDO VEGA
DIRECTOR DE OBRA

ING. ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

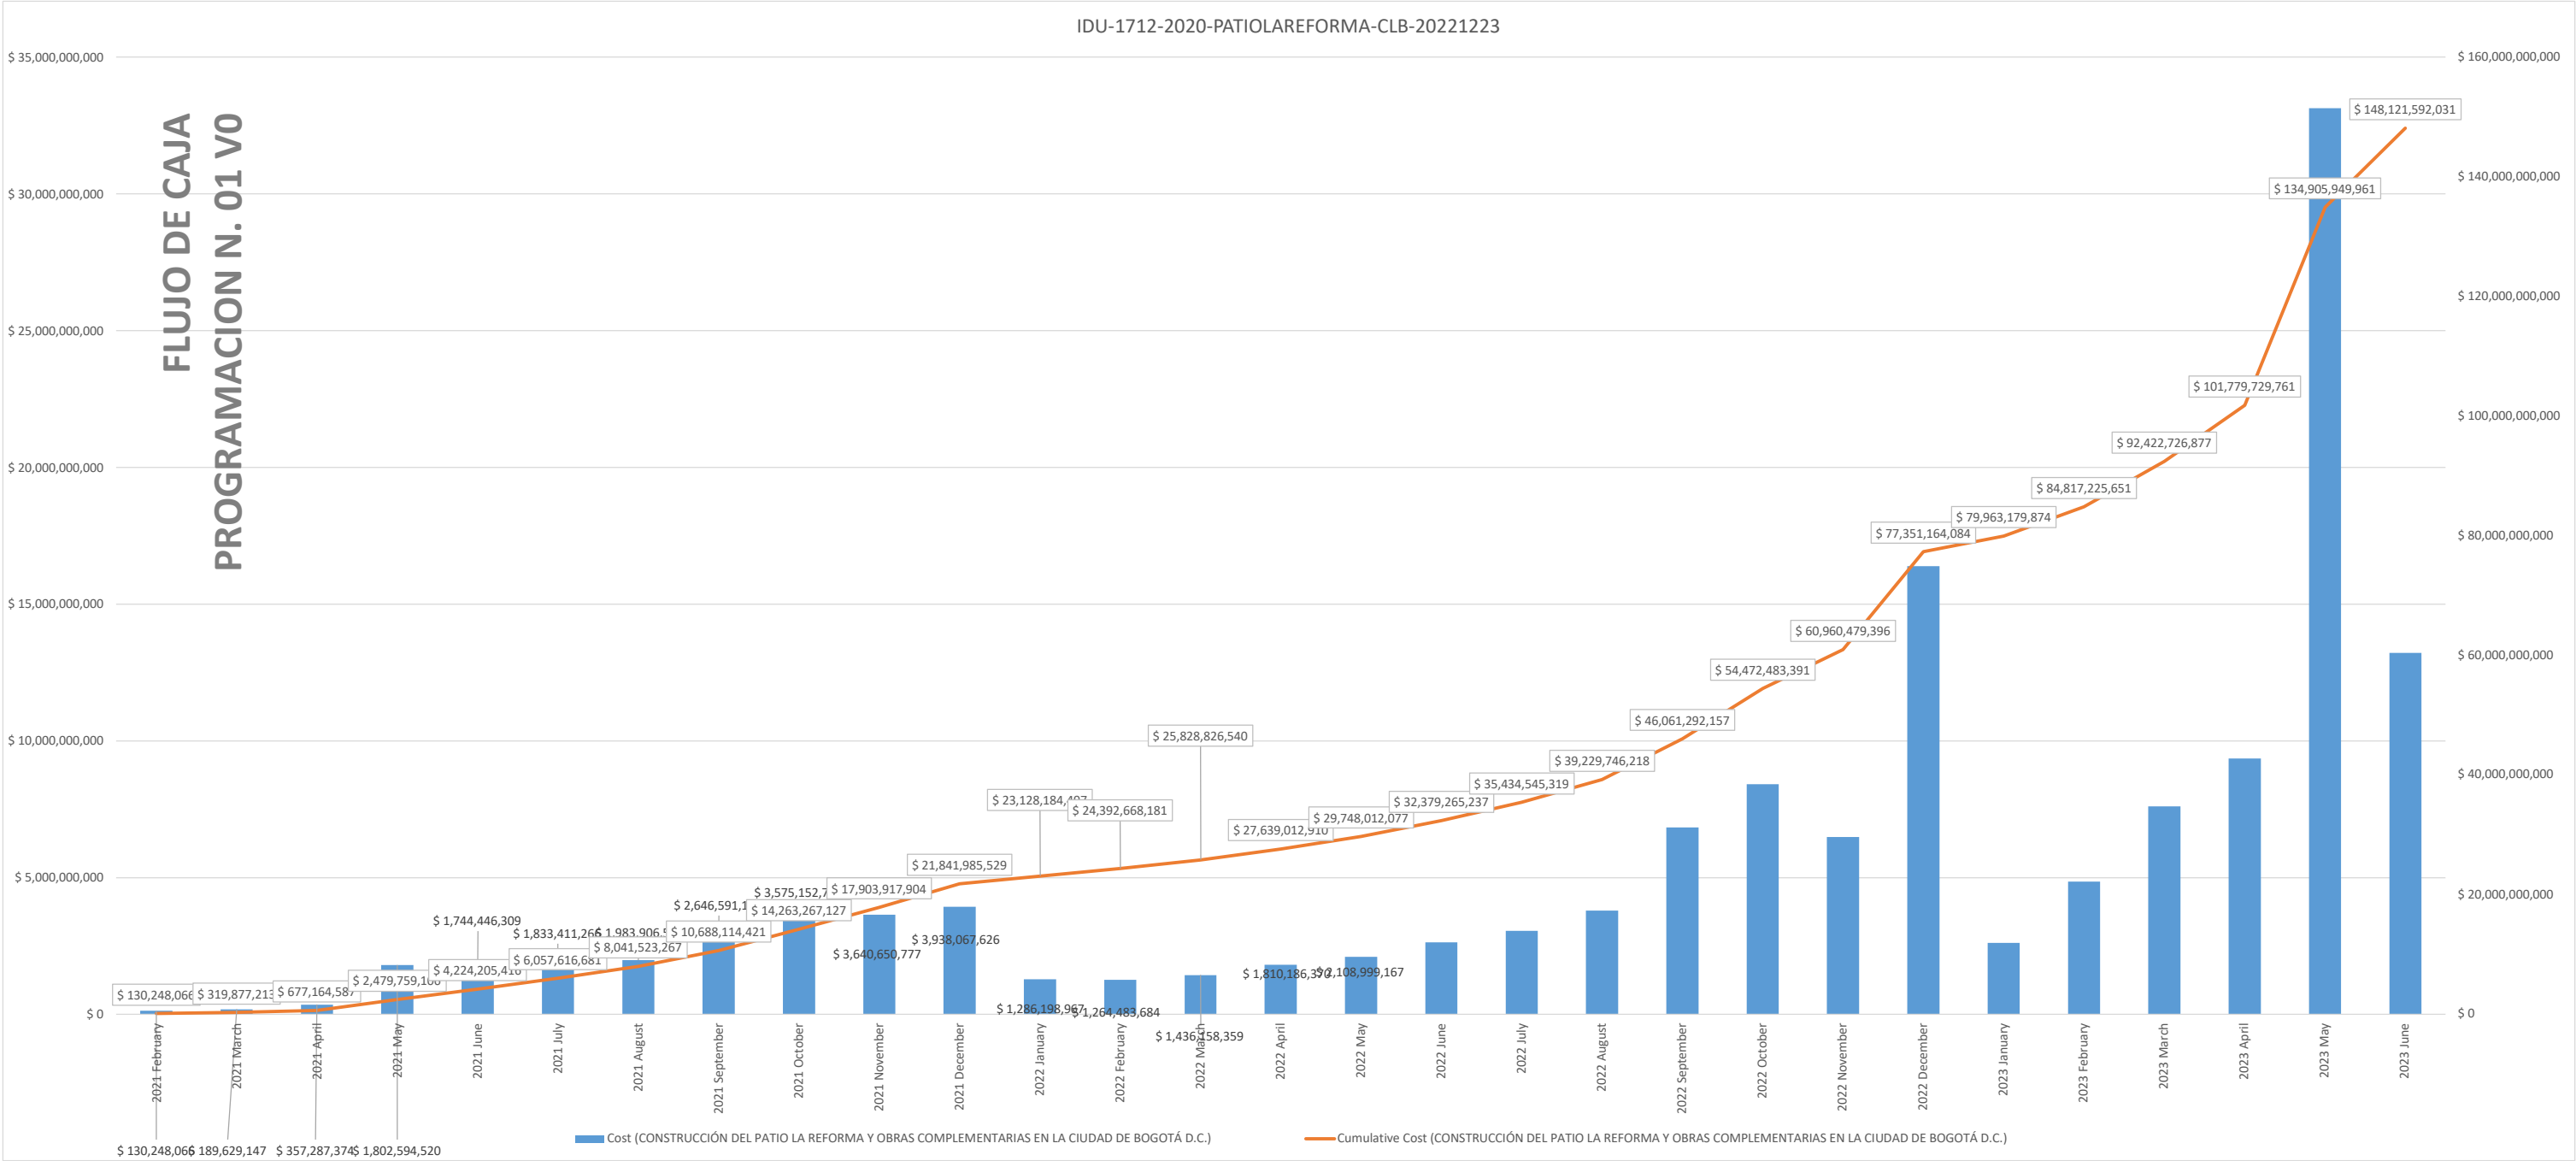

ID	Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	BCWS
1	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 148,121,592,031	\$ 0	\$ 148,121,592,031	\$ 79,963,179,874
2	Acta de Inicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	FASE DE PRELIMINARES	\$ 236,669,471	\$ 0	\$ 236,669,471	\$ 236,669,471
214	FASE PRELIMINARES - OBRA	\$ 96,983,404	\$ 0	\$ 96,983,404	\$ 96,983,404
219	FASE DE EJECUCIÓN	\$ 147,787,939,156	\$ 0	\$ 147,787,939,156	\$ 79,629,526,999
475	FIN CONTRATO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

[Handwritten signature]
