

HOJA N°1 CONTINUACION

ACTA N° 00138187

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



**EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

ACTA No. 00138187

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 26 de enero de 2023

INTERVIENEN: TC. JOHN JAIRO MEDINA AVILA
OFICIAL DE CONTRATACION Y
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ING

Señor. NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

MY. CRISTIAN JAVIER PEREZ LLORENTE
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA CENAC-ING

ASUNTO: PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

A. ORIGEN DE LOS RECURSOS

HOJA N°2 CONTINUACION

ACTA N° 00138187

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERÍAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERÍA, DEPÓSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y FORTIFICACIÓN PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022

El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (412.457.689,00). M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES. amparado con el CDP No.18422 del 18 de febrero de 2022.

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO	CONTRATO	A LIBERAR
C-1502-0100-32-0-1502088-02	16	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL	413.457.732,00	412.457.689,00	1.000.043,00
			413.457.732,00	412.457.689,00	1.000.043,00

El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$ 423.045.210,00). M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.

VALOR DEL CONTRATO ANTES DE ADICIÓN	ADICIÓN POR UN VALOR DE	UNIDAD	VALOR TOTAL
\$412.457.689,00	\$10.587.521,00	BASMIL	\$ 423.045.210,00
TOTAL			\$ 423.045.210,00

B. EJECUTANTE

- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISOR:

Representante Legal: NESTOR ROJAS TORRES
CC. 3.249.514

C. CONSIDERACIONES

Que el día 05 de mayo de 2022, se suscribió el contrato de interventoría No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

Que el día 01 de julio de 2022, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra e interventoría.

Que el día 12 de octubre de 2022, se suscribió el contrato modificatorio No. 001 – adicional No. 001 al contrato de interventoría No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.587.521,00).

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXION, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXION A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022.

Que la supervisión del contrato de interventoría recomienda efectuar la prórroga al contrato 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, en razón que al contrato de obra No. 163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, se le aprobó una prórroga por el termino de 60 días, es decir hasta el día 02 de marzo de 2022.

Que se hace necesario efectuar la prórroga en las mismas condiciones a la interventoría de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Que el día 28 de diciembre de 2022, el contratista de interventoría NESTOR ROJAS TORRES, mediante comunicación No. CENAC-ARGELIA-2021-045-C emite concepto de acuerdo a la solicitud del contratista de obra a la entidad para realizar la suspensión del contrato en tiempo con fecha de terminación hasta el día 26 de enero de 2023.

Que el día 26 de enero de 2022, la supervisión del contrato de interventoría recomienda efectuar la prórroga a la suspensión del contrato 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, por medio de comunicación No. CENAC-ARGELIA-2021-046-C, en razón que al contrato de obra No. 163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, se le aprobó una prórroga con fecha de terminación hasta el día 16 de febrero de 2023

D. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo al oficio con referencia: **CENAC-ARGELIA-2021-046-C** y con asunto: **Solicitud de prórroga de suspensión del contrato de obra – comunicación CTO. 163.23-CENAC-OFC022**. Realizada por la interventoría de obra expone lo siguiente.

“Dado al alcance al asunto y posterior a la revision del contenido de la comunicación del mismo, la interventoría manifiesta lo siguiente:

El contratista de obra, en su comunicacion manifiesta que:

(El día 09 de enero de 2023 se presenta derrumbe en la vía panamericana que conecta a Popayán con pasto, a la altura del municipio de Rosas Cauca lo que ocasionó que el ingreso vehicular de Popayan a Argelia Cauca se debiera hacer por rutas alternas como la sierra Cauca, pero rapidamente esta vía colapso además que el tiempo de recorrido por este sector es el doble de tiempo que por la ruta habitual. Esta situación ha ocasionado graves problemas de ingreso de vehiculos de carga al sur del país, a zonas como Nariño y el sur del Cauca, que por esta razon tienen graves problemas de abastecimiento de todos los insumos desde el combustible hasta materiales de construcción.)

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022

1. ANTECEDENTES



El día 09 de enero de 2023 se presentó derrumbe en la vía Panamericana que conecta a Popayán con Pasto, a la altura del Municipio de Rosas Cauca lo que ocasiono que el ingreso vehicular de Popayán a Argelia cauca se debiera hacer por rutas alternas como la sierra Cauca, pero rápidamente esta vía colapso además que el tiempo de recorrido por este sector es el doble de tiempo que por la ruta habitual. Esta situación ha ocasionado graves problemas de ingreso de Vehículos de carga al Sur del país, a zonas como Nariño y el sur del Cauca, que por esta razón tienen graves problemas de abastecimiento de todos los insumos desde Combustible hasta Materiales de construcción.

Luego del movimiento se hizo presentando el informe de la zona de la mañana del pasado 9 de enero en zona de la zona de Rosas Cauca a la Unidad Regional para la Gestión de Riesgos de Desastres (URGD), informo que se instalará un Punto de Mando Unificado (PMU) en la zona para definir el plan de atención a las 140 familias que resultaron afectadas y se hará el seguimiento al movimiento de insumos en el sector de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Tras de los movimientos se hizo presentando el informe de la zona de la mañana del pasado 9 de enero en zona de Rosas Cauca a la Unidad Regional para la Gestión de Riesgos de Desastres (URGD), informo que se instalará un Punto de Mando Unificado (PMU) en la zona para definir el plan de atención a las 140 familias que resultaron afectadas y se hará el seguimiento al movimiento de insumos en el sector de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Adicionalmente se hizo presentando el informe de la zona de la mañana del pasado 9 de enero en zona de Rosas Cauca a la Unidad Regional para la Gestión de Riesgos de Desastres (URGD), informo que se instalará un Punto de Mando Unificado (PMU) en la zona para definir el plan de atención a las 140 familias que resultaron afectadas y se hará el seguimiento al movimiento de insumos en el sector de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Semana

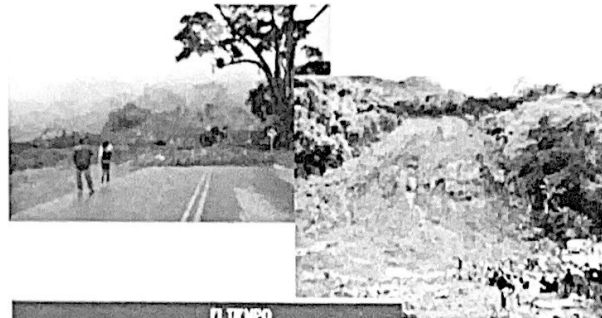

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

Los administradores de la zona de Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca, Rosas Cauca y Rosas Cauca.

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE CENAC INGENIEROS 2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR, ALOJAMIENTOS, BATERÍAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERÍA, DEPÓSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPPIO FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y FORTIFICACIÓN PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SÍ POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022

2. Consideraciones

- 2.1. En este Momento en el Municipio de Argelia Cauca hay desabastecimiento de Combustibles, Materiales de Construcción y Algunos Alimentos; que directamente afecta la obra tanto para el desarrollo de la misma como para el personal que se encuentra en labores.
- 2.2. El sistema de transporte vertical de materiales funciona con Gasolina que en este momento no se encuentra en el Municipio, por lo tanto, la única manera de ingreso de materiales la parte alta de la Base militar está parado.
- 2.3. En Taller tenemos materiales de Construcción y vehículos represados, por las afectaciones de las vías tanto como la Panamericana como las vías alternas que no están adecuadas para vehículos de carga
- 2.4. Al momento no hay una solución definitiva por parte del Gobierno para el ingreso de estos insumos al sur del cauca.

3. PETICION

Por todo lo anterior se hace imposible reanudar con estas condiciones el proyecto puesto que no tenemos materiales ni combustibles para poder trabajar; por lo tanto de Manera Respetuosa solicito a ustedes viabilizar PRORROGA A LA SUSPENSIÓN del Contrato de Obra No 163 Coad - Dicre - Cenac Ingenieros de 2022 suscrito entre el CENAC INGENIEROS y el CONSORCIO OBRAS ARGELIA, hasta el día 16 de Febrero de 2023 mientras se hace seguimiento a la situación de abastecimiento en los Municipios y el Gobierno encuentra soluciones para el tránsito de vehículos de carga.

Conforme a lo anterior, la Interventoría manifiesta que, en el acompañamiento y seguimiento constante y diario, evidencia las dificultades que se vienen presentando para el traslado de materiales, la escasez de insumos como la gasolina y el alza de precios de insumos, adicionalmente el derrumbe en la vía panamericana ha afectado de manera significativa el ingreso de insumos y vehículos; toda vez que, la zona afectada hace parte de la vía para el ingreso de vehículos de carga, lo que imposibilita ejecutar con normalidad las actividades de obra, puesto que, al no tener la posibilidad de paso al área de ejecución y la escasez de combustible para el transporte vertical de materiales, se dificulta el suministro de insumos y materiales. Esta situación es evidenciada por la Interventoría en su seguimiento diario, adicional, es soportado por los diversos reportes de la zona:

Derrumbe en la vía Panamericana: solicitan declarar emergencia social y económica en Cauca y Nariño

El presidente del Senado, Roy Barreras, explicó que el objetivo de la medida es brindar atención en la zona "de manera más eficaz"

<https://www.infobae.com/colombia/2023/01/20/derrumbe-en-la-via-panamericana-solicitan-declarar-emergencia-social-y-economica-en-cauca-y-narino/>

Dando lo anterior, se ha dificultado el suministro de insumos y materiales, toda vez que por efectos y consecuencia del derrumbe, escasez de insumos y alza de precios de los mismos, no ha sido posible el paso de materiales con normalidad, necesarios para la ejecución de actividades y culminación de las mismas de manera correcta y en los tiempos establecidos. Por todo lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto, se genera una prórroga a la suspensión del contrato de obra de la referencia, hasta el día 16 de febrero de 2023, tiempo que se espera se pueda continuar con la ejecución y terminación a cabalidad de las actividades del contrato de obra." (...)

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERÍAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERÍA, DEPÓSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y FORTIFICACIÓN PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2022

E. RECOMENDACIONES Y PROCEDER

PRIMERO: Acuerdan suspender de común acuerdo el Contrato de Obra No. 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

SEGUNDO: Se recomienda al ordenador del gasto, se genere la prórroga a la suspensión del contrato de obra de la referencia, desde el día 14 de febrero de 2023, hasta el día 14 de marzo de 2023, por motivos de orden público.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del mes de febrero de 2023.

DOCUMENTO REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADO EN CARPETA SOPORTE


TC. JOHN JAKO MEDINA
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC ING


Señor. NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA


MY. CRISTIAN JAVIER PEREZ LLORENTE
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA CENAC-ING
