

<div>AMC.</div> <div>Área Metropolitana de Cúcuta. ▲▶▼◀▶</div>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		PE-F02-1-13	
			FECHA	VERSIÓN
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS		18/05/2022	1
			Página 1 de 1	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nelly Gómez Llanez				IDENTIFICACIÓN	1093735129	
NÚMERO DEL CONTRATO:	064	FECHA DEL CONTRATO:	16/01/2023		DEPENDENCIA	Subdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.						
SUPERVISOR:	ING ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO						
FECHA DE INFORME:	17/02/2023	PERIODO DEL INFORME DESDE	16/01/2023		HASTA	15/02/2023	
VALOR MES COBRADO	4.000.000,00	PAGO NO.	01	DE	9	% DE AVANCE	11,11%
No DE PLANILLA APORTES	7868799392	PERIODO PAGADO		Enero/2023			

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

ACTIVIDAD: 1. Acompañamiento a la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura en la recolección de información y elaboración del informe de gestión de la Vigencia 2023.

ACTIVIDAD: 2. Apoyar a la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura en el informe de rendición de cuentas de la entidad en la vigencia 2023.

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▶▶▶▶▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
3 de 3

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

San José de Cúcuta, 08 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUSANTARIA NOS
RL ALVARO RAMIREZ MORA
UNION TEMPORAL INTER BATERIAS RL
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

Referencia: Informes de actividades solicitados por parte de la Contraloría Municipal de Cúcuta, sobre los contratos de obra e interventoría derivados de los convenios 1404, 1563, 2037 y 3068.

Asunto: Referencia a oficio con rad. 00218 de 25/01/2023, solicitud programación de obra actualizado, y los informes semestrales de interventoría actualizados hasta la fecha del 31 de diciembre del 2022.

Cordial saludo,

Con el fin de poder dar respuesta a la información solicitada por parte de la Contraloría Municipal de Cúcuta, para el seguimiento de la contratación celebrada en cumplimiento de los convenios celebrados con el Municipio de San José de Cúcuta, se solicita de carácter URGENTE y PRECIPITARIO a los contratistas de obra e interventoría pensar a día con el desarrollo de sus OBLIGACIONES CONTRACTUALES, y se entregada ante esta entidad en un plazo no mayor a 3 DIAS HÁBILES, los cronogramas de ejecución de las actividades de obra totalmente actualizados a la fecha y condiciones actuales de entrega, y los informes semestrales de obra e interventoría a corte del 31 de diciembre del 2022 los cuales ya debieron ser entregados con anterioridad. Esto para evitar una obsolescencia al control fiscal que se viene realizando y por ende multas por incumplimiento a los contratistas.

Atentamente,


ING. NELLY GÓMEZ LÓPEZ
Subdirectora Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Proyecto: Ing. Nelly Gómez López. Apoyo a la Subdirección de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura.

Atento: Oficio con radicado 00000.

NIT. 800153197-0

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta
Fecha: 25-01-2023 10:10:10
Desarrollado por: J. J. Rodríguez
Revisado por: J. J. Rodríguez
Aprobado por: J. J. Rodríguez
Elaborado por: J. J. Rodríguez
Elaborado por: J. J. Rodríguez
(2) Radicado: 00000

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

San José de Cúcuta, 08 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUSANTARIA NOS
RL ALVARO RAMIREZ MORA
UNION TEMPORAL INTER BATERIAS RL
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

Referencia: CONVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER - y Contrato de interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1404-001-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: BATERIAS QUE NO SE OBSERVA AVANCE DE OBRA.

Cordial saludo,

Una vez realizadas las visitas de obra por parte del Área Metropolitana de Cúcuta el día 08 de febrero de 2023 en los colegios 1. COLEGIO RIVERA LAQUADO-ESC. URBANA ESPIRITU SANTO, 2. COLEGIO GARCIA HERREROS-SEDE DE FEBRERO 3. COLEGIO GARCIA HERREROS-SEDE PRINCIPAL, 4. JUAN FERNANDEZ DE NOVOA-SEDE 3 ALPES, 5. COLEGIO JUAN FERNANDEZ DE NOVOA-ESCUOLA REYES MANTILLA. Estas obras se observan falencias de avance en general en un estado parcial, en otras no hay materiales y mano de obra parada, otras que el personal no tiene licencia e implementación del SST.

Es preocupante para el Área Metropolitana que a pesar de las notificaciones de las falencias que se observan en estas obras, persisten en las mismas, semanas y hasta meses, de manera que si no se toman las medidas necesarias no se va a dar paso a ser los cambios que se pretenden en cumplir con los tiempos programados y las obligaciones generales del contrato.

Como pueden observar en los cronogramas visitados no se ve progresivamente avance de obra por tanto decir que en algunos están igual que hace un mes. Los cronogramas se observan hoy en día.

1. COLEGIO RIVERA LAQUADO-ESC. URBANA ESPIRITU SANTO.
Hace una semana que no se presenta personal, hoy se encuentran 1 maestro y 2 obreros, programan que en el transcurso de la semana trabajen en la instalación de cubetas, actividades que vienen programadas desde hace un mes, exceso material y mano de obra. Han venido trabajando a media marcha, pero el resultado es el mismo no hay avance.
2. COLEGIO GARCIA HERREROS-SEDE DE FEBRERO:
El día de hoy 08 de febrero de 2023 están trabajando en la fundición de placa y armado de vigas aéreas, esta obra se encuentra activa esperando que en el transcurso de la semana se vea reflejada estas actividades.
3. COLEGIO GARCIA HERREROS-SEDE PRINCIPAL
Esta obra se observa que están instalando las alfombras cortadas y de la semana están a 40 cm debería ser a 30 cm.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

San José de Cúcuta, 10 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUSANTARIA NOS
RL ALVARO RAMIREZ MORA
UNION TEMPORAL INTER BATERIAS RL
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

Referencia: CONVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER - y Contrato de interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1404-001-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES.

Cordial saludo,

De acuerdo a las visitas realizadas y lo informado por la comunidad educativa evidenciando que no se está realizando el debido mantenimiento y limpieza de los baños portátiles el cual es obligación por parte de ustedes cumplir con dicho requerimiento, siendo esta una realidad se solicitan que realicen de carácter urgente el debido mantenimiento y la limpieza correspondiente a los baños portátiles que se encuentran en cada una de las baterías sanitarias.

Atentamente,


ING. NELLY GÓMEZ LÓPEZ
Subdirectora Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Proyecto: Ing. Nelly Gómez López. Apoyo a la Subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

San José de Cúcuta, 08 de febrero de 2023

Señores:
HUGO LARA MORA
CONSTRUTORA L.S.S.
INTERANTE DEL CONSORCIO EDUSANTARIA NOS
HECTOR EDUARDO MANRIQUE PORRAS
COORDINADOR DE OBRA
UNION TEMPORAL INTERBATERIAS
RL LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

Referencia: CONVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER - y Contrato de interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1404-001-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: REUNION DE CARACTER URGENTE, EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 2:30 PM EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de solicitar la presencia de los contratistas de obra e interventoría como lo son SHIRLEY PARRA RL INTERVENTORIA INTERBATERIAS, HUGO LARA MORA INTERANTE DEL CONSORCIO EDUSANTARIA NOS, HECTOR EDUARDO MANRIQUE PORRAS COORDINADOR DE OBRA, para un control de avance en las instalaciones de la Subdirección de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, el día 10 de febrero del 2023 a las 2:30 PM. Dado los diferentes incumplimientos por parte del contratista, motivo que genera incumplimiento por parte de ustedes para a partir de hoy de acuerdo a las actividades que el fin de dar cumplimiento a la entrega de 20 baños de sanitarios para a noche establecida de finalizar del presente semana (08 marzo). Por tal motivo, en las próximas semanas ante infraestructura se agendará por parte:

- Plan de desarrollo de actividades cronograma y actividades futuras independiente por cada batería sanitaria.
- Cronograma real independiente por cada batería sanitaria, con su respectivo porcentaje ejecución.
- Avance real independiente por cada batería sanitaria, con su respectivo porcentaje ejecución.
- Cronograma real general de todo el contrato, baterías sanitarias.
- Avance real general de todo el contrato, baterías sanitarias, con su respectivo porcentaje ejecución.
- Cronograma de presupuesto ejecutado VS presupuesto del proyecto.
- Estado actual del proyecto donde se evidencian las actividades realizadas y las actividades futuras evidenciando la ruta crítica del proyecto.
- Se entrega los planos del personal de obra que labora con la empresa por cada batería sanitaria con el fin de evidenciar la cantidad de cuadrillas que requiere el proyecto.
- Se solicita la verificación por parte de ustedes de la realización del mantenimiento y limpieza de los baños portátiles de cada batería sanitaria.


ING. NELLY GÓMEZ LÓPEZ
Subdirectora Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Proyecto: Ing. Nelly Gómez López. Apoyo a la Subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▶▶▶▶▶▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página

4 de 4

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

San José de Cúcuta, 13 de febrero de 2023

Señores

CONSORCIO EDUSANITARIA NOS
R/L ALVARO RAMIREZ MORA
Cúcuta

UNION TEMPORAL INTERBATERIAS
R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Cúcuta

Referencia: COVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y Contrato de Interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMC-LP-007-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 09 DEL 2021

Cordial saludo,

La subdirección de planeación de la Área Metropolitana solicita de manera formal la debida y justificada del porque los requerimientos de materiales van a ser excluidos del convenio y contrato anteriormente mencionado, y a su vez del porque los trabajos realizados en los estudios y diseños requeridos para la ejecución, también se solicita presentar un informe donde se especifique en que proyectos utilizar los recursos correspondientes a dichos estudios y diseños de los mencionados instituciones.

1. COLEGIO RIVERA LAQUADO-SEDE PRINCIPAL
2. SEDE PEREYU GODOFRIO
3. PABLO CONTRA LEONIA LIBERTAD
4. COLEGIO BUENOS AIRES
5. COLEGIO ALEJANDRO OUTIERREZ SEDE CUANDIMARCA
6. NUESTRA SEÑORA DE BELEN

Atentamente,

ING. NELLY GOMEZ LLANES
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Ing. Nelly Gómez Llanes - Apoyo a la Subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

3. COLEGIO PRESTIBERO DANIEL JORDAN

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se realizó visita técnica por parte del supervisor del AMC y no se encontraron personal de obra trabajando, manifiesta el personal administrativo de la institución que la situación anteriormente mencionada se presenta de manera repetitiva semana tras semana.

4. COLEGIO PABLO NERUDA - SEDE ESCUELA LA CRUITA N°6

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se encuentran 2 obreros, están trabajando en el enchufe de columnas para vaciado de las mismas, escaso personal para mano de obra.

5. COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA - SEDE ESCUELA URBANA ANTONIO MARIA CLARET N°30

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se encuentran 5 obreros de obra, están trabajando en el enchufe de columnas para vaciado de las mismas, instalación de pañete de muros internos e instalación de redes hidráulicas para funcionamiento de tanques.

6. COLEGIO CLAUDIA MARIA PRADA AYALA - SEDE ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL N°8

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se encuentran 2 obreros, están trabajando en el enchufe de base granular, espacio personal para mano de obra, no hay avance respecto a semana anterior.

7. COLEGIO JAMIE GARZON

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se encuentran 4 obreros, están trabajando en localización y replanteo, excavación de cimientos y trabajo y acopio de material, escaso personal para mano de obra, no hay avance respecto a semana anterior.

Se requiere que cada colegio cuente con las cuadrillas suficientes para dar cumplimiento en los tiempos estimados del contrato.

Es importante que como contratista revisar y dar solución de manera inmediata. El 28 de marzo de 2023 se deben cumplir con la terminación de estas obras.

Agradecemos su pronta colaboración.

Lo interior para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. NELLY GOMEZ LLANES
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Anexo: Evidencia fotográfica de visita de obra baterías.

Proyecto: Ing. Nelly Gómez Llanes - Apoyo a la Subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

San José de Cúcuta, 09 de febrero de 2023

Señores

CONSORCIO EDUSANITARIA NOS
R/L ALVARO RAMIREZ MORA
Cúcuta

Señores
UNION TEMPORAL INTERBATERIAS
R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Cúcuta

Referencia: COVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y Contrato de Interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMC-LP-007-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: BATERIAS QUE NO SE OBSERVA AVANCE DE OBRA.

Cordial saludo,

Una vez revisados los recibos de obra por parte del Área Metropolitana AMC el día 08 y 09 de febrero de 2023 en los colegios 1. COLEGIO GREGORIO VANDOS - SEDE PRIMARIA, 2. COLEGIO JAMIE GARZON - SEDE PABLO VILLO 43, 3. COLEGIO PRESTIBERO DANIEL JORDAN, 4. COLEGIO PABLO NERUDA - ESCUELA LA CRUITA N°6, 5. COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA - ESCUELA URBANA ANTONIO MARIA CLARET N°30, 6. COLEGIO CLAUDIA MARIA PRADA - ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL N°8, 7. COLEGIO JAMIE GARZON. Estas obras se observan falencias de avance en general en ausencia de ingeniería residente, un escaso personal de obra en obras no hay materiales y mano de obra parados.

Es preocupante para el Área Metropolitana que a pesar de las notificaciones de los falencias que se observan en estas obras, persisten en los días, semanas y hasta meses, de manera que si no se toman las medidas necesarias no se va a dar paso a ver los cambios que se pretenden en cumplir con los tiempos programados y las obligaciones generales del contrato.

Como pudimos observar en los trabajos visitados no se ve progresivamente avance de obra por lo tanto dese que en algunas estas que faltan un mes. Los colegios como se observan hoy en día.

1. COLEGIO GREGORIO VANDOS - SEDE PRIMARIA:

Resumen trabajos esta semana, se encuentran 1 obrero y 2 obreros, programan que en el transcurso de la semana trabajen en la localización y replanteo, excavación de cimientos, vaciado de concreto cimiento para las zapatas, demolición de vigas de cimentación de estructura anterior. Actividades que vienen programadas desde hace un mes, escaso personal para mano de obra, sin viendo trabajos a media marcha, no hay avance.

2. COLEGIO JAMIE GARZON - SEDE PABLO VI:

El día de hoy 08 de febrero de 2023, se encuentran 2 obreros, están trabajando en la instalación de pañete a muros internos y externos, adicional a ello están haciendo el trabajo y acopio de materiales pesados, el cemento longitudinal en foto verde se encuentra en mal estado, escaso personal para mano de obra, no hay

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

NIT. 800153197-0

San José de Cúcuta, 13 de febrero de 2023

Señores

EDUSANITARIA NOS
JEFE DE OFICINA JURIDICA AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
Cúcuta

Referencia: COVENIO 1404/2021 - Contrato de Obra No. 09 del 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y Contrato de Interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMC-LP-007-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: TRAZADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 09 DEL 2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y Contrato de Interventoría No. 11 de 2021 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMC-LP-007-2021 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Cordial saludo,

La subdirección de planeación de la Área Metropolitana quiere manifestar la preocupación que se ha venido presentando en la ejecución de los contratos anteriores se mencionados en el asunto debido a todas las inconsistencias que se han evidenciado en el desarrollo de los obras, observando incumplimiento a las obligaciones constructivas del contrato, cabe resaltar que durante todo este tiempo de ejecución de los obras se ha ido reduciendo el avance, todas las fallas que presentan y que hasta el momento siguen incumpliendo.

A continuación, se anexa en cuadro donde pueden evidenciar toda la trazabilidad que se le ha ido dando a todas las diferentes dependencias presentadas hasta la fecha.

TRAZABILIDAD DE CONTRATO EDUSANITARIA NOS			
REQUERIMIENTOS			
FECHA	RAZONADO	ASUNTO	DIRIGIDO A

		ACTUALIZADOS HASTA LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
3-ene-23	00347	COLEGIOS SIN EJECUCION DE OBRA	CONSORCIO EDUCANTARIA NOS
7-ago-23	00404	REITERACION A OFICIO CON RAD. 00218 DE 26/01/2023, SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO, Y LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA ACTUALIZADOS HASTA LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	CONSORCIO EDUCANTARIA NOS
9-ago-23	00440	BATERIAS QUE NO SE OBSERVA AVANCE DE OBRA	CONSORCIO EDUCANTARIA NOS

Por lo anterior pongo en conocimiento y consideración de la oficina jurídica y del director de la entidad para revisión y toma de decisiones al respecto.

Atentamente:


ING. NELLY GÓMEZ LINARES
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Ing. Nelly Gómez Linares. Apoyo a la Subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

Oficios realizados para el convenio 1872/2020 Contrato 03/2021.

San José de Cúcuta, 01 de febrero de 2023

Ingeniero:
UNION TEMPORAL REMODELACIONES IE CUCUTA
R/L GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
CONTRATISTA

Referencia: CONVENIO 1872/2020 - Contrato de Obra 03/2021. "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Reiteración a la solicitud de reparaciones pendientes de baterías sanitarias del contrato de obra 03 "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"

Cordial saludo,

Por medio de la presente reiteramos la solicitud realizada a ustedes, firma contratista, con radicado 05293 de fecha 12 de diciembre de 2022, y Rad 06407 de 18/12/2022, con el fin de que se atenderían estas reparaciones en el menor tiempo posible para que la secretaría de infraestructura pueda dar paso a recibir a satisfacción estas obras.

El AMC como entidad supervisora, como lo enmarca las obligaciones del contrato, estamos en el deber de exigir calidad y atención a estas falencias presentadas, por lo que se da un plazo de dos (02) días para que ustedes se manifiesten ante esta reiteración y den la entrega de la programación de estas actividades a ejecutar, de manera que la firma contratista haga caso omiso a este llamado, se procederá a otorgar la solución a la aseguradora para que sea directamente quienes puedan ayudar a que esto se solucione lo antes posible.

Los colegios que presentan observaciones entre urbanos y rurales son,

COLEGIO ANTONIO NARIÑO:
Humedad en muros, oxidación de divisiones de baños, fuga de agua en lavamanos, 2 lavamanos con diferente grifería, 2 chapas puerta en mal estado, no funcional.

COLEGIO JULIO PEREZ FERRERO SAN MIGUEL:
Humedad en muros debido a filtración de aguas lluvias por cubierta instalada a ras de los muros, esto provocó el deterioro del acabado, oxidación de división de baños, pendiente ajuste de puertas de acceso de ingreso.

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA BARRIO LATINO.

COLEGIO BUENA ESPERANZA SEDE LOS REYES: La carpintería metálica presenta oxidación, muro con humedad y hongo en zona de orinales, terminación en la zona donde la tubería que alimenta el tanque de almacenamiento atraviesa la placa y apagador mal instalado.

COLEGIO BUENA ESPERANZA SEDE SAN JOSÉ DE LA VEGA: Las divisiones metálicas presentan oxidación (ambos baños), la grifería de los lavamanos son diferentes justificar porque, en la batería nueva no funciona una lámpara led en el bloque de niñas.

COLEGIO AGUA CLARA: Las divisiones metálicas presentan oxidación, la puerta de acceso para baño de discapacidad tiene una mala terminación en la zona del marco, la zona de columnas en la base del tanque elevado se evidencia la caída de pintura debido a la humedad del exterior (escarpelo la pintura).

Por lo anterior se solicita hacer las respectivas intervenciones a las baterías en mención, como también informar las fechas que se realicen dichas actividades con el fin de verificar los arreglos y así poder dar la entrega a satisfacción a la secretaría de infraestructura y secretaría de Educación, así mismo se solicita presentar informe de las reparaciones realizadas con el fin de dejar evidencia de la subsanación.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


ING. NELLY GÓMEZ LINARES
Subdirector de Planeación Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Con copia: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REMODELACION COLEGIOS CUCUTA - R/L
PEDRO DAVID GALINDO GUTIERREZ

Anexo: Oficio con Rad No 05293 de 12/12/2022, y oficio con Rad 06407 de 18/12/2022

Proyecto: Ing. Nelly Gómez. Apoyo a la Subdirección de planeación e infraestructura.

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▼▲▼

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Página
7 de 7

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▼▲▼

INFORMACION Y COMUNICACION

ACTA DE COMITE Y REUNION

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Limite
Aumento Mano de obra calificada	consorcio Edusantarias	24/01/2023
sitio de obra bien acordado, onculos por seguridad de los niños	consorcio Edusantarias	24/01/2023
Aumento de baños portátiles y el aseo diario de los mismos	consorcio Edusantarias	24/01/2023
Entrega de obra de los colegios Manuel Antonio Fernández Novoa y Novoa 3 el 28/feb/2023.	consorcio Edusantarias	28/02/2023

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▼▲▼

ACTA DE COMITE Y REUNION

TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DIA

Estado actual y seguimiento al avance de los proyectos con educación desarrollado por la entidad:
- Convenio 1404- Contrato de obra No.9-2021.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

El día 13 de Febrero del 2023 a las 2:30 pm, se realiza un comité técnico en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, en donde intervienen, el Secretario de Infraestructura, Secretario de Educación, Subdirector de planeación del AMC, Consorcio EDUSANITARIA NDS, UNION TEMPORAL INTERBATERIAS y poyo técnico de cada una de estas dependencias. Durante la reunión se tocan los siguientes temas, y se debaten sobre las problemáticas y posibles soluciones de acuerdo a lo siguiente:

- Convenio 1404- Contrato de obra No.9-2021 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

El Ingeniero Álvaro Álvarez, toma la palabra manifestando la preocupación del proyecto de manera general tanto por las necesidades de los niños como de las obligaciones del contrato, por los tantos motivos que ha venido mencionando el contratista de obra como es, la logística de los materiales, mano de obra calificada que ha sido difícil de encontrar, baños portátiles, equipos de obra, en fin. Importante que para estas reuniones asistan directamente los responsables de los contratos ya que a veces envían es que personas que no tiene inherencia en dar un compromiso sin saber que opina los contratistas, por lo tanto se citó al miembro del consorcio, ya que hace parte del consorcio como responsable y le concierne estos temas y puede dar compromisos reales y tener presente los el avance que se lleva en todo el tiempo que ha venido en ejecución, plan de trabajo, fechas de entrega, actualmente con los recursos contractuales tenemos una fecha de entrega a 28 de marzo contando con

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▼▲▼

INFORMACION Y COMUNICACION

ACTA DE COMITE Y REUNION

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Limite
Solicitar reunión para el jueves 16 de febrero a las 11:30 am, para que los contratistas de obra e interventoría muestren el plan de contingencia, con programación por cada batería, no en general sino por batería.	CONTRATISTAS DE OBRA	16-FEBRERO-2023
Reinicio de obras suspendidas el día jueves 16 de febrero de 2023.	CONTRATISTA DE OBRA	16-FEBRERO-2023

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▼▲▼

INFORMACION Y COMUNICACION

ACTA DE COMITE Y REUNION

TEMA: Estado actual y seguimiento al avance de los proyectos con educación desarrollado por la entidad
- convenio 1404 - Contrato de obra No.9-2021

Acta No.: Fecha: 13/02/2023 Hora: 2:30


SUBDIRECCION A CARGO:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo Fernando Lara M	Contratista	
Luis G. Díaz C.	Profesional SIM	
Jose. Arango Garcia	Interventoría	
Hector Ponce M	Director Obra Edm	
Lida Shirley Páez García	R. I. Interventoría	
Nelly Gómez Herra	Supervisión AMC	
Bonita Ortiz Bern	Dir. de infra. ed. - SEM - Planes	
Jorge Ivan Rodríguez	Secretario SIM	
Andrés Román Galvis	Subsec. Planeación SEM	
Diego J. Páez Páez	Interventoría	
Luis Fernando Páez López	Sec. Planes	
Alvaro Luis Álvarez	Subdirección de planeación	

AMC. ▲▼▲▼ Área Metropolitana de Cúcuta		INFORMACION Y COMUNICACION ACTA DE COMITE Y REUNION	
TEMA: Atención al requerimiento de la Procuraduría en la sede Espinto Santo contrato 09/2021			
Acta No.:	Fecha:	15/02/2023	Hora: 10.00 Am
SUBDIRECCION A CARGO:			
NOMBRE	ASISTENTES CARGO	FIRMA	
Carlos Kuriel G.	PRESIDENTE SAC		
Nelson Anagosa Goto	Coordinador SST	Nelson Anagosa	
Nelly Enríquez Naranjo	Supervisión AMC		
Guillermo J. Perea Rueda	Interventoría	Guillermo Perea R.	
Ingrid Marcela Castilla Ortiz	Coordinadora S. Personal		
Shirley Pineda C.	Teniente S. Legal		
Rene Sando	T. A. Salud	Rene Sando	
Edo Orlando C. G.	Edil. Consumo 2	Edo Orlando C. G.	
Jonathan Páez R.	Presidente	Jonathan Páez R.	
Ciro Alberto Contrata Saulina	Coordinador Obra	Ciro Alberto Contrata	
Glady D. Jaramila R.	Proy. Subplanificación	Glady Jaramila	
Hector Páez M.	Edil. Salud	Hector Páez M.	

Evidencia Fotografica de los comites del contrato 09/2021- convenio 1404/2021.

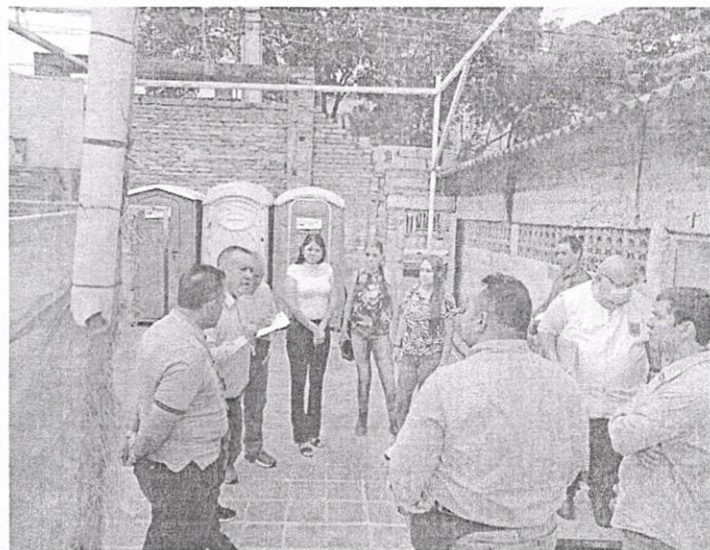

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▶▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13




FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
9 de 9

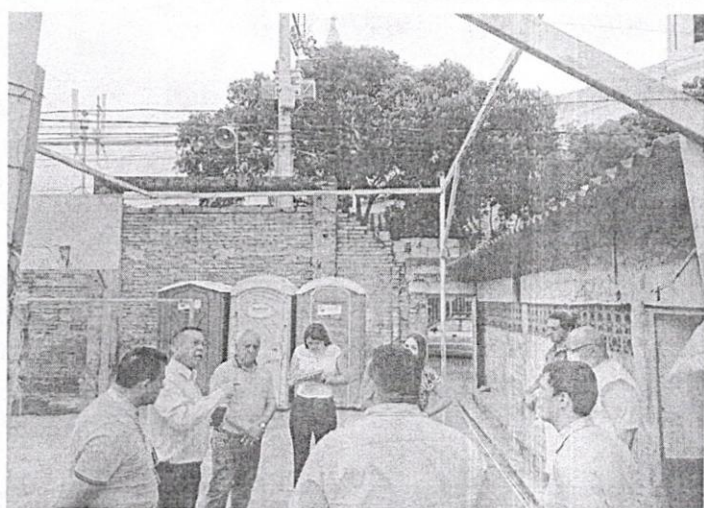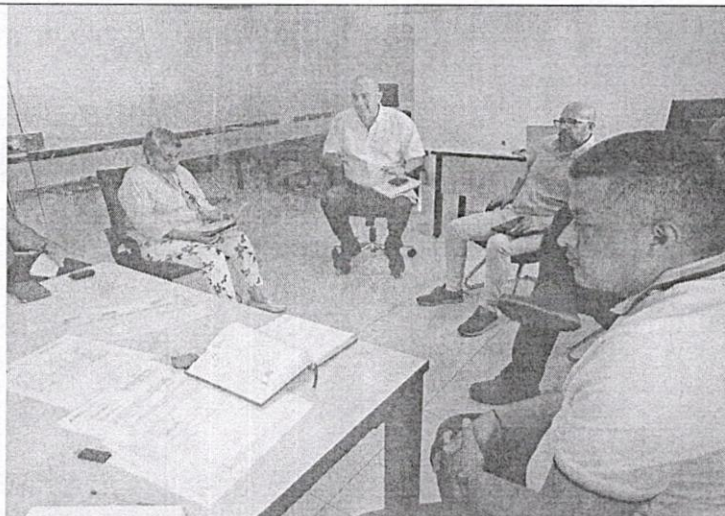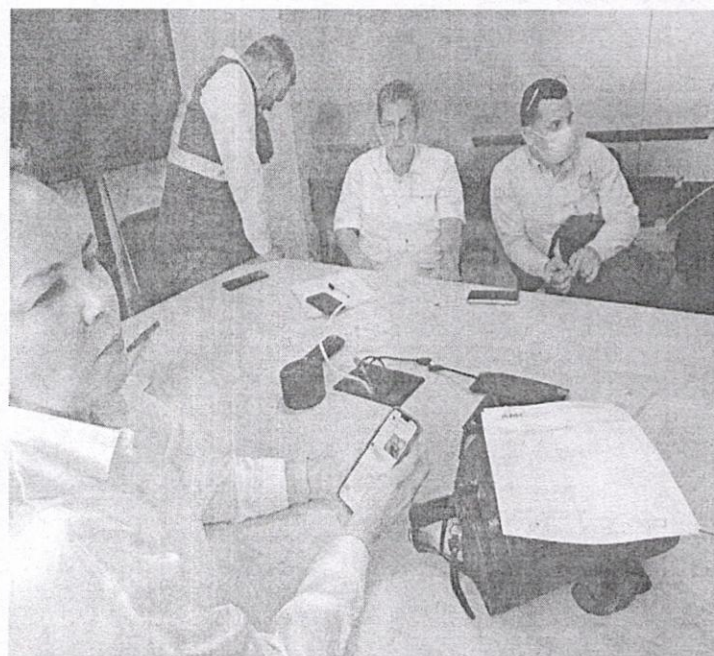

ACTIVIDAD: 5. Elaboración del informe mensual de avance de acuerdo a las tareas asignadas.

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 064

Informe mensual convenió 1404/Dic.

[illegible]

AMC American Medical Collection 1000 University Ave. Durham, NC 27705-1000 Tel: (919) 286-1000 Fax: (919) 286-1001 Email: amc@duke.edu	1000 UNIVERSITY AVENUE DURHAM, NC 27705-1000 TEL: (919) 286-1000 FAX: (919) 286-1001 E-MAIL: amc@duke.edu	1000 UNIVERSITY AVENUE DURHAM, NC 27705-1000 TEL: (919) 286-1000 FAX: (919) 286-1001 E-MAIL: amc@duke.edu
	1000 UNIVERSITY AVENUE DURHAM, NC 27705-1000 TEL: (919) 286-1000 FAX: (919) 286-1001 E-MAIL: amc@duke.edu	1000 UNIVERSITY AVENUE DURHAM, NC 27705-1000 TEL: (919) 286-1000 FAX: (919) 286-1001 E-MAIL: amc@duke.edu

[illegible]

AMC

THE NEW 1990-1991 250000

BLACK & WHITE

THE NEW 1990-1991 250000

AMC

THE NEW 1990-1991 250000

AMC

THE NEW 1990-1991 250000

AMC 2000-2001-2002 2003-2004-2005	1. LEGISLATION TO WHICH IT APPLIES (Indicate the law or laws to which this document applies)	2. REVISIONS NONE REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION 4 REVISION 5 REVISION 6 REVISION 7 REVISION 8 REVISION 9 REVISION 10 REVISION 11 REVISION 12 REVISION 13 REVISION 14 REVISION 15 REVISION 16 REVISION 17 REVISION 18 REVISION 19 REVISION 20 REVISION 21 REVISION 22 REVISION 23 REVISION 24 REVISION 25 REVISION 26 REVISION 27 REVISION 28 REVISION 29 REVISION 30 REVISION 31 REVISION 32 REVISION 33 REVISION 34 REVISION 35 REVISION 36 REVISION 37 REVISION 38 REVISION 39 REVISION 40 REVISION 41 REVISION 42 REVISION 43 REVISION 44 REVISION 45 REVISION 46 REVISION 47 REVISION 48 REVISION 49 REVISION 50 REVISION 51 REVISION 52 REVISION 53 REVISION 54 REVISION 55 REVISION 56 REVISION 57 REVISION 58 REVISION 59 REVISION 60 REVISION 61 REVISION 62 REVISION 63 REVISION 64 REVISION 65 REVISION 66 REVISION 67 REVISION 68 REVISION 69 REVISION 70 REVISION 71 REVISION 72 REVISION 73 REVISION 74 REVISION 75 REVISION 76 REVISION 77 REVISION 78 REVISION 79 REVISION 80 REVISION 81 REVISION 82 REVISION 83 REVISION 84 REVISION 85 REVISION 86 REVISION 87 REVISION 88 REVISION 89 REVISION 90 REVISION 91 REVISION 92 REVISION 93 REVISION 94 REVISION 95 REVISION 96 REVISION 97 REVISION 98 REVISION 99 REVISION 100 REVISION 101 REVISION 102 REVISION 103 REVISION 104 REVISION 105 REVISION 106 REVISION 107 REVISION 108 REVISION 109 REVISION 110 REVISION 111 REVISION 112 REVISION 113 REVISION 114 REVISION 115 REVISION 116 REVISION 117 REVISION 118 REVISION 119 REVISION 120 REVISION 121 REVISION 122 REVISION 123 REVISION 124 REVISION 125 REVISION 126 REVISION 127 REVISION 128 REVISION 129 REVISION 130 REVISION 131 REVISION 132 REVISION 133 REVISION 134 REVISION 135 REVISION 136 REVISION 137 REVISION 138 REVISION 139 REVISION 140 REVISION 141 REVISION 142 REVISION 143 REVISION 144 REVISION 145 REVISION 146 REVISION 147 REVISION 148 REVISION 149 REVISION 150 REVISION 151 REVISION 152 REVISION 153 REVISION 154 REVISION 155 REVISION 156 REVISION 157 REVISION 158 REVISION 159 REVISION 160 REVISION 161 REVISION 162 REVISION 163 REVISION 164 REVISION 165 REVISION 166 REVISION 167 REVISION 168 REVISION 169 REVISION 170 REVISION 171 REVISION 172 REVISION 173 REVISION 174 REVISION 175 REVISION 176 REVISION 177 REVISION 178 REVISION 179 REVISION 180 REVISION 181 REVISION 182 REVISION 183 REVISION 184 REVISION 185 REVISION 186 REVISION 187 REVISION 188 REVISION 189 REVISION 190 REVISION 191 REVISION 192 REVISION 193 REVISION 194 REVISION 195 REVISION 196 REVISION 197 REVISION 198 REVISION 199 REVISION 200 REVISION 201 REVISION 202 REVISION 203 REVISION 204 REVISION 205 REVISION 206 REVISION 207 REVISION 208 REVISION 209 REVISION 210 REVISION 211 REVISION 212 REVISION 213 REVISION 214 REVISION 215 REVISION 216 REVISION 217 REVISION 218 REVISION 219 REVISION 220 REVISION 221 REVISION 222 REVISION 223 REVISION 224 REVISION 225 REVISION 226 REVISION 227 REVISION 228 REVISION 229 REVISION 230 REVISION 231 REVISION 232 REVISION 233 REVISION 234 REVISION 235 REVISION 236 REVISION 237 REVISION 238 REVISION 239 REVISION 240 REVISION 241 REVISION 242 REVISION 243 REVISION 244 REVISION 245 REVISION 246 REVISION 247 REVISION 248 REVISION 249 REVISION 250 REVISION 251 REVISION 252 REVISION 253 REVISION 254 REVISION 255 REVISION 256 REVISION 257 REVISION 258 REVISION 259 REVISION 260 REVISION 261 REVISION 262 REVISION 263 REVISION 264 REVISION 265 REVISION 266 REVISION 267 REVISION 268 REVISION 269 REVISION 270 REVISION 271 REVISION 272 REVISION 273 REVISION 274 REVISION 275 REVISION 276 REVISION 277 REVISION 278 REVISION 279 REVISION 280 REVISION 281 REVISION 282 REVISION 283 REVISION 284 REVISION 285 REVISION 286 REVISION 287 REVISION 288 REVISION 289 REVISION 290 REVISION 291 REVISION 292 REVISION 293 REVISION 294 REVISION 295 REVISION 296 REVISION 297 REVISION 298 REVISION 299 REVISION 300 REVISION 301 REVISION 302 REVISION 303 REVISION 304 REVISION 305 REVISION 306 REVISION 307 REVISION 308 REVISION 309 REVISION 310 REVISION 311 REVISION 312 REVISION 313 REVISION 314 REVISION 315 REVISION 316 REVISION 317 REVISION 318 REVISION 319 REVISION 320 REVISION 321 REVISION 322 REVISION 323 REVISION 324 REVISION 325 REVISION 326 REVISION 327 REVISION 328 REVISION 329 REVISION 330 REVISION 331 REVISION 332 REVISION 333 REVISION 334 REVISION 335 REVISION 336 REVISION 337 REVISION 338 REVISION 339 REVISION 340 REVISION 341 REVISION 342 REVISION 343 REVISION 344 REVISION 345 REVISION 346 REVISION 347 REVISION 348 REVISION 349 REVISION 350 REVISION 351 REVISION 352 REVISION 353 REVISION 354 REVISION 355 REVISION 356 REVISION 357 REVISION 358 REVISION 359 REVISION 360 REVISION 361 REVISION 362 REVISION 363 REVISION 364 REVISION 365 REVISION 366 REVISION 367 REVISION 368 REVISION 369 REVISION 370 REVISION 371 REVISION 372 REVISION 373 REVISION 374 REVISION 375 REVISION 376 REVISION 377 REVISION 378 REVISION 379 REVISION 380 REVISION 381 REVISION 382 REVISION 383 REVISION 384 REVISION 385 REVISION 386 REVISION 387 REVISION 388 REVISION 389 REVISION 390 REVISION 391 REVISION 392 REVISION 393 REVISION 394 REVISION 395 REVISION 396 REVISION 397 REVISION 398 REVISION 399 REVISION 400 REVISION 401 REVISION 402 REVISION 403 REVISION 404
--	--	---

[illegible]

 <p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>LET US SHOW YOU HOW TO IMPROVE YOUR BUSINESS</p>	<p>NAME _____ PHONE _____ ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____</p>
<p>AMC</p> <p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>NAME _____ PHONE _____ ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____</p>
<p>AMC</p> <p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>NAME _____ PHONE _____ ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____</p>
<p>AMC</p> <p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>NAME _____ PHONE _____ ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____</p>
<p>AMC</p> <p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>Advertisement 1-800-4-A-M-C 1-800-426-2622</p>	<p>NAME _____ PHONE _____ ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____</p>

[illegible]

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▶▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13


FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
11 de 11



ACTIVIDAD: 6. Otras actividades inherentes al objeto contractual y a su perfil designas por el supervisor.

19/01/2023-Realización de presentación diapositivas sobre proyecto CONTARTO 04 “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA KENNEDY PERTENECIENTE A LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▶▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
13 de 13

03/02/2023- Realización de informe para Alcaldía Municipal de Cúcuta, del contrato 09/2021; CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	OTRO
18/05/2022	REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑO DE BATERIA SANITARIA	COMPLETADO	
18/05/2022	REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑO DE BATERIA SANITARIA	COMPLETADO	
18/05/2022	REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑO DE BATERIA SANITARIA	COMPLETADO	

Se realizó la revisión de planos y diseño de la batería sanitaria de la Institución Educativa "El Guayo" de Cúcuta, Norte de Santander. Se revisó el proyecto de construcción y reparación de la batería sanitaria, se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos y se aprobó el proyecto para su ejecución.

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

AMC

PROYECTO DE BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "EL GUAYO" DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Realización de informe de actividades contratistas para el contrato 09/2021.

Fecha: 18/05/2022

Elaborado por: [Firma]

- Semanalmente informe para la publicación de la revista sobre el contrato 09/2021 BATERIAS SANITARIAS/ CONV 1404/2021. Periodo 16 de enero a 15 de febrero de 2023, se presenta semanalmente.

Email YouTube Maps

TEXTOS BATERIAS 2 .docx

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda Última modificación hace unos segundos

100% Texto normal Arial 11 B I U A

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 28,8%
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 39 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 29,09%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 69
SEMANA EN CURSO: 63

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO CLAUDIA MARIA PRADA AYALA - ESCUELA SAN VICENTE DE PAÚL N°8

Se adecúa nivelación del terreno y trasiego de materiales pétreos. Por ende se procede al armado de acero y se realiza el encofrado de columnas para fundirlas.

Imagen 13

TEXTOS BATERIAS 2 .docx

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda Última modificación hace 3 minutos

100% Texto normal Arial 11 B I U A

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SEGUNDO COMITÉ:

El día 15 de febrero de 2023 a las 10:00am, con el objetivo de dar trazabilidad a baterías portátiles en la ejecución de las obras de baterías sanitarias, se realizó un comité técnico en los cuales se hicieron presentes; presidente de los ediles, presidente de la junta de acción comunal, coordinador del proyecto, coordinador del colegio y supervisión del AMC.

Así mismo se adquirieron unos compromisos por parte de contratista, para entregar 9 baterías portátiles con el fin de mitigar la problemática presentada y así continuar con el proceso respectivo de la obra y función del colegio con fecha de entrega para el 16/02/2023.

IMAGEN 16, IMAGEN 17

TERCER COMITÉ:

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta. ▲▶▼◀▶	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PE-F02-1-13	
		FECHA 18/05/2022	VERSIÓN 1
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 15 de 15	


2.COMPROMISOS ADQUIRIDOS/RECOMENDACIONES

3. EVIDENCIAS	Física	Magnética	LUGAR DE CONSULTA
---------------	--------	-----------	-------------------

ANEXOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO:

Se anexa al presente informe para hacer efectivo el pago los siguientes documentos:

- ✓ Formato único de supervisión contratos – convenios y certificación de pagos
- ✓ Certificado del supervisor en cumplimiento de las actividades
- ✓ Pagos seguridad social
- ✓ Pagos pensión
- ✓ Pagos riesgos profesionales
- ✓ Demás documentos pertinentes


 Firma Contratista
 Nombre: Nelly Gómez Llanez
 C.C. No. : 1093735129

00000067

RADICADO


AMC. RECIBIDO: Gabriel S

Área Metropolitana de Cúcuta ▲▶▼◀▶

FECHA: 21 FEB 2023

HORA: 2:36 pm

Certificación Bancaria



Jueves, 22 de diciembre de 2022

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NELLY GOMEZ LLANEZ** identificado(a) con cc. **1093735129** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	820-018779-48	2019/10/10	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, pueda comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

