



ICWJ_VÍAS_ORI_003_2022_010

Rionegro, 15 de Diciembre del 2022

Señor

JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO

Director Ejecutivo

MASER

Marinilla - Antioquia

Referencia: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053”.

Asunto: Radicación de acta parcial de obra No. 1, con sus anexos.

Cordial saludo

La empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS, hace entrega de los documentos a continuación relacionados en referencia al acta parcial de obra No. 01.

- Factura de cobro
- Certificado bancario y RUT
- Acta parcial de Obra No. 01
- Memorias de Cálculo de Cantidades
- Informe técnico de obra
 - -Informe SST
 - -Informe Ambiental
 - -Informe Social
 - -Informe PAPSO
 - -Ensayos de Laboratorio
 - -Planillas de Seguridad Social
- Certificación de pagos, revisor fiscal
- Copia minuta del contrato y demás documentos.

Atentamente,

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

Director de Obra

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

900355893

Tel.: 5311364

Factura electrónica de venta**No. FCWJ514**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DI		15/12/2022	\$ 3.042.238.020
NI No. : 800108848-6		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 31 30 29 P 2		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Marinilla PAIS : Colombia		14/01/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301026	COSTOS DIRECTOS	1	\$ 2.427.045.208		\$ 2.427.045.208
41301026	ADMINISTRACION	1	\$ 440.508.705		\$ 440.508.705
41301026	UTILIDADES	1	\$ 101.976.690		\$ 101.976.690
41301026	PLAN ADAPTACION GUIA AMBIENTAL	1	\$ 22.151.261		\$ 22.151.261
41301026	PMT	1	\$ 24.628.732		\$ 24.628.732
41301026	PAPSO	1	\$ 1.500.318		\$ 1.500.318
41301026	GEORREFERENCIACION VIAL	1	\$ 842.796		\$ 842.796

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.018.653.710	CxC # 1	Vence: 14/01/2023	\$ 3.042.238.020
IVA liquidado	\$ 22.151.261	19,00%	\$ 4.208.740			
IVA liquidado	\$ 101.976.689	19,00%	\$ 19.375.571			
VALOR TOTAL :			\$ 3.042.238.020			

VALOR (en letras) : TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764031737055. Prefijo: FCWJ. Rango: 501 al 600. Vigencia: 27/07/2022 hasta 27/07/2023.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 7
Factura a crédito, plazo hasta 14/01/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:



CONTRATO DE OBRA NO. 003 – 2022

ENTRE J.H.C S.A.S Y INGENIERIA Y CONTRUCCIONES WJ S.A.S

Entre los suscritos **DANIELA GARCIA SERNA**, identificado con cédula. Nro. 1.038.409.539, actuando en calidad de Representante legal de la compañía **J.H.C S.A.S** Con NIT: 900.334.866-1, en uso de las facultades quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y el señor **WILLIAM ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ** identificado con cédula. Nro. 15.441.658, actuando en calidad de Representante legal de la compañía **INGENIERIA Y CONTRUCCIONES WJ S.A.S** con Nit 900.355.893-9 debidamente autorizado para la celebración de contratos, quien para efectos del presente CONTRATO se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el presente CONTRATO, cuyas estipulaciones se consignan a continuación, por medio de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo BPIN 2022003050053.

PARAGRAFO. *Hacen parte integral del presente contrato todos los estudios, presupuestos y demás documentos del proyecto.*


SEGUNDA. VALOR: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$10.259.342.702) incluido impuestos y deducciones a lugar.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

a) **EL CONTRATANTE SE OBLIGA:** Se obliga para con el contratista a:

- 1) Realizar la supervisión al presente CONTRATO.
- 2) A desembolsar oportunamente el valor del presente CONTRATO de acuerdo con la forma de pago estipulada.
- 3) Vigilar la ejecución idónea y oportuna del CONTRATO, así como velar porque los recursos financieros cancelados sean invertidos en la ejecución del objeto y las obligaciones de este.
- 4) Efectuar los requerimientos y las recomendaciones que sean necesarias.
- 5) Verificar y exigir que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral de las personas a través de las cuales ejecuta el contrato, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

b) **EL CONTRATISTA SE OBLIGA:** Se obliga para con el contratante a:



- 1) Ejecutar las obras objeto del presente contrato
- 2) Presentar el estado de la cuenta cuando sea requerido.
- 3) Entregar al contratante, toda la información pertinente, relevante y necesaria que posea y que sea de importancia para el desarrollo del CONTRATO.
- 4) Designar a un funcionario responsable del CONTRATO, quien servirá de enlace entre el contratante, el contratista y las demás partes, en lo que al desarrollo de este se refiere, de manera que se puedan articular las acciones para su desarrollo integral.
- 5) Celebrar y ejecutar todos los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto del CONTRATO.
- 6) Destinar los recursos a administrar para la realización del objeto del CONTRATO de acuerdo con la propuesta presentada y los anexos técnicos.
- 7) Presentar informes periódicos de ejecución y un informe final.
- 8) Decidir oportunamente, los aspectos técnicos jurídicos y económicos que requiera el contratante para la ejecución del CONTRATO.
- 9) Exigir en los contratos que se suscriban, en desarrollo de este CONTRATO la garantía única de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales como mínimo según las leyes vigentes.
- 10) Realizar una supervisión al objeto del presente CONTRATO. Además de las obligaciones y derechos contemplados en la ley.
- 11) La mano de obra podrá ser contratada de acuerdo con lo estipulado en el Código Laboral Colombiano, si así lo consideran necesario.
- 12) Se podrá contratar personal por medio de contrato de prestación de servicios como contrato a meta cumplida.
- 13) Se deben cumplir con las actividades a desarrollar relacionadas en los anexos técnicos que hacen parte integral de este CONTRATO y que incluyen el transporte de materiales, del equipo técnico y el desarrollo de las actividades previstas.

CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: el presente está respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000152 del 05 de septiembre de 2022 administración delegada mejoramiento de vías terciarias en los municipios de concepción, el peñol, granada, marinilla, san Carlos, santo domingo bpin 2022003050053 y CRP:

QUINTA. Forma de Pago: Municipios Asociados de la Subregión de Embalses de los Rio – Negro Nare MASER, pagará mediante un pago anticipado del (40%) del valor de los recursos a administrar y el resto mediante actas parciales de acuerdo con el avance de las actividades objeto del contrato, previa la presentación de informe de actividades. Considerando que la naturaleza de este contrato es de administración delegada, MASER girará el pago a EL CONTRATISTA de con base a las actividades realizadas.

SEXTA. PLAZO: (06) SEIS MESES, contados desde la firma del acta de inicio.



SEPTIMA. SUPERVISION: EL CONTRATANTE ejercerá control administrativo por medio del que un funcionario designado.

PARAGRAFO PRIMERO: El funcionario encargado de la supervisión, podrá requerir la información necesaria al contratista, para hacer seguimiento y supervisión al presente CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las entidades que son parte del presente CONTRATO se comprometen a prestarse mutua colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones y a suministrarse los datos e informaciones que se soliciten, todo conforme a lo pactado en este CONTRATO y con el fin de velar por el oportuno y pleno cumplimiento de este.

OCTAVA. SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente CONTRATO de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta en la que conste la causa de esta. El término de la suspensión no será computable para efectos del plazo ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha de la suspensión.

NOVENA. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes que puedan surgir por razón de la celebración del CONTRATO, de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, se podrá someter al arreglo directo o de conciliación, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

DECIMA. LIQUIDACION: Las partes procederán a la liquidación del CONTRATO, dentro de los seis meses siguientes a la terminación de este, de conformidad con las normas legales vigentes, con participación de los supervisores, de la cual se dejará constancia en acta firmada por las partes y quienes intervengan en la misma.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL: El contratante no contrae por este CONTRATO ninguna obligación, vinculación o relación laboral con el personal que labora con el contratista, ni con las que este contrate para la ejecución del presente CONTRATO.

PARAGRAFO: El contratista se obliga a cumplir con el pago de los aportes de que trata la ley 789 de 2002.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: La responsabilidad, institucional o profesional, de cualquier orden, por los perjuicios que puedan derivarse de la atención prestada por el contratista a los usuarios objeto del presente CONTRATO, será asumida única y exclusivamente por el contratista.



DECIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral de este CONTRATO los siguientes documentos: 1) Propuesta. 2) Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario). 3) demás documentos aportados por el contratista y por el contratante.

DECIMA CUARTA. AJUSTES: El presente CONTRATO es susceptible de los ajustes que, de común acuerdo, consideren necesario las partes durante el desarrollo de este, sin que, en ningún caso, se modifique el Objeto.

DECIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes.


DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Por tratarse de un privado, no se pactan las cláusulas excepcionales.

DECIMA SEPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio el Municipio de Rionegro, Antioquia.

DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: El contratista mantiene libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del contratista o de las actuaciones de sus subcontratistas, independientes al contratante.

DECIMA NOVENA. GARANTÍAS.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Garantía de seriedad del ofrecimiento	NA	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	
Pago anticipado	X	Por el 100% del valor del pago anticipado y una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más.
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	X	Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más.



Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo contractual y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la obra	X	Por el 20% del valor del contrato y una vigencia de cinco (5) años desde el acta de recibo.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NA	
Calidad del servicio	NA	
Provisión de repuestos y accesorios	NA	
Otros amparos	NA	
Póliza Responsabilidad Extracontractual	X	Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más.


PARÁGRAFO PRIMERO: Estas garantías deberán ser expedidas por el subcontratista ejecutor y en las mismas serán asegurados MASER y el Administrador delegado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso cuando corresponda el establecimiento de un amparo o garantía diferente a las definidas en el presente CONTRATO, las mismas se establecerán con fundamento lo reglado en la sección 3, subsecciones 1, 2, 3 y 4 del decreto 1082 de 2045, reglamentario de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso que se pacte la entrega de recursos económicos a título de anticipo y/o pago anticipado en cualquier clase contrato que celebre el administrador delegado, la suma a desembolsar y/o autorizar, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (40%) del valor de cada contrato celebrado. Para tal fin, la solicitud de recursos por parte del Administrador delegado de que trata el presente parágrafo deberá ir acompañada del contrato y las respectivas pólizas y su recibo de pago debidamente aprobadas.

VIGECIMA. CLAUSULA DE CESION: El contratista no podrá ceder el presente CONTRATO sin previa autorización escrita por parte del contratante.

VIGESIMA PRIMERA. VEEDURIA CIUDADANA: Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos:



- 1) Suministrar información a quienes ejercen funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida
- 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana cuando se convoquen. El presente CONTRATO estará a disposición de la veeduría ciudadana.

VIGESIMA SEGUNDA. GASTOS: Los costos y gastos relativos al CONTRATO y a su legalización y demás impuestos de cualquier naturaleza, bien sean nacionales o territoriales, seguros y garantías, serán a cargo del contratista.

VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral de este CONTRATO, todos los documentos relativos a las calidades de los suscribientes y los documentos que se produzcan durante la ejecución de este, así mismo harán parte integral del CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para los efectos de este CONTRATO declara bajo la gravedad del juramento que NO está incluido dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional, las demás Normas Legales vigentes y en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en lo consagrado en la Ley 1474 de 2011.

VIGESIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato termina su duración, además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, por las siguientes causales:

- 1) En forma regular, cuando se configure:
 - a) La ejecución total del objeto del contrato.
 - b) El cumplimiento del plazo estipulado.
- 2) En forma anticipada cuando se configure:
 - a) El incumplimiento parcial o total de una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
 - b) Por acuerdo mutuo entre las partes.

Firmado en Rionegro – Antioquia, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022.


DANIELA GARCIA SERNA
Representante Legal Contratante
J.H.C. S.A.S.


WILLIAM A. JARAMILLO HERNANDEZ
Representante legal contratista
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

Certificado Bancario

Martes, 19 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ identificado(a) con NIT 900355893, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28458819850	2010/05/07	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos




Bancolombia

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14824588801



(415)7707212489984(8020) 000001482458880 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 5 8 9 3

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Rionegro

6 1 5

41. Dirección principal

CL 56 A 52 30

42. Correo electrónico

ingenieriawj@hotmail.es

43. Código postal

0 5 4 0 4 0

44. Teléfono 1

5 7 7 1 1 0 4

45. Teléfono 2

3 1 0 4 9 8 9 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 6 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 1

Otras actividades

1

4 1 1 2

2

4 1 1 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 4 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 25 / 08 : 35: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JARAMILLO HERNANDEZ WILLIAM ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado



ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	Nº 003-2022
CONTRATANTE:	J.H.C. S.A.S.
NIT:	900.334.866-1
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
NIT	900.355.893-9
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053.
VALOR:	DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$10.259.342.702) INCLUIDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES ALUGAR.
PLAZO:	SEIS (06) MESES

CONSIDERANDO

Que entre los suscritos a saber, **DANIELA GARCÍA SERNA** identificada con cédula de ciudadanía No 1.038.409.539 en su condición de representante legal de **JHC S.A.S.** con NIT 900.334.866-1 y quien para efectos del presente contrato se llamará el CONTRATANTE, y por la otra **WILLIAM A. JARAMILLO HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **15.441.658** en su condición de representante legal de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.** con NIT **900.355.893-9** y quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA y en adelante se celebró el Contrato No. 003 de 2022 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053".

CALLE 20 No. 19 – 18, CONCEPCIÓN – ANTIOQUIA
TEL: 3213458904



ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 003-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053".

En constancia se acepta y se firma por las partes en el municipio de Rionegro - Antioquia, a los 17 días del mes de noviembre del año 2022.


DANIELA GARCÍA SERNA
Representante Legal
JHC S.A.S.
CONTRATANTE


WILLIAM A. JARAMILLO HERNÁNDEZ
Representante Legal
Ingeniería y Construcciones WJ
CONTRATISTA

CALLE 20 No. 19 – 18, CONCEPCIÓN – ANTIOQUIA
TEL: 3213458904

ACTA DE INICIO

CONTRATO No MC 012-2022

Contratante:	Municipios Asociados De La Subregión de Embalses de los Rio – Negro NareMASER
Contratista:	J.H.C S.A.S
Objeto	Administración delegada mejoramiento de vías terciarias en los municipios de concepción, El peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo domingo bpin 2022003050053
Valor:	<p>VALOR ADMINISTRACION: el Presupuesto oficial es de veintiún millones de pesos (\$21.000.000).</p> <p>VALOR RECURSOS A ADMINISTRAR: Diez mil doscientos cincuenta y nueve millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos dos pesos (\$10.259.342.702) incluido impuestos y deducciones a lugar</p> <p>VALOR TOTAL: diez mil doscientos ochenta millones trescientoscuarenta y dos mil setecientos dos pesos (\$10.280.342.702)</p>
Duración:	(06) SEIS MESES, contados desde la firma del acta de inicio.

El día 17 de noviembre de 2022, se reunieron en la oficina de MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE “MASER, **Jonny Euclides Marín Agudelo**, mayor de edad, identificado con C.C. No.70.290.044, obrando en nombre y representación de **Municipios Asociados De La Subregión de Embalses de los Rio – Negro Nare MASER** Con NIT No. 800.108.848-6, quien para efectos de este contrato se denomina **El Contratante**, y **DANIELA SERNA GARCIA**, identificada con cédula. Nro. 1.038.409.539, actuando en calidad de Representante legal de la compañía **J.H.C S.A.S** Con NIT: 900.334.866-1 quien para los efectos del presente documento se denominará **El Contratista**, quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de iniciar las actividades inherentes al **CONTRATO No MC-012-2022** cuyo objeto es administración delegada mejoramiento de vías terciarias en los municipios de concepción, el peñol, granada, marinilla, san Carlos, santo domingo bpin2022003050053

Para constancia se firma, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).



JONNY EUCLIDES MARÍN AGUDELO
DIRECTOR EJECUTIVO



DANIELA SERNA GARCIA,
CONTRATISTA

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 31 # 30 – 29 piso 2
Municipio de Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

<div></div> <div></div>			ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1				<div></div>			
CONTRATO No. 003-2022			PERIODO DE COBRO		15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.				
VALOR DEL CONTRATO			\$ 10.280.342.702	FECHA DE INICIO	15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	
1	MEJORAR VIA TERCARIA									
1,1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m³								
1.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN.	m³	3.334	\$ 12.130	\$ 40.441.583	1.819,76	\$ 22.073.689	1.819,76	\$ 22.073.689	
1.1.2	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL.	m³	3.521	\$ 12.130	\$ 42.706.110	791,34	\$ 9.598.954	791,34	\$ 9.598.954	
1.1.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de GRANADA	m³	3.074	\$ 12.130	\$ 37.287.308	2.292,30	\$ 27.805.599	2.292,30	\$ 27.805.599	
1.1.4	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de MARINILLA	m³	2.348	\$ 12.130	\$ 28.485.273	2.030,11	\$ 24.625.234	2.030,11	\$ 24.625.234	
1.1.5	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de SAN CARLOS	m³	2.204	\$ 12.130	\$ 26.737.822	0,00		0,00		
1.1.6	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO	m³	3.778	\$ 12.130	\$ 45.824.442	822,15	\$ 9.972.680	822,15	\$ 9.972.680	
1.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m³/km								
1.2.1	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de CONCEPCIÓN	m³/km	15.970	\$ 1.311	\$ 20.936.312	7.461,00	\$ 9.781.371	7.461,00	\$ 9.781.371	
1.2.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).Municipio de EL PEÑOL	m³/km	18.277	\$ 1.248	\$ 22.809.526	3.909,23	\$ 4.878.719	3.909,23	\$ 4.878.719	
1.2.3	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de GRANADA	m³/km	17.194	\$ 1.060	\$ 18.226.106	11.952,68	\$ 12.669.839	11.952,68	\$ 12.669.839	
1.2.4	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de MARINILLA	m³/km	12.087	\$ 1.280	\$ 15.471.748	10.028,75	\$ 12.836.800	10.028,75	\$ 12.836.800	
1.2.5	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de SAN CARLOS	m³/km	12.437	\$ 1.108	\$ 13.780.292	0,00		0,00		
1.2.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de SANTO DOMINGO	m³/km	21.360	\$ 1.256	\$ 26.828.715	4.446,70	\$ 5.585.055	4.446,70	\$ 5.585.055	
1.3	Conformación de la calzada existente	m²								
1.3.1	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de CONCEPCIÓN	m²	5.348	\$ 1.132	\$ 6.053.596	2.888,50	\$ 3.269.782	2.888,50	\$ 3.269.782	
1.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de PEÑOL	m²	5.115	\$ 1.132	\$ 5.789.614	1.303,50	\$ 1.475.562	1.303,50	\$ 1.475.562	
1.3.3	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de GRANADA	m²	4.940	\$ 1.132	\$ 5.591.627	3.840,00	\$ 4.346.880	3.840,00	\$ 4.346.880	
1.3.4	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de MARINILLA	m²	3.260	\$ 1.132	\$ 3.689.754	3.222,40	\$ 3.647.757	3.222,40	\$ 3.647.757	
1.3.5	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de SAN CARLOS	m²	3.286	\$ 1.132	\$ 3.719.752	0,00		0,00		

				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONTRATO No. 003-2022				PERIODO DE COBRO		15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.					
VALOR DEL CONTRATO				\$ 10.280.342.702		FECHA DE INICIO		15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO								ACTA No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS			
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL		
1.3.6		Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de SANTO DOMINGO		m²	5.146	\$ 1.132	\$ 5.825.612	1.524,00	\$ 1.725.168	1.524,00	\$ 1.725.168		
1.4		Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C.		m³									
1.4.1		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de CONCEPCIÓN		m³	1.096	\$ 135.337	\$ 148.395.342	577,70	\$ 78.184.185	577,70	\$ 78.184.185		
1.4.2		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de EL PEÑOL		m³	1.015	\$ 151.929	\$ 154.233.702	251,22	\$ 38.167.603	251,22	\$ 38.167.603		
1.4.3		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de GRANADA		m³	990	\$ 191.663	\$ 189.674.496	758,00	\$ 145.280.554	758,00	\$ 145.280.554		
1.4.4		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de MARINILLA		m³	645	\$ 150.612	\$ 97.216.190	644,48	\$ 97.066.422	644,48	\$ 97.066.422		
1.4.5		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de SAN CARLOS		m³	669	\$ 242.708	\$ 162.329.615	0,00		0,00			
1.4.6		Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de SANTO DOMINGO		m³	1.073	\$ 196.010	\$ 210.314.418	301,80	\$ 59.155.818	301,80	\$ 59.155.818		
1.5		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte.		m³									
1.5.1		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN		m³	1.825	\$ 47.794	\$ 87.238.236	820,23	\$ 39.202.073	820,23	\$ 39.202.073		
1.5.2		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL		m³	1.745	\$ 64.438	\$ 112.426.649	363,83	\$ 23.444.478	363,83	\$ 23.444.478		
1.5.3		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de GRANADA		m³	1.876	\$ 104.172	\$ 195.462.045	1.080,64	\$ 112.572.430	1.080,64	\$ 112.572.430		
1.5.4		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de MARINILLA		m³	925	\$ 63.121	\$ 58.359.898	915	\$ 57.758.240	915,04	\$ 57.758.240		
1.5.5		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de SAN CARLOS		m³	961	\$ 155.217	\$ 149.174.930	0,00		0,00			
1.5.6		Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO		m³	2.333	\$ 108.519	\$ 253.175.994	404,25	\$ 43.868.806	404,25	\$ 43.868.806		
1.6		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGf/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo.		m³									
1.6.1		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGf/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de CONCEPCIÓN		m³	908	\$ 788.942	\$ 716.420.479	250,20	\$ 197.393.288	250,20	\$ 197.393.288		
1.6.2		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGf/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de EL PEÑOL		m³	870	\$ 738.294	\$ 642.367.165	180,90	\$ 133.557.385	180,90	\$ 133.557.385		
1.6.3		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGf/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de GRANADA		m³	844	\$ 782.008	\$ 660.083.178	498,96	\$ 390.190.712	498,96	\$ 390.190.712		

				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONTRATO No. 003-2022				PERIODO DE COBRO		15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.					
VALOR DEL CONTRATO				\$ 10.280.342.702		FECHA DE INICIO		15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO								ACTA No. 1				CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL		
1.6.4		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de MARINILLA		m³	561	\$ 736.849	\$ 413.177.761	547,20	\$ 403.203.773	547,20	\$ 403.203.773		
1.6.5		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de SAN CARLOS		m³	561	\$ 881.246	\$ 494.557.194	0,00		0,00			
1.6.6		Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de SANTO DOMINGO.		m³	879	\$ 812.300	\$ 713.977.583	0,00		0,00			
1,7		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado		m									
1.7.1		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de CONCEPCIÓN		m	2.018	\$ 62.493	\$ 126.107.749	1.090,00	\$ 68.117.370	1.090,00	\$ 68.117.370		
1.7.2		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de EL PEÑOL		m	1.921	\$ 60.304	\$ 115.841.572	474,00	\$ 28.584.096	474,00	\$ 28.584.096		
1.7.3		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de GRANADA		m	1.866	\$ 62.574	\$ 116.731.797	1.400,00	\$ 87.603.600	1.400,00	\$ 87.603.600		
1.7.4		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de MARINILLA		m	1.232	\$ 60.241	\$ 74.212.093	1.216,00	\$ 73.253.056	1.216,00	\$ 73.253.056		
1.7.5		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x435x80 prefabricado, Municipio de SAN CARLOS		m	1.241	\$ 67.132	\$ 83.277.246	0,00		0,00			
1.7.6		Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de SANTO DOMINGO		m	1.943	\$ 66.127	\$ 128.511.212	300,00	\$ 19.838.100	300,00	\$ 19.838.100		
1,8		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)		kg									
1.8.1		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de CONCEPCIÓN		kg	6.537	\$ 7.309	\$ 47.777.367	1.945,00	\$ 14.216.005	1.945,00	\$ 14.216.005		
1.8.2		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de EL PEÑOL		kg	6.188	\$ 7.309	\$ 45.231.351	1.363,88	\$ 9.968.599	1.363,88	\$ 9.968.599		
1.8.3		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de GRANADA		kg	6.018	\$ 7.309	\$ 43.988.741	3.590,75	\$ 26.244.792	3.590,75	\$ 26.244.792		
1.8.4		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de MARINILLA		kg	3.980	\$ 7.309	\$ 29.091.096	3.937,12	\$ 28.776.410	3.937,12	\$ 28.776.410		
1.8.5		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de SAN CARLOS		kg	3.998	\$ 7.309	\$ 29.220.881	0,00		0,00			
1.8.6		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de SANTO DOMINGO		kg	6.262	\$ 7.309	\$ 45.769.841	0,00		0,00			
1,9		Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia +/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia +/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia +/- 3 mm.		m									
1.9.1		Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia +/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia +/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia +/- 3 mm. Municipio de CONCEPCIÓN		m	1.685	\$ 28.116	\$ 47.378.272	465,00	\$ 13.073.940	465,00	\$ 13.073.940		
1.9.2		Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia +/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia +/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia +/- 3 mm. Municipio de EL PEÑOL		m	1.628	\$ 28.116	\$ 45.784.094	335,00	\$ 9.418.860	335,00	\$ 9.418.860		
1.9.3		Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia +/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia +/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia +/- 3 mm. Municipio de GRANADA		m	1.565	\$ 28.116	\$ 44.007.163	924,00	\$ 25.979.184	924,00	\$ 25.979.184		

 			ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1							
CONTRATO No. 003-2022			PERIODO DE COBRO		15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.				
VALOR DEL CONTRATO			\$ 10.280.342.702	FECHA DE INICIO	15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	
1.9.4	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de MARINILLA	m	1.035	\$ 28.116	\$ 29.108.495	1.020,00	\$ 28.678.320	1.020,00	\$ 28.678.320	
1.9.5	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de SAN CARLOS	m	1.039	\$ 28.116	\$ 29.205.495	0,00		0,00		
1.9.6	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de SANTO DOMINGO	m	1.639	\$ 28.116	\$ 46.089.153	0,00		0,00		
2	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE									
2.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m³								
2.1.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de CONCEPCIÓN	m³	295	\$ 23.300	\$ 6.884.451	22,89	\$ 533.337	22,89	\$ 533.337	
2.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de EL PEÑOL	m³	164	\$ 24.140	\$ 3.962.581	30,35	\$ 732.649	30,35	\$ 732.649	
2.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de GRANADA	m³	164	\$ 24.678	\$ 4.050.894	49,80	\$ 1.228.964	49,80	\$ 1.228.964	
2.1.4	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de MARINILLA	m³	98	\$ 24.113	\$ 2.374.889	25,54	\$ 615.846	25,54	\$ 615.846	
2.1.5	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de SAN CARLOS	m³	230	\$ 24.370	\$ 5.595.352	0,00		0,00		
2.1.6	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de SANTO DOMINGO	m³	230	\$ 24.699	\$ 5.676.077	6,30	\$ 155.604	6,30	\$ 155.604	
2.2	Relleno con arena (Protección tubería)	m³								
2.2.1	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de CONCEPCIÓN	m³	48	\$ 196.217	\$ 9.500.827	0,00		0,00		
2.2.2	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de EL PEÑOL	m³	27	\$ 165.648	\$ 4.455.931	5,38	\$ 891.186	5,38	\$ 891.186	
2.2.3	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de GRANADA	m³	27	\$ 196.212	\$ 5.278.103	5,38	\$ 1.055.621	5,38	\$ 1.055.621	
2.2.4	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de MARINILLA	m³	16	\$ 164.635	\$ 2.657.209	0,00		0,00		
2.2.5	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de SAN CARLOS	m³	38	\$ 265.753	\$ 10.008.258	0,00		0,00		
2.2.6	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de SANTO DOMINGO	m³	38	\$ 216.868	\$ 8.167.249	0,00		0,00		
2.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg								
2.3.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de CONCEPCIÓN	kg	9.305	\$ 7.309	\$ 68.013.147	0		0		
2.3.2	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de EL PEÑOL	kg	5.190	\$ 7.309	\$ 37.931.261	0		0		
2.3.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de GRANADA	kg	5.190	\$ 7.309	\$ 37.931.261	0		0		
2.3.4	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de MARINILLA	kg	3.129	\$ 7.309	\$ 22.869.861	0		0		
2.3.5	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de SAN CARLOS	kg	7.227	\$ 7.309	\$ 52.822.266	0		0		
2.3.6	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60). Municipio de SANTO DOMINGO	kg	7.241	\$ 7.309	\$ 52.924.469	0		0		
2.4	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras)	m³								
2.4.1	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de CONCEPCIÓN	m³	86	\$ 690.810	\$ 59.685.984	0		0		
2.4.2	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de EL PEÑOL	m³	48	\$ 645.874	\$ 31.001.952	0		0		
2.4.3	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de GRANADA	m³	48	\$ 690.803	\$ 33.158.544	0		0		

				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONTRATO No. 003-2022				PERIODO DE COBRO		15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.					
VALOR DEL CONTRATO				\$ 10.280.342.702		FECHA DE INICIO		15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO								ACTA No. 1				CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL		
2.4.4	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de MARINILLA	m³	29	\$ 644.384	\$ 18.558.259	0		0					
2.4.5	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de SAN CARLOS	m³	67	\$ 793.028	\$ 53.291.482	0		0					
2.4.6	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras). Municipio de SANTO DOMINGO	m³	67	\$ 721.167	\$ 48.462.422	0		0					
2,5	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada	m											
2.5.1	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de CONCEPCIÓN	m	54	\$ 966.114	\$ 52.170.156	0,00		0,00					
2.5.2	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de EL PEÑOL	m	30	\$ 944.984	\$ 28.349.520	6,00	\$ 5.669.904	6,00	\$ 5.669.904				
2.5.3	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de GRANADA	m	30	\$ 970.347	\$ 29.110.410	6,00	\$ 5.822.082	6,00	\$ 5.822.082				
2.5.4	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de MARINILLA	m	18	\$ 889.940	\$ 16.018.920	0,00		0,00					
2.5.5	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de SAN CARLOS	m	42	\$ 1.104.373	\$ 46.383.666	0,00		0,00					
2.5.6	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de SANTO DOMINGO	m	42	\$ 951.614	\$ 39.967.788	0,00		0,00					
2,6	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m³											
2.6.1	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Municipio de CONCEPCIÓN	m³	0,85	\$ 679.289	\$ 577.396	0		0					
2.6.2	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Municipio de EL PEÑOL	m³	2,34	\$ 622.125	\$ 1.453.782	0		0					
2.6.3	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Municipio de GRANADA	m³		\$ 679.280		0		0					
2.6.4	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Municipio de MARINILLA	m³		\$ 620.230		0		0					
2.6.5	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Municipio de SAN CARLOS	m³	0,85	\$ 809.321	\$ 687.923	0		0					
2.6.6	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa). Municipio de SANTO DOMINGO	m³		\$ 717.906		0		0					
2,7	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.	m³											
2.7.1	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de CONCEPCIÓN	m³	23,40	\$ 542.681	\$ 12.698.735	0,00		0,00					
2.7.2	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de EL PEÑOL	m³	13,00	\$ 495.498	\$ 6.441.474	2,18	\$ 1.080.186	2,18	\$ 1.080.186				
2.7.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de GRANADA	m³	13,00	\$ 542.674	\$ 7.054.762	2,18	\$ 1.183.029	2,18	\$ 1.183.029				
2.7.4	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de MARINILLA	m³	7,80	\$ 493.934	\$ 3.852.685	0,00		0,00					
2.7.5	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de SAN CARLOS	m³	18,20	\$ 650.010	\$ 11.830.182	0,00		0,00					
2.7.6	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de SANTO DOMINGO	m³	18,20	\$ 574.556	\$ 10.456.919	0,00		0,00					
3	INSTALAR SEÑALIZACION												
3,1	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	und											
3.1.1	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de CONCEPCIÓN	und	44	\$ 430.223	\$ 18.929.812	0		0					
3.1.2	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de EL PEÑOL	und	58	\$ 428.571	\$ 24.857.118	0		0					
3.1.3	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de GRANADA	und	38	\$ 430.222	\$ 16.348.436	0		0					
3.1.4	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de MARINILLA	und	28	\$ 428.516	\$ 11.998.448	0		0					

				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONTRATO No. 003-2022				PERIODO DE COBRO			15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.					
VALOR DEL CONTRATO				\$ 10.280.342.702		FECHA DE INICIO		15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO								ACTA No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS			
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL		
3.1.5		Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de SAN CARLOS		und	18	\$ 433.979	\$ 7.811.622	0		0			
3.1.6		Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". Municipio de SANTO DOMINGO		und	49	\$ 431.338	\$ 21.135.562	0		0			
3.2		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.		m									
3.2.1		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio de CONCEPCIÓN		m	2.988,00	\$ 6.881	\$ 20.560.428	0		0			
3.2.2		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio EL PEÑOL		m	2.881,44	\$ 6.881	\$ 19.827.189	0		0			
3.2.3		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio de GRANADA		m	2.798,25	\$ 6.881	\$ 19.254.758	0		0			
3.2.4		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio de MARINILLA		m	1.869,12	\$ 6.881	\$ 12.861.415	0		0			
3.2.5		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio de SAN CARLOS		m	1.873,16	\$ 6.881	\$ 12.889.180	0		0			
3.2.6		Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Municipio de SANTO DOMINGO		m	2.933,55	\$ 6.881	\$ 20.185.758	0		0			
3.3		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.		und									
3.3.1		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de CONCEPCIÓN		und	140	\$ 15.209	\$ 2.129.260	0		0			
3.3.2		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de EL PEÑOL		und	131	\$ 15.209	\$ 1.992.379	0		0			
3.3.3		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de GRANADA		und	116	\$ 15.209	\$ 1.764.244	0		0			
3.3.4		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de MARINILLA		und	79	\$ 15.209	\$ 1.201.511	0		0			
3.3.5		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de SAN CARLOS		und	79	\$ 15.209	\$ 1.201.511	0		0			
3.3.6		Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento. Municipio de SANTO DOMINGO		und	123	\$ 15.209	\$ 1.870.707	0		0			
4		DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES											
4.1		Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.		und									
4.1.1		Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de CONCEPCIÓN		und	4,00	\$ 978.999	\$ 3.915.996	0		0			
4.1.2		Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de EL PEÑOL		und	3,00	\$ 983.033	\$ 2.949.099	0		0			
4.1.3		Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de GRANADA		und	5,00	\$ 985.614	\$ 4.928.070	1	\$ 985.614	1	\$ 985.614		
4.1.4		Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de MARINILLA		und		\$ 982.901		0		0			
4.1.5		Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de SAN CARLOS		und	6,00	\$ 984.136	\$ 5.904.816	0		0			



JHG

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1



CONTRATO No. 003-2022			PERIODO DE COBRO			15/11/22 - 14/12/22		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.					
VALOR DEL CONTRATO			\$ 10.280.342.702		FECHA DE INICIO	15/11/2022		FECHA DE TERMINACION		14/05/2023	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA No. 1 CANTIDADES ACUMULADAS					
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DIRECTO	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	
4.1.6	Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de SANTO DOMINGO		und	6,00	\$ 985.717	\$ 5.914.302	0		0		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 8.048.872.356		\$ 2.427.045.208		\$ 2.427.045.208	
% ADMINISTRACIÓN				18,15%	\$ 1.460.870.333		\$ 440.508.705		\$ 440.508.705		
% IMPREVISTOS				0,00%	\$ -		\$ -		\$ -		
% UTILIDADES				5,00%	\$ 402.443.618		\$ 121.352.260		\$ 121.352.260		
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)						\$ 158.160.000		\$ 26.360.000		\$ 26.360.000	
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)						\$ 147.772.392		\$ 24.628.732		\$ 24.628.732	
PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)						\$ 9.001.909		\$ 1.500.318		\$ 1.500.318	
AJUSTE A ESTUDIO Y DISEÑOS (SI APLICA)											
GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)				12,00	\$ 70.233	\$ 842.796		\$ 842.796		\$ 842.796	
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)				67,44	\$ 776.680	\$ 52.379.299					
VALOR TOTAL DE OBRA						\$ 10.280.342.702		\$ 3.042.238.020		\$ 3.042.238.020	
AMORTIZACION DE ANTICIPO				40%	\$ 4.112.137.081		\$ 1.216.895.208		\$ 1.216.895.208		
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA							\$ 1.825.342.812		\$ 1.825.342.812		
PORCENTAJE DE ACTA POR COBRAR							29,59%				
PORCENTAJE COBRADO							29,59%				

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO
DIRECTOR EJECUTIVO
MUSA

JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO
DIRECTOR EJECUTIVO
MASER

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1819,76		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN.									
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
			[m]	[m]	[m]							
Ramal a Sonadora - Tramo 2			65,00	5,30	0,63	1,00		217,04	Vía			
Ramal a Sonadora - Tramo 1			480,00	5,30	0,63	1,00		1602,72	Vía			
SUB-TOTAL								1.819,76				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
 DIRECTOR CONTRATISTA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S


JARINSON MOSQUERA RENTERIA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									791,34		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.1.2	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL.										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00	5,30	0,63	1,00		791,34	Vía				
SUB-TOTAL							791,34					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022

ACTA DE OBRA No. 1

OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S					UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S							2292,30		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA						CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.1.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
			[m]	[m]	[m]						
La Tolda - Tafetanes			100,00	5,30	0,45	1,00		238,50	Vía		
			400,00	5,30	0,63	1,00		1335,60	Vía		
Ramal Cruces las Palmas			200,00	5,70	0,63	1,00		718,20	Vía		
SUB-TOTAL								2.292,30			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.							PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									2030,11	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria					CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.1.4	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de MARINILLA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00	5,30	0,63	1,00		754,61	Vía			
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00	5,30	0,63	1,00		1275,50	Vía			
SUB-TOTAL							2.030,11				

REGISTRO FOTOGRAFICO



Antioje

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

WmmuuePne

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022

ACTA DE OBRA No. 1

OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									822,15	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.1.6	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
Vía San Pedro		150,00	5,30	0,63	1,00		500,85	Vía			
Vía el Rayo		140,00	5,10	0,45	1,00		321,30	Vía			
SUB-TOTAL							822,15				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³/km	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									7461,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.2.1	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de CONCEPCIÓN										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	DISTANCIA	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]									
Ramal a Sonadora - Tramo 2				4,10	217,04		889,84	Excavaciones de la Vía				
Ramal a Sonadora - Tramo 1				4,10	1602,72		6571,15	Excavaciones de la Vía				
SUB-TOTAL							7.461,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³/km	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								3909,23		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM		1.2.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).Municipio de EL PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	DISTANCIA	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]									
Vía Montañitas Los Alpes - Yarumos				4,94	791,34		3909,23	Excavaciones de la Vía				
SUB-TOTAL							3.909,23					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
 DIRECTOR CONTRATISTA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S


JARINSON MOSQUERA RENTERIA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³/km	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								11952,68	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	1.2.3	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	DISTANCIA	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
		[m]	[m]							
La Tolda - Tafetanes				5,21	1575,98		8210,86	Excavaciones de la Vía		
Ramal Cruces las Palmas				5,21	718,20		3741,82	Excavaciones de la Vía		
SUB-TOTAL							11.952,68			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³/km	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								10028,75			
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA						
ITEM		1.2.4	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de MARINILLA										
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO [m]	ANCHO [m]	DISTANCIA	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1					4,94	754,61		3727,79	Excavaciones de la Vía				
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2					4,94	1275,50		6300,96	Excavaciones de la Vía				
SUB-TOTAL								10.028,75					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³/km	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									4446,70		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA								CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.2.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de SANTO DOMINGO										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO [m]	ANCHO [m]	DISTANCIA	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
Vía San Pedro				5,69	500,85		2849,84	Excavació de la Vía				
Vía el Rayo				4,97	321,30		1596,86	Excavació de la Vía				
SUB-TOTAL							4.446,70					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m²	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								2888,50			
CAPITULO		1	MEJORAR VIA Terciaria							CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM		1.3.1	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de CONCEPCIÓN										
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
			[m]	[m]	[m]								
Ramal a Sonadora - Tramo 2			65,00	5,30		1,00		344,50	Vía				
Ramal a Sonadora - Tramo 1			480,00	5,30		1,00		2544,00	Vía				
SUB-TOTAL								2.888,50					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRTISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m²	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1303,50		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00	5,50		1,00		1303,50	Vía			
SUB-TOTAL							1.303,50				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m²	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								3840,00		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA Terciaria							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.3.3	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
La Tolda - Tafetanes		500,00	5,40		1,00		2700,00	Vía				
Ramal Cruces las Palmas		200,00	5,70		1,00		1140,00	Vía				
SUB-TOTAL							3.840,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m²	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								3222,40		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.3.4	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de MARINILLA									
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
			[m]	[m]	[m]							
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1			226,00	5,30		1,00		1197,80	Vía			
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2			382,00	5,30		1,00		2024,60	Vía			
SUB-TOTAL								3.222,40				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m²	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1524,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.3.6	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de SANTO DOMINGO									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Vía San Pedro		150,00	5,40		1,00		810,00	Vía			
Vía el Rayo		140,00	5,10		1,00		714,00	Vía			
SUB-TOTAL							1.524,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									577,70		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.4.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de CONCEPCIÓN										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Ramal a Sonadora - Tramo 2		65,00	5,30	0,20	1,00		68,90	Vía				
Ramal a Sonadora - Tramo 1		480,00	5,30	0,20	1,00		508,80	Vía				
SUB-TOTAL							577,70					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								251,22		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de EL PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00	5,30	0,20	1,00		251,22	Vía				
SUB-TOTAL							251,22					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								758,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
La Tolda - Tafetanes		500,00	5,30	0,20	1,00		530,00	Vía			
Ramal Cruces las Palmas		200,00	5,70	0,20	1,00		228,00	Vía			
SUB-TOTAL							758,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol,							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									644,48		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.4.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de MARINILLA										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00	5,30	0,20	1,00		239,56	Vía				
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00	5,30	0,20	1,00		404,92	Vía				
SUB-TOTAL							644,48					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									301,80		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.4.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de SANTO DOMINGO										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Vía San Pedro		150,00	5,30	0,20	1,00		159,00	Vía				
Vía el Rayo		140,00	5,10	0,20	1,00		142,80	Vía				
SUB-TOTAL							301,80					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								820,23		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.5.1	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Ramal a Sonadora - Tramo 2		65,00	5,30	0,25	1,00		86,13	Vía			
		65,00	0,30	0,30	2,00		11,70	Llenos espalda cordón			
Ramal a Sonadora - Tramo 1		480,00	5,30	0,25	1,00		636,00	Vía			
		480,00	0,30	0,30	2,00		86,40	Llenos espalda cordón			
SUB-TOTAL							820,23				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								363,83		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.5.2	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Vía Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00	5,30	0,25	1,00		314,03	Vía			
		237,00	0,30	0,30	2,00		42,66	Llenos espalda cordón			
		6,00	1,70	0,70	1,00		7,14	Lleno cubrimiento de tubería			
SUB-TOTAL							363,83				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1080,64		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM		1.5.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
La Tolda - Tafetanes		500,00	5,30	0,25	1,00		662,50	Vía				
		500,00	0,30	0,30	2,00		90,00	Llenos espalda cordón				
		6,00	1,70	0,70	1,00		7,14	Lleno cubrimiento de tubería				
Ramal Cruces las Palmas		200,00	5,70	0,25	1,00		285,00	Vía				
		200,00	0,30	0,30	2,00		36,00	Llenos espalda cordón				
SUB-TOTAL							1.080,64					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL,						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								915,04		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.5.4	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de MARINILLA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00	5,30	0,25	1,00		299,45	Vía			
		226,00	0,30	0,30	2,00		40,68	Llenos espalda cordón			
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00	5,30	0,25	1,00		506,15	Vía			
		382,00	0,30	0,30	2,00		68,76	Llenos espalda cordón			
SUB-TOTAL							915.04				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								404,25	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.5.6	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO								
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
		[m]	[m]	[m]						
Vía San Pedro		150,00	5,30	0,25	1,00		198,75	Vía		
		150,00	0,30	0,30	2,00		27,00	Llenos espalda cordón		
Vía el Rayo		140,00	5,10	0,25	1,00		178,50	Vía		
SUB-TOTAL							404,25			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									250,20	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA								CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	1.6.1	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de CONCEPCIÓN									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Ramal a Sonadora - Tramo 2		65,00	5,00	0,18	1,00		58,50	Vía			
Ramal a Sonadora - Tramo 1		213,00	5,00	0,18	1,00		191,70	Vía			
SUB-TOTAL							250,20				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									180,90		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.6.2	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de EL PEÑOL										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		201,00	5,00	0,18	1,00		180,90	Vía				
SUB-TOTAL							180,90					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								498,96	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.6.3	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
		[m]	[m]	[m]						
La Tolda - Tafetanes		360,00	5,00	0,18	1,00		324,00	Vía		
Ramal Cruces las Palmas		180,00	5,40	0,18	1,00		174,96	Vía		
SUB-TOTAL							498,96			

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol,							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									547,20		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria								CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.6.4	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de MARINILLA										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00	5,00	0,18	1,00		203,40	Vía				
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00	5,00	0,18	1,00		343,80	Vía				
SUB-TOTAL							547,20					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									1090,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA								CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.7.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de CONCEPCIÓN										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Ramal a Sonadora - Tramo 2		65,00			2,00		130,00	Bordillos laterales				
Ramal a Sonadora - Tramo 1		480,00			2,00		960,00	Bordillos laterales				
SUB-TOTAL							1.090,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									474,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.7.2	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de EL PEÑOL										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00			2,00		474,00	Bordillos laterales				
SUB-TOTAL							474,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1400,00			
CAPITULO		1	MEJORAR VIA Terciaria							CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM		1.7.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de GRANADA										
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
			[m]	[m]	[m]								
La Tolda - Tafetanes			500,00			2,00		1000,00	Bordillos laterales				
Ramal Cruces las Palmas			200,00			2,00		400,00	Bordillos laterales				
SUB-TOTAL								1.400,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRTISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol,							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									1216,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria								CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	1.7.4	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de MARINILLA										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00			2,00		452,00	Bordillos laterales				
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00			2,00		764,00	Bordillos laterales				
SUB-TOTAL							1.216,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									300,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA					CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de SANTO DOMINGO										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Vía San Pedro		150,00			2,00		300,00	Bordillos laterales				
SUB-TOTAL							300.00					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	kg	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1945,00	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.8.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de CONCEPCIÓN								
ELEMENTO/UBICACIÓN		# BARRA	PESO	LONG.	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
			[Kg]	[m]			[Kg/m]			
Ramal a Sonadora - Tramo 2		7/8"	3,042	0,35	362		385,42	Acero transversal liso		
		3/8"	0,560	0,65	73,00		26,57	Acero longitudinal corrugado		
		1/2"	0,994	1,25	52,00		64,61	Acero longitudinal rampa de transición		
		1/2"	0,994	5,00	14,00		69,58	Acero transversal rampa de transición		
		1/2"	0,994	5,00	8,00		39,76	Acero longitudinal para riostras		
		1/4"	0,250	0,71	68,67		12,19	Estribos para riostras		
Ramal a Sonadora - Tramo 1		7/8"	3,042	0,35	1184		1260,60	Acero transversal liso		
		3/8"	0,560	0,65	237,00		86,27	Acero longitudinal corrugado		
SUB-TOTAL							1.945,00			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	kg	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1363,88		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.8.2	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de EL PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		# BARRA	PESO [Kg]	LONG. [m]	CANT.	DESC.	TOTAL [Kg/m]	OBSERVACIONES			
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		7/8"	3,042	0,35	1117,00		1189,27	Acero transversal liso			
		3/8"	0,560	0,65	224,00		81,54	Acero longitudinal corrugado			
		1/2"	0,994	1,25	26,00		32,31	Acero longitudinal rampa de transición			
		1/2"	0,994	5,00	7,00		34,79	Acero transversal rampa de transición			
		1/2"	0,994	5,00	4,00		19,88	Acero longitudinal para riostras			
		1/4"	0,250	0,71	34,33		6,09	Estribos para riostras			
SUB-TOTAL							1.363,88				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
 DIRECTOR CONTRATISTA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S


JARINSON MOSQUERA RENTERIA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	kg	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								3590,75	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCIARIA				CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	1.8.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN		# BARRA	PESO [Kg]	LONG. [m]	CANT.	DESC.	TOTAL [Kg/m]	OBSERVACIONES		
La Tolda - Tafetanes		7/8"	3,042	0,35	2000,00		2129,40	Acero transversal liso		
		3/8"	0,560	0,65	400,00		145,60	Acero longitudinal corrugado		
		1/2"	0,994	1,25	26,00		32,31	Acero longitudinal rampa de transición		
		1/2"	0,994	5,00	7,00		34,79	Acero transversal rampa de transición		
		1/2"	0,994	5,00	4,00		19,88	Acero longitudinal para riostras		
		1/4"	0,250	0,71	34,33		6,09	Estribos para riostras		
Ramal Cruces las Palmas		7/8"	3,042	0,35	1080,00		1149,88	Acero transversal liso		
		3/8"	0,560	0,65	200,00		72,80	Acero longitudinal corrugado		
SUB-TOTAL							3.590,75			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022			ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL,		PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S		UNIDAD	kg	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S				3937,12	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA			CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	1.8.4	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de MARINILLA				

ELEMENTO/UBICACIÓN	# BARRA	PESO [Kg/m]	LONG. [m]	CANT.	DESC.	TOTAL [Kg]	OBSERVACIONES
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1	7/8"	3,042	0,35	1256,00		1337,26	Acero transversal liso
	3/8"	0,560	0,65	252,00		91,73	Acero longitudinal corrugado
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2	7/8"	3,042	0,35	2123,00		2260,36	Acero transversal liso
	3/8"	0,560	0,65	425,00		154,70	Acero longitudinal corrugado
	1/2"	0,994	1,25	26,00		32,31	Acero longitudinal rampa de transición
	1/2"	0,994	5,00	7,00		34,79	Acero transversal rampa de transición
	1/2"	0,994	5,00	4,00		19,88	Acero longitudinal para riostras
	1/4"	0,250	0,71	34,33		6,09	Estribos para riostras
SUB-TOTAL						3.937,12	

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								465,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA					
ITEM	1.9.1	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de CONCEPCIÓN									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
		[m]	[m]	[m]							
Ramal a Sonadora - Tramo 2		5,00			22,00		110,00				
Ramal a Sonadora - Tramo 1		5,00			71,00		355,00				
SUB-TOTAL							465,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
 DIRECTOR CONTRATISTA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S


JARINSON MOSQUERA RENTERIA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								335,00			
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM		1.9.2	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de EL PEÑOL										
ELEMENTO/UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
			[m]	[m]	[m]								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos			5,00			67,00		335,00					
SUB-TOTAL								335,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO





JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								924,00	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria							CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	1.9.3	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
La Tolda - Tafetanes		5,00			120,00		600,00			
Ramal Cruces las Palmas		5,40			60,00		324,00			
SUB-TOTAL							924,00			
REGISTRO FOTOGRAFICO										
										
 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO DIRECTOR CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						 JARINSON MOSQUERA RENTERIA DIRECTOR INTERVENTORIA CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S				



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO		MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol,						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA		CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								1020,00		
CAPITULO		1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM		1.9.4	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de MARINILLA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		5,00			76,00		380,00					
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		5,00			128,00		640,00					
SUB-TOTAL							1.020,00					

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								22,89	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA				CANTIDAD ACUMULADA				
ITEM	2.1.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de CONCEPCIÓN								
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.	DESC.	VOLUMEN	OBSERVACIONES		
		LARGO	ANCHO	ALTO						
Ramal a Sonadora - Tramo 2		65,00	0,30	0,07	2,00		2,73	Excavacion para instalación de bordillo		
Ramal a Sonadora - Tramo 1		480,00	0,30	0,07	2,00		20,16	Excavacion para instalación de bordillo		
SUB-TOTAL								22.89		

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								30,35	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	2.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de EL PEÑOL								
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.	DESC.	VOLUMEN	OBSERVACIONES		
		LARGO	ANCHO	ALTO						
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		237,00	0,30	0,07	2,00		9,95	Excavacion para instalación de bordillo		
		6,00	1,70	2,00	1,00		20,40	Excavacion para instalación de tubería		
SUB-TOTAL							30.35			

REGISTRO FOTOGRAFICO





JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								49,80	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	2.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de GRANADA								
ELEMENTO/UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES			
	LARGO	ANCHO	ALTO							
La Tolda - Tafetanes	500,00	0,30	0,07	2,00		21,00	Excavacion para instalación de bordillo			
	6,00	1,70	2,00	1,00		20,40	Excavacion para instalación de tubería			
Ramal Cruces las Palmas	200,00	0,30	0,07	2,00		8,40	Excavacion para instalación de bordillo			
SUB-TOTAL						49,80				
REGISTRO FOTOGRAFICO										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO DIRECTOR CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>JARINSON MOSQUERA RENTERIA DIRECTOR INTERVENTORIA CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S</p> </div> </div>										

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO	15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								25,54	
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	2.1.4	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de MARINILLA								
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES		
		[m]	[m]	[m]						
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1		226,00	0,30	0,07	2,00		9,49	Excavacion para instalación de bordillo		
Via Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2		382,00	0,30	0,07	2,00		16,04	Excavacion para instalación de bordillo		
SUB-TOTAL							25,54			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								6,30		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	2.1.6	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de SANTO DOMINGO									
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		VOLUMEN	OBSERVACIONES			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
Vía San Pedro		150,00	0,30	0,07	2,00		6,30	Excavacion para instalación de bordillo			
SUB-TOTAL								6,30			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								5,38			
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	2.2.2	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de EL PEÑOL										
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		TOTAL	OBSERVACIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		6,00	1,70	0,90	1,00		9,18	Cubrimiento tubería				
		6,00	0,55		1,00		-3,80	Descuento area tubería				
SUB-TOTAL								5,38				

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								5,38		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	2.2.3	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		VOLUMEN	OBSERVACIONES			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
La Tolda - Tafetanes		6,00	1,70	0,90	1,00		9,18	Cubrimiento tubería			
		6,00	0,55		1,00		-3,80	Descuento area tubería			
SUB-TOTAL								5,38			

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1					
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								6,00			
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA							CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	2.5.2	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de EL PEÑOL										
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		TOTAL	OBSERVACIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO								
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		1,00			6,00		6,00					
SUB-TOTAL								6,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo.						PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S						UNIDAD	m	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S								6,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA Terciaria							CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	2.5.3	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		VOLUMEN	OBSERVACIONES			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
La Tolda - Tafetanes		1,00			6,00		6,00				
SUB-TOTAL								6,00			

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
 DIRECTOR CONTRATISTA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S


JARINSON MOSQUERA RENTERIA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S					UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S							2,18			
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA						CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	2.7.2	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de EL PEÑOL									
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		VOLUMEN	OBSERVACIONES			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
Via Montañitas Los Alpes - Yarumos		6,00	1,70	0,30	1,00		3,06	Atraque de tubería			
		6,00	0,55		1,00		-1,90	Descuento area tubería			
		6,00	1,70	0,10	1,00		1,02	Encamado para tubería			
SUB-TOTAL								2.18			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022							ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.					PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S					UNIDAD	m³	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S							2,18			
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA						CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	2.7.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de GRANADA									
ELEMENTO/UBICACIÓN		DIMENSIONES			CANT.		VOLUMEN	OBSERVACIONES			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
La Tolda - Tafetanes		6,00	1,70	0,30	1,00		3,06	Atraque de tubería			
		6,00	0,55		1,00		-1,90	Descuento area tubería			
		6,00	1,70	0,10	1,00		1,02	Encamado para tubería			
SUB-TOTAL								2,18			

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARRENO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 003-2022								ACTA DE OBRA No. 1				
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO.							PERIODO		15/11/2022	A	14/12/2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S							UNIDAD	und	CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S									1,00		
CAPITULO	1	MEJORAR VIA TERCARIA								CANTIDAD ACUMULADA		
ITEM	4.1.3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de GRANADA										
ELEMENTO/UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	DESC.	TOTAL	OBSERVACIONES				
		[m]	[m]	[m]								
La Tolda - Tafetanes					1,00		1,00	Obras existentes				
SUB-TOTAL							1.00					

REGISTRO FOTOGRAFICO




JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO
DIRECTOR CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S



JARINSON MOSQUERA RENTERIA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

**INFORME ACTA DE OBRA No. 1.
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de
Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos,
Santo Domingo**

CONTRATO No. COP-003-2022



**PERIODO:
15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022**



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INFORME DE OBRA No. 1

FECHA:	15 de Diciembre del 2022
CONTRATO DE OBRA:	003 - 2022
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
CONTRATANTE:	J.H.C. S.A.S.
INTERVENTORIA:	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.
SUPERVISIÓN:	Municipios Asociados de la Subregión de Embalses Rio Negro y Nare - MASER
OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo BPIN 2022003050053
ASUNTO:	Informe de obra No. 1 del Contrato No. 003-2022, correspondiente al período comprendido de noviembre del 2022.



TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	5
2 OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3 GENERALIDADES.....	7
3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	7
4 METODOLOGÍA	8
5 GENERALIDADES DEL PAVIMENTO.....	9
5.1 ESPESOR DE SUBBASE GRANULAR.	9
5.2 ESPESOR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	9
5.3 DEFINICIÓN DE LOSA EN CONCRETO RÍGIDO.	9
5.3.1 DIMENSIONES DE LA LOSA.....	10
5.4 SISTEMA DE CONFINAMIENTO LATERAL Y DRENAJE SUPERFICIAL	10
6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA EN CONCRETO RIGIDO	10
6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE CONCRETO	10
6.2 JUNTAS	11
6.2.1 RESISTENCIA DEL ACERO DE REFUERZO.	11
6.2.2 JUNTAS LONGITUDINALES	11
6.2.3 DOVELAS.....	11
6.2.4 ESQUEMAS ESTRUCTURALES	12
7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....	13
7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	13
7.2 SUPERVISOR DE OBRA.....	13
7.3 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	14
7.4 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA.....	14
8 OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO.....	15
9 SEGUIMIENTO FINANCIERO	16
10 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE OBRA	17
10.1 AVANCE GENERAL DE LA OBRA	17



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

10.2	AVANCE DE LA OBRA POR MUNICIPIO	18
10.2.1	CONCEPCIÓN	18
10.2.2	EL PEÑOL	37
10.2.3	GRANADA	55
10.2.4	MARINILLA	77
10.2.5	SAN CARLOS	97
10.2.6	SANTO DOMINGO	98
11	PERSONAL TÉCNICO	110
12	CONCLUSIONES GENERALES	110
13	ANEXOS	110



1 INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años no se han realizado mayores inversiones en la expansión de la red rural debido a que la prioridad ha sido mantener, conservar y mejorar lo existente antes de abrir nuevas carreteras, para lo cual, los entes territoriales han encontrado en el Fondo Nacional de Regalías un importante instrumento financiero de parte del gobierno central para la ejecución del proyecto cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO”, con el fin mejorar la transitabilidad y el desarrollo de las actividades de los habitantes de la zona, para evitar pérdidas económicas familiares y regionales.

Este proyecto se desarrolla en las zonas rurales de los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo, discriminado en los siguientes tramos:

TABLA No 1. DIVISIÓN DE TRAMOS DEL PROYECTO

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA VÍA
CONCEPCIÓN	Ramal a Sonadora Tramo 1
	Ramal a Sonadora Tramo 2
	Vía San Pedro Peñol Parte Baja
EL PEÑOL	Vía Peñol - Pozos Tramo 1
	Vía Peñol - Pozos Tramo 2
	Vía Peñol - Pozos Tramo 3
	Vía Peñol - Pozos Tramo 4
	Vía Peñol - Pozos Tramo 5
	Vía Montañita Los Alpes Yarumos
GRANADA	La Tolda-Tafetanes
	Ramal Cruces Las Palmas
MARINILLA	Vía Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1
	Vía Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2
SAN CARLOS	Narices - La Holanda
SANTO DOMINGO	Vereda El Rayo-Santa Gertrudis Tramo 1
	Vereda El Rayo-Santa Gertrudis Tramo 2
	Vía Vereda San Francisco
	Vía San Pedro
	Vía El Saltillo

El objeto de este informe es presentar un resumen sobre el avance, desarrollo y ejecución de los ítems del proyecto, así como también se presenta una descripción y análisis sobre los hechos o actividades que incidieron en el desarrollo del proyecto.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los procesos de construcción adoptando como norma técnica el “MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA VÍAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO”, redactada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Ministerio de Transporte. Igualmente se considera la “GUÍA PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE REDES DE ALCANTARILLADO”, en los municipios de Concepción, el Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir técnicamente y establecer las dimensiones de la estructura de pavimento rígido a construir.
- Definir todas las características técnicas de construcción como son el refuerzo longitudinal (pasadores) y transversal (acero de transferencia), el concreto y demás a utilizar en los diferentes elementos estructurales.
- Dar cumplimiento a las cantidades contractuales que se encuentran ejecutando en el contrato.
- Entregar las especificaciones técnicas de las construcciones que se encuentran estipuladas en los diseños contractuales.
- Dar evidencias de las actividades ejecutadas y programadas a ejecutar dentro del plazo contractual.
- Entrega de la documentación solicitada por la entidad contratante.



3 GENERALIDADES


3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como focalización 6 municipios del departamento de Antioquia, 5 localizados en la zona del Oriente Antioqueño en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y 1 localizo en la zona del Nordeste Antioqueño en el Municipio de Santo Domingo.

Este proyecto permite beneficiar a ambas subregiones dado que la inversión de las vías terciarias permite la conexión entre las Entidades Territoriales Municipales.



COLOMBIA

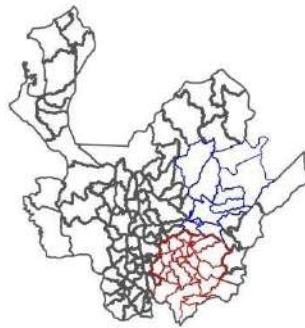

ANTIOQUIA



ORIENTE Y NORDESTE

Figura No 1. Ubicación General del Proyecto. Fuente elaboración propia.

Este proyecto cuenta con una longitud de 5112 m en los 6 municipios estipulados, los cuales se dividen en tramos de la siguiente manera:

TABLA NO 2. DIVICIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA VÍA	LONG. TRAMO	LONG. MUNICIPIO
CONCEPCIÓN	Ramal a Sonadora Tramo 1	508	1009
	Ramal a Sonadora Tramo 2	65	
	Vía San Pedro Peñol Parte Baja	436	
EL PEÑOL	Vía Peñol - Pozos Tramo 1	104	965
	Vía Peñol - Pozos Tramo 2	119	



	Vía Peñol - Pozos Tramo 3	420	
	Vía Peñol - Pozos Tramo 4	25	
	Vía Peñol - Pozos Tramo 5	60	
	Vía Montañita Los Alpes Yarumos	237	
GRANADA	La Tolda-Tafetanes	732	932
	Ramal Cruces Las Palmas	200	
MARINILLA	Vía Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 1	233	615
	Vía Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo Tramo 2	382	
SAN CARLOS	Narices - La Holanda	620	620
SANTO DOMINGO	Vereda El Rayo-Santa Gertrudis Tramo 1	200	971
	Vereda El Rayo-Santa Gertrudis Tramo 2	140	
	Vía Vereda San Francisco	331	
	Vía San Pedro	150	
	Vía El Saltillo	150	

4 METODOLOGÍA

El análisis de las estructuras de pavimento se basa en la teoría de la elasticidad bajo el supuesto de materiales perfectamente elásticos, isotrópicos y homogéneos. Todos los materiales poseen propiedades de elasticidad, lo que en pocas palabras se puede definir como la capacidad que tiene un material de deformarse bajo el efecto de una carga externa y recuperar la forma inicial cuando la carga desaparece.

El rango de esfuerzo admisible para lograr que el cuerpo se comporte dentro del límite elástico es variable de acuerdo con el tipo de material.

Los principales atributos de este tipo de pavimento son:

- ✓ Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactoria durante un amplio periodo de servicio, garantizando su integridad estructural en todo el periodo de diseño utilizado. Periodo de 20 años.
- ✓ No requerir mantenimientos diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.
- ✓ No requiere grandes modificaciones a la geometría de la vía existente, ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.
- ✓ Los pavimentos de concreto ofrecen una alta resistencia al desgaste.
- ✓ Los pavimentos de concreto tienen una alta rigidez por lo cual las cargas y los esfuerzos transmitidos al suelo son mínimas al ser ejercidas en áreas muy grandes, adicional, se le suma a la estructura de pavimento capas de agregados pétreos seleccionados en aras de transmitir esfuerzos a la subrasante de manera uniforme,



afectando a la misma en lo menor posible.

- ✓ Ofrece la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales.

5 GENERALIDADES DEL PAVIMENTO

Se seleccionó la aplicación de pavimento de concreto rígido, para el diseño se debe tener en cuenta lo presentado a continuación.

5.1 ESPESOR DE SUBBASE GRANULAR.

Como resultado del análisis de algunas variables que pudiesen incidir en el comportamiento del pavimento rígido como la importancia de las vías (terciarias), el nivel de tránsito (bajo volumen de tránsito) y el tipo de pavimento a utilizar (pavimento rígido), se concluyó la utilización de una capa de subbase granular clase C del INVIAS de 20 cm de espesor, con el fin de tener una transferencia de cargas adecuada al suelo de soporte y que no se vea afectada la losa de concreto hidráulico del pavimento de diseño.

5.2 ESPESOR MATERIAL DE MEJORAMIENTO.

Debido a las condiciones existentes del suelo en las vías de los municipios del proyecto, se estableció realizar un mejoramiento de la subrasante a través de la implementación de material granular de reemplazo con un espesor de 25 cm. Este mejoramiento se determinó a partir del informe de estudio de suelos según los resultados obtenidos de CBR.

5.3 DEFINICIÓN DE LOSA EN CONCRETO RÍGIDO.

Las losas de pavimento son elementos estructurales cuya función es transportar cargas debidas al tránsito vehicular. Estas cargas producen esfuerzos que deben ser calculados para seleccionar el material y las dimensiones más apropiadas para la estructura.

Teniendo en cuenta el diseño presentado, se observa que el espesor seleccionado es de 18 cm para la losa que compone el pavimento rígido de todos los municipios, cumpliendo a satisfacción las condiciones de porcentaje de erosión y fatiga, dado que corresponden a valores menores al 100%.



5.3.1 DIMENSIONES DE LA LOSA.

Las dimensiones efectivas de la losa se tomaron con el fin de optimizar la relación de esbeltez. El cual se ha establecido de 1,2 según lo establecido en el capítulo 3.5 de juntas del Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito del INVIAS.

TABLA No 3. MEDIDAS DE LA LOSA DE CONCRETO

ANCHO DE VÍA	ANCHO DE PLACA	LARGO DE PLACA	RE
[m]	[m]	[m]	
5,0	2,50	3,0	1,20

5.4 SISTEMA DE CONFINAMIENTO LATERAL Y DRENAJE SUPERFICIAL.

Se establece la instalación de bordillos prefabricado con el fin de mejorar el comportamiento mecánico de las losas, el cual cumple la función de confinamiento lateral de la vía. Las dimensiones de este son 35 cm de alto, 80 m de largo y 15 cm de espesor.

Por otro lado, la vía presenta drenaje superficial el cual consiste en el bombeo mismo de los carriles y la pendiente longitudinal de la calzada, la cual se canaliza en los bordes con bordillos para conducir las aguas a los sistemas de drenaje transversales que se plantean en el “Estudio hidrológico e hidráulico”.

6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA EN CONCRETO RIGIDO

El criterio adoptado es diseñar losas de 18 cm de espesor, en concreto reforzado (mediante acero de transferencias), dicha losa ocupará un espacio donde su área se apoyará directamente sobre el material denominado subbase granular.

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE CONCRETO

Las mezclas del concreto hidráulico para pavimentos debe estar previstas para garantizar una durabilidad y asegurar la resistencia deseada a la flexión, los parámetros de la mezcla deben ser:

- ✓ Resistencia a la flexo-compresión a los 28 días de 3.8 MPa (38 kg/cm²).
- ✓ Tamaño máximo del agregado grueso T_{máx.} = Treinta y ocho milímetros (38 mm).
- ✓ Asentamiento comprendido aproximadamente entre 3” equivalente a 9 cm.



6.2 JUNTAS.

Para el diseño del sistema de transferencia de cargas, se tuvo en cuenta lo establecido por el Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito del INVIAS.

6.2.1 RESISTENCIA DEL ACERO DE REFUERZO.

Se selecciono la resistencia de acero de 60,000 PSI que equivale a 420 MPa, debido a que esta corresponde al acero comercial, esto teniendo en cuenta la recomendación del *Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito de INVIAS*.

6.2.2 JUNTAS LONGITUDINALES.

Con el objetivo de presentar un confinamiento lateral de la estructura de pavimento, es necesario anclar barras de acero seleccionadas según el Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, mediante la Tabla 6-1 del INVIAS.

TABLA No 4. REFUERZO LONGITUDINAL

ESPESOR DE LOSA	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD	ESPACIAMIENTO	Fy ACERO
[m]	[pulg]	[m]	[m]	[Mpa]
0.18	3/8"	0.65	0.9	420

6.2.3 DOVELAS.

También llamadas pasadores de carga, estas se instalan en las juntas transversales permitiendo que las losas se separen y se unan entre sí, pero garantizando que no se desplacen verticalmente. Su función es absorber los esfuerzos cortantes generados por el tránsito.

Para determinar sus dimensiones se tuvo en cuenta la Tabla 6-2 del INVIAS



TABLA No 5. REFUERZO TRANSVERSAL

ESPESOR DE LOSA	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD	ESPACIAMIENTO	Fy ACERO
[m]	[pulg]	[m]	[m]	[Mpa]
0.18	7/8"	0.35	0.3	420

6.2.4 ESQUEMAS ESTRUCTURALES.

A continuación, se presentan las secciones de estructuras de pavimento para cada una de las vías de los municipios, teniendo en cuenta los espesores y dimensiones de losa de concreto, subbase granular y material granular de subrasante, mencionados anteriormente.


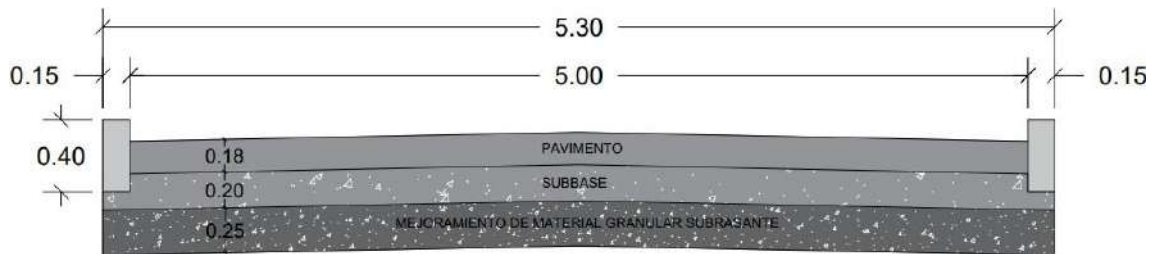


Figura No 2. Sección de vía. Fuente elaboración propia.



ANCHO DE VÍA	ANCHO DE PLACA (m)	LARGO DE PLACA (m)	RE
5.0	2.50	3.0	1.20

Figura No 3. Modelo esquemático estructural para las placas de concreto. Fuente elaboración propia.

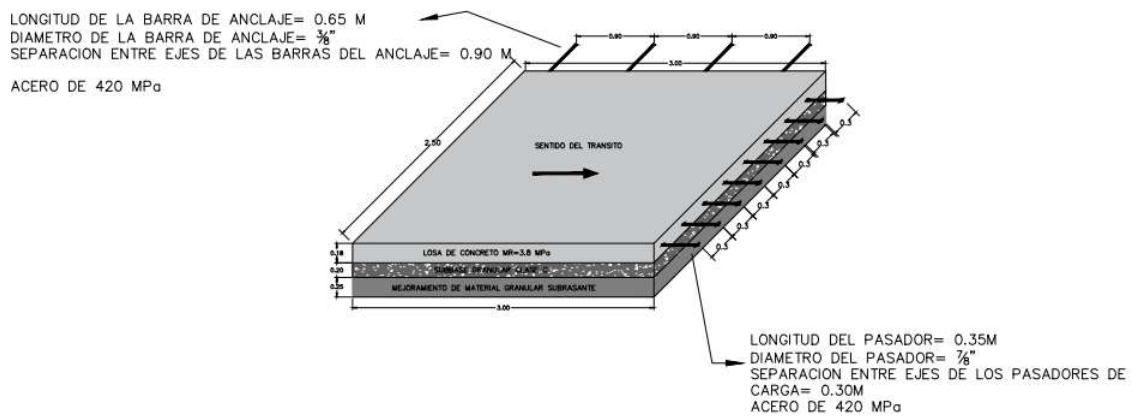

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

TABLA No 6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES	
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	003 - 2022
OBJETO DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053
CONTRATANTE	J.H.C. S.A.S.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
SUPERVISIÓN	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE - MASER
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	14 DE MAYO DEL 2023
RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO	
ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10,280,342,702
ANTICIPO	\$ 4,112,137,081
VALOR DEL ACTA No. 1	\$ 3,042,238,020
VALOR DEL PRESENTE ACTA	\$ 3,042,238,020
AMORTIZACIÓN ANTICIPO EN EL PRESENTE ACTA	\$ 1,216,895,208
VALOR A PAGAR POR EL PRESENTE ACTA	\$ 1,825,342,812
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 7,238,104,682
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	29.59%

7.2 SUPERVISOR DE OBRA.

TABLA No 7. SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE DEL INGENIERO	SARA BAENA
DEPENDENCIA	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE - MASER



7.3 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA No 8. RELACIÓN ACTADS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	NINGUNA

7.4 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: M-100178597
PÓLIZA RCE No: M-100036860

TABLA No 9. PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS DEL CONTRATO					
ANEXO: 0	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL				
AMPAROS	POLIZA N°	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	PRIMA
CUMPLIMIENTO	100178597	\$1,025,934,270.20	14/09/2022	14/07/2023	\$2,129,165
PAGO ANTICIPADO		\$4,103,737,080.80	14/09/2022	14/07/2023	\$8,516,660
PRESTACIONES SOCIALES		\$1,025,934,270.20	14/09/2022	14/03/2026	\$8,973,411
ESTABILIDAD DE LA OBRA		\$2,051,868,540.40	14/03/2023	14/03/2028	\$25,676,465

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
ANEXO: 0	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL				
AMPAROS	POLIZA N°	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	PRIMA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100036860	\$1,025,934,270.20	14/09/2022	15/07/2023	\$2,554,997.95
GASTOS MEDICOS		\$512,967,135.10			\$0.00



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

PATRONAL		\$512,967,135.10			\$0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		\$512,967,135.10			\$0.00
R.C. CRUZADA		\$512,967,135.10			\$0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		\$512,967,135.10			\$0.00

8 OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO.

TABLA No 10. CANTIDAD DE OBRAS PROGRAMADAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mejorar via terciaria		
1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m³	18231.79
1.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m³/km	97205.80
1.3	Conformación de la calzada existente	m²	27093.60
1.4	Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C.	m³	5496.34
1.5	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte.	m³	9666.08
1.6	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo.	m³	4623.13
1.7	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	m	10220.23
1.8	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	32983.89
1.9	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm.	m	8592.00
2	Construir obras de drenaje		
2.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m³	1181.67
2.2	Relleno con arena (Protección tubería)	m³	193.68



2.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa (Grado 60)	kg	37281.74
2.4	Concreto Clase D (21MPa) (Estructuras)	m ³	345.60
2.5	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada	m	216.00
2.6	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m ³	4.04
2.7	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.	m ³	93.60
3	Instalar señalización		
3.1	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	und	235.00
3.2	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	15949.91
3.3	Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.	und	668.00
4	Demoler estructuras existentes		
4.1	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	und	19

9 SEGUIMIENTO FINANCIERO

TABLA No 11. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10,280,342,702	
VALOR ANTICIPO	\$ 4,112,137,081	
VALOR ACTA N° 1		\$3.042,238,020
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		\$1,216,895,208
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA		\$1,825,342,812
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		\$ 7,238,104,682
PORCETAJE DE ACTA POR COBRAR		29.59%
PORCETAJE COBRADO		29.59%



10 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE OBRA

10.1 AVANCE GENERAL DE LA OBRA

TABLA No 12. CANTIDADES GENERALES EJECUTADAS EN ACTA No 1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mejorar vía terciaria		
1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m³	7755.66
1.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m³/km	37798.36
1.3	Conformación de la calzada existente	m²	12778.40
1.4	Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C.	m³	2533.20
1.5	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte.	m³	3583.99
1.6	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo.	m³	1477.26
1.7	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	m	4480.00
1.8	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	10836.75
1.9	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm.	m	2744.00
2	Construir obras de drenaje		
2.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m³	134.88
2.2	Relleno con arena (Protección tubería)	m³	10.76
2.5	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada	m	12.00
2.7	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.	m³	4.36
4	Demoler estructuras existentes		
4.1	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	und	1.00

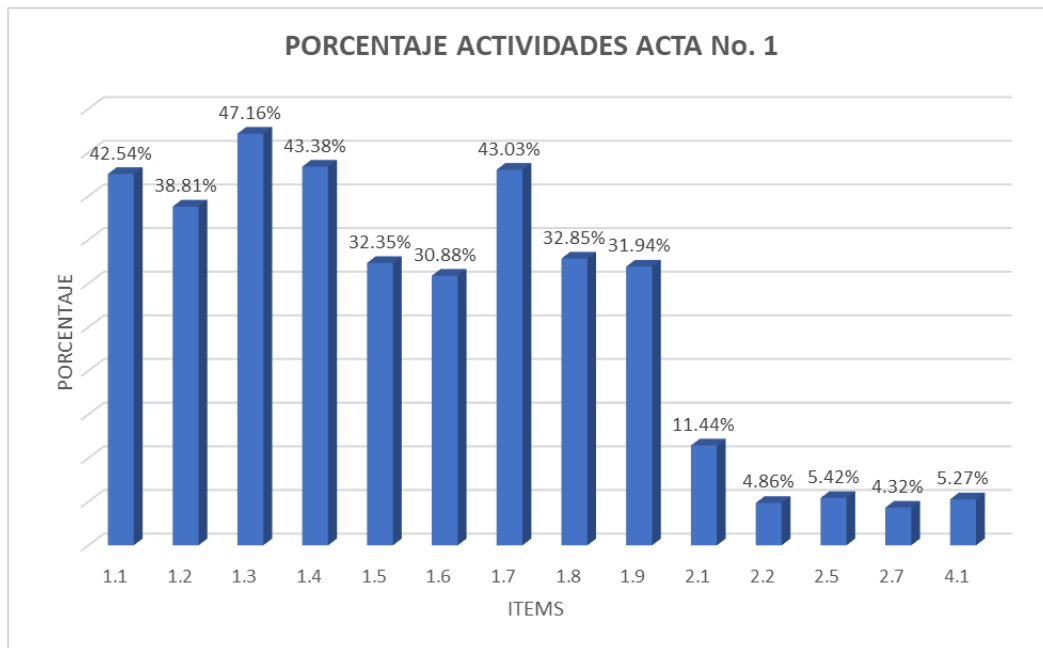


Ilustración 1. PORCENTAJE DE AVANCE POR ITEM ACTA No. 1

10.2 AVANCE DE LA OBRA POR MUNICIPIO

10.2.1 Concepción

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 1.009 metros, los cuales se divide en tres tramos de la siguiente manera:

- Ramal a Sonadora – Tramo 1: Consta de 508 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos, así como los ítems de la estructura de concreto como: Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 KGF/Cm2, suministro e instalación de bordillos prefabricado para el confinamiento de la estructura, Instalación de acero de refuerzo y canastillas de soporte de los pasadores.
- Ramal a Sonadora – Tramo 2: Consta de 65 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances



tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos, así como los ítems de la estructura de concreto como: Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 KGF/Cm², suministro e instalación de bordillos prefabricado para el confinamiento de la estructura, instalación de acero de refuerzo y canastillas de soporte de los pasadores.

- Vía San Pedro Peñol Parte Baja: Consta de 436 metros, hasta la fecha de este informe se ha iniciado con el acopio de material de playa y bordillos prefabricados.

A continuación, se relaciona las cantidades ejecutadas:

TABLA NO 13. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN ACTA NO 1. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA 1
			CANTIDAD
1	Mejorar via terciaria		
1.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN.	m ³	1819.76
1.2.1	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de CONCEPCIÓN	m ³ /km	7461.00
1.3.1	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de CONCEPCIÓN	m ²	2888.50
1.4.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de CONCEPCIÓN	m ³	577.70
1.5.1	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de CONCEPCIÓN	m ³	820.23
1.6.1	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM ² (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de CONCEPCIÓN	m ³	250.20
1.7.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de CONCEPCIÓN	m	1090.00
1.8.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de CONCEPCIÓN	kg	1945.00
1.9.1	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm,	m	465.00



	tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de CONCEPCIÓN		
2	Construir obras de drenaje		
2.1.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de CONCEPCIÓN	m³	22.89

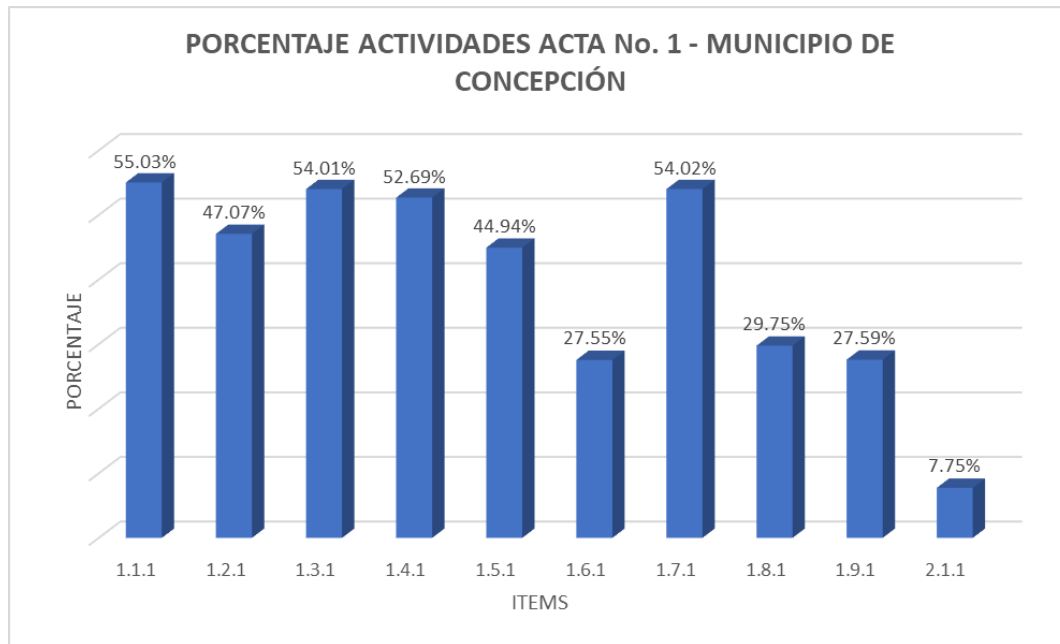


Ilustración 2. PORCENTAJE DE AVANCE POR ITEM ACTA No. 1 - MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN



REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de Concepción	m ³	1819.76
-------	--	----------------	---------



Se realizó la excavación en la vía Ramal a Sonadora tramo 2 entre las abscisas K0+645 a la K0+580 y en la vía Ramal a Sonadora Tramo 1 entre las abscisas K0+538 a la K0+058, las dimensiones promedias en tramo 2 fueron 65 m de largo, 5.30 de ancho y 0.63 m de profundidad y en tramo 1 fueron 480 m de largo, 5.30 de ancho y 0.63 m de profundidad

1.2.1	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de Concepción	m ³ /km	7461.00
-------	--	--------------------	---------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se cargo el material sobrante de las excavaciones, el cual se transportó hasta el depósito autorizado por el municipio.

1.3.1	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de Concepción	m ²	2888.50
-------	---	----------------	---------



Se finalizo la conformación en las vías Ramal a Sonadora tramo 1 y Ramal a Sonadora tramo 2, con un ancho promedio de calzada de 5.30 m según topografía, primero se escarifico y luego se conformó. Se acopiaba y retiraba el material sobrante para luego disponerlo al sitio autorizado.



1.4.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de Concepción	m ³	577.70
-------	---	----------------	--------



Se suministro material de subbase de cantera la cual cumple con las especificaciones del manual INVIAS, el material fue extendido, conformado y compactado en una profundidad de 0.20m. Esta actividad se ejecutó en las vías Ramal a Sonadora tramo 1 y tramo 2.

Se realizaron ensayos de densidad por el método del cono de arena de los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95% del Proctor).

1.5.1	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de Concepción	m ³	820.23
-------	---	----------------	--------



Se suministro e instalo material de préstamo para el reemplazo del material proveniente de la excavación el cual no cumplía con las propiedades exigidas en la norma. Por este motivo, luego de la excavación, se extendió, conforme y compacto material para lleno en una longitud de 65 m, ancho 5.3 m y profundidad 0.25 m dimensiones promedio en tramo 2 y una longitud de 480 m, ancho 5.3 m y profundidad 0.25 m dimensiones promedio en tramo 1

A todo material instalado y compactado, se le realizo ensayos de densidad por el método del cono de arena los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95 % del Proctor).

Además, se realizaron llenos manuales en los espaldares de los bordillos laterales, para el correcto confinamiento de toda la estructura instalada en los dos tramos ejecutados.

1.6.1	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de Concepción	m	250.20
-------	--	---	--------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



A la fecha de este informe se han ejecutado 65 metros de concreto hidráulico en la vía Ramal a Sonadora tramo 2, divididos en 21 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, y 2 rampas de acceso a la estructura de 1.5 metros de longitud cada una. El ancho promedio es de 5 metros y 0.18 metros de espesor. En la vía Ramal a Sonadora tramo 1, se han ejecutado 480 metros de concreto hidráulico, divididos en 160 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, ancho promedio es de 5 metros y 0.18 metros de espesor.

En este frente se realiza la preparación del concreto en sitio con concretadora, se realizó el vaciado de los módulos intercalados para generar la junta fría de dilatación.



1.7.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de Concepción	m	1090.00
-------	---	---	---------



Se suministro e instalo bordillos laterales entre las abscisas K0+645 a la K0+580 en la vía Ramal a Sonadora tramo 2, en una longitud de 65 metros en cada costado, para un total de 130 metros y en la vía Ramal a Sonadora tramo 1 entre las abscisas K0+538 a la K0+048, en una longitud de 480 metros en cada costado, para un total de 960 metros.

1.8.1	Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa (Grado 60), Municipio de Concepción.	Kg/m	1945.00
-------	---	------	---------





Teniendo en cuenta la dimensión del ancho de la vía es necesario dividirla en dos placas por lo cual se forma una dilatación entre las losas, por esta razón se instala acero No. 3 (3/8") corrugado de longitud 0.65 m y una separación entre ejes de las barras de anclaje de 0.90 m.

Además, se instala acero liso No. 7 (7/8") de longitud 0.35 m y separación entre ejes de los separadores de carga de 0.30 m, este se ubica en la dilatación del ancho de la placa, el cual su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación de las juntas.

1.9.1	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de Concepción	Kg/m	465.00
-------	--	------	--------



Con el fin de mantener el acero liso de 7/8" en el eje neutro, se instala canastillas de pasa juntas cada 3 metros donde se ubican los pasadores, la dimensión de las canastillas es de 2.5 de largo.

2.1.1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de Concepción	m ³	22.89
-------	--	----------------	-------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se realizó la excavación para la colocación del solado de pega de soporte del bordillo, las dimensiones promedio fueron 65 m de largo, 0.30 m de ancho y 0.07 m de profundidad en cada costado de la vía en el tramo 2 y 480 m de largo, 0.30 m de ancho y 0.07 m de profundidad en cada costado de la vía en el tramo 1.

Georreferenciación vial



Se realiza la búsqueda por medio de GPS del mojón instalado por la topografía y referenciado en el informe de topografía RS2 del paquete técnico en el cual contiene el amarre y coordenadas reales en el sistema WGS 84.

10.2.1.1 Control de calidad

Se solicitan los certificados de calidad de cada uno de los materiales utilizados en la



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de los procesos constructivos.



10.2.1.2 Maquinaria y equipo en obra

TABLA No 14. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA – MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

MAQUINARIA/EQUIPO	OPERADOR
Retroexcavadora	Contratada
Volqueta	Contratada
Vibro compactador (Jala Bobo)	Administración y obra



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Rana compactadora	Administración y obra
Vibro para concreto	Administración y obra
Cortadora de concreto	Administración y obra
Planta eléctrica	Administración y obra
Herramienta menor	Administración y obra

10.2.1.3 Plan de manejo de tránsito

Desde el inicio de obra se lleva a cabo el plan de manejo de tránsito indicándole a la comunidad el cierre total de la vía; en la socialización se dejó claro que por el método constructivo y el diseño del concreto hidráulico, es imposible dar paso a vehículos. para ello se han usado las indicaciones basadas en el PMT presentado y aprobado por la interventoría.

- Se instala valla informativa



Figura No 4. Valla informativa - Municipio de Concepción

- Se han instalados señales verticales fijas que indican el cierre de la vía



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Figura No 5. Señalización de cierre de vía - Municipio de Concepción

- También se instalaron las señales de inicio, fin de obra y maquinaria pesada



Figura No 6. Señalización de maquinaria pesada, inicio y fin de obra - Municipio de Concepción



10.2.1.4 Inconvenientes presentados

- Debido a los trabajos que se adelantan en la obra del puente ubicado en el sector el Campamento de San Vicente Ferrer, la vía hacia el Municipio de Concepción se encuentra cerrada en algunos puntos, esto nos dificulta el traslado de materiales tales como bordillos, base granular, cemento y tubería de concreto para iniciar las labores preliminares del cronograma.
- Se presenta deslizamiento en el sector Palmichal afectando también el ingreso de material para iniciar las actividades.



Figura No 7. Deslizamiento sector palmichal - Fuente MiOriente

10.2.1.5 Conclusiones

- El día 29 de septiembre del 2022 se realiza socialización del proyecto que se ejecutara en la vía Ramal a Sonadora, se contó con la participación de representantes de la alcaldía, interventoría y contratista, por parte de la comunidad no hubo participación, por lo cual los representantes de la alcaldía se comprometieron a informar a la comunidad sobre las actividades y cierres viales que se presentaran durante los meses de ejecución del proyecto.
- El día 30 de septiembre del 2022 se realiza socialización del proyecto de la vía San Pedro Peñol parte baja, contando con la participación del secretario de planeación y obras públicas, profesionales de interventoría y contratista, representantes de la acción comunal y la comunidad. Se informa sobre el alcance del proyecto, actividades a desarrollar y cierres totales viales.
- En la vía Ramal a Sonadora tramo 1, en la abscisa K0+030 de acuerdo con los diseños, se proyecta la construcción de dos aliviaderos, sin embargo, en este puntose requiere la construcción de una obra transversal, esto para evitar la descarga de



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

agua lluvia en la vía principal.

- El avance financiero del Municipio de Concepción a la fecha del presente informe es del 5.43%.
- El avance financiero por cobrar en el Municipio de Concepción a la fecha del presente informe es del 5.43% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico a la fecha del presente informe es del 20.02%, representado en los ítems ejecutados en el Municipio de Concepción.
- El avance físico en el Municipio de Concepción a la fecha del presente informe es del 3.45%, representado en las actividades consolidadas en el proyecto.
- Se cumple con la implementación del plan de manejo de tránsito, garantizando la movilidad de los habitantes del sector.

10.2.1.6 Anexos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.1.6.1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.1.6.2

ENSAYOS DE LABORATORIO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.1.6.3 BITACORA



10.2.2 El Peñol

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 965 metros, los cuales se divide en seis tramos de la siguiente manera:

- Vía Peñol – Pozos Tramo 1: Consta de 104 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades correspondientes a los ítems necesarios para la construcción del pavimento rígido, esto debido a que el tramo se encuentra en la misma vía de otro frente de trabajo y no es posible realizar el cierre total de la vía al mismo tiempo por solicitud de la comunidad.
- Vía Peñol – Pozos Tramo 2: Consta de 119 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades correspondientes a los ítems necesarios para la construcción del pavimento rígido, esto debido a que el tramo se encuentra en la misma vía de otro frente de trabajo y no es posible realizar el cierre total de la vía al mismo tiempo por solicitud de la comunidad.
- Vía Peñol – Pozos Tramo 3: Consta de 420 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades correspondientes a los ítems necesarios para la construcción del pavimento rígido, esto debido a que el tramo se encuentra en la misma vía de otro frente de trabajo y no es posible realizar el cierre total de la vía al mismo tiempo por solicitud de la comunidad.
- Vía Peñol – Pozos Tramo 4: Consta de 25 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades correspondientes a los ítems necesarios para la construcción del pavimento rígido, esto debido a que el tramo se encuentra en la misma vía de otro frente de trabajo y no es posible realizar el cierre total de la vía al mismo tiempo por solicitud de la comunidad.
- Vía Peñol – Pozos Tramo 5: Consta de 60 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades correspondientes a los ítems necesarios para la construcción del pavimento rígido, esto debido a que el tramo se encuentra en la misma vía de otro frente de trabajo y no es posible realizar el cierre total de la vía al mismo tiempo por solicitud de la comunidad.

Vía Montañita los Alpes – Yarumos: Consta de 237 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos, así como los ítems de la estructura de concreto como: Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 KGF/Cm², suministro e instalación de bordillos prefabricado para el confinamiento de la estructura, Instalación de acero de refuerzo y canastillas de soporte de los pasadores. También, se avanza en los ítems para la construcción de obras de



drenaje como: Excavaciones, Relleno con arena para la protección de la tubería, lleno con material de préstamo hasta el nivel de la rasante, suministro e instalación de tubería de 900 mm, preparación e instalación de concreto clase F para solado y atraque de la tubería.

concreto como: Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 KGF/Cm², suministro e instalación de bordillos prefabricado para el confinamiento de la estructura, Instalación de acero de refuerzo y canastillas de soporte de los pasadores. También, se avanza en los ítems para la construcción de obras de drenaje como: Excavaciones, Relleno con arena para la protección de la tubería, lleno con material de préstamo hasta el nivel de la rasante, suministro e instalación de tubería de 900 mm, preparación e instalación de concreto clase F para solado y atraque de la tubería.

A continuación, se relaciona las cantidades ejecutadas:

TABLA NO 15. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN ACTA 1. MUNICIPIO DEL PEÑOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA 1 CANTIDAD
1	Mejorar via terciaria		
1.1.2	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL.	m ³	791.34
1.2.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de EL PEÑOL	m ³ /km	3909.23
1.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de PEÑOL	m ²	1303.50
1.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de EL PEÑOL	m ³	251.22
1.5.2	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de EL PEÑOL	m ³	363.83
1.6.2	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM ² (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de EL PEÑOL	m ³	180.90
1.7.2	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de EL PEÑOL	m	474.00
1.8.2	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de EL PEÑOL	kg	1363.88
1.9.2	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las	m	335.00



	juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de EL PEÑOL		
2	Construir obras de drenaje		
2.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de EL PEÑOL	m³	30.35
2.2.2	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de EL PEÑOL	m³	5.38
2.5.2	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de EL PEÑOL	m	6.00
2.7.2	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de EL PEÑOL	m³	2.18

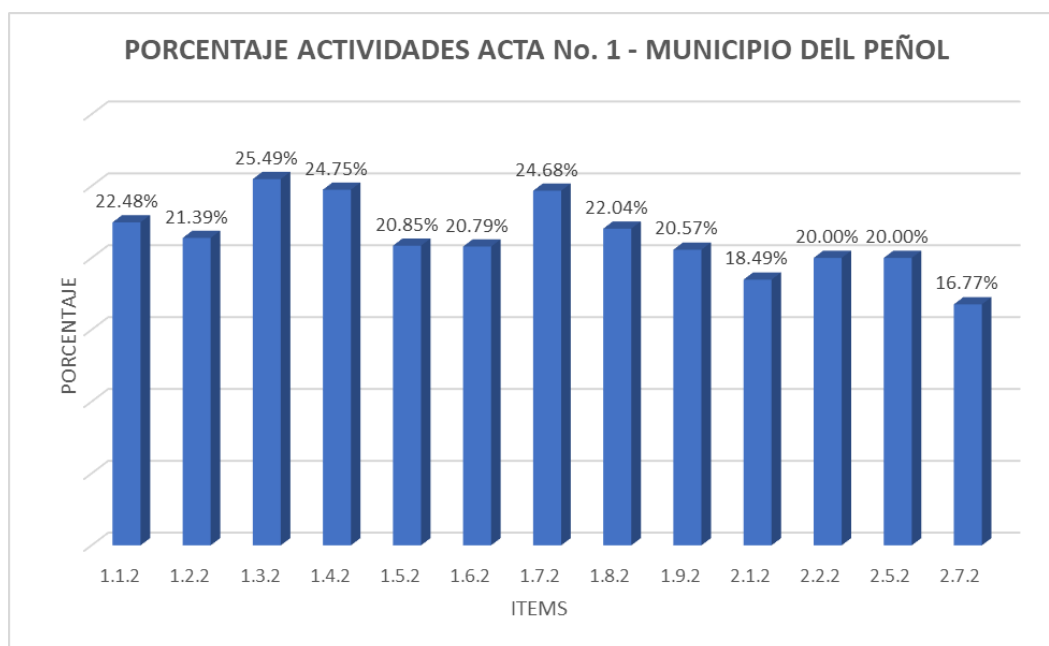


Ilustración 3. PORCENTAJE DE AVANCE POR ITEM ACTA No. 1 – MUNICIPIO DEL PEÑOL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.2	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio del Peñol	m ³	791.34
-------	--	----------------	--------



Se realizaron excavaciones en la vía Montañitas los Alpes – Yarumos entre las abscisas K6+880 a la K7+117, en algunas zonas fue necesario la ampliación de la banca debido a que no contaba con el ancho de calzada establecido en el diseño.

1.2.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de Peñol	m ³ /km	3909.23
-------	---	--------------------	---------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se carga y transporta el material proveniente de las excavaciones realizadas para el mejoramiento y ampliación de la vía, instalación de bordillos y para la instalación de tubería de la obra transversal. Luego se dispone el material en el sitio autorizado por el municipio.

1.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de Peñol	m ³	1303.50
-------	--	----------------	---------



Se finalizó la conformación de la vía, con promedio de ancho de calzada de 5.5 m diseños, primero se escarificó y luego se conformó, se acopiaba y retiraba el material sobrante de dicha conformación para finalmente disponerlo en la zona de acopio.



1.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de Peñol	m ³	251.22
-------	--	----------------	--------



Se suministro material de subbase de cantera la cual cumple con las especificaciones del manual INVIAS, el material fue extendido, conformado y compactado. Esta actividad se realizó en la vía Montañita los Alpes – Yarumos.

Se realizaron ensayos de densidad por el método del cono de arena de los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95% del Proctor).

1.5.2	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de Peñol	m ³	363.83
-------	--	----------------	--------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se suministro e instalo material de préstamo para el reemplazo del material proveniente de la excavación el cual no cumplía con las propiedades exigidas en la norma. Por este motivo, luego de la excavación, se extendió, conforo y compacto material para lleno en una longitud de 237 m, ancho 5.3 m y profundidad 0.25 m dimensiones promedio.

A todo material instalado y compactado, se le realizo ensayos de densidad por el método del cono de arena los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95 % del Proctor).

Además, se realizaron llenos manuales en los espaldares de los bordillos laterales, para el correcto confinamiento de toda la estructura instalada en los dos tramos ejecutados.

1.6.2	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 Mpa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio del Peñol	m ³	180.90
-------	--	----------------	--------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



A la fecha de este informe se han ejecutado 201 metros de concreto hidráulico en la vía Montañitas los Alpes – Yarumos, divididos en 67 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.18 metros de espesor. Esta estructura cuenta con bombeo del 2% en para el desagüe de las aguas lluvias.

En este frente se realiza esta actividad con concreto premezclado el cual cumple con los estándares de calidad, diseño de mezclas y los acabados requeridos para su correcto funcionamiento.

1.7.2	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recta 15x35x80 prefabricado, Municipio del Peñol	m	474.00
-------	---	---	--------





Se suministro e instalo bordillos laterales entre las abscisas K6+880 a la K7+117 en la vía Montañitas los Alpes – Yarumos, en una longitud de 237 metros en cada costado, para un total de 474 metros.

Las dimensiones del bordillo prefabricado son ancho 0.15 m, largo de 0.35 m y alto 0.80 m, el cual tiene como función el confinamiento de la estructura. Además, permite la canalización de las aguas lluvias conduciéndolas a los sistemas de drenaje (Alcantarillas).

1.8.2	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa (Grado 60), Municipio del Peñol	kg	1363.88
-------	--	----	---------



Se instala acero No. 3 (3/8") corrugado de una longitud de 0.65 m y una separación entre ejes de las barras de anclaje de 0.90 m, en toda la longitud de la vía, debido a que el ancho este compuesto por dos placas de 2.5 metros.

Además, se instala acero liso No. 7 (7/8") de una longitud de 0.35 m y separación entre ejes de los separadores de carga de 0.30 m, este se ubica en la dilatación del ancho de la placa, el cual su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación de las juntas.



1.9.2	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio del peñol	m	335.00
-------	--	---	--------



Con el fin de mantener el acero liso de 7/8" en el eje neutro, se instala canastillas de pasa juntas cada 3 metros donde se ubican los pasadores, la dimensión de las canastillas es de 2.5 de largo.

2.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio El Peñol	m ³	30.35
-------	---	----------------	-------



Esta actividad comprende las excavaciones necesarias para la instalación de la tubería de 36", la cual se ejecutó con las dimensiones establecidas en los diseños, También se realizó la excavación para la colocación del solado de pega de soporte del bordillo, las dimensiones promedias fueron 237 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad en cada costado de la vía.

2.2.2	Relleno con arena (Protección tubería). Municipio del Peñol	m ³	5.38
-------	---	----------------	------



Para la protección de la tubería, se realiza lleno con material granular hasta llegar a una altura de 10 cm por encima de la tubería instalada.



2.5.2	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 – Prefabricada. Municipio del Peñol	m	6.00
-------	---	---	------



Luego de la colocación del concreto clase F, se instala tubería de concreto prefabricado de 36". Se colocan 6 tubos cada uno de 1m de largo en cada obra transversal.

2.7.2	Concreto Clase F (14 Mpa). Elementos varios. Municipio del Peñol	m ³	2.18
-------	--	----------------	------



Para la colocación de la tubería se prepara una capa de concreto de 0.10 m de espesor, la cual se extiende en el fondo de la excavación con el fin de eliminar desigualdades en su base y garantizar la pendiente de diseño necesaria para su correcto funcionamiento. Además, se realiza recubrimiento lateral a la 1/3 parte de la tubería, el cual funciona como atraque para evitar desplazamientos de la tubería instalada.



Georreferenciación vial



Se realiza la búsqueda por medio de GPS del mojón instalado por la topografía y referenciado en el informe de topografía RS2 del paquete técnico en el cual contiene el amarre y coordenadas reales en el sistema WGS 84.

10.2.2.1 Control de calidad

Se solicitan los certificados de calidad de cada uno de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de los procesos constructivos.





10.2.2.2 Maquinaria y equipo en obra

TABLA No 16. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA – MUNICIPIO EL PEÑOL

MAQUINARIA/EQUIPO	OPERADOR
Retroexcavadora	Administración y obra
Volqueta	Administración y obra
Motoniveladora	Contratada
Vibro compactador	Administración y obra
Vibro para concreto	Administración y obra
Cortadora de concreto	Administración y obra
Planta eléctrica	Administración y obra
Herramienta menor	Administración y obra

10.2.2.3 Plan de manejo de tránsito

Desde el inicio de obra se lleva a cabo el plan de manejo de tránsito indicándole a la comunidad el cierre total de la vía; en la socialización se dejó claro que por el método constructivo y el diseño del concreto hidráulico, es imposible dar paso a vehículos. Para ello se han usado las indicaciones basadas en el PMT presentado y aprobado por la interventoría.

- Se han instalados señales verticales fijas que indican el cierre de la vía y hombres trabajando



Figura No 8. Señalización de cierre de vía y hombres trabajando – Municipio del Peñol



10.2.2.4 Inconvenientes presentados

- Debido a que los 5 tramos ubicados en la vía El Nuevo Peñol – Pozos, se encuentra en el mismo recorrido de los tramos estipulados en el municipio de Marinilla, se priorizo iniciar los tramos ubicados en marinilla evitando afectar las comunidades que se encuentran asentadas en las veredas aledañas. Por esta razón, solo se inicia las actividades correspondientes a la construcción de las obras de drenaje ya que estas no cierran por completo la vía, las demás actividades se realizarán después de habilitar el tránsito en la vía del municipio de Marinilla.

10.2.2.5 Conclusiones

- Se realiza socialización del proyecto donde participo el alcalde, secretario de obras, concejales, lideres de la junta de acción comunal, la comunidad, profesionales de interventoría y contratista, donde se informó sobre el alcance y las actividades del proyecto. Adicional, se informa sobre el cierre total de la vía.
- Se realizaron actas de vecindad en las viviendas aledañas a los seis tramos a ejecutar.
- El avance financiero del Municipio del Peñol a la fecha del presente informees del 3.29%.
- El avance financiero por cobrar en el Municipio del Peñol a la fecha del presente informe es del 3.29% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico a la fecha del presente informe es del 14.65%, representado en los ítems ejecutados en el Municipio del Peñol.
- El avance físico en el Municipio del Peñol a la fecha del presente informe esdel 2.40%, representado en las actividades consolidadas en el proyecto.
- Se cumple con la implementación del plan de manejo de tránsito, garantizando la movilidad de los habitantes del sector.

10.2.2.6 Anexos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.2.6.1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.2.6.2

ENSAYOS DE LABORATORIO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.2.6.3

BITACORA



10.2.3 Granada

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 932 metros, los cuales se divide en dos tramos de la siguiente manera:

- La Tolda - Tafetanes: Consta de 732 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha venido ejecutando actividades tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y llenos con material de préstamo, así como los ítems más representativos como: suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 Kgf/cm², Bordillos prefabricados para el confinamiento de la estructura, Acero de refuerzo fy=420 y canastillas para pasa juntas, los ítem de obras de drenaje que se realizaron fueron excavaciones, concreto clase F para solados y atraques de tubería, suministro e instalación de tubería en concreto, cubrimiento con arenas y lleno con material de préstamo.
- Ramal Cruces las Palmas: Consta de 200 metros, en este tramo hasta la fecha de este informe se han ejecutado actividades que representan avances tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos, así como los ítems más representativos como: suministro e instalación de concreto hidráulico MR 37 Kgf/cm², bordillos prefabricados para el confinamiento de la estructura, Acero de refuerzo fy=420 y canastillas para pasa juntas.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el municipio de Granada, hasta la fecha de la presente acta:

TABLA No 17. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN ACTA 1. MUNICIPIO DEL PEÑOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA 1
			CANTIDAD
1	Mejorar via terciaria		
1.1.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de GRANADA	m ³	2292.30
1.2.3	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de GRANADA	m ³ /km	11952.68
1.3.3	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de GRANADA	m ²	3840.00
1.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de GRANADA	m ³	758.00



1.5.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de GRANADA	m³	1080.64
1.6.3	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de GRANADA	m³	498.96
1.7.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de GRANADA	m	1400.00
1.8.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de GRANADA	kg	3590.75
1.9.3	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de GRANADA	m	924.00
2	Construir obras de drenaje		
2.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de GRANADA	m³	49.80
2.2.3	Relleno con arena (Protección tubería) , Municipio de GRANADA	m³	5.38
2.5.3	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada. Municipio de GRANADA	m	6.00
2.7.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de GRANADA	m³	2.18
4	Demoler estructuras existentes		
4.1.3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de GRANADA	und	1.00

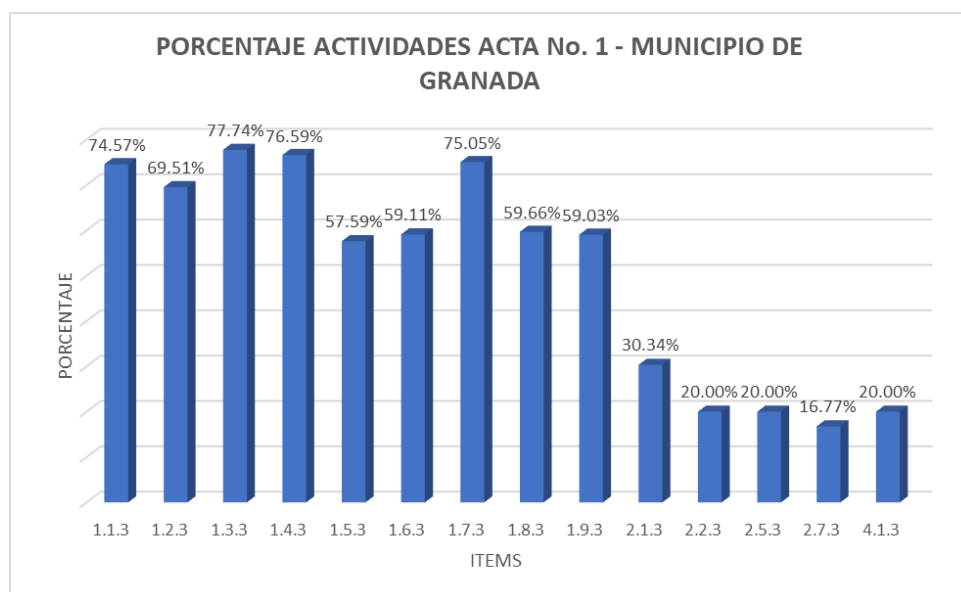


Ilustración 4. PORCENTAJE DE COBRO POR ITEM ACTA No. 1 - MUNICIPIO DE GRANADA



REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de Granada	m ³	2292.30
-------	---	----------------	---------



Se realizaron excavaciones en la vía la Tolda -Tafetanes entre las abscisas K3+700 a la K3+800, cuentan con un material de subrasante con muy buenas especificaciones granulométricas, por tal motivo la excavación tiene una profundidad de 0.45 metros para la instalación de material de préstamo y subbase. Por otro lado, entre las abscisas K3+801 a la K4+200, se cuenta con un material con material no adecuado, por ende, se opta por realizar una excavación de 0.63 metros de profundidad.

En la vía Ramal Cruces las Palmas entre las abscisas K0+000 a la K0+200, se realiza una excavación con profundidad de 0.63 metro, este tramo cuenta con un ancho promedio de 5.70 ya que las obras transversales existentes se encuentran en buen estado, lo que se toma la decisión de ampliar la calzada a 5.40 para hacer uso de estas obras de drenaje.

1.2.3	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de Granada	m ³ /km	11952.68
-------	---	--------------------	----------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se cargo el material sobrante de las excavaciones generadas para la instalación de la estructura de concreto, bordillos prefabricados y instalación de tubería de 36", el cual se transportó hasta el depósito autorizado por el municipio.

1.3.3	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de Granada	m ³	3840.00
-------	--	----------------	---------





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



En la vía la Tolda – Tafetanes se conformó la calzada con un promedio de 5.40 de ancho y la vía Ramal Cruces las Palmas se conformó la calzada con un promedio de 5.70 de ancho, primero se escarificó y luego se conformó, el material sobrante se acopiaba y retiraba para finalmente disponerlo en la zona de acopio.

Esta actividad se ejecuta para obtener las pendientes y niveles necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, teniendo presente los parámetros indicados en los documentos del proyecto.

1.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de Granada	m ³	758.00
-------	--	----------------	--------





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Se suministro material de subbase de cantera la cual cumple con las especificaciones del manual INVIAS, el material fue extendido, conformado y compactado. Esta actividad se realizó en la vía la Tolda – Tafetanes y Ramal Cruces las Palmas

Se realizaron ensayos de densidad por el método del cono de arena de los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95% del Proctor).

1.5.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de Granada	m ³	1080.64
-------	--	----------------	---------



En la vía Ramal Cruces las Palmas se suministró e instalo material de préstamo en una longitud de 200 m, ancho 5.70 m y 0.25 m de profundidad, también se llenó los espaldares de los bordillos laterales, para el confinamiento de toda la estructura instalada.

En la vía la Tolda – Tafetanes, se suministró e instalo material de préstamo para darle estabilidad a la subrasante en una longitud de 732 m, ancho 5.30 m y 0.25 m de profundidad, además se realizaron llenos manuales en los espaldares de los bordillos laterales y cubrimiento de la tubería hasta llegar al nivel requerido.

A todo material instalado y compactado, se le realizo ensayos de densidad por el método del cono de arena los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95 % del Proctor).



1.6.3	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de Granada	m ³	498.96
-------	---	----------------	--------



En la vía la Tolda - Tafetanes se han ejecutado 360 metros de concreto hidráulico, divididos en 120 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.18 metros de espesor. Esta estructura cuenta con bombeo del 2% para el desagüe de las aguas lluvias. En este frente se realiza esta actividad con concretadora.

En la vía Ramal Cruces las Palmas se han ejecutado 180 metros de concreto hidráulico, divididos en 60 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.18 metros de espesor. Esta actividad se realiza con autohormigonera "Fiori".



En ambos frentes se cumple con los estándares de calidad, diseño de mezclas y los acabados requeridos para su correcto funcionamiento

1.7.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de Granada	m	1400.00
-------	--	---	---------



Se suministro e instalo bordillos laterales entre las abscisas K3+700 a la K4+200 en la vía la Tolda - Tafetanes, en una longitud de 500 metros en cada costado, para un total de 1000 metros y entre las abscisas K0+000 a la K0+200 en la vía Ramal Cruces las Palmas, se instaló una longitud de 200 metros de bordillo en cada costado, para un total de 400 metros.

Las dimensiones del bordillo prefabricado son ancho 0.15 m, largo de 0.35 m y alto 0.80 m, el cual tiene como función el confinamiento de la estructura. Además, permite la canalización de las aguas lluvias conduciéndolas a los sistemas de drenaje (Alcantarillas).

1.8.3	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa (Grado 60), Municipio de Granada	kg	3590.75
-------	---	----	---------



Teniendo en cuenta el diseño de la estructura en los dos frentes de trabajo, se tiene que el ancho de la vía se divide en dos placas, lo cual se genera una dilatación entre las losas, por esta razón se instala acero No. 3 (3/8") corrugado de una longitud de 0.65 m y una separación entre ejes de las barras de anclaje de 0.90 m.

Además, se instala acero liso No. 7 (7/8") de una longitud de 0.35 m y separación entre ejes de los separadores de carga de 0.30 m, este se ubica en la dilatación del ancho de la placa, el cual su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación de las juntas.

En la vía La tolda- Tafetanes, se realiza la construcción de 1 rampa de acceso de 1.5 metros de longitud, la cual cuenta con cero de refuerzo de 1/2" formando una malla y se amarra a una viga transversal con refuerzo de 1/2".

1.9.3	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de Granada	m	924.00
-------	---	---	--------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Con el fin de mantener el acero liso de 7/8" en el eje neutro, se instala canastillas de pasa juntas cada 3 metros donde se ubican los pasadores, la dimensión de las canastillas es de 2.5 de largo.

2.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de Granada	m ³	49.80
-------	---	----------------	-------



Esta actividad comprende la excavación para la colocación del solado de pega de soporte del bordillo, las dimensiones para el tramo comprendido en Ramal Cruces las Palmas fueron 200 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad cada costado de la vía. Para el



tramo ubicado en la vía la Tolda – Tafetanes, las dimensiones fueron 500 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad en cada costado de la vía. También se realizó las excavaciones necesarias para la instalación de la tubería de 36", la cual se ejecutó con las dimensiones establecidas en los diseños.

2.2.3	Relleno con arena (Protección tubería) Municipio de Granada	m ³	5.38
-------	---	----------------	------



Para la protección de la tubería, se realiza lleno con material granular hasta llegar a una altura de 10 cm por encima de la tubería instalada.

2.5.3	Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 – Prefabricada. Municipio de Granada	m	6.00
-------	--	---	------





Luego de la colocación del concreto clase F, se instala tubería de concreto prefabricado de 36". Se colocan 6 tubos cada uno de 1m de largo en cada obra transversal.

2.7.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. Municipio de Granada	m ³	2.18
-------	--	----------------	------



Para la colocación de la tubería se prepara una capa de concreto de 0.10 m de espesor, la cual se extiende en el fondo de la excavación con el fin de eliminar desigualdades en su base y garantizar la pendiente de diseño necesaria para su correcto funcionamiento. Además, se realiza recubrimiento lateral a la 1/3 parte de la tubería, el cual funciona como atraque para evitar desplazamientos de la tubería instalada.

4.1.3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado), Alcantarilla incluye aletas y retiro del tubo. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Municipio de Granada	Und	1.00
-------	---	-----	------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se realiza demolición de obra transversal existente, la cual se reemplazó por el deterioro en el qese encontraba la estructura, esta actividad se ejecutó en la vía Tolda – Tafetanes.

Georreferenciación vial



Se realiza la búsqueda por medio de GPS del mojón instalado por la topografía y referenciado en el informe de topografía RS2 del paquete técnico en el cual contiene el amarre y coordenadas reales en el sistema WGS 84.

10.2.3.1 Control de calidad

Se solicitan los certificados de calidad de cada uno de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de los procesos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

constructivos.



10.2.3.2 Maquinaria y equipo en obra

TABLA No 18. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA – MUNICIPIO EL PEÑOL

MAQUINARIA/EQUIPO	OPERADOR
Retroexcavadora	Contratada
Volqueta	Contratada
Motoniveladora	Contratada



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Vibro compactador	Contratada
Rana compactadora	Administración y obra
Vibro para concreto	Administración y obra
Cortadora de concreto	Administración y obra
Planta eléctrica	Administración y obra
Herramienta menor	Administración y obra

10.2.3.3 Plan de manejo de transito

Desde el inicio de obra se lleva a cabo el plan de manejo de tránsito indicándole a la comunidad el cierre total de la vía; en la socialización se dejó claro que por el método constructivo y el diseño del concreto hidráulico, es imposible dar paso a vehículos. para ello se han usado las indicaciones basadas en el PMT presentado y aprobado por la interventoría.

- Se instala valla informativa



Figura No 9. Valla informativa - Municipio de Granada

- Se han instalados señales verticales fijas que indican el cierre de la vía



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Figura No 10. Señalización de cierre de vía - Municipio de Granada

- También se instalaron las señales de inicio y fin de obra



Figura No 11. Señalización de inicio y fin de obra - Municipio de Granada

- En la obra se limita el área de trabajo con maletines para evitar el tránsito de vehículos, y se señala el paso para peatones garantizando su seguridad.



Figura No 12. Señalización para paso de peatones y vehiculos - Municipio de Granada

10.2.3.4 Inconvenientes presentados

- Durante el recorrido para la localización de las obras transversales a reemplazar en el tramo Tolda – Tafetanes se encontró un artefacto explosivo en el centro de la vía a intervenir, al cual se le dio manejo a través de la unidad de minas antipersonas que se encuentra presente en la vereda las palmas. Por este motivo, no se iniciaron en el tiempo programado las actividades hasta que no se obtuviera el certificado de seguridad.
- En el recorrido que se realiza en el tramo Ramal Cruces las Palmas, se identificó que las obras de drenaje existentes se encuentran en buen estado y funcional, por lo cual, se determinó realizarles mantenimiento y en caso de ser necesario realce de cabezotes.
- Se presentan lluvias continuas durante la ejecución de las actividades como: Excavación, Conformación, Instalación de subbase y llenos, y vaciado de concreto. Esta situación conlleva a retrasos y pérdidas de material. Por tal motivo, es necesario reemplazar el material saturado y en algunos puntos se ha requerido colocar nuevamente material que se lavó por la escorrentía, obteniendo el espesor estipulado en los diseños.
- En el proceso de recolección de firmas para actas de vecindad y entorno, no fue posible localizar todos los propietarios de las viviendas y lotes aledaños al proyecto.
- Mientras se adelantan los trabajos con la conformación e instalación de formaleta para el vaciado del concreto, al día siguiente cuando se inician actividades, se observó que dañaron y quitaron la madera ya instalada. Por tal motivo, nuevamente se procede a conformar e instalar la formaletería. Esto se presenta en el tramo vía



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Ramal cruces las Palmas.



10.2.3.5 Conclusiones

- Se realiza socialización del proyecto donde participo el alcalde, secretario de obras, concejales, lideres de la junta de acción comunal, la comunidad, profesionales de interventoría y contratista, donde informo las actividades y alcance del proyecto. Adicional, se informa sobre el cierre total de la vía para la ejecución de actividades.
- Se realizaron actas de vecindad en las viviendas aledañas a los dos tramos a ejecutar.
- El avance financiero del Municipio de Granada a la fecha del presente informe es del 10.18%.
- El avance financiero por cobrar en el Municipio de Granada a la fecha del presente informe es del 10.18% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico a la fecha del presente informe es del 37.68%, representado en los ítems ejecutados en el Municipio de Granada.
- El avance físico en el Municipio de Granada a la fecha del presente informe es del 6.17%, representado en las actividades consolidadas en el proyecto.
- Se cumple con la implementación del plan de manejo de tránsito, garantizando la



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

movilidad de los habitantes del sector.

10.2.3.6 Anexos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.3.6.1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.3.6.2

ENSAYOS DE LABORATORIO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.3.6.3 BITACORA



10.2.4 Marinilla

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 615 metros, los cuales se divide en dos tramos de la siguiente manera:

- Vía Marinilla Nuevo Peñol – El Pozo Tramo 1: Consta de 233 metros de longitud, se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: excavaciones, conformación de calzada, suministro e instalación de material de subbase, suministro e instalación de llenos con material de préstamo, así como los ítems netamente de la estructura en concreto como suministro e instalación de concreto hidráulico de MR 37 Kgf/cm², suministro e instalación de cordones prefabricados, suministro e instalación de acero de refuerzo de fy=420Mpa.
- Vía Marinilla Nuevo Peñol – El Pozo Tramo 2: Consta de 382 metros de longitud, se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: excavaciones, conformación de calzada, suministro e instalación de material de subbase, suministro e instalación de llenos con material de préstamo, así como los ítems netamente de la estructura en concreto como suministro e instalación de concreto hidráulico de MR 37 Kgf/cm², suministro e instalación de cordones prefabricados, suministro e instalación de acero de refuerzo de fy=420Mpa.

A continuación, se hace referencia con más detalle de lo expuesto anteriormente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mejorar vía terciaria		
1.1.4	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de MARINILLA	m ³	2030.11
1.2.4	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de MARINILLA	m ³ /km	10028.75
1.3.4	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de MARINILLA	m ²	3222.40
1.4.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de MARINILLA	m ³	644.48
1.5.4	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de MARINILLA	m ³	915.04
1.6.4	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de	m ³	547.20



	dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de MARINILLA		
1.7.4	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de MARINILLA	m	1216.00
1.8.4	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de MARINILLA	kg	3937.12
1.9.4	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de MARINILLA	m	1020.00
2	Construir obras de drenaje		
2.1.4	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de MARINILLA	m³	25.54

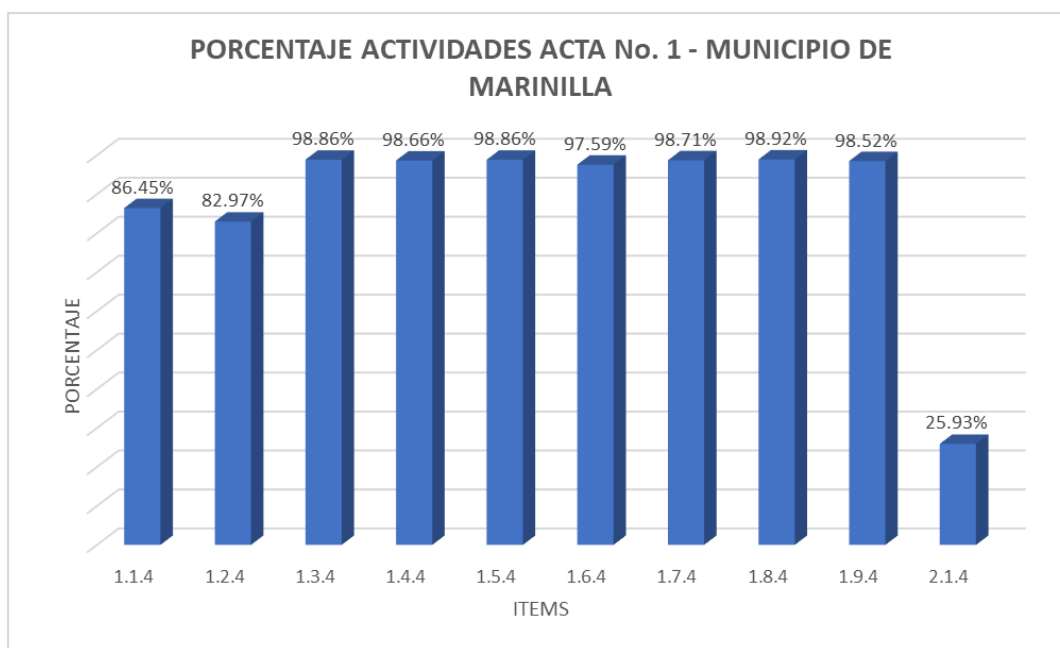


Ilustración 5. PORCENTAJE DE AVANCE POR ITEM DEL ACTA No. 1 - MUNICIPIO DE MARINILLA

1.1.4	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de Marinilla	m³	2030.11
-------	---	----	---------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se realizaron excavaciones en la vía Marinilla Nuevo Peñol – Pozos 1 entre las abscisas K2+111 a la K1+885, la cual cuenta con un material de subrasante con muy malas especificaciones granulométricas, por tal motivo la excavación tiene una profundidad de 0.63 metros aproximadamente para la instalación de material de préstamo y subbase.

En la vía Marinilla Nuevo Peñol – Pozos 2 entre las abscisas K2+195 a la K2+577, se realiza una excavación con profundidad de 0.63 metro, en este tramo también se cuenta con un material no apto para la instalación del material de préstamo y subbase, por tal motivo fue necesario realizar en algunas zonas el reemplazo de este material.

Mientras se adelantaban los trabajos de conformación y compactación de los materiales instalados, debido a la ola invernal se presentaron derrumbes en los dos frentes de trabajo, por lo cual se procede a realizar el retiro del material.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

1.2.4	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de Marinilla	m ³ /km	10028.75
-------	---	--------------------	----------



Se cargo el material sobrante de las excavaciones generadas para la instalación de la estructura de concreto y derrumbes presentados, el cual se transportó hasta el depósito autorizado por el municipio.

1.3.4	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de Marinilla	m ³	3222.40
-------	--	----------------	---------





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

En la vía Marinilla Nuevo Peñol – El pozo, se conformó la calzada con un promedio de 5.30 de ancho, primero se escarificó y luego se conformó, el material sobrante se acopiaba y retiraba para finalmente disponerlo en la zona de acopio.

Esta actividad se ejecuta para obtener las pendientes y niveles necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, teniendo presente los parámetros indicados en los documentos del proyecto.

1.4.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de Marinilla	m ³	644.48
-------	--	----------------	--------





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Se suministro material de subbase de cantera la cual cumple con las especificaciones del manual INVIAS, el material fue extendido, conformado y compactado.

Se realizaron ensayos de densidad por el método del cono de arena de los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95% del Proctor).

1.5.4	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de Marinilla	m ³	915.04
-------	--	----------------	--------



Se suministró e instalo material de préstamo en la vía Pozos tramo 1 en una longitud de 226 m, ancho 5.30 m y 0.25 m de profundidad y en Pozos tramo 2 en una longitud de 382



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

m, ancho 5.30 m y 0.25 m de profundidad, también se llenó los espaldares de los bordillos laterales, para el confinamiento de toda la estructura instalada.

A todo material instalado y compactado, se le realizo ensayos de densidad por el método del cono de arena los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95 % del Proctor).

1.6.4	Pavimento en concreto hidráulico MR 37 KGF/CM2 (Compresión 28 MPa). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. No incluye acero de refuerzo. Municipio de Marinilla	m ³	547.20
-------	---	----------------	--------



En la vía la Pozos tramo 1 se han ejecutado 226 metros de concreto hidráulico, divididos en 75 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.18



metros de espesor. Esta estructura cuenta con bombeo del 2% para el desagüe de las aguas lluvias, también se empalmo la estructura nueva con la existente por medio de rampas de 1.5 metros de longitud.

En la vía la Pozos tramo 2 se han ejecutado 382 metros de concreto hidráulico, divididos en 127 módulos de aproximadamente 3 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.18 metros de espesor. Esta estructura cuenta con bombeo del 2% para el desagüe de las aguas lluvias, también se empalmo la estructura nueva con la existente por medio de rampas de 1.5 metros de longitud.

En ambos frentes se realiza el vaciado con mixer, cumpliendo con los estándares de calidad, diseño de mezclas y los acabados requeridos para su correcto funcionamiento

1.7.4	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recta 15x35x80 prefabricado, Municipio de Marinilla	m	1216.00
-------	--	---	---------



Se suministro e instalo bordillos laterales entre las abscisas K2+111 a la K1+885 en la vía Pozos tramo 1, en una longitud de 226 metros en cada costado, para un total de 452 metros y entre las abscisas K2+195 a la K2+577 en la vía Pozos tramo 2, se instaló una longitud de 382 metros de bordillo en cada costado, para un total de 764 metros.

Las dimensiones del bordillo prefabricado son ancho 0.15 m, largo de 0.35 m y alto 0.80 m, el cual tiene como función el confinamiento de la estructura. Además, permite la canalización de las aguas lluvias conduciéndolas a los sistemas de drenaje (Alcantarillas).

1.8.4	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Municipio de Marinilla	kg	3937.12
-------	--	----	---------



Teniendo en cuenta el diseño de la estructura en los dos frentes de trabajo, se tiene que el ancho de la vía se divide en dos placas, lo cual se genera una dilatación entre las losas, por esta razón se instala acero No. 3 (3/8") corrugado de una longitud de 0.65 m y una separación entre ejes de las barras de anclaje de 0.90 m.

Además, se instala acero liso No. 7 (7/8") de una longitud de 0.35 m y separación entre ejes de los separadores de carga de 0.30 m, este se ubica en la dilatación del ancho de la placa, el cual su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación de las juntas.

En la vía Pozos tramo 2 se construyó una rampa de acceso de 1.5 metros de longitud, la cual cuenta con acero de refuerzo de 1/2" formando una malla y se amarra a una viga transversal con refuerzo de 1/2".

1.9.4	Suministro e instalación de canastilla pasa juntas para placas de 18cm de espesor, en acero de 1/4" con dovelas de transferencia de carga para las juntas transversales en la construcción de pavimento rígido, ANCHO DE LA BASE: 41,5 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ANCHO SUPERIOR: 30 cm, tolerancia '+/- 3 mm. ALTURA DESDE EL SUELO: 9 cm, tolerancia '+/- 3 mm. Municipio de Marinilla	kg	1020.00
-------	---	----	---------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Con el fin de mantener el acero liso de 7/8" en el eje neutro, se instala canastillas de pasa juntas cada 3 metros donde se ubican los pasadores, la dimensión de las canastillas es de 2.5 de largo.

2.1.4	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de Marinilla	m ³	25.54
-------	---	----------------	-------





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Esta actividad se realiza para la colocación del solado de pega de soporte del bordillo, las dimensiones en Pozos Tramo 1 fueron 226 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad cada costado de la vía y en Pozos tramo 2 fueron 382 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad cada costado de la vía.

Georreferenciación vial



Se realiza la búsqueda por medio de GPS del mojón instalado por la topografía y referenciado en el informe de topografía RS2 del paquete técnico en el cual contiene el amarre y coordenadas reales en el sistema WGS 84.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

10.2.4.1 Control de calidad

Se solicitan los certificados de calidad de cada uno de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de los procesos constructivos.





10.2.4.2 Maquinaria y equipo en obra

TABLA No 19. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA – MUNICIPIO EL PEÑOL

MAQUINARIA/EQUIPO	OPERADOR	
Retroexcavadora	Contratada	
	Volqueta	Administración y obra
	Rana compactadora	Administración y obra
	Vibro para concreto	Administración y obra
	Cortadora de concreto	Administración y obra
	Planta eléctrica	Administración y obra
	Herramienta menor	Administración y obra

10.2.4.3 Plan de manejo de transito

Desde el inicio de obra se lleva a cabo el plan de manejo de tránsito indicándole a la comunidad el cierre total de la vía; en la socialización se dejó claro que por el método constructivo y el diseño del concreto hidráulico, es imposible dar paso a vehículos. para ello se han usado las indicaciones basadas en el PMT presentado y aprobado por la interventoría.

- Se instala valla informativos



Figura No 13. Valla informativa - Municipio de Marinilla



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

- Se han instalados señales verticales fijas que indican el cierre de la vía



Figura No 14. Señalización de cierre de vía - Municipio de Marinilla

- También se instalaron las señales de inicio y fin de obra



Figura No 15. Señalización inicio y fin de obra - Municipio de Marinilla

10.2.4.4 Inconvenientes presentados

- Durante el desarrollo de los permisos para el descole de las obras de drenaje a construir, ningún propietario de los lotes aledaños a estos puntos dio permiso para su ejecución, portal motivo no se realizarán alcantarilla en este municipio.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

- Se presentan lluvias en horas de la noche los cuales generan socavaciones y arrastre de material ya seriado y compactado, esto provocando perdidas monerías y reprocesos queretrasan el cronograma de ejecución de actividades.



- En la vía principal Marinilla – Peñol, se presentó perdida de banca en el sector conocido como la cabaña, quedando como única ruta alterna la vía Nuevo Peñol – Pozos, donde se vienen realizando las actividades, las cuales fueron necesario suspender para evitar que se desestabilice la rasante y subrasante ya conformada.



- Debido a la ola invernal, se vienen presentando constantes derrumbes, los cuales se procede inmediatamente a retirar. En algunos casos se presentan en zonas donde ya se ha conformado e instalado material de subbase, la cual es necesario retirar y reemplazar cumpliendo el espesor de diseño estipulado. Adicional, se presenta daños en los bordillos prefabricados ya instalados.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



10.2.4.5 Conclusiones

- Se realiza socialización del proyecto donde participo el ingeniero de obras públicas del municipio, lideres de la junta de acción comunal, la comunidad, profesionales de interventoría y contratista, donde informo las actividades y alcance del proyecto. Adicional, se informa sobre el cierre total de la vía para la ejecución de actividades.
- Se realizaron actas de vecindad en las viviendas aledañas a los dos tramos a ejecutar.
- El avance financiero del Municipio de Marinilla a la fecha del presente informe es del 8.84%.
- El avance financiero por cobrar en el Municipio de Marinilla a la fecha del presente informe es del 8.84% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico a la fecha del presente informe es del 49.19%, representado en los ítems ejecutados en el Municipio de Marinilla.
- El avance físico en el Municipio de Marinilla a la fecha del presente informe es del 7.63%, representado en las actividades consolidadas en el proyecto.
- Se cumple con la implementación del plan de manejo de tránsito, garantizando la movilidad de los habitantes del sector.

10.2.4.6 Anexos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.4.6.1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.4.6.2

ENSAYOS DE LABORATORIO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.4.6.3 BITACORA



10.2.5 San Carlos

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 620 metros en la vía Narices – La Holanda. A la fecha de este informe no se ha avanzado en ningún ítem, por situaciones no atribuibles al contratista. Sin embargo, se inició con el acopio de material de playa y cordonería.

10.2.5.1 Inconvenientes presentados

- Durante la socialización del proyecto, la administración municipal manifestó que en el tramo a pavimentar se debe realizar la red de alcantarillado. Por lo tanto, no es posible iniciar las actividades programadas.

10.2.5.2 Conclusiones

- Se realiza socialización del proyecto donde participo personal de la alcaldía municipal, líderes de la junta de acción comunal, la comunidad, profesionales de interventoría y contratista, donde informo las actividades y alcance del proyecto.
- No es posible iniciar la ejecución de las actividades contractuales hasta que la administración municipal subsane el inconveniente descrito anteriormente.



10.2.6 Santo Domingo

En este Municipio se ejecutará una longitud total de 971 metros, los cuales se divide en cinco tramos de la siguiente manera:

- Vereda El Rayo – Santa Gertrudis Tramo 1: Consta de 200 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades. Pero se ha iniciado con el acopio de material de playa, bordillos prefabricados y tubería en concreto de 36”
- Vereda El Rayo – Santa Gertrudis Tramo 2: Consta de 140 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos.
- Vía vereda San Francisco: Consta de 331 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades. Pero se ha iniciado con el acopio de material de playa, bordillos prefabricados y tubería en concreto de 36”
- Vía vereda San Pedro: Consta de 150 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe se ha ejecutado una serie de actividades que representan avances tales como: Excavaciones, conformación, suministro e instalación de subbase y material de préstamo para llenos. Además, se ha suministrado e instalado bordillos prefabricados para el confinamiento de la estructura en concreto.
- Vía El Saltillo: Consta de 150 metros, de los cuales hasta la fecha de este informe no se han ejecutado actividades. Pero se ha iniciado con el acopio de material de playa, bordillos prefabricados y tubería en concreto de 36”

A continuación, se relaciona las cantidades ejecutadas:

TABLA No 20. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN ACTA 1. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mejorar vía terciaria		
1.1.6	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO	m ³	822.15
1.2.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000	m ³ /km	4446.70



	m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de SANTO DOMINGO		
1.3.6	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de SANTO DOMINGO	m ²	1524.00
1.4.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de SANTO DOMINGO	m ³	301.80
1.5.6	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de SANTO DOMINGO	m ³	404.25
1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de SANTO DOMINGO	m	300.00
2	Construir obras de drenaje		
2.1.6	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de SANTO DOMINGO	m ³	6.30

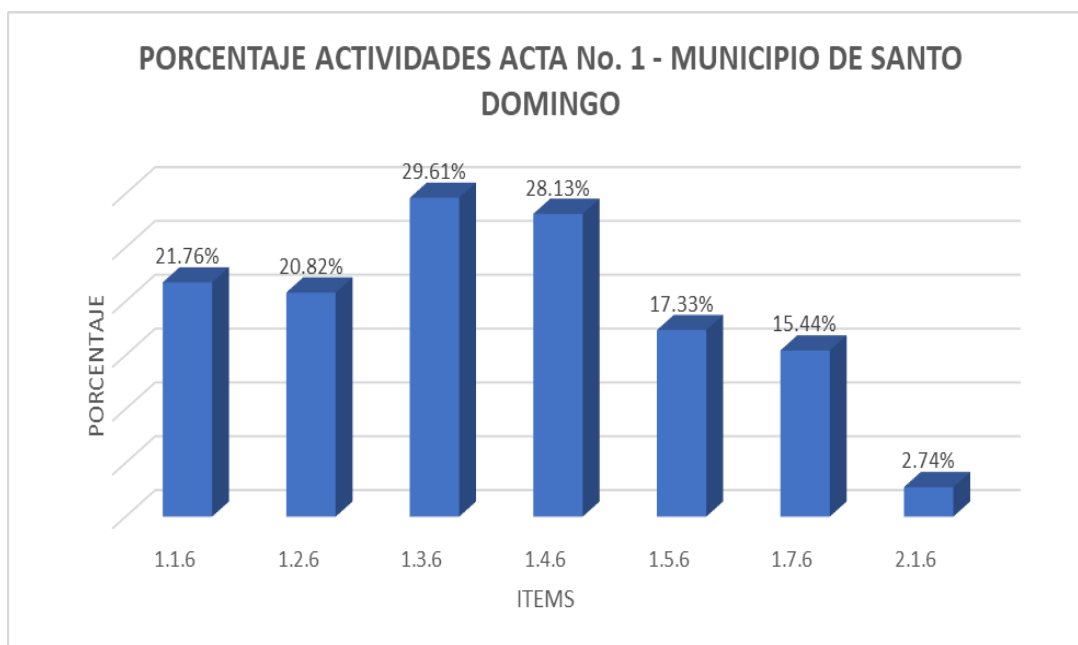


Ilustración 6. PORCENTAJE DE COBRO POR ITEM ACTA No.1 - MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.6	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. Municipio de Santo Domingo	m ³	822.15
-------	---	----------------	--------



Se realizaron excavaciones en la vía San Pedro entre las abscisas K1+700 a la K1+850, con una profundidad de 0.63 metros y ancho promedio 5.30 metros.

En la vereda El Rayo – Santa Gertrudis tramo 2 entre las abscisas K3+679 a la K3+539, en este tramo de 140 m de longitud no se cuenta con el ancho de diseño, pero tampoco es posible ampliarla. Por tal motivo se realiza una excavación con un ancho promedio de 5.10 y profundidad de 0.45 ya que el terreno natural cuenta con una buena compactación y un material con propiedades optimas.

1.2.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). Municipio de Santo Domingo	m ³ /km	4446.70
-------	---	--------------------	---------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se cargo el material sobrante de las excavaciones generadas en los ítems necesarios, el cual se transportó hasta el depósito autorizado por el municipio.

1.3.6	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Municipio de Santo Domingo	m ³	1524.00
-------	--	----------------	---------



En la vía San Pedro, se conformó la calzada con un promedio de 5.40 de ancho y en la vereda El Rayo – Santa Gertrudis tramo 2, se conformó la calzada con un promedio de 5.10. Esta actividad se ejecuta primero escarificando el terreno y luego se conforma. El material sobrante se acopiaba y retiraba para finalmente disponerlo en la zona autorizada.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Esta actividad se ejecuta para obtener las pendientes y niveles necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, teniendo presente los parámetros indicados en los documentos del proyecto.

1.4.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Municipio de Santo Domingo	m ³	301.80
-------	--	----------------	--------



Se suministro material de subbase de cantera la cual cumple con las especificaciones del manual INVIAS, el material fue extendido, conformado y compactado.

Se realizaron ensayos de densidad por el método del cono de arena de los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95% del Proctor).

1.5.6	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte. Municipio de Santo Domingo	m ³	404.25
-------	--	----------------	--------



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Se suministró e instalo material de préstamo en la vía San pedro en una longitud de 150 m, ancho 5.30 m y 0.25 m de profundidad, también se llenó los espaldares de los bordillos laterales, para el confinamiento de toda la estructura instalada. En la vereda El Rayo – Santa Gertrudis tramo 2, se realizó llenó en una longitud de 140 m, ancho 5.10 m y 0.25 m de profundidad,

A todo material instalado y compactado, se le realizo ensayos de densidad por el método del cono de arena los cuales se anexan los resultados cumpliendo con la compactación mínima (95 % del Proctor).

1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado, Municipio de SANTO DOMINGO	m ³	300.00
-------	--	----------------	--------





Se suministro e instalo bordillos laterales entre las abscisas K1+700 a la K1+850 en la vía San Pedro, en una longitud de 150 metros en cada costado, para un total de 300 metros

Las dimensiones del bordillo prefabricado son ancho 0.15 m, largo de 0.35 m y alto 0.80 m, el cual tiene como función el confinamiento de la estructura. Además, permite la canalización de las aguas lluvias conduciéndolas a los sistemas de drenaje (Alcantarillas).

2.1.6	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Municipio de Santo Domingo	m ³	6.30
-------	---	----------------	------



Esta actividad se realiza en la vía San Pedro, para la colocación del solado de pega de soporte del bordillo, las dimensiones promedias fueron 150 m de largo, 0.30 de ancho y 0.07 m de profundidad en cada costado de la vía.



Georreferenciación vial



Se realiza la búsqueda por medio de GPS del mojón instalado por la topografía y referenciado en el informe de topografía RS2 del paquete técnico en el cual contiene el amarre y coordenadas reales en el sistema WGS 84.

10.2.6.1 Maquinaria y equipo en obra

TABLA No 21. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA – MUNICIPIO EL PEÑOL

MAQUINARIA/EQUIPO	OPERADOR
Retroexcavadora	Contratada
Volqueta	Administración y obra
Vibro compactador	Contratada
Rana compactadora	Administración y obra
Vibro para concreto	Administración y obra
Cortadora de concreto	Administración y obra
Planta eléctrica	Administración y obra
Herramienta menor	Administración y obra



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

10.2.6.2 Plan de manejo de transito

Desde el inicio de obra se lleva a cabo el plan de manejo de tránsito indicándole a la comunidad el cierre total de la vía; en la socialización se dejó claro que por el método constructivo y el diseño del concreto hidráulico, es imposible dar paso a vehículos. para ello se han usado las indicaciones basadas en el PMT presentado y aprobado por la interventoría.

- Se instala valla informativa



Figura No 16. Valla informativa - Municipio de Santo Domingo

- Se han instalados señales verticales fijas que indican el cierre de la vía



Figura No 17. Señalización de cierre de vía - Municipio de Santo Domingo



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

- También se instalaron las señales de inicio y fin de obra en ambos sentidos de la vía Ramal a Sonadora.



Figura No 18. Señalización de inicio y fin de obra - Municipio de Santo Domingo

10.2.6.3 Inconvenientes presentados

- Durante la ejecución de las actividades que se adelantan en la vía San Pedro, se vienen presentando fuertes lluvias, debido a estas, ha sido necesario suspender actividades con el fin de evitar pérdidas monetarias. Además, es de resaltar que esta situación incrementa el tiempo de ejecución de las actividades.

10.2.6.4 Conclusiones

- Se realiza socialización del proyecto donde participo el ingeniero de obras públicas del municipio, líderes de la junta de acción comunal, la comunidad, profesionales de interventoría y contratista, donde informo las actividades y alcance del proyecto. Adicional, se informa sobre el cierre total de la vía para la ejecución de actividades.
- El avance financiero del Municipio de Santo Domingo a la fecha del presente informe es del 1.77%.
- El avance financiero por cobrar en el Municipio de Santo Domingo la fecha del presente informe es del 1.77% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico a la fecha del presente informe es del 7.15%, representado en los ítems ejecutados en el Municipio de Santo Domingo.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

- El avance físico en el Municipio de Santo Domingo a la fecha del presente informe es del 1.17%, representado en las actividades consolidadas en el proyecto.
- Se cumple con la implementación del plan de manejo de tránsito, garantizando la movilidad de los habitantes del sector.

10.2.6.5 Anexos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 10.2.6.5.1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL




11 PERSONAL TÉCNICO

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	JOSÉ RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE OBRA
2	WILLIAM JARAMILLO	RESIDENTE DE OBRA
3	SANTIAGO VANEGAS	RESIDENTE DE OBRA
4	ALEJANDRA DUQUE	INGENIERA AMBIENTAL
5	JAKELYN ARIAS	COORDINADORA. SST
6	JUAN DAVID CASTRO	AUXILIAR
7	LUIS FELIPE DIAZ	AUXILIAR
8	JORGE ALIRIO MENESES	INSPECTOR

12 CONCLUSIONES GENERALES

- El avance financiero del proyecto a la fecha del presente informe es del 29.59%.
- El avance financiero por cobrar del proyecto a la fecha del presente informe es del 29.59% representado en el corte de acta No. 1.
- El avance físico del proyecto a la fecha del presente informe es del 18.71%, representado en las actividades ejecutadas del proyecto.
- Se vienen realizando actas de reunión cada 15 días donde participan profesionales de la supervisión, interventoría y contratistas, para informar sobre el avance de obra y los inconvenientes presentados durante la ejecución de las actividades.
- A pesar de los inconvenientes presentados, se vienen adelantando las actividades de acuerdo con lo presentado en el cronograma.
- Se acatan todas las recomendaciones y correcciones presentadas por la interventoría.

13 ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Elaboro	Antonio Rodríguez	Ingenieria y construcciones WJ S.A.S	
Reviso y aprobó	Jarinson Mosquera	Constructores Asociados H&G	



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.1

POLIZAS



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.2

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.3

INFORME AMBIENTAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.4

INFORME SOCIAL



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.5

INFORME SST



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.6

INFORME PAPSO




INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ANEXO 13.7

SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2022
INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONCEPCIÓN

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.09	2.83	9.1

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.07	2.90	9.1

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	194	414	9.0	865	1173	280

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en m ³	Grueso en m ³	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	0.194	0.135	9.0	0.280	0.391	280

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
28 MPA= ARENA 4.1 CANECAS, GRUESO 5.8 CANECAS, AGUA 28 LITROS.


COMENTARIOS

En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:


Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
 OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO
 FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2022
 INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
 MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONCEPCIÓN

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.35	1	1.6	2.23	9.1

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.35	1	1.99	2.70	9.1

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.35	154	434	10.21	865	1173	MR 3.8

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA


A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en m ³	Grueso en m ³	Resistencia en Kg/cm ²
0.35	0.154	0.175	10.21	0.280	0.391	MR 3.8

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
 MR 3.8= ARENA 4. CANECAS, GRUESO 5.4 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR: CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
MARCA DEL CEMENTO: ALION GEN. PROCEDENCIA DE AGREGADOS: DE LA ZONA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	GRAVILLA		ASENTAMIENTO EN CM
280	0.42	1	4.17		9.0

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	GRAVILLA		ASENTAMIENTO EN CM
280	0.42	1	4.18		9.0

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Gravilla en kilos		Resistencia en Kg/cm ²
0.42	194	465.5	9.31	1940.29		280

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Gravilla en kilos		Resistencia en Kg/cm ²
0.42	0.194	0.163	9.31	0.643		280


CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =

28 Mpa = PROPORCIONES REALES DE LA GRAVILLA = 4.18 CANECAS / SACO
REEMPLAZAR ASI: 3 CANECAS DE GRAVILLA, 1.18 CANECAS DE TRITURADO DE 3/4 Y 23.4 LITROS DE AGUA

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
 OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
 FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
 INTERVENTOR: CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
 MARCA DEL CEMENTO: ALION GEN. PROCEDENCIA DE AGREGADOS: DE LA ZONA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	GRAVILLA		ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.35	1	4.09		8.0

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	GRAVILLA		ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.35	1	4.05		8.0

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Gravilla en kilos		Resistencia en Kg/cm ²
0.35	169	485.5	9.71	1968.74		MR 3.8

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Gravilla en kilos		Resistencia en Kg/cm ²
0.35	0.169	0.163	9.71	0.668		MR 3.8

CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =


MR 3.8 = PROPORCIONES REALES DE LA GRAVILLA = 4.05 CANECAS / SACO
 REEMPLAZAR ASI: 3 CANECAS DE GRAVILLA, 1.05 CANECAS DE TRITURADO DE 3/4 Y 14.88 LITROS DE AGUA

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: JHC. S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO" Dirección: Calle 56ª No. 52-30 Teléfonos: 531 13 64 N.I.T.#: 900.355.893-9 Dirección de la Obra: CONCEPCIÓN	Características: _____ Agregado Fino: De la zona Agregado Grueso: Calcáneos Industriales Cemento: Cemex de uso general Dosificación: _____ Interventor: _____	Fecha de Informe: 16 de Noviembre de 2022 Contacto: _____ Factor de Proyección. 3 días: _____ Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673 Factor de Proyección. 14 días: _____
---	--	---


[illegible]

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
 OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
 FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
 INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONCEPCIÓN

GRUESO	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
¾"	Grava triturada gris	Calcáreos Industriales

ARENA	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
Arena	Arena amarillenta para concreto	De la zona

DATOS DE LOS MATERIALES	GRUESO	ARENA	NORMA	NORMA
			GRUESO	ARENA
Peso específico aparente seco	2.744	2.698	ICONTEC 176	ICONTEC 237
Peso unitario varillado en Kg/m ³	1.718		ICONTEC 92	ICONTEC 92
Peso unitario suelto en Kg/m ³	1.442	1.378		
% de absorción	1.3	1.7		
Tamaño máximo	¾"			
Módulo de finura		3.0		
Desgaste físico				
Desgaste químico				
% de caras alargadas				
% de caras aplanadas				
Análisis colorimétrico		<1		NTC – 127

DATOS DEL CEMENTO


Marca	Cemex general			
Peso específico aparente	3-15			
Densidad suelta	1.3			

ADITIVO


MARCA	USO	DENSIDAD

Observaciones: _____

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
 Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9

OBRA: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO”

LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

CEMENTO: ALION DE USO GENERAL **K ANILLO:** 9.35

PROCEDENCIA DE LA GRAVILLA: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022 **MR:** MR 3.8

MUES No.	FECHA DE VACIADO	FECHA DE FALLO	DÍAS DE CURA DO	TIPO MUESTRA	ESPESOR e (cm)	ANCHO a (cm)	L (cm)	LUZ (cm) entre apoyo	D ²	CARGA (KN)	MR	K. ANILLO
1	25-11-22	1-12-22	7		15	15	50	40		24.0	3.20	9.35
2	29-11-22	5-12-22	7		15	15	50	40		23.3	3.15	9.35
3	01-12-22	8-12-22	7		15	15	50	40		27.2	3.63	9.35
4	06-12-22	12-12-22	7		15	15	50	40		26.8	3.57	9.35

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: **INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
M.P. 0520267546 ANT.
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: DE LA ZONA MATERIAL DE AFIRMADO
FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K0+160	K0+120	K0+060
Márgen		Izquierda	Eje	Derecha
Profundidad (Cm)		14,00	14,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5849	5942	6013
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3186	3274	3286
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2663	2668	2727
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1750	1755	1814
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1296	1300	1344
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3142	3204	3286
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	758,9	841,6	965
10. Humedad (%)	Obten.	7,7	8,9	9,1
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2917,36	2942,15	3011,92
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	19,45	20,80	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,25	2,26	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,26	2,27	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	95,70	96,16	95,49
DENSIDAD MEDIA= 95,78	ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI 0,98*DM 93,87
Di>=0,98Dm	CUMPLE:	SI		

ENSAYADO POR:


FABIO JARAMILLO CARDONA




REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: DE LA ZONA MATERIAL DE AFIRMADO
FECHA DEL INFORME: 07 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+290	K0+250	K0+210
Márgen		Izquierda	Eje	Derecha
Profundiad (Cm)		13,00	12,00	14,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5723	5624	5548
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3045	2997	2976
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2678	2627	2572
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1765	1714	1659
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1307	1270	1229
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3152	3103	3110
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	858,6	758,6	942
10. Humedad (%)	Obten.	7,8	8,3	9,2
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2923,93	2865,19	2847,99
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	21,41	19,64	23,25
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,24	2,26	2,32
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,25	2,27	2,32
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	95,28	95,91	97,98
DENSIDAD MEDIA= 96,39 ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM 94,46
D_i>=0,98D_m CUMPLE: SI				


ENSAYADO POR:


FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR:


INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: DE LA ZONA MATERIAL DE AFIRMADO
FECHA DEL INFORME: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Abcisa:		K0+410	K0+370	K0+330
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5740	5578	5531
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3076	2986	2975
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2664	2592	2556
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1751	1679	1643
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1297	1244	1217
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3156	3041	3064
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	836,4	736,8	1144
10. Humedad (%)	Obten.	8,9	7,8	8,8
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2898,07	2820,96	2816,18
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	20,95	19,50	27,19
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,23	2,27	2,31
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,25	2,28	2,31
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	95,20	96,30	97,87
DENSIDAD MEDIA= 96,46 ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM 94,53
Di>=0,98Dm CUMPLE: SI				


ENSAYADO POR:



FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: DE LA ZONA MATERIAL DE AFIRMADO
FECHA DEL INFORME: 01 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K0+530	K0+490	K0+450			
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda			
Profundiad (Cm)		14,00	13,00	12,00			
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5420	5528	5473			
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2836	2896	2875			
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2584	2632	2598			
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913			
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1671	1719	1685			
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35			
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1238	1273	1248			
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3052	3074	3064			
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	725,6	736,8	1144			
10. Humedad (%)	Obten.	8,3	7,8	8,4			
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2818,10	2851,58	2826,57			
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	19,21	19,33	27,19			
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32			
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,28	2,24	2,26			
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,28	2,25	2,28			
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37			
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,59	95,32	96,35			
DENSIDAD MEDIA=	96,08	ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM	94,16
Di>=0,98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR:


FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: CALCAREOS INDUSTRIALES
FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+270	K0+230	K0+190
Márgen		Izquierda	Eje	Derecha
Profundiad (Cm)		14,0	15,0	14,0
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5624	5514	5489
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3095	2976	2937
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2529	2538	2552
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1616	1625	1639
6. Densidad de la arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1197	1204	1214
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2963	2956	2984
9. Peso material retenido 3/4" humedo (g)	Peso	724,5	795,3	824
10. Humedad (%)	Obten.	8,9	9,5	9,6
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2720,84	2699,54	2722,63
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	19,65	21,20	21,64
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,27	2,24	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,28	2,26	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,47	95,49	95,49
DENSIDAD MEDIA= 95,82 ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM 93,90
Di>=0,98Dm CUMPLE: SI				


ENSAYADO POR:

FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR:

INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: CALCAREOS INDUSTRIALES
FECHA DEL INFORME: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+390	K0+350	K0+310
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		13,0	12,0	13,0
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5396	5423	5542
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2936	2914	3012
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2460	2509	2530
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1547	1596	1617
6. Densidad de la arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1146	1182	1198
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2812	2876	2945
9. Peso material retenido 3/4" húmedo (g)	Peso	758,9	825,4	865
10. Humedad (%)	Obten.	8,6	8,4	9,2
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2589,32	2653,14	2696,89
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	21,25	22,30	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,24	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,26	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,05	95,57	95,82
DENSIDAD MEDIA= 95,81	ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI 0,98*DM 93,90
D_i>=0,98D_m	CUMPLE:	SI		


ENSAYADO POR:



FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: CALCAREOS INDUSTRIALES
FECHA DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K0+535	K0+480	K0+430
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundiad (Cm)		14,0	13,0	13,0
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5231	5376	5476
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2765	2896	2945
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2466	2480	2531
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1553	1567	1618
6. Densidad de la arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1150	1161	1199
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2843	2876	2945
9. Peso material retenido 3/4" humedo (g)	Peso	786,6	836,8	844
10. Humedad (%)	Obten.	8,36	8,6	8,5
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2623,66	2648,25	2714,29
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	21,67	22,54	22,28
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,28	2,28	2,26
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,29	2,29	2,28
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,76	96,80	96,24
DENSIDAD MEDIA= 96,60 ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM 94,67
Di>=0,98Dm CUMPLE: SI				

ENSAYADO POR:

FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
 M.P. 0520267546 ANT
 Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: DE LA ZONA MATERIAL DE AFIRMADO
FECHA DEL INFORME: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+585	K0+610	K0+640		
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda		
Profundiad (Cm)		14,00	13,00	12,00		
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5380	5241	5134		
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2891	2793	2670		
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2489	2448	2464		
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913		
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1576	1535	1551		
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35		
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1167	1137	1149		
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2865	2874	2878,3		
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	825,6	733,5	1144		
10. Humedad (%)	Obten.	8,31	9,8	8,7		
11. Peso del material extraído seco (g)	(8/((1+10)/100)	2645,19	2617,49	2647,93		
12. % retenido 3/4" (%)	(9*100)/(8+9)	22,37	20,33	28,44		
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32		
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,27	2,30	2,30		
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	(13-14)*(12/100+14)	2,28	2,30	2,31		
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37		
17. % de compactación	(15/16)*100	96,28	97,46	97,59		
DENSIDAD MEDIA= 97,11 ESPECIFICACIÓN		Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM	95,17
Di>=0,98Dm CUMPLE:		SI				


ENSAYADO POR:


FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales

CONTROL DE CALIDAD
INV. 161 - 2013
PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO
METODO DEL CONO DE ARENA



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
DIRECCION: CALLE 56a No. 52 - 30 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO"
LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TRAMO 1 SONADORA
PROCEDENCIA DEL MATERIAL: CALCAREOS INDUSTRIALES
FECHA DEL INFORME: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+590	K0+625	K0+643
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundiad (Cm)		14,0	13,0	12,0
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5123	5275	5480
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2630	2845	2945
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2493	2430	2535
4. Constante del cono (g)	Fijo	913	913	913
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1580	1517	1622
6. Densidad de la arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5-6)	1170	1124	1201
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2910	2896	2945
9. Peso material retenido 3/4" humedo (g)	Peso	822,3	738,5	844
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,8	8,5
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2689,22	2637,52	2714,29
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,03	20,32	22,28
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,30	2,35	2,26
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,30	2,34	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,33	98,98	96,06
DENSIDAD MEDIA= 97,45 ESPECIFICACIÓN	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0,98*DM 95,51
Di>=0,98Dm CUMPLE: SI				

ENSAYADO POR:



FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT
Laboratorista de Materiales


Fecha: Jueves 17/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleado

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes 7, Topógrafo

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, volquetes 2

Actividades: Se inicia con el replanteo del trazo de 65 mts de la sonadora en el municipio de Concepción, ingresa material de playa, afirmado, tubería de concreto y bordillos; se arranca con la conformación y excavación, carga y botada de material.



contratista



interventor

Fecha: Viernes 18/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada


Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, volquetes 2

Actividades: Se continúa con la excavación del material, se carga y se bota, llega material de afirmado y se coloca o instala también se arranca con la compactación del material, llega más bordillos y tubería de concreto



contratista



interventor

Fecha: Sábado 19/11/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Lluviosa

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoria, supervisor, oficial 2, Ayudante 7.

Actividades: Se arranca con la instalación de bordillos y se continúa con la instalación de afirmado y compactación, se sigue con la excavación y el carga de material sobrante; se espera la próxima semana realizar ensayos de densidad



contratista



interventor


Fecha: Lunes 21/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactor tipo rana, concretadora volqueta 2

Actividades: Se continua con la excavación y cargue de material sobraute adicionalmente llega material de afirmado y se realiza la instalación mas la compactación, se sigue con la instalación de bordillos, llega a la obra la concretadora y se inicia con el almacenamiento de material de playa.


 contratista


 interventor


Fecha: Martes 22/11/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactor tipo rana, concretadora, volquetes 2

Actividades: Se sigue con la excavación y cargue de material sobraute, se continua con la instalación de bordillos y afirmado igual con la compactación del material, se espera mañana para la realización de los ensayos de cono.


 contratista


 interventor

Fecha: Miércoles 23/11/2022


Clima: Mañana Soleada, Tarde Soleada


Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoría, supervisor, oficial 2, ayudante 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactor tipo rana, concretadora, volquetas 2

Actividades: Se continua con la excavación y cargue de material se sigue con la instalación de afirmado y bordillos en el primer tramo se realiza los ensayos de cono de arena

para liberar el trazo para iniciar con la instalación de subbase granular


 contratista


 interventor


Fecha: Jueves 24/11/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde lluviosa

Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetas 2

Actividades: Se continua con la instalación de afirmado y en el trazo liberado se inicia con la instalación de la subbase en capas de 8cms para dar la compactación correcta, se continua con la instalación de bordillo y alternando el afirmado.


 contratista


 interventor

Fecha: Viernes 25/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetas 2

Actividades: llega material de afirmado y se continua con la excavación y cargando material sobrante, se sigue con la instalación de bordillo, subbase y afirmado; se inicia con el vaciado de concreto se realizan ensayos de viga


 contratista


 interventor


Fecha: Sabado 26/11/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde lluviosa


Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se continua con la excavación y el cargue de material sobrante, se sigue con la instalación de bordillos y afirmado; el material de subbase se continua aplicandose en capas de 8 cms. para llegar a la compactación de base



contratista



intervenitor

Fecha: Lunes 28/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada.

Personal: Supervisor, Ing. Residente, Ing. Intervenitor, oficial 2, Ayudante 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora.

Actividades: Se continua con la instalación de bordillo y material de subbase, se realizan ensayos de cono de arena para determinar la densidad y liberar el trazo para la instalación de subbase; en el primer trazo se continua con el vaciado de concreto y se realizan los ensayos de viga a flexión



contratista



intervenitor


Fecha: Martes 29/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volqueta 2

Actividades: llega material de subbase y afirmado para continuar con la instalación y compactación; se continua con el vaciado de concreto e instalación de bordillos, se realizan ensayos de viga a flexión se toman muestras.


 contratista


 interventor


Fecha: Miércoles 30/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada.

Personal: Supervisor, oficial 2, ayudante 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetes 1

Actividades: llega material de afirmado y se continua con la instalación y compactación del material de subbase; se continua con la instalación de bordillos y el vaciado de concreto el media calzada.


 contratista


 interventor

Fecha: Jueves 01/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventor, supervisor, oficial 2, ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora,

Actividades: Se inicia trabajos en el tramo 1 de sonadora el cual son 500 mts de longitud se inicia con la conformación y excavación cargue de material sobrante, en el tramo 2 se continua con el vaciado de concreto e instalación de subbase granular; y se realiza los ensayos de rigidez.


 contratista


 interventor


Fecha: Viernes 02/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventor, Supervisor, Oficial 2, Ayudante 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetas 2

Actividades: Se continúa con la excavación y conformación del trazo 1 de la vereda sonadora, se cargan volquetas para sacar material sobrante e ingresa material de afirmado para iniciar el lleno compactado, en el trazo 2 se continúa con el vaciado de concreto.


 Contratista


 Interventor

Fecha: Sábado 03/12/2022


Clima: Mañana lluvioso y Tarde lluvioso

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes raso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetas

Actividades: Se sigue con la excavación y conformación del trazo 1 se cargan volquetas para sacar el material sobrante; se sigue compactando material de afirmado y subbase en capas pequeñas se continúa con el vaciado de concreto y se toman muestras de vigas.


 Contratista


 Interventor

Fecha: Lunes 05/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada.


Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, Supervisor, Oficial 2 ayudante raso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetas.

Actividades: Se realiza la excavación de material y se carga

los sobrantes, se continua con la conformación y la instalación de bordillos y afirmado, se realiza la toma de densidades con el método de cono de arena.


 contratista


 interventor


Fecha: Martes 06/12/2022


Clima: Mañana lluvioso y tarde lluvioso

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes varo 7.

Equipo: Retroexcavadora de llantas, vibrocompactador tipo rana, concretadora.

Actividades: Se continua con el vaciado de concreto y la instalación de bordillos, afirmado y subbase en el trazo 1 y se sigue vaciando el concreto en el trazo 2, se sigue sacando material sobrante de la excavación; se realiza muestras de vigas


 contratista


 interventor


Fecha: Miércoles 07/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudantes 7

Equipo: Retroexcavadora de llantas, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volquetes

Actividades: Se realiza el vaciado de concreto en el trazo 2 de la vereda sonadora se toman muestras de viga; en el trazo 1 se continua con la excavación, cargue y transporte de material sobrante, como tambien el manejo de la compactación del afirmado y subbase.


 contratista


 interventor


Fecha: Viernes 09/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada.


Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoría, supervisores, oficial 2, Ayudante rasero 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactados tipo rana, concretadora, volqueta


Actividades: se continúa con el vaciado de concreto en el trazo 1 y la compactación del afirmado y subbase; se realiza muestras de vigas a flexión



contratista



interventor



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2022

INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: EL PEÑOL

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.02	3.12	9.0

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.06	2.82	9.0

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	194	414	9.74	836	1292	280

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	0.194	0.137	9.74	0.282	0.387	280

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
28 MPA= ARENA 4.1 CANECAS, GRUESO 5.6 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2022

INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: EL PEÑOL

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.37	1	1.59	2.46	9.0

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.37	1	1.4	2.30	9.0

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.37	194	524	10.30	836	1292	MR 3.8

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.37	0.194	0.171	10.30	0.240	0.395	MR 3.8

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
MR 3.8= ARENA 2.8 CANECAS, GRUESO 4.6 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA


Cliente: JHC. S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO" Dirección: Calle 56ª No. 52-30 Teléfonos: 531 13 64 N.I.T.#: 900.355.893-9 Dirección de la Obra: EL PEÑOL	Características: _____ Agregado Fino: De la zona Agregado Grueso: Calcáreos Industriales Cemento: Cemex de uso general Dosificación: _____ Interventor: _____	Fecha de Informe: 09 de Noviembre de 2022 Contacto: _____ Factor de Proyección. 3 días: _____ Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673 Factor de Proyección. 14 días: _____
---	--	---

[illegible]

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: EL PEÑOL

GRUESO	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
¾"	Grava triturada gris	Calcareos Industriales

ARENA	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
Arena	Arena amarillenta para concreto	De la zona

DATOS DE LOS MATERIALES	GRUESO	ARENA	NORMA	NORMA
			GRUESO	ARENA
Peso específico aparente seco	2.744	2.663	ICONTEC 176	ICONTEC 237
Peso unitario varillado en Kg/m ³	1.718		ICONTEC 92	ICONTEC 92
Peso unitario suelto en Kg/m ³	1.442	1.367		
% de absorción	1.3	1.5		
Tamaño máximo	¾"			
Módulo de finura		3.0		
Desgaste físico				
Desgaste químico				
% de caras alargadas				
% de caras aplanadas				
Análisis colorimétrico		<1		NTC – 127

DATOS DEL CEMENTO


Marca	Cemex general			
Peso específico aparente	3-15			
Densidad suelta	1.3			

ADITIVO


MARCA	USO	DENSIDAD

Observaciones: _____

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K0+07	K0+35	K0+65
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5630	5845,00	5746,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3140,00	3380,00	3240,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2490,00	2465,00	2506,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1577,00	1552,00	1593,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1168,15	1149,63	1180,00
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2910,00	2896,00	2961,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2689,22	2637,52	2729,03
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,94	21,35	23,21
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,30	2,29	2,29
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,31	2,30	2,30
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,48	97,20	97,08

DENSIDAD MEDIA=	97,25	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	95,306
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+92	K0+120	K0+150
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5970	6120,00	6230,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3480,00	3730,00	3790,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2490,00	2390,00	2440,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1577,00	1477,00	1527,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1168,15	1094,07	1131,11
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2870,00	2780,00	2760,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2652,25	2531,88	2543,78
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,19	22,04	24,49
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,27	2,31	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,28	2,31	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,45	97,87	95,79

DENSIDAD MEDIA=	96,70	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,767
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K0+92	K0+120	K0+150
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5970	6120,00	6230,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3480,00	3730,00	3790,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2490,00	2390,00	2440,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1577,00	1477,00	1527,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1168,15	1094,07	1131,11
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2870,00	2780,00	2760,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2652,25	2531,88	2543,78
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,19	22,04	24,49
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,27	2,31	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,28	2,31	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,45	97,87	95,79

DENSIDAD MEDIA=	96,70	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,767
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+92	K0+120	K0+150
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5970	6120,00	6230,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3480,00	3730,00	3790,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2490,00	2390,00	2440,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1577,00	1477,00	1527,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1168,15	1094,07	1131,11
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2870,00	2780,00	2760,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2652,25	2531,88	2543,78
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,19	22,04	24,49
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,27	2,31	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,28	2,31	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,45	97,87	95,79

DENSIDAD MEDIA=	96,70	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,767
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES


FECHA DEL INFORME: 06 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+10	K0+40	K0+70
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5123,00	5275,00	5480,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2630,00	2845,00	2945,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2493,00	2430,00	2535,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1580,00	1517,00	1622,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1170,37	1123,70	1201,48
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2910,00	2896,00	2945,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	822,30	738,50	844,40
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2689,22	2637,52	2714,29
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,03	20,33	22,28
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,30	2,35	2,26
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,30	2,34	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,33	98,98	96,06

DENSIDAD MEDIA=	97,45	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	95,5054
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES


FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+75	K0+105	K0+145
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	6150,00	5940,00	5740,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3640,00	3680,00	3368,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2510,00	2260,00	2372,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1597,00	1317,00	1459,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1182,96	997,78	1080,74
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2486,00	2630,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2264,12	2423,96
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,76	24,02	25,39
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,30	2,27	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,30	2,28	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,30	96,42	95,62

DENSIDAD MEDIA=	96,45	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,518
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: EL PEÑOL MONTAÑITA - YARUMOS

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K0+75	K0+105	K0+145
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	6150,00	5940,00	5740,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3640,00	3680,00	3368,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2510,00	2260,00	2372,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1597,00	1317,00	1459,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1182,96	997,78	1080,74
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2486,00	2630,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	866,30	786,00	895,00
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2264,12	2423,96
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,76	24,02	25,39
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,30	2,27	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,30	2,28	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,30	96,42	95,62

DENSIDAD MEDIA=	96,45	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,518
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



Fecha: 16/11/2022 Miércoles

Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 2

Equipo:

Actividades: Se inicia con el descargue del material para las transversales y bordillos en los tramos de vía manilla - El Peñol por motivos que la comunidad nos expone no debemos iniciar ya que cerraremos el ingreso a las viviendas.



Contratista



Interventor.

Fecha: Jueves 17/11/2022

Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada


Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 2.

Equipo:

Actividades: Se continúa con el ingreso de material a los sectores del Peñol como es tubería y bordillos



Contratista



Interventor

Fecha: Lunes 21/11/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 2

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactor tipo ranca.

Actividades: Se inicia en el tramo montaña - yermos con el sobreaancho de la vía y conformación de la misma, se realiza excavación del material y se acopra.



Contratista



Interventor.

Fecha: Martes 23/11/2020 - 22/11/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada

Personal: Supervisores, Oficial, Ayudante 2

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, Volquete 2

Actividades: Se inicia con la excavación de material y argués para pasar al lleno con afirmado y subbase, se sigue con la conformación de la calzada y el sobreacuerdo.


Contralista


Interventora


Fecha: Miércoles 24/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisores, Oficial, Ayudante 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, volquetes 2

Actividades: Llega material como es la tubería de concreto y los bordillos para amarrar con la instalación, llega también material de afirmado para iniciar con los llenos.


Contralista


Interventora

Fecha: Jueves 24/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada

Personal: Supervisores, Oficial, Ayudantes 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana

Actividades: Se continúa con la excavación y el transporte de sobrantes, llega más material de afirmado para continuar con la instalación y compactación; llega un camión con cemento e insumos para el inicio de la pega de bordillos


Contralista


Interventora


Fecha: Viernes 25/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudantes 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana

Actividades: se continua con la excavación y transporte de sobrantes, se inicia con la instalación de subbase en el primer sector se espera el lunes tomar densidades ya que se aplico afirmado y en capas pequeñas.


Contralista


Interventoría


Fecha: Sabado 26/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudantes 3

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador tipo rana

Actividades: se continua con la instalación y compactación de afirmado para mejorar la subrasante, se continua con la instalación de bordillos, ingresa mas material de afirmado.


Contralista


Interventoría


Fecha: Lunes 28/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Ing. Residente, Ing. Interventoría, Oficial, Ayudante 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana

Actividades: Se inicia con la toma de densidades por el método del cono de arena y se continua con la instalación de afirmado y subbase. como tambien la instalación de bordillos


Contralista


Interventoría

Fecha: Martes 29/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, volquete

Actividades: llega mas material de afirmado y se continua con la excavación y cargue de material sobrante, se continua con la instalación de afirmado y subbase; la instalación de bordillo se continua


 contratista


 interventoria

Fecha: Miércoles 30/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada

Personal: Supervisores, Oficial, Ayudantes 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana

Actividades: llega material de subbase para continuar con el llea de material y se sigue con la instalación del afirmado y con la instalación de bordillos


 contratista


 interventoria

Fecha: Jueves 01/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, oficial, ayudantes 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactados tipo rana, volquete

Actividades: Se inicia con la excavación de una obra transversal para realizar el reemplazo de la tubería, se continua con la aplicación de afirmado y subbase como tambien de la instalación de los bordillos


 contratista


 interventoria

Fecha: Viernes 02/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactados tipo rana

Actividades: se continua con la excavación y cambio de tubería de 36" en la obra transversal, se realiza el solado y abaque de la tubería, se sigue con la instalación de afirmado y subbase


 contratista


 interventoria


Fecha: Sabado 03/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 3

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactados tipo rana, volquete

Actividades: se continua con la excavación y cargue de material sobraute, se continua con la instalación de bordillo y afirmado en capas pequeñas para dar la compactación adecuada


 contratista


 interventoria

Fecha: Lunes 05/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 3.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibracompactados tipo rana

Actividades: Se inicia con la toma de densidades por el método del cono de arena para liberar el trazo y continuar con la instalación de subbase, se sigue con la instalación de bordillo y afirmado


 contratista


 interventoria


Fecha: Martes 06/12/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial, Ayudantes 5

Equipo: Retroexcavadora de llantas, vibrocompactador tipo rana, Volquetes

Actividades: Llega mas material de afirmado y subbase para continuar con la instalación, se esta a la espera de la programación del premezclado que con la dificultad de la vía principal se tardaría que tomar una vía alterna, se continua con la instalación de bordillos.


 contratista


 interventoria


Fecha: Miércoles 07/12/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Ing. Residente, Ing. Interventoria, oficial, Ayudantes 5

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana,

Actividades: Se debe dejar todo a punto ya que la programación es para el viernes 08-12-2022 para que ingrese el premezclado por lo que se esta compactando la subbase y se miden anchos y largos para determinar que se encuentren ya se contaron los pasajeros para tener la cantidad correcta.


 contratista


 interventoria


Fecha: Viernes 08/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2 Ayudante 5

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Ingresó el primer carro con premezclado y se veía se espera el restante la programación es 30 m^3 , se continua con la instalación de bordillo y afirmado


 contratista


 interventoria


Fecha: Sabado 09/12/2022

Clima: Mañana Nublada y tarde lluviosa

Personal: Supervisor, oficial y Ayudantes 5

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana


Actividades: Se inicia con el ingreso de un vehículo con premezclado para el vaciado, se sigue con la instalación del afirmado.



contratista



interventor.



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE 2022

INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: GRANADA

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.15	3.00	9.3

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.66	3.35	9.3

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	194	414	8.28	892	1238	280

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	0.194	0.115	8.28	0.306	0.385	280

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
28 MPA= ARENA 5.3 CANECAS, GRUESO 6.7 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE 2022

INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: GRANADA

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.37	1	1.78	2.47	9.3

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.37	1	1.62	2.38	9.3

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.37	194	500	10	892	1238	MR 3.8

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.37	0.194	0.161	10	0.261	0.384	MR 3.8

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
MR 3.8= ARENA 3.2 CANECAS, GRUESO 4.7 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: JHC S.A.S.-INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO" Dirección: Calle 56ª No. 52-30 Teléfonos: 531 13 64 N.I.T.#: 900.355.893-9 Dirección de la Obra: GRANADA	Características: _____ Agregado Fino: De la zona Agregado Grueso: Calcáreos Industriales Cemento: Cemex de uso general Dosificación: _____ Interventor: _____	Fecha de Informe: 12 de Noviembre de 2022 Contacto: _____ Factor de Proyección. 3 días: _____ Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673 Factor de Proyección. 14 días: _____
---	--	---


[illegible]

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: GRANADA

GRUESO	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
¾"	Grava triturada gris	Calcáreos Industriales

ARENA	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
Arena	Arena amarillenta para concreto	De la zona

DATOS DE LOS MATERIALES	GRUESO	ARENA	NORMA	NORMA
			GRUESO	ARENA
Peso específico aparente seco	2.744	2.523	ICONTEC 176	ICONTEC 237
Peso unitario varillado en Kg/m ³	1.718		ICONTEC 92	ICONTEC 92
Peso unitario suelto en Kg/m ³	1.442	1.306		
% de absorción	1.3	1.6		
Tamaño máximo	¾"			
Módulo de finura		3.0		
Desgaste físico				
Desgaste químico				
% de caras alargadas				
% de caras aplanadas				
Análisis colorimétrico		<1		NTC – 127

DATOS DEL CEMENTO


Marca	Cemex general			
Peso específico aparente	3-15			
Densidad suelta	1.3			


ADITIVO

MARCA	USO	DENSIDAD

Observaciones:

ENSAYADO POR:


Fabio Jaramillo Cardona
 Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9

OBRA: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO”

LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE GRANADA

CEMENTO: ALION DE USO GENERAL **K ANILLO:** 9.35

PROCEDENCIA DE LA GRAVILLA: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022 **MR:** MR 3.8

MUES No.	FECHA DE VACIADO	FECHA DE FALLO	DÍAS DE CURA DO	TIPO MUESTRA	ESPESOR e (cm)	ANCHO a (cm)	L (cm)	LUZ (cm) entre apoyo	D ²	CARGA (KN)	MR	K. ANILLO
1	26-11-22	2-12-22	7		15	15	50	40		25.3	3.37	9.35
2	30-11-22	6-12-22	7		15	15	50	40		24.8	3.31	9.35
3	03-12-22	9-12-22	7		15	15	50	40		26.7	3.56	9.35
4	06-12-22	12-12-22	7		15	15	50	40		25.9	3.45	9.35

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: **INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
M.P. 0520267546 ANT.
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: GRANADA TOLDA – TAFETANES

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K3+800	K3+900	K4+000
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5460	5684,00	5931,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2964,00	3150,00	3351,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2496,00	2534,00	2580,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1583,00	1621,00	1667,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1172,59	1200,74	1234,81
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2984,00	3004,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	845,20	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2717,67	2768,66
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,16	22,07	23,18
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,32	2,26	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,32	2,27	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,96	96,19	95,53

DENSIDAD MEDIA=	96,56	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,63
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: GRANADA TOLDA – TAFETANES

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K4+030	K4+100	K4+200
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5974,00	5896,00	5742,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3410,00	3287,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2564,00	2609,00	2592,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1651,00	1696,00	1679,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1222,96	1256,30	1243,70
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3018,00	2974,00	3086,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	741,30	798,00	876,00
10. Humedad (%)	Obten.	9,40	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2758,68	2874,00	2844,24
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	19,72	21,16	22,11
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,29	2,29
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,29	2,29
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	95,88	96,98	96,97

DENSIDAD MEDIA=	96,61	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,679
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: GRANADA TOLDA - TAFETANES

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 01 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K3+810	K3+890	K4+030
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5542,00	5604,00	5768,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2975,00	3087,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2567,00	2517,00	2618,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1654,00	1604,00	1705,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1225,19	1188,15	1262,96
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2994,00	2974,00	3086,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	815,60	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2766,84	2763,00	2844,24
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,84	21,52	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,33	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,32	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,05	98,24	95,84

DENSIDAD MEDIA=	96,71	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,774
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: GRANADA TOLDA - TAFETANES

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K4+130	K4+240	K4+330
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5960,00	5842,00	5739,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	3394,00	3204,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2566,00	2638,00	2589,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1653,00	1725,00	1676,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1224,44	1277,78	1241,48
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	3069,00	2986,00	3094,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	751,60	803,60	896,00
10. Humedad (%)	Obten.	9,40	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2805,30	2874,00	2851,61
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	19,67	21,21	22,46
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,29	2,25	2,30
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,30	2,26	2,30
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,08	95,70	97,30

DENSIDAD MEDIA=	96,70	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,762
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.


Fecha: Martes 15/11/2022

Clima: Mañana Nublada y Tarde lluviosa

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, supervisor, Oficial, Ayudante raso 2, topógrafo

Equipo: Retroexcavadora de llanta, Volquetes 2.

Actividades: Se realiza la firma de acta de inicio por parte del contratista, de esa manera se comienza con las actas de verificación y de entorno en el sector desde la parte social, la comisión topográfica del contratista realiza la localización y replanteo, se realiza la verificación de las obras transversales por lo que los hallazgos son que la obra en la abscisa K3+219 que aparece en el diseño hidráulico no se encuentra en la implantación; K4+075 y K4+373 no se encuentran en campo y la K4+449 no está en la implantación; si se puede observar que al final del tramo se requiere un carcamo ya que el agua llegará a toda la cancha de fútbol y la inundará.



contratista



interventor


Fecha: Miércoles 16/11/2022

Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada.


Personal: Supervisores, Oficial, Ayudante raso 4

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora de 1.5 bultos.

Actividades: Se inicia con la medición de anchos y verificación del abscisado para dar arranque a la ejecución de la obra, llega material para la ejecución de la obra como: bordillos prefabricados, tubería de concreto, material de playa como triturado.



contratista



interventor



Fecha: Jueves 17/11/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde lluviosa


Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante raso 4

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tiporana, concretadora

Actividades: se inicia con la excavación y conformación de la calzada, se carga volquetes para el retiro del material de la excavación, llega material de afirmado para la instalación en el centro poblado de Tafetanes. y se inicia con la compactación



contratista



interventor

Fecha: Viernes 18/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Nublada.


Personal: Supervisor, Oficial, Ayudante 8

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, volquetes 2 concretadora de 1,5 bultos

Actividades: Se continua con la excavación y conque de sobrantes, se continua con la instalación de afirmado en capas pequeñas para que la compactación sea la adecuada. y se inicia con la instalación de bordillos prefabricados.



contratista



interventor

Fecha: Sabado 19/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada


Personal: Supervisores, Oficial 2, Ayudante 8

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactos tipo rana, volquetes 2 concretadora de 1,5 bultos

Actividades: Se continua con la excavación y conformación de la calzada. Se sigue con la instalación del afirmado para darle paso a la Subbase y se continua con la instalación de los bordillos. se realiza inspección profunda de las obras transversales.



contratista



interventor

Fecha: Lunes 21/11/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 9

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: se inicia con la toma de muestras del cono de arena para liberar el trazo e instalar subbase granular, se continua con la instalación de bordillos y afirmado para dar inicio al vaciado de concreto.



contratista



intervenitor

Fecha: Martes 22/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y tarde lluviosa


Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante 9

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: llega material de afirmado para continuar con la instalación y subbase granular, el primer trazo se libera para el vaciado de las primeras placas y se continua con la instalación de bordillo y afirmado.



contratista



intervenitor

Fecha: Miércoles 23/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y tarde soleada


Personal: Supervisor, oficial 2, Ayudante raso 9

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se inicia con el vaciado de concreto de las primeras 5 placas, se realiza la instalación de las pasagatos y dovelas transversales, se continua con la instalación de bordillos y afirmado para realizar la liberación del trazo para continuar con el concreto



contratista



intervenitor.


Fecha: Jueves 24/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventor, Supervisores, Oficial 2, Ayudante raso 11, volquetas 2

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: llega mas material de préstamo para continuar con el afirmado y darle paso a la subbase, se continua con el vaciado de concreto, instalación de bordillos.


 Contratista


 Interventor

Fecha: Viernes 25/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde lluviosa

Personal: Supervisores, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volqueta 2

Actividades: Se continua con la excavación y conformación de la calzada, se mueve material de la excavación y llega material de afirmado para continuar con la instalación, se realiza el vaciado de concreto y se sigue con la instalación de bordillos


 Contratista


 Contratista.


Fecha: Sabado 26/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y tarde nublada

Personal: Supervisores, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se continua con la instalación de afirmado y su compactación como subbase de la subbase, se continua con el vaciado de concreto, la instalación de bordillo, la compactación de afirmado y subbase, se realizan ensayos de viga a flexión


 Contratista


 Interventor.


Fecha: Lunes 28/11/2022


Clima: Mañana Soleada y tarde Nublada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora, volqueta 2

Actividades: Llegó material de subbase y afirmado, se continuó con la instalación de bordillos y compactación de afirmado, se realiza el ensayo de cono de arena para librasa trazo y seguir con la instalación de subbase y vaciado de concreto.


 contratista


 interventor


Fecha: Martes 29/11/2022


Clima: Mañana lluviosa y tarde lluviosa

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: El día amanece muy lluvioso por lo que solo se realizan trabajo en la instalación de bordillos.


 contratista.


 interventor.


Fecha: Miércoles 30/11/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se inicia con el vaciado de concreto y se sigue instalando afirmado y subbase como también los bordillos se programan los ensayos para el día de mañana y poder librasa otro trazo y continuar con subbase. y se realiza muestras de uga a flexión


 contratista


 interventor.


Fecha: Jueves 01/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, Supervisores, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se inicia con la toma de muestras como de arena para liberar el trazo y continuarse con el vaciado de concreto; la instalación de bordillos, afirmado y subbase.


 Contratista


 Interventor

Fecha: Viernes 02/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora volquetes 2.

Actividades: Llega material de subbase para continuarse con la instalación como también llega un camión con bordillos, se realiza el primer cambio de tubería de las obras transversales, se continúa con el vaciado de concreto y la instalación de bordillo


 Contratista


 Interventor

Fecha: Sábado 03/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se continúa con el vaciado de concreto y la instalación de los bordillos, se sigue con la instalación de afirmado y subbase, se toman muestras de viga a flexión


 Contratista


 Interventor


Fecha: Lunes 05/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: Se inicia con la toma de muestras de densidad con el cono de arena, se sigue con el vaciado de concreto e instalación de bordillos, la instalación de afirmado y subbase.


 contratista


 interventor

Fecha: Martes 06/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Soleada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoria, supervisor, oficial 2, Ayudantes raso 10

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana, concretadora

Actividades: El día lunes 5 de diciembre se iniciaron actividades en el tramo Cruce las Palmas con actividades de conformación, limpieza de obras transversales, ingreso material para el concreto. El tramo La Tafetales se continúa con el vaciado de concreto e instalación de bordillos y afirmado; se toman muestras de viga flexión.


 contratista


 interventor.

Fecha: Miércoles 07/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde lluviosa

Personal: Supervisor, Oficial 4, Ayudante raso 15

Equipo: Retroexcavadora 2, Autohormigonera, vibrocompactador tipo rana 2, concretadora 1, volquetes 3

Actividades: En el cruce las Palmas se continúa con la conformación y se inicia con la excavación y la llegada de afirmado; en tafetales se continúa con el vaciado de concreto e instalación de bordillos el jueves es festivo no se trabaja


 contratista


 interventor.


Fecha: Viernes 09/12/2022


Clima: Mañana Nevosa y Tarde Nublada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, supervisor 2, Oficial 4, Ayudante 15.

Equipo: Retroexcavadora de altura 2, Autohormigonera 1, vibrocompactador tipo rana 2, concretadora 1, volquetas 1.

Actividades: En el cruce la palma se realiza los ensayos de cono de arena para liberar el trazo y continuar con la subbase, se continúa con la instalación de bordillos; en el trazo de tafetanes se realizan también los ensayos para continuar con el vaciado de concreto, llega material de playa para el vaciado concreto


Contratista


Interventor

Fecha: Sabado 10/12/2022


Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada


Personal: Supervisores 2, Oficial, 4, Ayudante raso 15

Equipo: Retroexcavadora de altura 2, Autohormigonera 1, vibro compactador tipo rana 2, concretadora 1, volquete 1

Actividades: En el cruce de las palmas se inicia con la instalación de formleta de madera para dar inicio al vaciado, llega material de playa; en el sector de tafetanes se continúa con el vaciado de concreto como también la instalación de bordillos y subbase llega material de afirmado y subbase.




Interventor


Contratista


Fecha: Lunes 12/12/2022


Clima: Mañana Soleada y Tarde Nublada


Personal: Supervisor 2, Oficial 4, Ayudante varo 15

Equipo: Retroexcavadora 2, Autohormigonera 1, vibrocompactador tipo rema concretadora 1, volquete 2

Actividades: En el sector cruce las palmas se continúa con la excavación y conformación, instalación de bordillo y se inicia con el vaciado de concreto; en el sector tafetales continuamos con el vaciado de concreto como también la instalación de bordillos, afirmado y sub-base; se toman muestras de viga a flexión.


contratista


inspector



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
 OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
 FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2022
 INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
 MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MARINILLA

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.45	2.97	9.3

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
280	0.55	1	2.83	3.43	9.3

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	194	414	8.4	1014	1229	280

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en m3	Grueso en m3	Resistencia en Kg/cm ²
0.55	0.194	0.111	8.4	0.314	0.381	280

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
28 MPA= ARENA 5.6 CANECAS, GRUESO 6.8 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
 OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
 FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2022
 INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
 MARCA DEL CEMENTO: CEMEX PROCEDENCIA DE AGREGADOS CALCAREOS INDUSTRIALES
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MARINILLA

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN PESO

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.38	1	2.09	2.52	9.3

PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS EN VOLUMEN

Resistencia esperada en Kg/cm ²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
MR 3.8	0.38	1	1.70	2.42	9.3

CANTIDAD DE MATERIALES PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm ²
0.38	194	486	9.70	1014	1229	MR 3.8

VOLUMENES ABSOLUTOS PARA PRODUCIR UN M³ DE MEZCLA

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en m3	Grueso en m3	Resistencia en Kg/cm ²
0.38	0.194	0.157	9.70	0.268	0.381	MR 3.8

CANTIDADES EN CANECAS POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =
MR 3.8= ARENA 3.4 CANECAS, GRUESO 4.8 CANECAS, AGUA 28 LITROS.

COMENTARIOS


En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales





FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: J.H.C. S.A.S.-INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO" Dirección: Calle 56ª No. 52-30 Teléfonos: 531 13 64 N.I.T.#: 900.355.893-9 Dirección de la Obra: MARINILLA	Características: _____ Agregado Fino: De la zona Agregado Grueso: Calcáneos Industriales Cemento: Cemex de uso general Dosificación: _____ Interventor: _____	Fecha de Informe: 08 de Noviembre de 2022 Contacto: _____ Factor de Proyección. 3 días: _____ Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673 Factor de Proyección. 14 días: _____
--	---	---


[illegible]

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com



CLIENTE: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS
OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO
FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2022
INTERVENTOR: MUSA – CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MARINILLA

GRUESO	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
¾"	Grava triturada gris	Calcáreos Industriales

ARENA	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
Arena	Arena amarillenta para concreto	De la zona

DATOS DE LOS MATERIALES	GRUESO	ARENA	NORMA	NORMA
			GRUESO	ARENA
Peso específico aparente seco	2.744	2.747	ICONTEC 176	ICONTEC 237
Peso unitario varillado en Kg/m ³	1.718		ICONTEC 92	ICONTEC 92
Peso unitario suelto en Kg/m ³	1.442	1.404		
% de absorción	1.3	1.6		
Tamaño máximo	¾"			
Módulo de finura		3.0		
Desgaste físico				
Desgaste químico				
% de caras alargadas				
% de caras aplanadas				
Análisis colorimétrico		<1		NTC – 127

DATOS DEL CEMENTO


Marca	Cemex general			
Peso específico aparente	3-15			
Densidad suelta	1.3			

ADITIVO


MARCA	USO	DENSIDAD

Observaciones: _____

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 **TEL:** 531 13 64 **NIT:** 900.355.893-9

OBRA: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO”

LOCALIZACIÓN OBRA: MUNICIPIO DE MARINILLA

CEMENTO: ALION DE USO GENERAL **K ANILLO:** 9.35

PROCEDENCIA DE LA GRAVILLA: DE LA ZONA


FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022 **MR:** MR 3.8

MUES No.	FECHA DE VACIADO	FECHA DE FALLO	DÍAS DE CURA DO	TIPO MUESTRA	ESPESOR e (cm)	ANCHO a (cm)	L (cm)	LUZ (cm) entre apoyo	D ²	CARGA (KN)	MR	K. ANILLO
1	25-11-22	1-12-22	7		15	15	50	40		24.9	3.32	9.35
2	05-12-22	11-12-22	7		15	15	50	40		25.2	3.36	9.35
3	07-12-22	13-12-22	7		15	15	50	40		25.1	3.34	9.35

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA



REVISADO POR: **INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
M.P. 0520267546 ANT.
Laboratorista de Materiales



CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 1 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 02 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K1+890	K1+990	K2+105
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5460	5684,00	5931,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2964,00	3150,00	3351,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2496,00	2534,00	2580,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1583,00	1621,00	1667,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1172,59	1200,74	1234,81
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2984,00	3004,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	845,20	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2717,67	2768,66
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,16	22,07	23,18
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,32	2,26	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,32	2,27	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,96	96,19	95,53

DENSIDAD MEDIA=	96,56	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,63
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 2 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K2+200	K2+260	K2+300
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5460	5684,00	5931,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2964,00	3150,00	3351,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2496,00	2534,00	2580,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1583,00	1621,00	1667,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1172,59	1200,74	1234,81
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2984,00	3004,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	845,20	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2717,67	2768,66
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,16	22,07	23,18
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,32	2,26	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,32	2,27	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,96	96,19	95,53

DENSIDAD MEDIA=	96,56	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,63
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 2 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE PRESTAMO: DE LA ZONA

FECHA DEL INFORME: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K2+360	K2+410	K2+570
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5460	5684,00	5931,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2964,00	3150,00	3351,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2496,00	2534,00	2580,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1583,00	1621,00	1667,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1172,59	1200,74	1234,81
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2940,00	2984,00	3004,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	845,20	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2716,94	2717,67	2768,66
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	23,16	22,07	23,18
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,32	2,26	2,24
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,32	2,27	2,26
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	97,96	96,19	95,53

DENSIDAD MEDIA=	96,56	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,63
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 1 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 12 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K1+880	K1+980	K2+110
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5542,00	5604,00	5768,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2975,00	3087,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2567,00	2517,00	2618,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1654,00	1604,00	1705,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1225,19	1188,15	1262,96
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2994,00	2974,00	3086,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	815,60	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2766,84	2763,00	2844,24
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,84	21,52	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,33	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,32	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,05	98,24	95,84

DENSIDAD MEDIA=	96,71	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,774
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 2 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 01 DE DICIEMBRE DE 2022


Abscisa:		K2+210	K2+240	K2+290
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5542,00	5604,00	5768,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2975,00	3087,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2567,00	2517,00	2618,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1654,00	1604,00	1705,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1225,19	1188,15	1262,96
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2994,00	2974,00	3086,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	815,60	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2766,84	2763,00	2844,24
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,84	21,52	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,33	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,32	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,05	98,24	95,84

DENSIDAD MEDIA=	96,71	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,774
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.





CLIENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

DIRECCIÓN: CALLE 56ª No. 52-3 TEL: 531 13 64 NIT: 900.355.893-9

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO ANTIOQUIA


LOCALIZACIÓN OBRA: MARINILLA TRAMO 2 VEREDA POZO

PROCEDENCIA DE LA SUB BASE GRANULAR: CALCAREOS INDUSTRIALES

FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

Abscisa:		K2+350	K2+430	K2+560
Márgen		Derecha	Eje	Izquierda
Profundidad (Cm)		14,00	13,00	12,00
1. Peso frasco + cono + arena inicial (g)	Peso	5542,00	5604,00	5768,00
2. Peso frasco + cono + arena final (g)	Peso	2975,00	3087,00	3150,00
3. Peso arena total usada (g)	(1-2)	2567,00	2517,00	2618,00
4. Constante del cono (g)	Fijo	913,00	913,00	913,00
5. Peso de arena en el hueco (g)	(3-4)	1654,00	1604,00	1705,00
6. Densidad de al arena (g/cm3)	Fijo	1,35	1,35	1,35
7. Volumen del hueco (cm3)	(5/6)	1225,19	1188,15	1262,96
8. Peso material extraído húmedo (g)	Peso	2994,00	2974,00	3086,00
9. Peso maetrial retenido 3/4" humedo (g)	Peso	886,30	815,60	906,30
10. Humedad (%)	Obten.	8,21	9,80	8,50
11. Peso del material extraído seco (g)	$(8/((1+10)/100))$	2766,84	2763,00	2844,24
12. % retenido 3/4" (%)	$(9*100)/(8+9)$	22,84	21,52	22,70
13. Densidad aparente retenido 3/4" (g/cm3)	Fijo	2,32	2,32	2,32
14. Densidad seca (g/cm3)	(11/7)	2,26	2,33	2,25
15. Densidad seca corregida (g/cm3)	$(13-14)*(12/100+14)$	2,27	2,32	2,27
16. Densidad max de laboratorio (g/cm3)	Fijo	2,37	2,37	2,37
17. % de compactación	$(15/16)*100$	96,05	98,24	95,84

DENSIDAD MEDIA=	96,71	ESPECIFICACIÓN:	Dm>=De	CUMPLE:	SI	0.98Dm=	94,774
Di>=0.98Dm	CUMPLE:	SI					

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

Fecha: martes 19/11/2022

Clima: lluvia en la mañana y soleado en la tarde

Personal: residente interventoria 1, residente de obra 1, superv. obr 1, residente social 1

Equipo:

Actividades: se realiza la firma de acta de inicio por parte del contratista; de esta manera se comienza con los actos de vecindad y de entorno en el sector, la comisión topografica del contratista realiza la localización y replanteo como tambien el levantamiento de la rasante existente y de esta manera tener la cartera de inicio del proyecto; por otro lado se puede evidenciar que algunos propietarios no se encuentran en sus predios ya que son casas fincas de descanso por lo que se hace comunicación telefonica por medio de la presidenta de la JAC para poder determinar los días a visitar para la revisión de las condiciones de las viviendas, se plantea el siguiente fin de semana. Por otro lado se encuentra una dificultad con los permisos de entorno ya que las personas no acceden a que se hagan las obras transversales en sus predios o decales. Se presenta contingencia en el municipio ya que por un movimiento en masa, la via de acceso de los municipios Marinilla - El Peñol fue afectada lo que hace que el tramo a intervención sea la via alterna para las personas que viajan al municipio del Peñol y Guatapé.




Fecha: miercoles 16/11/2022


Clima: en la noche anterior llueve, el día muy lluvioso

Personal: residente interventoria, ingeniero residente, supervisor, oficial, ayudante Raso

Equipo: Retroexcavadora de llanta, volqueta sencilla 2, volqueta doble troque

Actividades: las actividades del tramo No. 2 de la via Marinilla nuevo Peñol - el Pozo, se inicia con la medición de anchos y verificación del abocinado para dar arranque a la ejecución de obra; llega material necesario para la ejecución como es un viaje de triturado tubería, cordonería y equipo para iniciar con la excavación. Se recomienda al contratista el cierre de la via para continuar con los trabajos por lo que se debe hablar con la alcaldia de Marinilla y El Peñol, ya que con ellos los que autorizan dicho cierre.







Fecha: Jueves 17/11/2022

Clima: en la noche anterior llueve y la mañana es muy lluviosa

Personal: residente de interventoría, ingeniero residente, supervisor, oficial, ayudante rasador

Equipo: retroexcavadora de llanta, volqueta sencilla 4, volqueta doble troque

Actividades: Se autoriza el cierre de la vía para continuar con el desarrollo normal del proyecto, se inicia con la excavación del material de la vía así como también en los costados para dar el ancho correspondiente y conformar la calzada; se está a la espera de las actas de entorno para viabilizar el correspondiente y conformar el inicio de las obras transversales que se encuentran en el diseño hidráulico. Desde la parte social nos informan que no fue posible realizar las actas de entorno, los propietarios se oponen a la realización de las obras transversales dentro de los predios ya que dentro del diseño hidráulico se tiene contemplado en las siguientes abscisas K2+195, K2+352, K2+482 del tramo No. 2 vía Marinilla Nuevo Peñol - El Pozo; se solicita al contratista que convoque una reunión en la cual puede explicar de una manera más clara a los propietarios porque es pertinente realizar las obras transversales.




Fecha: Viernes 18/11/2022

Clima: lluvia en la mañana y soleado en la tarde.

Personal: residente de interventoría, ingeniero residente, supervisor, oficial, Ayudante rasador

Equipo: retroexcavadora de llanta, volqueta sencilla 4, volqueta doble troque 2

Actividades: se inicia con la compactación de la subrasante para darle firmeza y poder aplicar el material de préstamo o afirmado en capas de 8.5cm y lograr darles las tres capas para realizar los ensayos de conos y así liberar el tramo y poder instalar la subbase granular lo que implicaría no retrasar el correcto desarrollo de la obra y aplicar las capas correspondientes a las sugeridas por parte de la interventoría, se realizó la segunda reunión con los propietarios para dar claridad al tema de las obras transversales pero no fue posible que se autorizara la realización de las obras propuestas por el diseño hidráulico por lo que se

solicita a la comunidad realizar un documento que informe a la alcaldía de las actividades gestionadas por la JAC, contratista e interventoría para poder resolver el tema pero no se logro el respectivo permiso, por lo que se continua con el proceso sin las obras transversales por lo que se hace salvedad que la comunidad fue informada por el contratista e interventor del riesgo que eso conlleva; el no adecuado manejo del agua por la vía. Se puede evidenciar la instalación de la señalización correspondiente al PMT, se le da instrucciones precisas al personal a cargo de la obra para el buen manejo de los residuos sólidos así como también de la instalación de puntos ecológicos.

Fecha: sábado 19/11/2022

Clima: llana en la noche y en la mañana

Personal: residente de interventoría, ingeniero residente, supervisor, oficial 2, ayudante ra 604

Equipo: retroexcavadora de llanta, volqueta sencilla 2, volqueta doble troque

Actividades: se sigue llenando con material de préstamo (afirmado), se observan 3 puntos críticos en las siguientes aberturas K2+409 presenta problema con el arrastre de material se solicita al contratista aplicar mas afirmado y compactar, K2+343 costado derecho por arrastre de material, lo mismo que en la abtura K2+488 costado izquierdo; por otro lado en el K2+504, K2+243 y K2+564 se solicita el reemplazo del material ya que la lluvia de la noche, hizo que el material se saturara demasiado y se presentara acoldonamiento.

Fecha: lunes 21/11/2022


Clima: lluvia en la mañana y soleado en la tarde

Personal: residente interventoría, ingeniero residente, supervisor, oficial, ayudante ra 603

Equipo: retroexcavadora de llanta, vibrocompactadora tipo ranca, volqueta sencilla 2, volqueta doble troque

Actividades: el primer tramo de 80 mts ya que se realizaron bagos de cono de arena para la instalación de subbase, ya no presenta fallas y se puede continuar con la instalación de afirmado y de bordillo se continua con la aplicación de la subbase por lo que se recomienda que se realice en capas pequeñas de 10 cms para lograr llegar a la compactación requerida por el contrato,

y de esta manera liberar el tramo para iniciar con el vaciado de concreto e instalación de parrillas y aceros de refuerzo transversal.





Fecha: Martes 22/11/2022

Clima: mañana soleada y lluvia en la noche

Personal: residente interventoria, ingeniero residente, supervisor, oficial, ayudante raso 4

Equipo: retroexcavadora de llanta, vibrocompactador t-po rana, volqueta sencilla 2, volqueta doble troque

Actividades: se continua con la instalación de bordillo y el material afirmado, se realiza la compactación de la subbase con el afirmado para obtener la resistencia adecuada. Se verifica el material aplicado el día anterior que fue reemplazado y se autoriza para continuar instalando material de afirmado como subbase, se identificaron unos puntos con acolchamiento en K2+400, K2+405. Se solicita el reemplazo de material.




Fecha: miércoles 23/11/2022

Clima: lluvia en la mañana y soleado en la tarde

Personal: Residente de interventoria, ing. residente, supervisor, oficial, ayudante raso 4

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador t-po rana, volqueta sencilla, volqueta doble troque

Actividades: se presenta lluvia en la noche y se ve afectado parte del material instalado con el lavado de la subbase y acolchamiento. Se inicia con el cambio de material para dar vía libre al vaciado de concreto en el K2+544 que se autoriza el vaciado de concreto hidráulico.





Fecha: Jueves 24/11/2022

Clima: Mañana y tarde soleada

Personal: Residente interventoria, ing. residente, supervisor, oficial 2, ayudante vaso 4

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana

Actividades: Se inicia con la preparación de los equipos Vibrador de concreto, planta eléctrica para el ingreso de los camiones de concreto hidráulico en la abisa K2+844 y se avanzan 45 ml en un ancho de 5 mts; se verifica la cantidad de paquitas de 4/8" y dovelas de 3/8" para la longitud programa de premezclado.





Fecha: Viernes 25/11/2022

Clima: Mañana lluviosa y tarde Soleada.

Personal: Supervisores, Oficial 2, ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Las lluvias de la noche anterior lavaron el material instalado de préstamo y subbase se realiza la limpieza y se instala nuevo material para reemplazarlo; se continúa con la instalación de cordonería y subbase. En la tarde llegan camiones con concreto premezclado, se toman muestras de masa a flexión.




Fecha: Sábado 26/11/2022

Clima: Mañana Soleada y tarde nublada

Personal: Supervisores, Oficial 2, ayudante vaso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se continúa con la instalación de cordonería y subbase, realizando la instalación en capas pequeñas para poder dar la compactación adecuada, se instala plástico a la superficie para protegerla de la lluvia.








Fecha: 27/11/2022 Domingo

Clima: Mañana Soleada y la tarde igual

Personal: Supervisores, Oficial 2, Ayudantes Raso 3

Equipo: vibrocompactos tipo rana, cortadora de piso

Actividades: Se realiza el corte de piso con la cortadora y se inicia con el lleno del espaldar de los bordillos, se continua con la compactación de la subbase para tenerla a punto el día de mañana.



Fecha: Lunes 28/11/2022

Clima: Mañana Lluviosa y Tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoría, Supervisores, Oficial 2, Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: En la noche anterior llueve muy fuerte y se generan daños en varios sectores por lavado de materiales, se realiza la toma de densidades a las zonas menos afectadas. y se continua con la instalación de subbase.

Fecha: Martes 29/11/2022



Clima: Mañana Lluviosa y tarde Lluviosa.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoría, Supervisor, Oficial 2 Ayudante raso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se continua con la instalación de bordillos y subbase granular; se presenta cierre en la vía principal de —

marinilla - el Peñol por lo que los vehículos tomaron como vía alterna el trazo en intervención, se plantea el cierre total con material de la obra para evitar el daño como lo fue en días anteriores.


Fecha: Miércoles 30/11/2022

Clima: Noche y madrugada lluviosa; Mañana con lluvia

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se inicia el día con la limpieza de los deslucamientos y limpieza de la rasante ya que por las lluvias de la noche anteriores y la madrugada se lavó parte del material, se puede evidenciar el paso en horas de la noche de vehículos tipo motocicleta.


Fecha: Jueves 01/12/2022

Clima: Mañana Soleada y tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, supervisor, Oficial 2, Ayudante vaso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se realiza ensayos de cono de arena y se libera el trazo para la instalación de concreto hidráulico, llega a la obra material de bordillos para continuar con esta actividad.


Fecha: Viernes 02/12/2022

Clima: Mañana Nublada y tarde Soleada.

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se inicia a intervenir el tramo 2 de marimilla con la excavación y conformación; en el tramo 1 se continúa con la instalación de subbase y bordillos; los bordillos se instalan hasta llegar a la placa huella; se realiza ensayo de cono de arena




Fecha: Sábado 03/12/2022

Clima: Mañana Soleada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante vaso 7

Equipo: Retroexcavadora tipo llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se continúa con la instalación de material de préstamo en el tramo 1 y se inicia la instalación de bordillo, en el tramo 2 se sigue con la compactación de la subbase.





Fecha: Lunes 05/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventor, Supervisor, Oficial 2, Ayudante vaso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Llegan camiones con concreto premezclado a la obra se inicia con esta actividad, se instalan pasajuntas y doweles; en el tramo 1 se continúa con la instalación de afirmado. se toman muestras de viga a flexión


Fecha: Martes 06/12/2022

Clima: Mañana lluviosa y Tarde Soleada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoria, supervisor, oficial 2, Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se inicia el día con el vaciado de concreto premezclado, en el tramo 1 se continúa con la instalación de bordillos y la compactación del afirmado.



Fecha: Miércoles 07/12/2022

Clima: Mañana Soleada y Tarde Soleada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventoria, supervisor, oficial 2, Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Llegan camiones con concreto hidráulico a la obra para continuar con el vaciado de concreto, se realiza la toma de muestras de cono de arena, en el tramo 1 se continúa con la instalación de afirmado y subbase; se toman muestras vigor a flexión.


Fecha: Jueves 08/12/2022

Clima: Mañana Nublada y tarde Soleada

Personal: Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se presentan daños por cuenta de vehículos tipo motocicleta y camioneta que transitaban por el concreto que fue instalado el día de ayer y se evidencia las marcas de llantas sobre el texturizado del concreto; se continúa con la instalación de bordillos y subbase en tramo 1.





Fecha: Viernes 09/12/2022

Clima: Mañana Nublada y Tarde Nublada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventor, Supervisor, Oficial 2 y Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: A las 9:00 am llega el primer camión con concreto hidráulico para continuar con el vaciado, se realiza ensayo de cono de arena para liberar el trazo para continuar con el vaciado, se continúa con la instalación de bordillos en el trazo 1.





Fecha: Sábado 10/12/2022

Clima: Mañana Nublada

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, Supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 7.

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: El día de hoy se programaron 2 camiones de concreto hidráulico y se continúa con la instalación de bordillo y subbase en el trazo 1; se toman muestras vigas a flexión.




Fecha: Lunes 12/12/2022

Clima: Mañana Nublada y Tarde Soleada.

Personal: Ing. Residente, Ing. Interventora, supervisor, Oficial 2, Ayudante raso 7

Equipo: Retroexcavadora de llanta, vibrocompactador tipo rana.

Actividades: Se inicia con la llegada de camiones con concreto hidráulico y se realizan ensayos de cono de arena para liberar otro trazo para el concreto; en el trazo 1 se sigue con la instalación de bordillo y subbase.

No. PÓLIZA	M-100178597	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14749075	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 14/09/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 14/03/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ				No. DOC. IDENTIDAD	900.355.893-9	
DIRECCIÓN	CRA 79 55-15				TELÉFONO	3207190109	
ASEGURADO	J.H.C. S.A.S.				No. DOC. IDENTIDAD	900.334.866-1	
DIRECCIÓN	CALLE 30 NO 32A-50 INT. 107 MARINILLA - ANT.				TELÉFONO	5691924	
BENEFICIARIO	J.H.C. S.A.S.				No. DOC. IDENTIDAD	900.334.866-1	
DIRECCIÓN	CALLE 30 NO 32A-50 INT. 107 MARINILLA - ANT.				TELÉFONO	5691924	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.003-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022083050053.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS: J.H.C S.A.S NIT: 900334866-1 Y/O MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE NIT: 800108848-6.

HOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/09/2022	24:00 Horas Del 14/07/2023	1.025.934.270,20	2.129.165,00
PAGO ANTICIPADO	00:00 Horas Del 14/09/2022	24:00 Horas Del 14/07/2023	4.103.737.080,80	8.516.660,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/09/2022	24:00 Horas Del 14/03/2026	1.025.934.270,20	8.973.411,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 14/03/2023	24:00 Horas Del 14/03/2028	2.051.868.540,40	25.676.465,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 8.207.474.161,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		45.295.701,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA META	\$ 45.295.701,00
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
			IVA	\$ 8.607.133,19
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/09/2022		TOTAL A PAGAR	\$ 53.907.834,19

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	M-100036860	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14749149	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		
00:00 Horas Del		14/09/2022		24:00 Horas Del		14/07/2023		
				N/A		N/A		
				N/A		N/A		
TOMADOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ						No. DOC. IDENTIDAD	900.355.893-9
DIRECCIÓN	CRA 79 55-15						TELÉFONO	3207190109
ASEGURADO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ						No. DOC. IDENTIDAD	900.355.893-9
DIRECCIÓN	KR 46 39 102 URB EL ROSAL						TELÉFONO	3207190109
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS						No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN							TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 003-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (J.H.C. S.A.S. NIT 900334866-1 Y/O MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE NIT 800108848-6) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (J.H.C. S.A.S.).

- BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (J.H.C. S.A.S. NIT 900334866-1 Y/O MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	512,967,135.00	1,025,934,270.20	1,025,934,270.20	2,554,997,95
GASTOS MEDICOS	307,780,281.00	512,967,135.10	512,967,135.10	0,00
PATRONAL	307,780,281.00	512,967,135.10	512,967,135.10	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	307,780,281.00	512,967,135.10	512,967,135.10	0,00
R.C. CIVIL	307,780,281.00	512,967,135.10	512,967,135.10	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	307,780,281.00	512,967,135.10	512,967,135.10	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 1,025,934,270.20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 2,554,997,95
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 2,554,997,95
GASTOS EXP.	\$ 5,000,00
IVA	\$ 486,399,61
TOTAL A PAGAR	\$ 3,046,397,56

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2005 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/11

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN LA CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SÉGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100036860	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14749149	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	19/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	08:00 Horas Del 14/09/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 14/07/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EMBALSES RIO NEGRO Y NARE NIT 800108848-6) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

1 de 3

FECHA

7/12/2022

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: MASER

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 003 -2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
BPIN 2022003050053

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PS-010-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MUSA - CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realiza la lectura del acta de comité de obra No.1; se informa acerca de la reunión con el alcalde de Santo Domingo y se le explico detalladamente el por que no se puede mover el tramo, se envió formato de respuesta a la solicitud del municipio de Concepción para ser redirigido por MASER directamente a la alcaldía.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Resumen detallado de las actividades ejecutadas en cada municipio de entrega de acta e informe de contratista, interventoría presupuestal por los cambios de precios del mercado de materiales

Tiempo
Actualización



ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se inicia con el resumen detallado de actividades por cada municipio por parte del Ing. Miguel Ángel Vargas a los asistentes en el cual describe las dificultades hasta el momento en los siguientes municipio Marinilla, El Peñol y Concepción; Para el caso concreto de Marinilla y El Peñol se presenta pérdida de la calzada lo que ocasiona que los vehículos se desplacen por el tramo a intervenir y se generan daños en el material de afirmado y subbase ya instalado, se coordina con las alcaldía de Marinilla y El Peñol el cierre total de la vía para continuar con los trabajos. En el caso del municipio de Concepción se tiene el cierre temporal para vehículos de carga por la construcción del puente en el sector de El campamento de acceso al municipio, adicionalmente se tiene un movimiento en masa en el sector el Palmichal que impide el movimiento de material para los tramos a intervenir. En el municipio de Granada se informa el avance de 250 mts de pavimento rígido y los trabajos en el Cruce del Ramal las Palmas se iniciaría las próxima semana, en el municipio de El Peñol sector Yarumos se inicio con la instalación de tubería, conformación y excavación de material. En el municipio de Santo Domingo se inicio con la excavación y conformación del tramo en la vereda San Pedro. Juliana por parte de MASER informa que la fecha limite de entrega del informe y acta de cobro es el 15 de Diciembre por el tema de cierre de las plataformas del SGR. Para la actualización presupuestal el contratista envió el estudio de mercado y el archivo con los cambios realizados al presupuesto sin afectar el objetivo y alcance del mismo el Ing. Faber Arenas nos informa que va realizar la revisión de la actualización.



ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

1 de 3

FECHA

16/11/2022

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: MASER

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 003 -2022

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JHC S.A.S. - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo
BPIN 2022003050053

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PS-010-2022

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MUSA - CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Aclarar el tema documental y fechas de entrega de documentos para maser por parte del contratista

Definir el punto de instalación de las vallas

Dar respuesta a solicitud del municipio de Concepción para mover el tramo de lugar

Definir lugar y hora de la reunión con el alcalde de Santo Domingo para definir temas de los tramos a ejecutar

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se inicia con la presentación del personal tecnico de cada una de las areas del proyecto y de la interventoria, se realiza el cruce de correos electronicos en los cuales se van a enviar los oficios desde el contratista a la interventoria y viceversa, se acuerda la entrega de los informes para los 5 primeros dias del mes. Se realiza la presentación del informe ejecutivo por parte de Auxiliar de Interventoria Javier Tobon de todos los hallazgos por parte de la interventoria en los tramos a ejecutar. De acuerdo a la presentación de la interventoria el contratista solicita que se tenga en cuenta los retrasos para la finalización del contrato por la suspension de labores en el municipio de San Carlos, puesto que en la socialización se le informo al contratista por parte de la alcaldia que el tramo a ejecutar no se puede iniciar hasta que el alcantarillado contemplado por la administración no este instalado, se acuerda que desde la interventoria se realizara un documento solicitando a la alcaldia de San Carlos los tiempos de ejecución del alcantarillado y se enviara con copia a MASER. Para las vallas se define que la supervisión enviara el arte de la valla para que sea aprobada e instaladas en los diferentes municipios, se revisa la solicitud de mover los tramos a ejecutar en los municipios de Concepción y Santo domingo, se realiza el analisis y se define que por los componentes tecnicos no es posible realizar el desplazamiento de los tramos puesto que no se tiene como tal diseños de pavimento, geometrico, estudio de suelos y tampoco hidraulico por lo que la petición no aplica en este caso ya que afectaria el objetivo y alcance del proyecto; se define reunión con el alcalde de Santo Domingo para exponer los temas tecnico de la solicitud.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3




COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/12/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jonny Marin Agudelo	Director Ejecutivo	MASER	
Sara Baena	Ingeniera de Supervisión	MASER	
Jose Antonio Rodriguez	Director de Obra	Ingenieria y Contruccion WJ S.A.S.	
Alejandra Tobon Duque	Ingeniera Ambiental	Ingenieria y Contruccion WJ S.A.S.	
Jakelyn Arias Ramirez	Administradora en SST	Ingenieria y Contruccion WJ S.A.S.	
Marcela Valencia Velasquez	Representante Legal	Constructores Asociados HyG S.A.S.	
Luisa Maria Rocha	Ingeniera Ambiental	Constructores Asociados HyG S.A.S.	
Javier Tobon Giraldo	Auxiliar de Interventoria	Constructores Asociados HyG S.A.S.	
Miguel Ángel Vargas Ortiz	Ingeniero Residente	Constructores Asociados HyG S.A.S.	
Juliana Ruiz	Ingeniera de Supervisión	MASER	



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INFORME # 1

GESTIÓN AMBIENTAL

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo



CONTRATO DE OBRA N° 003-2022

PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INTRODUCCIÓN

El presente informe indica de manera detallada cómo se desarrollan las actividades ambientales propuestas en el Plan De Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del proyecto: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo de la empresa contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental.

Objetivo general

- Dar cumplimiento a las medidas de manejo ambiental del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.

Objetivos específicos

- Establecer un conjunto de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas para mejorar y/o mantener la calidad ambiental en el área de influencia y así evitar o mitigar los impactos negativos del proyecto.
- Contribuir a la conservación del medio ambiente durante cada una de las etapas del proyecto.

1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

1.1. Conformación del grupo de gestión ambiental – DAGA-1.1-01

Se realizó la conformación del grupo de gestión ambiental, para el proyecto de la referencia; con sus respectivos participantes. En el anexo 1 se relaciona el acta de conformación del comité ambiental y el listado de asistencia.

1.2. Capacitación ambiental al personal de la obra – DAGA-1.2-02

Se realizó una inducción al personal de obra, con el fin de educar a los empleados en la protección y cuidado del medio ambiente. En esta capacitación se dio información general sobre las actividades que se deben realizar para dar cumplimiento al PAGA formulado para el proyecto.

Cabe mencionar que para los municipios de Santo Domingo y El Peñol las capacitaciones quedan pendientes para el siguiente mes, de acuerdo al plan de



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

trabajo. El municipio de San Carlos no se presenta inducciones ya que la obra se encuentra suspendida por la construcción de un alcantarillado por parte del municipio.

En el anexo 2 se presentan las planillas de asistencia y las actas de reunión correspondientes. A continuación se muestra el registro fotográfico de las inducciones ambientales realizadas a la fecha:



Imagen 1. Inducción al personal técnico del proyecto.



Imagen 2. Inducción al personal de obra en la vereda Tafetanes de Granada.



Imagen 3. Inducción al personal de obra en la vereda Pozos de Marinilla.



Imagen 4. Inducción al personal de obra en la vereda Sonadora de Concepción.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

1.3. Cumplimiento requerimientos legales - DAGA-1.2-03

A la fecha no se ha requerido del trámite de licencias o permisos ambientales. Se cuenta con la documentación legal ambiental de la fuente de material que corresponde a la empresa INGETIERRAS y CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA.

Nombre de la cantera	Licencia Ambiental		Registro Minero
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA	112-2776-2017	Tiempo de duración del proyecto.	03/12/2032
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A	131-0670	Tiempo de duración del proyecto.	30/05/2037

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

2.1. Proyecto de manejo integral de materiales de construcción – PAC-2.1-04

Para hacer el almacenamiento se verificó que las cantidades acopiadas en los frentes de obra correspondieran únicamente al necesario para trabajar una o dos jornadas. Además se ubicó teniendo en cuenta que no se afectaran los recursos naturales próximos a los tramos de intervención ni la seguridad de los trabajadores o población que transita por el lugar.

En cuanto al almacenamiento temporal de las bolsas de cemento se tiene en cuenta cuando está a la intemperie cubrirlas adecuadamente y ponerlas sobre un material impermeable para evitar deterioro.

Para algunos de los municipios donde se está ejecutando el proyecto se han establecido lugares de acopio temporal de materiales, tal como se muestra a continuación:

- **Granada:** En la vereda Tafetanes se tiene un acopio temporal de material en el salón de la Junta de Acción Comunal en donde se almacenan bultos de cemento, herramientas y elementos de protección personal de los trabajadores. Dicho lugar se encuentra confinado por lo cual no se presentan riesgos de contaminación a sistemas naturales.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Además se tiene el almacenamiento de materiales pétreos en los frentes de obra en cantidades requeridas para una o dos jornadas laborales.



Imagen 5. Almacenamiento temporal de cemento.



Imagen 6. Almacenamiento temporal de cemento.

- **Concepción:** Para este municipio se hace el acopio temporal en los frentes de obra. Este se encuentra cubierto con un material para protegerlo de las condiciones ambientales.



Imagen 7. Almacenamiento temporal de materiales.

- **Marinilla:** En este municipio se tiene un acopio temporal en una vivienda localizada sobre el tramo intervenido. Este lugar tiene los materiales debidamente separados, cubiertos y señalizados. Además se



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

tiene almacenamiento temporal en los frentes de obra a los costados de la vía, garantizando que estos materiales sean cubiertos.



Imagen 8. Acopio temporal de materiales.



Imagen 9. Almacenamiento de materiales.

- **Santo Domingo:** En este municipio se está empezando a realizar el acopio temporal de material. Actualmente se está haciendo la gestión del acta de compromiso para acopio temporal de materiales.



Imagen 10. Acopio temporal de materiales en la vereda Saltillo.



Imagen 11. Almacenamiento de materiales en la vereda Saltillo.

- **El Peñol:** A la fecha en la vereda Yarumo se ha hecho únicamente acopio de materiales pétreos y bordillo.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 12. Acopio temporal de materiales en la vereda Yarumo.



Imagen 13. Almacenamiento de materiales en la vereda Yarumo.

- **San Carlos:** No se reporta información debido a que las actividades del municipio se encuentran suspendidas por la instalación del sistema de alcantarillado por parte de la administración municipal.

2.2. Proyecto de explotación fuentes de materiales - PAC-2.2-05.

No aplica.

2.3. Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales – PAC-2.3-06

Para cada uno de los municipios se han instalado señales preventivas e informativas en los frentes de obra durante el periodo. A continuación, se hace una relación de las señales instaladas durante el periodo comprendido entre el 15 y 30 de noviembre.

- **Concepción:**



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 14. Señalización inicio de obra.



Imagen 15. Señalización fin de obra.



Imagen 16. Señalización inicio de obra.



Imagen 17. Maletines demarcando área de almacenamiento de material.

- Granada:





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Imagen 18. Señalización de inicio de obra, vereda Las Palmas.



Imagen 19. Señalización inicio de obra, vereda Tafetanes.



Imagen 20. Señalización excavación profunda vereda Las palmas.



Imagen 21. Señalización inicio de obra, vereda Tafetanes.



Imagen 22. Señalización de peatones, vereda Tafetanes



Imagen 23. Señalización de inicio de obra, vereda Las Palmas.

Imagen 24. Señalización



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

- **Marinilla:**

	
<p>Imagen 25. Señalización de inicio de obra.</p>	<p>Imagen 26. Señalización de vía cerrada.</p>
	
<p>Imagen 27. Señalización de inicio de obra.</p>	<p>Imagen 28. Señalización de fin de obra.</p>

- **Santo Domingo:** Para este periodo de seguimiento no se tiene reporte de instalación de señalización.
- **San Carlos:** No se reportan actividades ya que este municipio se encuentra suspendido debido a que están pendiente la instalación de alcantarillado.

2.4. Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos – PAC2.4-07

Para el periodo comprendido entre el 15 y 30 de noviembre de 2022, no se reporta disposición final de escombros y lodos, estos se encuentran acopiados para luego ser dispuestos de acuerdo a la normatividad.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

2.5. Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales - PAC-2.5-08

Durante el periodo de seguimiento se tuvo en cuenta durante la inducción orientar al personal de obra sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos generados, la importancia de la limpieza en los frentes de obra al finalizar la jornada laboral y finalmente se hizo la instalación de los puntos ecológicos en los frentes de obra.

Durante este periodo, no se generó gran cantidad de residuos sólidos, por esta razón se dejaron almacenados en los acopios temporales, para posteriormente ser retirados hasta y entregados a las Empresas de Servicios Públicos de Cada uno de los municipios que se están interviniendo.

Actualmente, la empresa está realizando el proceso de suscripción como usuarios al servicio de aseo con el fin de garantizar una gestión adecuada de los residuos. Además se hizo la verificación del cumplimiento ambiental para hacer la disposición final de las bolsas de cemento con la empresa Aseo Global.

En el registro fotográfico relacionado a continuación se muestran las actividades que se han desarrollado a la fecha para cada uno de los municipios en los que se están desarrollando actividades.



Imagen 29. Instalación de punto ecológico, municipio de Marinilla.



Imagen 30. Instalación de punto ecológico, vereda Tafetanes del municipio de Granada.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 31. Instalación de punto ecológico de la vereda Las Palmas del municipio de Granada.



Imagen 32. Instalación de punto ecológico en frente de obra en el municipio de Concepción, vereda Sonadora.

3. PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

3.1. Proyecto de manejo de aguas superficiales – PGH-3.1-09

Para el desarrollo del proyecto no se requiere de permisos de ocupación de cauce ni concesiones temporales de agua superficial, por lo cual no se están generando impactos sobre el recurso hídrico. El suministro de agua se está realizando de predios aledaños a la zona de intervención, con los cuales se acordó hacer el pago del excedente en la facturación; sin embargo, por el tiempo de ejecución del proyecto a la fecha no se ha emitido esta por lo cual no hace parte del presente informe.

Durante la jornada de inducción al personal técnico y de obra se ha hecho énfasis en la importancia del acopio adecuado de materiales y prevenir fuentes de contaminación que puedan ser conducidas a cuerpos de agua superficial. Durante el periodo de ejecución se han realizado actividades de replanteo y excavaciones menores.

En cuanto a las contingencias ambientales, a la fecha no se han presentado reportes que requieran la activación de protocolos de emergencia.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

3.2. Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales – PGH-3.2-10

Para dar cumplimiento al programa PGH-3.2-10, la empresa contratista solicito a propietarios ubicados cerca de los frentes de obra, la autorización para el préstamo de la unidad sanitaria para ser utilizada por los trabajadores del frente de obra. A la fecha se están haciendo las gestiones pertinentes.

Con respecto a los residuos líquidos no domésticos, para el proyecto no se tiene contemplada la generación de los mismos.

4. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORAL DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

4.1. Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal – PMIT-5.1-15

La empresa Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S, tiene en los municipios que se van a intervenir viviendas alquiladas, las cuales funcionan como campamento para los empleados del proyecto que no son del área de influencia. Además se tienen ubicados en los frentes de obra puntos en donde se hace el acopio de material tomando en consideración que no se presenten afectaciones a los recursos naturales, cubriendo adecuadamente los materiales y aislándolos del suelo. Adicionalmente se tiene instalado material de primeros auxilios para la atención de emergencias y puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos de acuerdo al código de colores vigente para el país.

A continuación se presenta un registro fotográfico de cada uno de los lugares. Es importante aclarar que a la fecha se están haciendo las gestiones pertinentes para las autorizaciones con los propietarios de los predios, estableciendo el compromiso de retornar los lugares a las condiciones iniciales una vez se culmine con las intervenciones:



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 33. Sitio de almacenamiento temporal -vereda Yarumo, municipio del Peñol.



Imagen 34. Almacenamiento de materiales en puntos de acopio temporal en el municipio de Granada en la vereda Las Palmas.



Imagen 35. Almacenamiento temporal en Granada, vereda Las Palmas.



Imagen 36. Almacenamiento temporal en Granada (Las Palmas).



Imagen 37. Almacenamiento temporal de



Imagen 38. Almacenamiento



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

materiales en Tafetanes (Granada).	temporal de materiales de construcción Marinilla.
------------------------------------	---

4.2. Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto – PMIT-5.2-16.

No aplica.

4.3. Proyecto de manejo de maquinaria y vehículos – PMIT-5.3-17

Para los vehículos y maquinaria utilizada en los frentes de obra para cada uno de los municipios se revisó previamente el cumplimiento de la documentación legal, verificando tarjeta de propiedad, seguro y revisión técnico-mecánica en los casos en los que aplica. Además durante las inspecciones oculares realizadas desde el área ambiental se verificó que estas estuvieran previamente aprobadas. A continuación se hace una relación de maquinaria y equipos utilizados en cada uno de los municipios en los que se están ejecutando labores:

Maquinaria:

Para el periodo reportando en el presente informe, se contó para cada uno de los municipios con la siguiente maquinaria:

Municipio	Maquinaria	Registro fotográfico
Concepción	Retroexcavadora	



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Granada Las Palmas	Retroexcavadora	
Granada-Tafetanes	Motoniveladora	
Granada-Tafetanes	Retroexcavadora	
Granada-Tafetanes	Concretadora (trompo)	



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Marinilla	Motoniveladora	
Marinilla	Retroexcavadora	
Santo domingo	Retroexcavadora	

Vehículos:

A continuación se presenta la relación de vehículos utilizados en cada uno de los frentes de obra. Adicionalmente se anexa la documentación legal de cada uno de los vehículos en el anexo 4.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Municipio	Vehículo	Registro fotográfico
Granada- Las Palmas	Volqueta	
Granada- Tafetanes	Volqueta	
Marinilla	Volqueta	



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Marinilla	Camión tipo turbo	
-----------	-------------------	--

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra reportadas dentro del informe del área correspondiente.

6. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PBSE)

9.1. Proyecto de protección de fauna y flora– PBSE-6.1-13

A la fecha no se reportan avistamientos de fauna silvestre en los frentes de obra; no obstante desde la inducción se dieron algunos lineamientos para seguir en caso de presentarse un avistamiento.

Dada la importancia de este componente desde la gestión ambiental desde el PAGA se establecieron lineamientos para prevenir la generación de impactos ambientales.

Debido a que el proyecto pretende el mejoramiento en los corredores viales no se tocan especies forestales que requieran la adopción de medidas de manejo especiales.

7. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

En el informe de gestión social se amplían las actividades ejecutadas con corte al 30 de noviembre respecto al componente social del proyecto.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

ALEJANDRA TOBÓN DUQUE

Ingeniera Ambiental

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

Anexos

- Anexo 1. Acta de conformación del comité ambiental y listado de asistencia
- Anexo 2. Listado de asistencia capacitación ambiental
- Anexo 3. Documentos fuentes de materiales
- Anexo 4. Documentos legales de vehículos

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de elaboración	27/10/2022
		Código	Act_AMB_001
		Versión	1
		Páginas	

DATOS GENERALES							
Número de acta			001				
Contratista:			Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S				
Lugar:	Instalaciones de Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S	Fecha:	16/10/2022	Hora Inicio:	8:30 am	Hora Finalización:	9:30 am
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo	Anexa listada de asistencia					
		SI		X		NO	
Objetivo de la reunión:	Conformar el comité de gestión ambiental para el proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo”						



AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Contextualización sobre las actividades constructivas que se pretenden ejecutar.
2	Información general del Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental.
3	Conformación del comité de gestión ambiental.

DESARROLLO TEMÁTICO	
<p>El día 16 de octubre del año en curso se realizó una reunión convocada por parte del director de obra y la profesional ambiental con la finalidad de hacer una contextualización sobre el proyecto y las actividades propuestas dentro del componente ambiental, haciendo alusión a los programas que se tienen planeados para dar cumplimiento a la gestión ambiental en los frentes de obra.</p> <p>A continuación se dio una explicación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes frente a las actividades propuestas y se hizo la convocatoria para la conformación del grupo de gestión ambiental, incluyendo dentro de este comité al director de obra como coordinador, a la profesional ambiental y a la residente de Seguridad y Salud en el trabajo. Posteriormente se tiene planeada la incorporación de los residentes civiles.</p>	
CONCLUSIONES	
1	Se dio cumplimiento al orden del día planeado para la reunión del grupo técnico del proyecto.
2	Se pudo hacer la conformación del grupo de gestión ambiental.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Ninguna		

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa listado de asistencia

	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION			Código	RG-CP-001
				Versión	1
				Páginas	1
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO				
N° DE CONTRATO	COP-0046-2021				
FECHA	16/10/22.				
LUGAR	Rinconegro - Antioquia.				
TEMA	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental				
	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA	
	Jose Antonio Rodríguez R.	Director Obra	79560053		
	Jaxelyn Arias Ramirez	Coord SST	1036431026		
	Alejandra Tobón Duque	Ing. Ambiental	1098769513		
Elaboró:	Alejandra Tobón Duque	Revisó:	Jose Antonio Rodríguez Careño	Aprobó:	Jose Antonio Rodríguez Careño

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de elaboración	27/10/2022
		Código	Act_AMB_001
		Versión	1
		Páginas	

DATOS GENERALES							
Número de acta			002				
Contratista:			Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S				
Lugar:	Frentes de obra en los municipios de Marinilla y Granada	Fecha:	17/11/2022	Hora Inicio	10:00 am	Hora Finalización:	4:00 pm
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo	Anexa listada de asistencia					
		SI		X		NO	
Objetivo de la reunión:	Hacer inducción al personal operativo del proyecto en las buenas practicas ambientales que se deben desarrollar en obra en los municipios de Granada y Marinilla.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Información general del Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental.
4	Buenas prácticas ambientales en los frentes de obra.

DESARROLLO TEMÁTICO	
<p>El día 17 de octubre se realizó una reunión con el personal operativo en los frentes de obra de Marinilla y Granada, con la finalidad de hacer una contextualización sobre el PAGA para el desarrollo del proyecto, haciendo alusión a los programas que se tienen planeados para dar cumplimiento a la gestión ambiental en los frentes de obra.</p> <p>A continuación se dio una explicación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes frente a las actividades propuestas.</p> <p>Finalizando la reunión se hace una lluvia de ideas sobre los conocimientos obtenidos en relación con la gestión ambiental.</p> <p>La reunión para el municipio de Granada se realizó a las 10:00 a.m y para el municipio de Marinilla se hizo a las 3:00 p.m.</p>	
CONCLUSIONES	
1	Se dio cumplimiento al orden del día planeado para la reunión del personal operativo.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Ninguna		

 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de elaboración	27/10/2022
		Código	Act_AMB_001
		Versión	1
		Páginas	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa listado de asistencia

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de elaboración	27/10/2022
		Código	Act_AMB_001
		Versión	1
		Páginas	

DATOS GENERALES							
Número de acta			002				
Contratista:			Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S				
Lugar:	Frentes de obra en los municipios de Marinilla y Granada	Fecha:	18/11/2022	Hora Inicio	11:00 am	Hora Finalización:	12:00 pm
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo	Anexa listada de asistencia					
		SI		X		NO	
Objetivo de la reunión:	Hacer inducción al personal operativo del proyecto en las buenas prácticas ambientales que se deben desarrollar en obra en el municipio de Concepción.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Información general del Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental.
4	Buenas prácticas ambientales en los frentes de obra.

DESARROLLO TEMÁTICO	
<p>El día 18 de octubre se realizó una reunión con el personal operativo en el frente de obra del municipio de Concepción, con la finalidad de hacer una contextualización sobre el PAGA para el desarrollo del proyecto, haciendo alusión a los programas que se tienen planeados para dar cumplimiento a la gestión ambiental del proyecto.</p> <p>A continuación se dio una explicación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes frente a las actividades propuestas.</p> <p>Finalizando la reunión se hace una lluvia de ideas sobre los conocimientos obtenidos en relación con la gestión ambiental.</p>	
CONCLUSIONES	
1	Se dio cumplimiento al orden del día planeado para la reunión del personal operativo.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Ninguna		

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa listado de asistencia

	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION		Código	RG-CP-001
			Versión	1
			Páginas	1
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
N° DE CONTRATO	COP-0046-2021			
FECHA	17/11/2022.			
LUGAR	Marinilla.			
TEMA	Inducción Ambiental.			
	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
	Jhon Atehortua	OF	109533 12	Jhon
	Pedro Velez	OFI	1294327	Pedro V
	Hernan Jaramillo	OF	70115454	Hernan
	Ruben Quiñones	AY	98480 622	RUBEN QUIÑONES
	Juan Pablo Alvarez	AY	1007115534	Juan Pablo Alvarez
	Carlos Ponton	OFICIAL	6893882	Carlos
Elaboró:	Alejandra Tobón Duque	Revisó:	Jose Antonio Rodríguez Careño	Aprobó:
			Jose Antonio Rodríguez Careño	

		REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION		Código	RG-CP-001
				Versión	1
				Páginas	1
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
N° DE CONTRATO		COP-0046-2021			
FECHA		17/11/22.			
LUGAR		Granada.			
TEMA		Inducción Ambiental.			
NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA		
Aldema Rojas white.	Ayudante	10480938	Aldema Rojas white.		
CARLOS ALBERTO PERDOMO	Ayudante	1001444293	Carlos		
JHON EDINSON G	OFICIAL	16015628	JHON EDINSON G		
Juan Carlos Malinab Lopez	Ayudante	1118538134	Juan Carlos.		
Raul Asdrubal Seina	Ayudante	1121867947	Asdrubal S.		
OSCAR CASTAÑO	OFICIAL	7073322770	Oscar		
YOFELIS R	Ayudante	299553310	YOFELIS		
Ramiro Rubio Garcia	Ayudante	1054540007	Ramiro		
carlos Mano Lopez	Ayudante	1077977708	Carlos		
Gustavo Sandoval	Maestro	100170262	Gustavo		
Jaidet Aras Carden	Ayudante	100475380	Jaidet Aras		
Guillermo Raizen	OFICIAL	10-189077	Guillermo		
Elaboró:	Alejandra Tobón Duque	Revisó:	Jose Antonio Rodríguez Careño	Aprobó:	Jose Antonio Rodríguez Careño

	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION		Código	RG-CP-001	
			Versión	1	
			Páginas	1	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO				
N° DE CONTRATO	COP-0046-2021				
FECHA	19/11/2022				
LUGAR	MUNICIPIO DE CONCEPCION				
TEMA	Inducción Ambiental				
NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA		
Diana Alejandra Ortiz	Aya	15323190	Diana A.P.		
Jhon Fredy Puerta	Oficial	70580337	Jhon Fredy		
Juan Sebastian Cardenas Franco	Ayudante	1091202344	Juan Sebastian Cardenas		
Ribeiro	Ayudante	15453628	Ribeiro		
marlen andres morales	Ayudante	1036362016	marlen morales		
Jorge Henao	Ayudante	3364409	Jorge Henao		
Elaboró:	Alejandra Tobón Duque	Revisó:	Jose Antonio Rodríguez Careño	Aprobó:	Jose Antonio Rodríguez Careño

RESOLUCIÓN No. **131-0670**

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL

26 JUN 2013

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 2820 del 2010 y

CONSIDERANDO

Mediante Auto No. 112-0142 del 6 de mayo de 2013, se inició trámite administrativo de Licencia Ambiental, en favor de la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, con Nit 811006779-8, para el Proyecto de explotación de materiales de la construcción de origen aluvial del Río Negro, ubicado en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro, Concesión Minera 6872

El día 16 de mayo de 2013, con Auto No. 112-0155, se le solicitó a la empresa interesada, la complementación de la información inicialmente presentada.

Con radicado Cornare No. 131-2264 del 28 de mayo de 2013, el señor Diego Javier Jiménez Giraldo, en calidad de Representante Legal de la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, presentó la información requerida mediante Auto No. 112-0155 de 2013.

Posteriormente mediante Auto No. 112-0178 del 14 de junio de 2013, se declaró reunida toda la información y se ordenó la evaluación de la información presentada por la empresa interesada, con radicado No. 131-2264 del 28 de mayo de 2013, con el fin de poder determinar la viabilidad del otorgamiento o no de la Licencia Ambiental solicitada.

El 17 de junio de 2013, la empresa interesada anexa una información para que sea anexada al expediente.

Una vez revisada, analizada y evaluada la información presentada por la interesada, y la visita técnica de evaluación ambiental realizada al proyecto, se emitió el Concepto técnico No. 112-0607 del 24 de junio de 2013, en donde se recomienda el otorgamiento de la Licencia Ambiental, a la empresa interesada.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que *"es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación"*.

El artículo 79 ibídem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

De la competencia de esta Corporación

Mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en Municipios y Departamentos por delegación de aquellas.

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que "la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental."

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como competencia de esta Corporación el otorgar las licencias ambientales.

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la siguiente manera:

Artículo 50 de la ley 99 de 1993. *"De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."*

Artículo 3 del Decreto 2820 de 2010. *"La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.*

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad autorizada.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental."

Esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto 2820 de 2010.

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. *Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.*

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 9, 24 y ss del Decreto 2820 de 2010, la Corporación es competente para otorgar la Licencia Ambiental solicitada por la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, además de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.

Que es competente el Director General de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto.



CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, los documentos que reposan dentro del expediente No. 056151016630 y realizada la visita al área donde se ejecutaría el mismo, un equipo técnico interdisciplinario de la Corporación, expidió los Concepto Técnico No. 112-0607 del 24 de junio de 2013, en el cual se realiza un análisis detallado de los elementos constitutivos de los términos de referencia, y en estos se identifican de manera adecuada una zonificación ambiental, con las respectivas áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas de intervención, además de todas las medidas de mitigación, compensación, conservación y recuperación de los impactos generados por el proyecto.

En la evaluación se pudo establecer que la información allegada a esta Corporación por la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, en el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de explotación de materiales de la construcción de origen aluvial del Río Negro, ubicado en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro, Concesión Minera 6872; es suficiente para la toma de decisión relacionada con la Licencia Ambiental del Proyecto y que el informe técnico referido, se encuentra ajustado a las disposiciones legales y técnicas y hace parte integral del presente Acto Administrativo y por lo tanto, las observaciones, conclusiones y recomendaciones allí contempladas son de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa interesada, en la licencia ambiental que se otorga y sobre los mismos, Cornare realizará el respectivo Control y Seguimiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación considera que el desarrollo del Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental planteadas para la presente Licencia Ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos identificados, y como quiera que se ha presentado la información suficiente para tomar decisiones y emitir el informe técnico referido, se procederá a otorgar Licencia Ambiental.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la empresa **INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN**, Licencia Ambiental para el Proyecto de explotación de materiales de la construcción, ubicado en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro, Concesión Minera 6872, en las siguientes coordenadas:

INGETIERRAS GUAYABITO (título Minero No 6872) (materiales de construcción)					
Con un área a explotar de 13 hectáreas con 6177 metros cuadrados					
TITULO MINERO	AREA (Ha)	PLANCHA IGAC	PUNTO	ESTE - Longitud	NORTE - Latitud
HHIN-12 L685 6872	13,6177	147-III-D	1	849.134,00	1.169.123,00
			2	849.093,00	1.169.261,00
			3	849.854,00	1.169.036,00
			4	849.580,00	1.169.740,00
			5	849.964,00	1.169.731,00
			6	849.108,00	1.169.985,00

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal de las siguientes especies:

Nombre común	Científico	Cantidad encontrada
Eucalipto	Eucaliptus	5
Pino	Pinus	3
Laurel	Laurusnobilis	1
Urapan	Fraxinus chinensis	1
Total		10

PARÁGRAFO: Estas especies no podrían ser comercializadas, y deberán ser compensadas con la siembra de 50 árboles nativos en las zonas protección del Río Negro.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN, que:

1. Sólo se permite la siguiente secuencia minera: Una celda en recuperación, una en explotación y una en preparación, no se podrá tener dos celdas a la vez en explotación.
2. Deberá dar cumplimiento al Acuerdo Corporativo de Cornare No 093 de 2000, sobre cenizas volcánicas.
3. Antes de dar inicio a las actividades de transporte del material hacia la planta deberá construirse un lava llantas.
4. En torno al componente social deberá entregarse información bimensual a los vecinos del área de influencia directa a través de comunicados sobre las actividades de manejo ambiental que realizan en la mina, así como mantener comunicación permanente con los mismos.
5. Deberá mantenerse en todo momento limpia la vía principal pavimentada que comunica a los municipios de Rionegro y El Retiro y establecer las medidas de seguridad vial para la salida y entrada de volquetas.

6. Con respecto a las emisiones de ruido y material particulado se deberán establecer e implementar todas las acciones necesarias para prevenir todo tipo de afectación, así como las propuestas en el P.M.A.
7. Tanto para la fase de explotación como de recuperación, se prohíbe la construcción de lagos, en razón de la seguridad aviaria por la proximidad al Aeropuerto JMC y la densidad de reservorios ya existentes; las áreas intervenidas en la fase de recuperación deberá tener la cota natural del terreno.
8. El retiro mínimo a linderos de predios vecinos debe ser de 20 metros de la pata externa del jarillón que se propone como pantalla, toda vez que, por conocimiento de procesos mineros anteriores deberá garantizarse que no se afecte la estabilidad de los terrenos en las vecindades y el mantenimiento de las áreas de colindancia desde la parte interna del proyecto minero.
9. Entregar informes trimestrales de avance de la implementación de las actividades del P.M.A., con los respectivos registros fotográficos, actas e indicadores entre otras evidencias; igualmente para lo concerniente a la propuesta de compensación con la instalación de las estaciones limnimétricas, para las de orden social y para las de protección a los recursos naturales (proyecto Plántalo).

ARTÍCULO CUARTO: La empresa interesada deberá informar a la Corporación, la fecha de inicio de actividades con 15 días de anticipación el inicio de obras del proyecto.

ARTÍCULO QUINTO: La presente licencia ambiental se otorga por el tiempo de duración del proyecto.

ARTÍCULO SEXTO: La empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN, deberá informar previamente y por escrito a CORNARE, cualquier modificación que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluación y aprobación

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la presente Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente.

El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes a que haya lugar.

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTÍCULO NOVENO: La empresa interesada deberá realizar el proyecto de acuerdo a la información suministrada a esta Corporación

ARTÍCULO DÉCIMO: CORNARE, supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento y plan de contingencia. Cualquier incumplimiento de los mismos dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: En caso que la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN, en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto de explotación de materiales de la construcción, ubicado en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro, Concesión Minera 6872; se procederá a dar aplicación a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2820 de agosto 5 de 2010 en relación con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental

ARTÍCULO DUODÉCIMO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al señor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, en su calidad de Representante Legal de la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACIÓN, o a quien haga sus veces, quien puede ser localizado en la Vía el Tranvía Kilómetro 2 frente al Colteger, Rionegro (Ant), con número telefónico 5625600.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Comunicaciones de la Corporación publicar la presente providencia en la página WEB de la Corporación, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante el mismo funcionario que la expidió.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE


CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ

Director General

Expediente: 056151016630

Asunto: Licencia Ambiental

Proceso: Tramita

ICGP 26/06/2013

Revisó: Laura Emile Marulanda Tobón

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Fecha de

06/05/2016

Hora: 11:01:54

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: HHIN-12

RMN: HHIN-12

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 31/05/2007 Hasta: 30/05/2037

Fecha y Hora de Registro: 31/05/2007 14:52:11

TITULARES:

IDENTIFICACIÓN

INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.

N 8110067798

AREA TOTAL: 13 Hectárea(s) y 6177 mt(s)2

MUNICIPIOS: RIONEGRO-ANTIOQUIA

MINERALES: GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: PUNTO UNO DE LA POLIGONAL

NORTE: 1169123,0000

ESTE: 849134,0000

PLANCHA IGAC: 147

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1169261,0000	849093,0000
1169036,0000	848854,0000
1168740,0000	848580,0000
1168731,0000	848964,0000
1168951,0000	849108,0000

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1

FECHA ANOTACIÓN: 31/05/2007

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION

FECHA EJECUTORIA: 12/02/2007

DOCUMENTO: CONTRATO

NÚMERO: 6872

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA

FECHA DOCUMENTO: 12/02/2007

LUGAR: MEDELLIN

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 6872 A NOMBRE DE INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.

***** FIN DE ESTE DOCUMENTO *****

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN
REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. con NIT número No. 8110067798, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. HHIN-12 ubicado en el municipio RIONEGRO-ANTIOQUIA, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENAS Y GRAVAS NATURALES .

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 6 días del mes de mayo del año 2022.

Pedro Perez
Cargo Responsable

AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

 LIBERTAD Y ORDEN		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.			10016781307		
PLACA	MARCA	LINEA	MODELO		
TOR224	CHEVROLET	NHR	2019		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
2.999	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO			
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ		
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	1725		
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN			
3P8149	N	9GDNLR770KB009466			
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG		
9GDNLR770KB009466	N	9GDNLR770KB009466	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN		
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS			NIT 900355893		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	104		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.		PUERTAS
032018001207363	I	30/07/2018		2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD				

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO		
05/09/2018	05/09/2018	*****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO				
SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO				
				
LT06001565977				

SOAT

2022 09 06 2022 09 07 2023 09 06



ASEGURADORA

sura

890.903.407 - 9

NÚMERO DE PÓLIZA	NÚMERO DE TORNO	CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE VIGENCIA
29550897	TOR224	CAMIONETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	2999
2019				
PLACA	SEÑAL	MARCA		
3	NHR	CHEVROLET		
NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE CHASIS	NÚMERO DE DOCUMENTO DEL TITULAR	NÚMERO DE DOCUMENTO DEL TITULAR	CAPACIDAD DE CARGA
3P8149	9GDNLR770KB009466	9GDNLR770KB009466	9GDNLR770KB009466	1725.0
NOMBRE Y NÚMERO DEL TITULAR		TIPO DE DOCUMENTO DEL TITULAR	NÚMERO DE DOCUMENTO DEL TITULAR	CUBIERTA DE SEGURO
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS		3135928652	NIT	9003558939
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓDIGO NACIONAL DE EMPRESA	CLASE DE VEHÍCULO	NÚMERO DE PLACA	CUBIERTA DE SEGURO
AT1318	248	4999		
SEÑAL	PREMIUM SOAT	CONTROLES DE ACCIDENTES	TASA DE RIESGO	AMPAROS POR VÍCTIMA
310	\$ 480,600	\$ 249,900	\$ 1,900	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS
TOTAL A PAGAR \$ 732,400				B. INCAPACIDAD PERMANENTE
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

800 SALARIOS
180 MÍNIMOS
750 LEGALES
10 DIARIOS
VIGENTES

Andrés G. G. G.



CON EL SOAT SURA VAMOS MÁS ALLÁ

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del #888.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO NACIONAL DE UNIFORMES DE TRÁFICO



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 162847732

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL CORDOBS

NIT: 901151055

No. de Certificado de
Acreditación: 18-DIN-069-005

Fecha de expedición: 2022/11/26

Fecha de vencimiento: 2023/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TOR224

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: 3P8149

NRO. CHASIS: 9GDNLR770KB009466

VIN: 9GDNLR770KB009466

LÍNEA: NHR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS

Corporación RUNT S.A. / N° 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 01800093309119 / www.runt.co.cr



Samsung Triple Camera
GERMAN ISAZA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 48985

No. DE REGISTRO
MC016512

MARCA
JCB

LINEA
3CX CM

AÑO MODELO
2012

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
RETROEXCAVADORA

No. SERIE
JCB3CX4TP02104532

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
SB320 40344U1675412

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
8070 Kg

ALTO
3610 mm

ANCHO
2230 mm

LARGO
5620 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.355.893

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO
29-08-2018

FECHA EXPEDICIÓN
29-08-2018

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

DEC. IMPORTACIÓN

FECHA DE LEVANTE

IMPORTACIÓN 482013000111575

19/03/2013



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000033559

 LIBERTAD Y ORDEN		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.				10018760252	
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
TJY499	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2019		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
10.824	BLANCO	PÚBLICO			
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ		
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900		
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN			
35356362	N	3HTWYAHT8KN299516			
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG		
3HTWYAHT8KN299516	N	3HTWYAHT8KN299516	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.			NIT 890903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	375		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.		PUERTAS
482019000030104	I	12/01/2019		2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD				

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO		
12/07/2019	12/07/2019	*****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO				
STRIA DE TTOYTTE DEL MCPIO DE MARINILLA				
				
LT03003611476				

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA			HASTA			
AÑO	MESES	DÍA	DESDE	AÑO	MESES	DE LAS 20:59 HORAS DEL	AÑO	MESES	DÍA
2022	07	11	2022	07	12		2023	07	11



ASEGURADORA



890.903.407 - 9

Nº DE PÓLIZA:	PLACA Nº:	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
29078921	TJY499	VOLQUETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	10824	2019
PASAJEROS	MARCA	INTERNATIONAL			CARROCEJA
2	LÍNEA VEHICULO	7600SBA6X4			
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE		Nº VIN	CAPACIDAD TON	
35356362	3HTWYAHT8KN299516		3HTWYAHT8KN299516	15900.0	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		3135928652	NIT	9003558939	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1318	248	4999			
TARIFA:	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN ADRES	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	
330	\$ 878,400	\$ 456,700	\$ 1,900	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR \$ 1,337,000				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	

HASTA

800

180

750

10

**SALARIOS
MÍNIMOS
LEGALES
DIARIOS
VIGENTES**

Ana G. G. G.

FIRMA AUTORIZADA



CON EL SOAT SURA VAMOS MÁS ALLÁ

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del **#888**.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 160216290

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI RIO

NIT: 901151055

No. de Certificado de
Acreditación: 18-OIN-069-001

Fecha de expedición: 2022/07/11

Fecha de vencimiento: 2023/07/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TJY499

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10824

NRO. MOTOR: 35356362

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT8KN299516

VIN: 3HTWYAHT8KN299516

LÍNEA: 7600 SBA 6X4

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCOLOMBIA S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INFORME SOCIAL

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios
Concepción, El Peñol, Marinilla, Granada, San Carlos
y Santo Domingo”**



CONTRATO DE OBRA

COP-003-2022

NOVIEMBRE 2022



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

1.

2. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

2.1. Proyecto de atención a la comunidad – PGS-6.1-18

Dentro de los profesionales encargados de la ejecución del proyecto, se cuenta con:

Concepción: Ing. Ambiental Alejandra Tobón y el Inspector de Obra Camilo Arredondo

El peñol: Ing. Ambiental Alejandra Tobón y el Inspector de obra Luis Eliecer Cuervo

Granada: Ing. Ambiental Alejandra Tobón y el inspector de obra Roger López

Marinilla: Ing. Ambiental Alejandra Tobón y el inspector de obra John William Jaramillo Franco

Santo Domingo: Ing. Ambiental Alejandra Tobón y el director de obra José Antonio Rodríguez.

Los cuales están a la disposición de atender las quejas o reclamos que presenta la comunidad.

2.2. Proyecto de información y divulgación - PSG-6.2-19

Dentro de las actividades encaminadas en el cumplimiento del proyecto de informar y divulgar a la comunidad. Se realiza la socialización del proyecto en cada uno de los municipios, contando con la participación de los líderes de las veredas y la comunidad en general. Ver anexo 1. Acta de reunión y Anexo 2. Listado de asistencia.

A continuación se exponen las fechas de socialización en cada uno de los municipios.

Concepción: 29 y 30 de Septiembre de 2022,

El peñol: 27 de Septiembre y 3 de octubre 2022

Marinilla: 23 de Septiembre de 2022

Granada: 26 de Septiembre de 2022

San Carlos: 15 de Octubre de 2022

Santo Domingo: 07 de Octubre de 2022



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Registro fotográfico



Imagen 1. Socialización Municipio de Concepción



Imagen 2. Socialización Municipio de Concepción



Imagen 3. Socialización del proyecto vereda Yarumos – Municipio El peñol.



Imagen 4. Socialización del proyecto vereda Yarumos - Municipio El peñol.





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Imagen 5. Socialización del proyecto vereda Horizontes – Municipio El peñol.



Imagen 6. Socialización del proyecto Vereda Horizontes – Municipio El peñol.



Imagen 7. Socialización del proyecto vereda Pozos – Municipio Marinilla.



Imagen 8. Socialización del proyecto vereda Pozos – Municipio Marinilla.



Imagen 9. Socialización del proyecto vereda El ramal - Municipio de Granada.

Imagen 10. Socialización del proyecto vereda El ramal - Municipio de Granada.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 11. Socialización del proyecto vereda Tafetanes – Municipio El peñol



Imagen 12. Socialización del proyecto vereda Tafetanes – Municipio El peñol



Imagen 13. Socialización del proyecto vereda Narices- La Holanda – Municipio San Carlos.



Imagen 14. Socialización del proyecto vereda Narices- La Holanda – Municipio San Carlos.



Imagen 15. Socialización del proyecto vereda El Saltillo – Municipio Santo Domingo.



Imagen 16. Socialización del proyecto vereda El Saltillo – Municipio Santo Domingo.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 17. Socialización del proyecto vereda San Pedro – Municipio Santo Domingo



Imagen 18. Socialización del proyecto vereda San Pedro – Municipio Santo Domingo

Durante el mes de Noviembre se Instalieron las vallas informativas en los Municipios de Marinilla, Granada y Concepción.



Imagen 19. Valla informativa Municipio de Marinilla



Imagen 20. Valla Informativa Municipio de Granada.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9



Imagen 21. Valla informativa Municipio de Concepción.

2.3. Proyecto para el manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos – PSG-6.3-20

Se realizaron las actas de vecindad en los siguientes Municipios: Marinilla, El peñol, Granada, Santo Domingo.

En el Municipio de San Carlos, no se han iniciado actividades, debido a la construcción de un alcantarillado en el tramo a intervenir, por tal razón las actas de vecindad no se han realizado. Ver anexo 3.

2.4. Proyecto de contratación de mano de obra PGS-6.6-23

Se realizó contratación de mano de obra calificada con el personal asentado en el territorio, en cada uno de los Municipios; excepto en el Municipio de San Carlos ya que esta obra no se ha iniciado por actividades constructivas en el tramo a intervenir.

Para el periodo objeto de seguimiento se hace una relación de la mano de obra vinculada al proyecto.

Tabla 1. Relación personal de obra Municipio de Granada

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Granada		
Numero	Descripción de la actividad	Nº de empleos
1	Encargado de obra	2
2	Oficial de obra	4
3	Ayudante de obra	15
Total		21



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Empleos del Área de influencia	19
--------------------------------	----

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Relación personal de obra Municipio de Concepción

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Concepción		
Numero	Descripción de la actividad	Nº de empleos
1	Encargado de obra	1
2	Oficial de obra	2
3	Ayudante de obra	7
Total		10
Empleos del Área de influencia		10

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Relación personal de obra Municipio de Marinilla

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Marinilla		
Numero	Descripción de la actividad	Nº de empleos
1	Encargado de obra	1
2	Oficial de obra	2
3	Ayudante de obra	7
Total		10
Empleos del Área de influencia		2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Relación personal de obra Municipio de Santo Domingo

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Marinilla		
Numero	Descripción de la actividad	Nº de empleos
1	Encargado de obra	1
2	Oficial de obra	1
3	Ayudante de obra	3
Total		5
Empleos del Área de influencia		3

Fuente: Elaboración propia



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Viviana Ceballos H

VIVIANA DEL SOCORRO CEBALLOS HENAO
Residente Social
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

Anexos

- Anexo 1. Acta de reunión.
- Anexo 2. Listado de asistencia socialización.
- Anexo 3. Actas de vecindad

	ACTA DE REUNIÓN		Fecha de elaboración	27/10/2022
			Código	Act_SOC_001
			Versión	1
			Páginas	

DATOS GENERALES					
Número de acta					
Contratista:	Ingeniería y construcciones WJ. S.A.S				
Lugar:	Marimilla	Fecha:	23 Sept	Hora Inicio	Hora Finalización
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marimilla, San Carlos y Santo Domingo.		Anexa listada de asistencia		
			SI	X	NO
Objetivo de la reunión:	<ul style="list-style-type: none"> - Socializar con la comunidad el objetivo del proyecto. - Escuchar dudas sugerencias e inquietudes de la comunidad. - Dar a conocer los beneficios del proyecto 				

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Socializar con la comunidad el objetivo del proyecto. (presentación de la empresa).
2	Información general y alcance de valor.
3	Exposición del Área Técnica.
4	Inquietudes de la comunidad.

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>El día 16 de noviembre de 2022, se realizó Socialización con la comunidad en la zona de influencia del proyecto, este conto con la participación de los líderes de las JAC, El ingeniero encargado del proyecto. y el Director de obra.</p> <p>1. Presentación de la empresa Ingeniería y construcciones WJ. S.A.S. Se presenta la empresa y el equipo del contratista. encargados del proyecto "mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marimilla, San Carlos y Santo Domingo"</p> <p>2. Información general. El contratista informa a la comunidad los beneficios del Proyecto</p> <p>3. Exposición del Área Técnica. - el contratista socializa cada uno de los puntos del Proyecto, explicando las actividades que se van a realizar y los tramos a intervenir.</p> <p>4. Inquietudes de la comunidad. Se da paso a resolver las dudas de la comunidad.</p>

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

1 Se logro entregar información clara a la comunidad, explicando cada una de las actividades del proyecto, tiempo de ejecución y beneficios a la comunidad.

2 Se resolvieron las dudas de la comunidad.

DOCUMENTOS ANEXOS

1 Listado de Asistencia.

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa listado de Asistencia.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

DATOS GENERALES

Número de acta

Contratista:

Ingenieria y construcciones WJ S.A.S.

Lugar:

Granada

Fecha:

26 sept

Hora Inicio

Hora Finalización

Objeto del contrato de obra

Mejoramiento de vías terciarias en los Municipios de Concepción, El Penol, Granada, Marimilla, San Carlos y Santo Domingo.

Anexa listada de asistencia

SI

X

NO

Objetivo de reunión:

- Socializar con la comunidad el objetivo del proyecto.
- Escuchar dudas sugerencias e inquietudes de la comunidad

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)

ITEM

TEMA

1. Presentación de la empresa contratista, Ingenieria y construcciones WJ S.A.S
2. Exposición del Área Técnica.
3. Información general y alcance de valor.
4. Inquietudes de la comunidad.

DESARROLLO TEMÁTICO

El día 26 Septiembre de 2022. Se realizó la socialización con la comunidad. Se contó con el acompañamiento del Alcalde y líderes sociales, AS. mismo con el personal del contratista.

1. Presentación de la empresa Ingenieria y construcciones WJ S.A.S

Se presenta la empresa y el equipo del contratista, ingenieros y encargados de la obra.

2. Exposición del Área Técnica.

El contratista socializa cada uno de los puntos del proyecto, explicando las actividades a desarrollar, los tramos a intervenir, cierres viales, entre otros.

3. Información general y alcance de valor.

Se le informa a la comunidad el alcance del proyecto y los beneficios que representa a nivel vial y social.

4. Inquietudes de la comunidad.

- Se da paso a resolver las dudas e inquietudes de la comunidad.
- El Alcalde Resuelve varias inquietudes que tiene la comunidad.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

- 1 Se logra entregar Información Clara a la comunidad, explicando cada una de las actividades del proyecto, Tiempo de ejecución y beneficios.
- 2 Se tiene una buena comunicación con la comunidad y esto permite resolver las dudas e inquietudes.

DOCUMENTOS ANEXOS

- 1 Listado de Asistencia.

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa lista de asistencia.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

DATOS GENERALES

Número de acta								
Contratista:		Ingenieria y construcciones WJ S.A.S.						
Lugar:		San carlos.	Fecha:	15 octubre	Hora Inicio		Hora Finalización	
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías Terciarias en los municipios de concepcion, el petrol, Granada, Manilla, san carlos, Santo Domingo!				Anexa listada de asistencia			
					SI	X	NO	
Objetivo de la reunión:	a	- Socializar con la comunidad el objetivo del proyecto. - Resolver las dudas e inquietudes de la comunidad.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)

ITEM	TEMA
1	Presentación de la empresa Ingenieria y construcciones WJ S.A.S.
2	Exposición del Área Técnica.
3	Información General y alcance de Valor.
4	Inquietudes de la comunidad.

DESARROLLO TEMÁTICO

El día 15 de octubre de 2022, se realizó la socialización con la comunidad, se conto con el acompañamiento de los líderes sociales y el equipo del contratista.

1. Presentación de la empresa Ingenieria y construcciones WJ S.A.S.
Se presenta la empresa y el equipo del contratista; Ingenieros, director de obra.
2. Exposición del Área Técnica.
El contratista socializa el Proyecto, los tramos a intervenir, cierres Viales, entre otros.
3. Información General y alcance de valor.
Se le informa a la comunidad el alcance del Proyecto y los beneficios que este aportara.
4. Inquietudes de la comunidad.
 - Se resuelven las inquietudes de la comunidad.
 - Se dan los datos del contratista con el fin que la comunidad se pueda contactar en caso de alguna inquietud o problema.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

1 Se logra entregar información clara a la comunidad, explicando cada una de las actividades del Proyecto, tiempo de duración y beneficios.

2 Se logra resolver las dudas e inquietudes de la comunidad.

DOCUMENTOS ANEXOS

1 Listado de Asistencia.

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lista de Asistencia.

	ACTA DE REUNIÓN		Fecha de elaboración	27/10/2022
			Código	Act_SOC_001
			Versión	1
			Páginas	

DATOS GENERALES					
Número de acta					
Contratista:	Ingenieria y Construcciones WJ S.A.S.				
Lugar:	El Peñol.	Fecha:	27 sept 03 octubre.	Hora Inicio	Hora Finalización
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marimilla, San Carlos y Santo Domingo.	Anexa listada de asistencia			
		SI	X	NO	
Objetivo de la reunión:	<ul style="list-style-type: none"> • Socializar con la comunidad el objetivo del proyecto. • Escuchar dudas, sugerencias e inquietudes de la comunidad acerca del proyecto. 				

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	presentación de la empresa Ingenieria y Construcciones WJ. S.A.S.
2	Exposición del Área Técnica.
3	Información general y alcance de valor.
4	Inquietudes de la comunidad.

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>El día 27 de Septiembre y 03 octubre, se realizó la socialización con la comunidad, se contó con el acompañamiento de líderes sociales y el personal del contratista. Ingeniero Residente y Director de obra.</p> <p>1. Presentación de la empresa Ingenieria y construcciones WJ. S.A.S. se presenta la empresa y el equipo del contratista. encargados del proyecto.</p> <p>2. Exposición del Área Técnica El contratista socializa cada uno de los puntos del proyecto, explicando las actividades a desarrollar, los tramos a intervenir, los cierres viales entre otros.</p> <p>3. Información general y alcance de valor. Se le informa a la comunidad el alcance del proyecto, los beneficios que representa a nivel social.</p> <p>4. Inquietudes de la comunidad. <ul style="list-style-type: none"> - Se da paso a resolver las dudas e inquietudes de la comunidad. - Se comunica los datos de la empresa y encargados del proyecto con el fin que la comunidad pueda tener una línea de atención. </p>



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

1 Se entrega información clara a la comunidad, explicando cada una de las actividades del proyecto, tiempo de ejecución y beneficios a la comunidad.

2 Se resuelven dudas e inquietudes de la comunidad.

DOCUMENTOS ANEXOS

1 Listado de Asistencia.

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se anexa el listado de Asistencia.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

DATOS GENERALES							
Número de acta							
Contratista:							
Lugar:	Concepción	Fecha:	30 sept	Hora Inicio		Hora Finalización	
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Concepción El Penol, Granadas, Nicunilla, San Carlos y Santo Domingo			Anexa listada de asistencia			
Objetivo de reunión:	Socializar con la comunidad el objeto del proyecto			SI	X	NO	
	- escuchar dudas, dudas sugerencias inquietudes de la comunidad acerca del proyecto						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	presentación de la empresa Ingenieria y Construcciones WJF SAS
2	Exposición del área técnica
3	Información general y alcance del valor
4	Inquietudes de la comunidad.

DESARROLLO TEMÁTICO	
1	El día 29 y 30 de Septiembre 2022, se realizó la socialización con la comunidad, se contó con el acompañamiento de líderes y el personal del contratista. Ingeniero y residente y director de obra
2	1. presentación de la empresa Ingenieria y construcciones WJF se presenta la empresa y el equipo del contratista encargados del proyecto
3	2. Exposición del área técnica el contratista socializa cada uno de los proyectos, explicando las actividades a desarrollar, los temas a intervenir, los temas tales entre otros
4	3. Información general y alcance del valor: Se le informa a la comunidad el alcance del proyecto los beneficios que representan a nivel social.
5	4. - se da paso para resolver las dudas de la comunidad. - se comunican los datos de la empresa y encargados del proyecto con el fin de que la comunidad pueda tener una línea de atención



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

1 Se entrega información a la comunidad explicando cada una de las actividades del proyecto, tiempo de ejecución y beneficios a la comunidad.

2 Se resuelven dudas e inquietudes de la comunidad.

DOCUMENTOS ANEXOS

1 Listado de Asistencia.

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lista de asistencia



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

DATOS GENERALES

Número de acta

Contratista:

Ingenieria y construcciones WJ.

Lugar:

Santo Domingo.

Fecha:

07 octubre

Hora Inicio

Hora Finalización

Objeto del contrato de obra

Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de conservación, el primer distrito, Manilla, San Carlos, y Santo Domingo

Anexa listada de asistencia

SI

X

NO

Objetivo de reunión:

a Socializar con la comunidad, el objetivo del proyecto
- escuchar dudas y subgerencias inquietudes de la comunidad a cerca del proyecto.

AGENDA (ORDEN DEL DIA)

ITEM

TEMA

1

presentación de la

2

presentación de la Ingenieria y construcciones WJ S.A.S

3

explicación del area tecnica

4

Información general y alcance del valor

Inquietudes de la comunidad

DESARROLLO TEMÁTICO

El día

07 octubre del 2022, Se realizo socialización con la comunidad, se conto con el acompañamiento de los líderes sociales, concejales del municipio, alcaldia municipal y el personal del contratista, Ingeniero Residente y director de obra
1 palabras del señor Alcalde explicando los recursos del mejoramiento de la vía

2. exposición de la empresa Ingenieria y construcciones WJ S.A.S Socializa cada uno de los puntos del proyecto explicando las condiciones y actividades a desarrollar

3. Información general y alcance del valor
Se le informa a la comunidad el alcance del proyecto, los beneficios que representa a nivel social

4. Inquietudes de la comunidad

- se da paso a resolver las dudas inquietudes de la comunidad
- se comunica los datos de la empresa y encargados del proyecto con el fin de que la comunidad pueda tener una linea de atención

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de
elaboración

27/10/2022

Código

Act_SOC_001

Versión

1

Páginas

CONCLUSIONES

1 Se entrega información clara a la comunidad explicando cada una de las actividades del proyecto tiempo de ejecución y beneficios a la comunidad

2 Se informa sobre el tema social de mano de obra calificada del sector permisos durante la obra

Se resuelven dudas e inquietudes de la comunidad.

DOCUMENTOS Y ANEXOS

1 Listado de Asistencia.

Cargos asignados en la reunión

Responsable

Fecha de compromiso

Ninguna

ASISTENTES A LA REUNIÓN



No. Contrato

PLANILLA DE ASISTENCIA

Fecha

26-09-2022

Contratista:

Interventor:

OBJETO

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
Tel. 900.365.893-9

Construcciones Asociadas

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias
EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL,
GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO
DOMINGO

ACTIVIDAD:

Socialización Placa huella
total, telefones, ramal cruce
las palmas

LUGAR:

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA
(TOLDAS, Tafetanes Y EL RAMAL CRUCE DE LAS
PALMAS)

Nº	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA
1	Hector Emilio Parra	Vrd. Tafetanes	30.825.611	Heli
2	Judy Marcela Quintero	Vrd. Tafetanes	3126969413	Judy Quintero
3	Rosa Eulalia Parra G.	Vrd. Tafetanes	3103763950	Eulalia Parra
4	Luz Mary Noriega Quintero	Tafetanes	3148449744	Mary Noriega
5	Gilberto Giraldo P.	Tafetanes P.J.A.C.	3116325533	Gilberto Giraldo P.
6	Uriel Aristizabal Arco	Tafetanes	3207600191	Uriel Aristizabal A.
7	Maria Claudia Arias Rios	Tafetanes	3722358443	Claudia Arias
8	Luz Dary Aristizabal	Tafetanes	3218757755	Luz Dary
9	Oscar Rios G.	Tafetanes	3135102564	Oscar Rios G.
10	Esteban de Jesus Giraldo Rios	Tafetanes	3223058730	Esteban Giraldo
11	Alfredo Parra G.	Tafetanes	3178169586	Alfredo Parra G.
12	Sonia Giraldo Aguirre	Tafetanes	3136660401	Sonia Giraldo
13	William Alfonso Aristizabal	Tafetanes	3233731663	William Aristizabal
14	Nora Cecilia Muñoz B.	Tafetanes	3113929378	Nora CMB
15	Luz Dary Parra Giraldo	Tafetanes	3205120500	Luz Dary
16	Freddy Castano A.	(Alcalde)	3128638450	Freddy
17	Joaquin Zapata Ospina	(Alcaldia)	3235231359	Joaquin
18				

Firma

Nombre: Jose Antonio Rodriguez
Representante Contratista

Firma

Nombre: Marcela Valencia V.
Representante Interventoria

Firma

Nombre: Representante MASER



No. Contrato

PLANILLA DE ASISTENCIA

Fecha 26 de sept 22

Contratista:

Interventor:

OBJETO

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
Tel: 900 355 893-9PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias
EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL,
GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO
DOMINGO

ACTIVIDAD:

Socialización

LUGAR:

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA
(TOLDAS, Tafetanes Y EL RAMAL CRUCE DE LAS
PALMAS)

N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA
1	Sonia Giraldo Garcia	Tafetanes	311 259 7343	Sonia Giraldo G.
2	Glady's Aguirre Parra	Tafetanes		Glady's Aguirre
3	William David Giraldo Aguirre	Tafetanes	313 719 693	David Giraldo
4	Blanca Nohe my Aristizabal	Tafetanes	320 725 8884	Blanca Aristizabal
5	Amaira Stella Novoa	Tafetanes		Amaira Stella N Q
6	Paola Andrea Garcia	Tafetanes	312 701 2268	Paola Garcia
7	Julio César Giraldo	Tafetanes	321 647 2769	Julio
8	Franklin Eliecer Rios Quintero	Tafetanes	314 384 9846	Franklin Rios Q.
9	Arnaldo Zebello No. 8	Tafetanes	322 306 7474	Arnaldo Zebello No. 8
10	José Aristide No. 9	Tafetanes	320 604 4444	José Aristide No. 9
11	Dubán Aristizabal	Tafetanes	312 295 4914	Dubán
12	Heber Aristizabal	Tafetanes	312 776 8042	Heber Aristizabal
13	Alejandro Parra Aristizabal	Tafetanes	314 555 9320	Alejandro Parra A.
14	Carlos Andres Giraldo	TAFETANES	32 341 03519	Carlos
15	Julian Aristizabal	Tafetanes	313 693 5623	Julian Aristizabal
16	Fabio Hernan Rios N	Tafetanes	321 877 5755	Fabio Rios N
17	Dubán Aristizabal	Tafetanes	327 334 9789	Dubán Aristizabal
18	Gloria Edilma Rios	Tafetanes	310 387 2608	Gloria Rios

Firma

Nombre:

 Representante Contratista

Firma

Nombre:













 Representante Interventoria

Firma


Nombre:

Representante MASER

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	27-09-2022
			Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		003-2022	 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S <small>NIT. 900.355.893-9</small>	 Constructores Asociados H&G SAS	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIO CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:			Socialización plaza huella Horizontes		LUGAR:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS EL MUNICIPIO DEL PEÑOL
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO		FIRMA	
1	Marteny Ceballos	V. Horizontes	3147589341		Marteny P.	
2	Maritza Marin Ceballos	V. Horizontes	3148977316		MARITZA MARIN.	
3	Maria Rosmisa Lopez Aspin	Horizontes	3728112355		Maria Rosmisa Lopez	
4	Mariela Garcia U	Horizontes	3736354573		Mariela Garcia U	
5	Liliana Nora Marin	Horizontes	3216220373		Liliana Nora Marin	
6	Elvia Rosa Ceballos G.	Horizontes	3113924535		Elvia Rosa Ceballos G.	
7	Juliana Ceballos G.	Horizontes	319447304		Juliana Ceballos G.	
8	Tamile Marin Ceballos	V. Horizontes	3117812520		Tamile Marin C.	
9	Nury Giraldo Giraldo	V. Horizontes	3148958249		Nury Giraldo	
10	Durley Angulo Bastro	V. Horizontes Pozo	3147763887		Durley Angulo Bastro	
11	Dora Alba Bastro	Horizonte Pozo	3147169578		Dora Bastro	
12	Luzmila Baritica D	V. Horizontes	3218420673		Luzmila Baritica D.	
13	Gillermo Valencia	V. Horizontes	3116103053		Gillermo Valencia	
14	Octavio Botero	V. Pozo Mirilla	3233254605		Octavio Botero	
15	Paula Andrea Rivera U	V. Horizontes	3117600775		Paula Andrea Rivera U	
16	Rosa Argemira Salazar S.	Vereda El Carmelo	3148345515		Rosa Argemira Salazar S.	
17	Alejandro Cano	V. Horizontes	3195537731		Alejandro Cano	
18	Mar Nidia Villalba	V. Horizontes	3153729891		Mar Nidia Villalba	
Firma Nombre: <u>Jose Antonio Rodriguez</u> Representante Contratista			Firma <u>Marcela Valencia U</u> Nombre: Representante Interventoria			

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha
			Contratista:	Interventor:	OBJETO
		003-2022	 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. <small>Nit: 900.355.693-9</small>		PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIO CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO DOMINGO.
ACTIVIDAD:	Socialización Placa huella		LUGAR:		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS EL MUNICIPIO DEL PEÑOL
Nº	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO		FIRMA
1	José Manuel Flencio	Vda Horizontes	Tel 3206033720		
2	Adolfo León Botero G	Vereda horizontes	Tel 3136132174		
3	Juan Villegas	Vereda Horizontes	Tel 3128599840		
4	Frika Villegas	Vereda horizontes	Tel 3128599840		
5	Dna Maria Hincapié V	Vereda Horizontes	Tel 3207670054		
6	Maria Rubiela Gómez	Vereda Horizontes	3148758318		
7	Heran Alfonso Alzate A	Vda Horizontes	3113733959		
8	Juan Fernando Salazar	Vda Horiz. Sector caballeros	3206368012		
9	Janneth Vega	Vda H. Caballeros	3147477824		
10	María Rubiela Brincos H	Vda Horizontes-Caball.	3217938407		
11	Luz Arredondo Parra Gómez	Pozo	3185324133		
12	Juan Molina	Pozo	3162381879		
13	Andrés Felipe González Riquelme	Pozo	3176863871		
14	Robinson yerald. Quintero	Horizonte	3206283632		
15	Guisa F. Gallego Díaz	horizontes	3228677707		
16	Manuel de Jesús Arredondo	Horizontes	3177228451		
17	Diego Salazar Meier	Horizonte	3136453406		
18					
Firma Nombre:  Representante Contratista			Firma  Nombre: Representante Interventoría		

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha
			Contratista:	Interventor:	OBJETO
		003-2022	 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. No. 900 355 893-9	 Construcciones Asociadas H&G S.A.S.	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIO CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO DOMINGO.
ACTIVIDAD:	Socialización plaza huella Horizontes			LUGAR:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS EL MUNICIPIO DEL PEÑOL
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA	
1	AUBERNEY GARCIA	POZO	3215355815	AUBERNEY G.	
2	Reinaldo Amaro	Horizontes	3207051868	Reinaldo	
3	Juan G. V	3144140416		J. V	
4	Elizabeth Varguera	Horizonte	3008339750	Elizabeth M. V.	
5	Esperanza Crespo	"	3045413525		
6	Ruby Martinez	Horizonte	311570328	Ruby	
7	Bernardino Valero	POZO	3103753692	Bernardino	
8	Rosa Eulalia Barea H	POZO	3173833941	Rosa Eulalia	
9	Camilo Jellauer	Horizontes	3125890426		
10	Stefani Hincapié C	HORIZONTES	3235809256	Stefani Hincapié	
11	Soniu Dossary Flusin	Horizontes	3013458051	Soniu	
12	Regemito Chaverragil	Carretero	3116319558	Regemito	
13	Rafael Antonio Ocasio	Horizontes	3747624738	Rafael	
14	Pantaleón Gómez A	Horizontes	3206196570	Pantaleón Gómez	
15	Deisy Katherine Pios B.	POZO	3107357472	Deisy	
16					
17					
18					


Firma: 

Nombre: **José Antonio Rodríguez**
Representante Contratista

Firma: 

Nombre: **Horceda Valencia V**
Representante Interventoria

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	27-09-2022
			Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		003-2022	 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. Nit: 900 355 893-9	 Constructores Asociados H&G S.A.S.	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIO CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:		Socialización placa huella Horizontes		LUGAR:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS EL MUNICIPIO DEL PEÑOL	
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA		
1	Sorany Andrea Daza	V. Pozo	311 603 1192	Sorany Daza		
2	Otonel Curi	Horizontes	3127556460	Otonel Curi		
3	Angela Torres	Horizontes	3192228835	Angela Torres		
4	Angela Torres	Horizontes	3192228835	Angela Torres		
5	Luis Eloy Vargas	Horizontes	3148680872	Luis Eloy Vargas		
6	Alpidio Jimenez	POZO	3118037130	ALPIDIO		
7	Cristian Julian Morales	Horizontes	3128016916	Cristian Morales		
8	Catherine Villegas Aizte	Horizontes	3205831744	Catherine Villegas		
9	Dario Torres	POZO	322.5345544	Dario Torres		
10	Rodolfo Lopez C	POZO	3104507051	Rodolfo Lopez		
11	Hector Marin	"	3013772799	Hector Marin		
12	José María Barón	Los Andes	3172416479	José María Barón		
13	Marisol Gallego Salazar	Presidenta Pozo	3206186521	Marisol Gallego		
14	Mario de Jesús Osorio	POZO		Mario Osorio		
15	Vilmar y Abelardo	Horizontes				
16	Angelica Sampedo	Horizontes				
17	Alvaro Roldán	POZO	312303935	Alvaro Roldán		
18	Libardo Roldán	POZO	3116620995	Libardo Roldán		
Firma Nombre: José Antonio Rodríguez Representante Contratista			Firma Nombre: Marcela Valencia V Representante Interventoría			

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha
			Contratista:	Interventor:	OBJETO
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S Nit. 900.355.893-9	 Constructores Asociados HCG	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EMUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, EL PEÑOL SAN CARLOS, Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:	Socialización para huella 30 de sept 2022		LUGAR:	VEREDA SAN PEDRO PEÑOL PARTE BAJA	
Nº	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA	
1	Andrés Jairo Ospina	San Pedro bajo	3215604547	Andrés G.	
2	Maria Rubiela Díaz Salazar	San Pedro bajo	3104466414	Rubiela Díaz	
3	Guillermo Salazar	San Pedro bajo	3218646239	Guillermo Salazar	
4	Paula Andrea Salazar Graldo	San Pedro bajo	3207265442	Paula Salazar	
5	Bentura Londoño	San Pedro bajo	3108244171		
6	Alfonso Jairo Amaya Londoño	San Pedro bajo	3105195059	Alfonso Jairo Amaya Londoño	
7	Luz Dary Ríos M	San Pedro bajo		Luz Dary Ríos M	
8	Roque A. Gonzalez	S. Pedro bajo	3122136654	Roque A. -	
9	Alfonso Jairo Valencia Marquez	S. Pedro bajo	3226659843	Alfonso Jairo Valencia M.	
10	Ruben Darío Lopez H.	S. Pedro bajo		Ruben Lopez	
11	Hector Lopez	San Pedro bajo	98474366	Hector Lopez	
12	Eusebio Salazar	San Pedro bajo	320515884	Eusebio	
13	Argiro Osorio	San Pedro bajo	3226647368	Argiro Osorio	
14	Fabian Lopez	San Pedro bajo	3122884662	Fabian Lopez	
15	Joaquín Lopez	San Pedro bajo	3194836220	Joaquín Lopez	
16	Hector Morales C.	San Pedro	3108089932		
17	Ofelia Hernandez	San Pedro bajo	3746565761		
18	Amparo Guarín F	San Pedro bajo		Amparo Guarín	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma _____ Nombre: _____ Representante Contratista </div> <div> Firma  Nombre: _____ Representante Interventoría </div> </div>					



No. Contrato

PLANILLA DE ASISTENCIA

Fecha

Contratista:

Interventor:

OBJETO



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nº: 900 355 893-9



MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EMUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, EL PEÑOL SAN CARLOS, Y SANTO DOMINGO.

ACTIVIDAD:

LUGAR:

VEREDA SAN PEDRO PEÑOL PARTE BAJA

Nº	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA
1	Rodrigo J Salazar	93 473 561		Rodrigo J Salazar
2	María Margarita Hernández	42 847 903		María Margarita HZ
3	María José Cárdenas	43029255		María José Cárdenas
4	Dario Castaño		318 279 07 06	
5	Orma Vergara Callejo	Ver San Pedro Bajo	374 6934755	Orma Vergara B.
6	Edwin Andrés López C.	San Pedro Bajo	321 893 38 48	Edwin
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Firma

Nombre:

Representante Contratista

Firma

Nombre:

Representante Interventoría

Haroldo Valencia V



Dependencia		Municipio de Concepción		Fecha		1 octubre 2022		Lugar		Concepción Tramo 1									
Producto y/o Actividad		Socialización proyecto municipal de las telenovelas																	
NRO	Nombres y apellidos completos	No. Documento de identidad	Entidad/ Organización	Cargo	Teléfono o correo electrónico	Señale con una X la condición que cumple											FIRMA		
						Zona		Sexo	Rango de edad				Grupo poblacional						
						Urbana	Rural		Hombre	Mujer	0 a 5 años	6 a 11 años	12 a 25 años	26 a 40 años	Mayor de 40 años	LGTBI		Afrodescendiente	Indígena
1	Mauricio Gil Cardenas	98474052	sonadora	Delegado	3117423865	X	X				X							X	
2	Delva Pabla Arango	20094786	sonadora		3773426670	X	X					X							X
3	Luz Dary Cardenas C		sonadora		3168467493	X	X	X				X							X
4	RAUL Gil E	7638212208	sonadora	Socio	3141170072	X	X					X						X	X
5	Ana Maria Gil	1038213308	sonadora	Socia	3177301528			X			X						X	X	Ana Gil
6	Olivia Rincón	21666789																	
7	Oliverio Gil E	15453834		Delegado	3205371994	X	X												Oliverio
8	Nora Isabel Rios D.	102350381	J.A.C.	SOCIA	320845275	X		X			X						X		Nora Rios
9	Luz Amparo Delgado F	31431563	J.A.C.	Vicepresidente	320480570	X		X			X						X		Luz Amparo
10	Fredy maguiber A.G	76083772	U.C.S.M.	Socio	320470537	X	X				X							X	Fredy maguiber A.G
11	Monica Ma. Hoyos	374492			311615836			X	X	X		X							Monica Hoyos
12	Malena J. Gil	11507710			310421552	X	X				X								Malena Gil
13	Edith Gil	32409833		SOCIA	3154100042														Edith Gil
14	Edelva Valera	1286687			3168656472														Edelva Valera
TOTALES																			






En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, que modificó la Ley 1581 de 2012 (Regimen General de la Protección de Datos Personales); las personas participantes de esta reunión, taller, capacitación, etc. Autorizan a la Administración Municipal de Concepción-Antioquia, para tomar listado de asistencia y registros fotograficos, para ser utilizados con fines estadísticos en el cumplimiento de programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023



Dependencia		Alcaldía Urbana y Rural		Fecha		1 de octubre/22		Lugar		Concepción Granada														
Producto y/o Actividad		mejoramiento de las freccionas terciarias																						
NRO	Nombres y apellidos completos	No. Documento de identidad	Entidad/ Organización	Cargo	Teléfono o correo electrónico	Señale con una X la condición que cumple														FIRMA				
						Zona		Sexo		Rango de edad					Grupo poblacional									
						Urbana	Rural	Hombre	Mujer	0 a 5 años	6 a 11 años	12 a 20 años	21 a 30 años	Mayor de 30 años	LGTBI	Atrodescendiente	Indígena	Con Discapacidad	Desplazado		Victima del Conflicto	Otro		
1	Mario Fernando Espin	43858701	JAC. sonadoro	president	3185512413		X												X	X				
2	Esai Hernán Agudelo m	103820433	Alcalde. o.	Apoyo tecnico	3108332490	X					X									X				
3	Robinson Franco S.	103820415	Alcalde	Apoyo Técnico	3122867071		X	X				X									X			
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
TOTALES																								

En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, que modificó la Ley 1581 de 2012 (Regimen General de la Protección de Datos Personales); las personas participantes de esta reunión, taller, capacitación, etc. Autorizan a la Administración Municipal de Concepción-Antioquia, para tomar listado de asistencia y registros fotográficos, para ser utilizados con fines estadísticos en el cumplimiento de programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023.

		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha
			Contratista:	Interventor:	OBJETO
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V.I. S.A.S. NIT 10.122.0011	 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:	mejoramiento de las terciarias		LUGAR:	VIA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL POZO	
Nº	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA	
1	GIOHANNY GARCIA	POZO	3117429051	Guis	
2	Libardo Olavio	POZO	3116630995	Libardo	
3	Bethz Elena Ramirez	VI POZO	3214623392	Bethz Elena Ramirez	
4	Fabian Nelson Marin	Vereda POZO	311444092	Fabian Nelson	
5	Pablo Martinez	El POZO	3122513880	Pablo	
6	Bernardino Valorel	POZO	3103453692	Bernardino	
7	Rosa Eulalia Benardi	POZO	3173833941	Rosa Eulalia	
8	IVON GOMEZ	POZO	70 953478	IVON	
9	IVON NARAYO	POZO	43010719	IVON	
10	Aronas Felix Gamba	POZO	3136863821	Aronas	
11	Rosa Saura S.	POZO	3215484772	Rosa	
12	Gerardo Gomez	POZO	3148625831	Gerardo	
13	ALVARO ARBOGAVE	POZO	3112303935	ALVARO	
14	Naxalba Serna Gomez	POZO	3122850229	Naxalba	
15	Adriana Serna Gomez	V-POZO	3126396383	Adriana Serna	
16	Dario Torres	POZO	3105055405	Dario	
17	Julio Garmy N	POZO	3208554425	Julio Garmy N	
18	Cecilia Vazquez	POZO	3205656697	Cecilia	
Firma		Firma			
Nombre:		Nombre:			
Representante Contratista		Representante Interventoria			

		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha: 03 de octubre 2022
			Contratista:	Interventor:	
				OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:		Socialización Proyecto mejoramiento vías terciarias		LUGAR:	VIA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL POZO
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA	
1	DANIELA GONZALEZ	VEREDA POZO	3217285167		
2	Soyani Andrea Lanza	Vereda POZO	311 603 1197	Soyani Lanza	
3	Marisol Gallego S	Vereda POZO	3206186521	Marisol Gallego	
4	Roberto Poma Villegas Rivera	POZO	3226743439		
5	Roberto Salazar (Carriz)	POZO	3125889677		
6	Juan Molina Alvarez	Vereda POZO	316 238 1879		
7	JAZHE MONTAÑA	Vereda POZO	3128161203		
8	Emelio Aguadeb.	Vereda POZO	3588370	Emelio Aguadeb.	
9	Wahelin Duran G.	Vereda POZO	32318129	Wahelin Duran G.	
10	CODE GARCIA GONZALEZ	Vereda POZO	3116094066		
11	CLAUDIO BOTSVO	Vereda POZO	70981618		
12	Vicente Alfonso Ortiz Gama	SIC DOPP Municipio Marinilla	3178945555	Vicente A Ortiz Gama	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma _____

Nombre: _____

Representante Contratista

Firma Marcela Valencia V

Nombre: _____

Representante Interventoría

		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	7 de octubre 2022
			Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. H# 900 265 093-9	 Constructores Asociados HOG S.A.S.	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.		
ACTIVIDAD:	Socialización mejoramiento mas terciarias Santo Domingo		LUGAR:	Santo Domingo Vda Saltillo - San Pedro		
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA		
1	Jorge A Montoya R	V el Saltillo Sto Domingo	302 622 5081	Jorge Montoya		
2	Ramiro Berrio	V el Saltillo Sto Domingo	321 771 5847	Ramiro Berrio		
3	Oracio Betancur		310 412 18 45	Humberto Montoya B		
4	John Jairo Valencia G	Ledev Conventorio	314 805 3202	[Signature]		
5	Juan Camilo Londoño	Verep el Saltillo	313 679 7422	[Signature]		
6	Diego Bustamante J	Contratista planeación	310 592 6329	Diego B		
7	Wilmar Andrés Restrepo Franco	el saltillo	373 566 2971	Wilmar Restrepo		
8	Juan Luis Puentes Echeverry	Concejal	312 295 2207	[Signature]		
9	Andrés Castaño Rivas	Planeación	313 743 33 62	[Signature]		
10	Brais Alvarado Belmonte	Concejal	313 720 2334	[Signature]		
11	Samuel Sanchez	consejal	312 828 6158	[Signature]		
12	Juan Manuel Bustamante	Concejal	312 235 7353	Juan Manuel Bustamante		
13	Adriana Durango G	Concejal	320 276 6413	Adriana Durango G		
14						
15						
16						
17						
18						

Firma _____ Nombre: Representante Contratista	Firma _____ Nombre: Representante Interventoria
--	--

		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	7 de octubre 2022
			Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES N2 S.A.S. TEL: 300 355 803-9	 CONSTRUCTORAS ASOCIADAS HOG S.A.S.	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.		
ACTIVIDAD:	Socialización mejoramiento de vereda Santo Domingo		LUGAR:	Vereda San Pedro		
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA		
1	Hector Waiman Acuña	Dpto. Comunitario	310 377 82 64	Hector Acuña		
2	Didier Arbey Orrego	San Pedro	327 846 55 835	Didier Orrego		
3	Samuel Hernán Galvis	San Pedro	312 739 68 55	Samuel Galvis		
4	Berty Elva Patac	Concepción	313 720 73 34	Berty Patac		
5	Adrián Gustavo Rivera	Platación	313 743 33 62	Adrián Rivera		
6	Juan Carlos Chorro	Concepción	316 334 27 32	Juan Chorro		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Firma Nombre: _____ Representante Contratista		Firma Nombre: _____ Representante Interventoría				

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	15/10/2022
			Contratista:	Interventor:		
			 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S Nit 900 355 893-9	 Construcciones Asociadas	OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:			Socialización mejoramiento de la red de vías nariques - La Holanda		LUGAR:	
					NARICES - LA HOLANDA	
					Narices - La Holanda	
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA		
1	Betty Abelcy Ramirez Hincapié	Vereda 43476720	Vereda Juanes 3207265773	Betty Abelcy Ramirez		
2	Carlos Manrique Giraldo		Polideportivo 3218740002	Carlos Manrique Giraldo		
3	Edilma Hernandez	70762364	Edilma Hernandez 3222387825	Edilma H		
4	Edilma Hernandez	27999076	377 587 0703	Edilma H		
5	Gloria An Parro G			Gloria An Parro G		
6	Jesús Mosquera	Buenos Aires	El Jordan	Jesús Mosquera		
7	JULIAN SUAREZ HERRERA	EL PARAGUAS	3117082814 EL JORDAN	JULIAN D. SUAREZ, H		
8	Diego A Hincapié	Elanoga cho	3213281434	Diego A Hincapié		
9	Diego A Hincapié	Morro gaciro	El Jordan	Diego A Hincapié		
10	Carlos Ciro Morales	La Luz	2127049790	Carlos Ciro		
11	Manuel Castrillos	El Jordan		Manuel Castrillos		
12	Diego Jerez Jimenez	Garrucha	3206729307	Diego Jerez		
13	Roberto Londoño	Vereda Juanes Mesas Sanes	Roberto Londoño 3205068243	Roberto Londoño		
14	Roberto Londoño	Vereda Juanes	V. Juanes 3205068243	Roberto Londoño		
15	Hernando Garcia	La cascada	3146550517	Hernando Garcia		
16	Julio Paredes	Barrio Obispo	4397854	Julio Paredes		
17	José Tavo Paredes	Buenos Aires	3218284231	José Tavo Paredes		
18	David Bustamante	La Bomba 1086130383	3122989729	David Bustamante		
Firma		Firma				
Nombre:		Nombre:				
Representante Contratista		Representante Interventoria				


 		No. Contrato		PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	15-10-2022
				Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M3 S.A.S. Tel: 900 366 893-9		 Construcciones Asociadas HOG SAS		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.	
ACTIVIDAD:		Socialización mejoramiento de la vía Narices - La Holanda			LUGAR:		NARICES - LA HOLANDA Narices - La Holanda
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO		FIRMA		
1	Maria Rosa Gaitero	El Jordan	312-7360999		Maria Rosa Gaitero		
2	Stefano Pérez Hueto	El Jordan	3136455981		Stefano Pérez Hueto		
3	Geraldin Bustamante	El Jordan	3102944933		Geraldin Bustamante		
4	Yurany Marcela Ramírez	El Jordan	3146620859		Yurany Ramírez		
5	Carceliano Huerto	El Jordan	3228043904		Carceliano Huerto		
6	José Castellón	Jac	3105094472		José Castellón		
7	Saul Londoño	Jac Barrio obrero	3108297936		Saul Londoño		
8	Marcela Varanjo	El Jordan	3128941597		Marcela Varanjo		
9	MARCELA RAMÍREZ	El Jordan	3146159993		MARCELA RAMÍREZ		
10	Mauricio A Sudelo	Jordan	3136485722		Mauricio A Sudelo		
11	Juan Carlos B	Jordan	3117767981		Juan Carlos B		
12	José Nino P.	Jordan	31061328		José Nino P.		
13	Leonel Viquez Duque	La Bomba	3212584258		Leonel Viquez Duque		
14	Jhon Fredy Priado	La Bomba	3136815937		Jhon Fredy P.		
15	José Saul Londoño B	B. Obreros Presidente	3108297		José Saul Londoño B		
16							
17							
18							

Firma: 

Nombre: José Carlos Rodríguez
Representante Contratista

Firma: _____

Nombre: _____
Representante Interventoría

 		No. Contrato	PLANILLA DE ASISTENCIA		Fecha	15/10/2022
			Contratista:	Interventor:	OBJETO	
		 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. Tel: 900 355 893-9	 Constructores Asociados HOG S.A.S.	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MARINILLA, CONCEPCIÓN, SAN CARLOS, MARINILLA Y SANTO DOMINGO.		
ACTIVIDAD:	Socialización mejoramiento de la vía narices - la Holanda		LUGAR:	El Narices - LA HOLANDA		
N°	NOMBRE	BARRIO / ENTIDAD	DIRECCIÓN / TELÉFONO / CORREO	FIRMA		
1	DUBIAN GARCIA A	MONTEGACHO	312-213-891-79			
2	ELIZABETH HENAO G.	MORROGACHO	3147209252	ELIZABETH HENAO		
3	Jorge Eduardo Daza	MORROGACHO	3128024338	JORGE DAZA		
4	Mónica Cristina Mendoza	San Carlos El Jardín Admon	3207595141	Mónica Mendoza		
5	Jos. ADRIANA GARCIA GARCIA	SAN CARLOS Admon	3137777315	ADRIANA GARCIA		
6	Lina María Castañón B	V. La Cascada	3122139306	Lina M. Castañón B.		
7	Reinaldo Salazar	barrio obrero	3117109434	Reinaldo Salazar		
8	José ortiz Garcia	San Gerardo	3128020732	José O		
9	Orlando Herrera	Urbanización Canos	3205340469	Orlando		
10	Carlos López	El Jordán	3505445048	Carlos López		
11	Ferny Angel	Barrio obrero	3128444488			
12	Yudy Aguirre Guadalupe	Buenos Aires	3122143086	Yudy		
13	Aurora Quintero	Jordán	3138395447			
14	JAVIER Quiroga. lidev	Barrio la bomba	3126512837	JAVIER QUIROGA.		
15	Auxilio Quiroga M	Barrio obrero la Bomba	3147809262	Auxilio Quiroga M.		
16	María Beltrán Parra	Barrio obrero la Bomba		Beltrán Parra		
17	Gerardo Jairo Suarez	El Jordán	3117598690			
18	Mariagloria Cardona	la bomba	323-2864780	Maria cardona		
Firma Nombre:  Representante Contratista		Firma Nombre: Representante Interventoría				




ACTA DE VECINDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.

Hoy 1 de		FECHA	
DD	MM	AA	
ACTA No.:		CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3		INTERVENTORÍA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		MUNICIPIO:	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

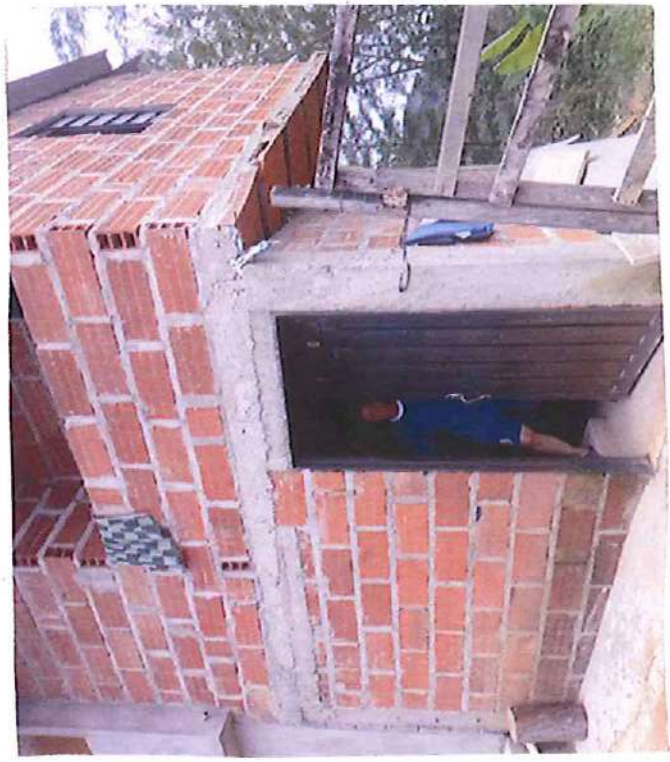

Nombre del Responsable del predio o lote:		Propietario: <u>Alvaro Edina Ros</u>	
Tenencia:		Arrendatario: <u>Ros</u>	
Nombre del Propietario:		No. de pisos:	
Dirección:		Municipio:	
Departamento:		Vereda:	
Zona Urbana:		Zona Rural:	
Teléfono: <u>710 43 50 7208</u>		Long. del frente (mts):	

SERVICIOS PUBLICOS	
SI	NO
1. Agua	☐
2. Alcantarillado	☐
3. Energía	☐
4. Teléfonos	☐
5. Gas	☐
6. Televisión cable	☐
7. Otros	☐


TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	☐
2. Valor Arquitectónico	☐
3. Valor Intermedio	☐
4. Valor normal	☐
5. En construcción	☐
6. Sin edificar	☐
7. Otro	☐
Cual?	
ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐
Garaje	☐
Cuantos	
El garaje se usa como	
Comercio	☐
NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utiliza el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
GRIETAS Y FISURAS:	
HUMEDADES:	
HUNDIMIENTO PISO:	
DESPLAZAMIENTOS:	
OTRO: Cual?	
ESTRUCTURA:	
MUROS:	
CUBIERTA:	
PISOS:	
FACHADA:	

MUNICIPIO:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información suministrada en el numeral 3. ESTADO DEL PREGIO ANTES DE INTERVENIR):

Representante del Municipio



ACTA DE VECINDAD

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Hoy a las

FECHA

DD MM AA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

CONTRATO DE OBRA N°:

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

MUNICIPIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____
Tenencia: Propietario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Victor Eduardo Sepulveda No. de piezas _____
Dirección: Vda. de los toros Municipio: Granada
Departamento: Mosqueles Vereda: _____
Zona Urbana: _____ Zona Rural: X Long. del frente (mts): _____
Teléfono: _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	<u>Cable</u>

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cual?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	Garaje	☐ SI ☐ NO
2. Comercial	☐	Cuantos	☐
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Comercio	☐ SI ☐ NO

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

GRUETAS Y FISURAS: _____
ESTRUCTURA: _____
MUROS: _____
CUBIERTA: _____
PISOS: _____
FACHADA: _____
HUMEDADES: _____
HUNDIMIENTO PISO: _____
DESPLAZAMIENTOS: _____
OTRO: Cual? _____



INVESTA
CONSTRUCTIONS NO S.A.S
RUE BOUJOLLE 05200

Moja 1 de

FECHA

11

9A

ACTA No.: _____

CONTRATO DE OBRA N.º:

CONSIGA CUBES ASSOCIADOS H&G

MUNICIPIO:

OBJETO DEL PROYECTO: MEMORANDO DE VÍAS TERCERAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑO, GRANADA, MARZITILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO



FIRMAS

Firma: Kirschner

Nombre: 47 111 68 100

Responsible Proprietario/owner:

Prints: _____

Nombre: _____

CCCONT: : _____

Representante del contratista

Firma: _____

Nombre: _____

CCONTY: _____


Representante de la intervención

From:

Firm: _____

CCONT: : _____

Representante del Municipio



ACTA DE VECINDAD

INSTRUMENTOS Y CONSTRUCCIONES NO S.A.S.

Hoja 1 de 1

OBJETO DEL PROYECTO: MEDICAMENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MASINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YC

CONTRATO DE OBRAS N°:

INTERVENIDORA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS MAG

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:

MUNICIPIO:

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Pepe Lopez No. de pisos _____

Dirección: Vda. La Estrella Municipio: Granada

Departamento: Amorosa Vereda: La Estrella

Zona Urbana: La Estrella Long. del frente (mts): _____

Teléfono: 7109522

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

USO ACTUAL	Garaje	SI	NO
1. Residencial	☐	☐	☐
2. Comercial	☐	☐	☐
3. Industrial	☐	☐	☐
4. Institucional	☐	☐	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (adjuntar el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Adobe y Lija Forro cemento

MUROS: _____

CUBIERTA: Lija Forro cemento

PISOS: Cemento

FACHADA: _____

HUMEDADES: NP

HUNDIMIENTO PISO: NP

DESPLAZAMIENTOS: NP

OTRO: Cuál? _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





ACTA DE VECINDAD



INGENIERIA Y CONTRATACIONES W S.A.S

Hoy: 1 de

FECHA

DD

MM

AA

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCAJAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARTILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONTRATACIONES W S.A.S

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

MUNICIPIO:

ACTA No.:

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral 3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR?)

Gradera por cercada en obra y faja fundación

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO



FIRMAS

Firma: E. Faber López

Nombre:

CC O NIT: 10117902789

Nombre:

Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

Representante del contratista

Firma:

Nombre:

CC O NIT:

Representante de la Interventoría

Firma:

Nombre:

CC O NIT:

Representante del Municipio



ACTA DE VECINDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MO S.A.S.

Hoja 1 de	
FECHA	
DD	MM
AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MO	
CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:	
INTERVENCIÓN: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
MUNICIPIO:	

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARTINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
Nombre del Responsable del predio o lote:	
Teniente:	Propietario: <u>Arrendatario</u> ☒ Poseedor ☐ Otro Qual?
Nombre del Propietario:	<u>Dina Vargas</u>
Dirección:	<u>Arboledas</u> No. de pisos:
Departamento:	<u>Artesia</u> Municipio: <u>Granada</u>
Zona Urbana:	Zona Rural: ☒ Vereda:
Teléfono:	<u>234900664</u> Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS	
SI	NO
1. Agua	☒
2. Alcantarillado	☒
3. Energía	☒
4. Teléfonos	☒
5. Gas	☒
6. Televisión cable	☒
7. Otros	☒

TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	☐
2. Valor Arquitectónico	☐
3. Valor Intermedio	☒
4. Valor normal	☐
5. En construcción	☐
6. Sin edificar	☐
7. Otro	☐
Qual?	
ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐
5. Recreacional	☐
6. Balido	☐
7. Otro	☐
Qual?	
Garaje	☐
Cuantos	
El garaje se usa como	
Comedor	☐
NO	☐



1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Útilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
GRIETAS Y FISURAS:	
HUMEDADES:	
HUNDIMIENTO PISO:	
DESPLAZAMIENTOS:	
OTROS Qual?	
ESTRUCTURA:	
MUROS:	
CUBIERTA:	
PIESOS:	
FACHADA:	



INVESTING & CONSULTING CO. S.A. S
1401 BOULEVARD, 01225

FEDHA

FEDHA

MM

MA

OBJETO DEL PROYECTO: MEDRAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.

CONTRATO DE OBRA N.º:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º

MUNICIPIO:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral 3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO



FIRMS

Films: .121774 32823980

Nombre:

CCO NIT

Responsible propietario/poseedor

Films:

Number

CCOM

Representante del contabilista

Films:

November

100

Firma:

Nomb

CCONT: ;

ACTA DE VICINIDAD

Hoja 1 de 1

FECHA: DD MM AA

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARUNTILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M.D.

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:

MUNICIPIO:

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: José Beltrán

Dirección: vd San Francisco No. de pisos 1

Departamento: San Francisco Municipio: Santo Domingo

Zona Urbana: Arroquia Zona Rural: ☒ Vereda: _____

Teléfono: 2130 4554 Long. del frente (mts): _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	SI	NO
1. Monumento Nacional	☐	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	☐
3. Valor Intermedio	☐	☐
4. Valor normal	☐	☐
5. En construcción	☐	☐
6. Sin edificar	☐	☐
7. Otro	☐	☐
Cuál?		

USO ACTUAL

	SI	NO
1. Residencial	☐	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional	☐	☐
5. Recreacional	☐	☐
6. Balido	☐	☐
7. Otro	☐	☐
Cuál?		

ACCESOS VEHICULARES

	SI	NO
Garaje	☐	☐
Cuartos	☐	☐
El garaje se usa como		
Comercio	☐	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

GRIETAS Y FISURAS: en piso, en muro y patio

HUMEDADES: NO

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

OTRO: Cuál?

ESTRUCTURA: _____

MUROS: tapeta en rebuque putua

CUBIERTA: En estufa

PISOS: secano liso

FACHADA: rebuque putua




ACTA DE VECINDAD



Hoja 1 de 1		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
DD	MM	AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		INTERVENTORA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	
ACTA N°:		MUNICIPIO:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

vivienda con tejado en piso concreto patio casa a techu estalla

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO










FIRMAS

Firma: *Javier Betancud*

Nombre: _____

C.C.O NIT: _____

Responsable propietario/poseedor

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.O NIT: _____

Representante del contratista

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.O NIT: _____

Representante de la Interventoría

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.O NIT: _____

Representante del Municipio




ACTA DE VICINIDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M.D. S.A.S.

Hoja 1 de 1	
FECHA	DD MM AA
DD	MM
AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M.D.	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS M&G
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
MUNICIPIO:	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

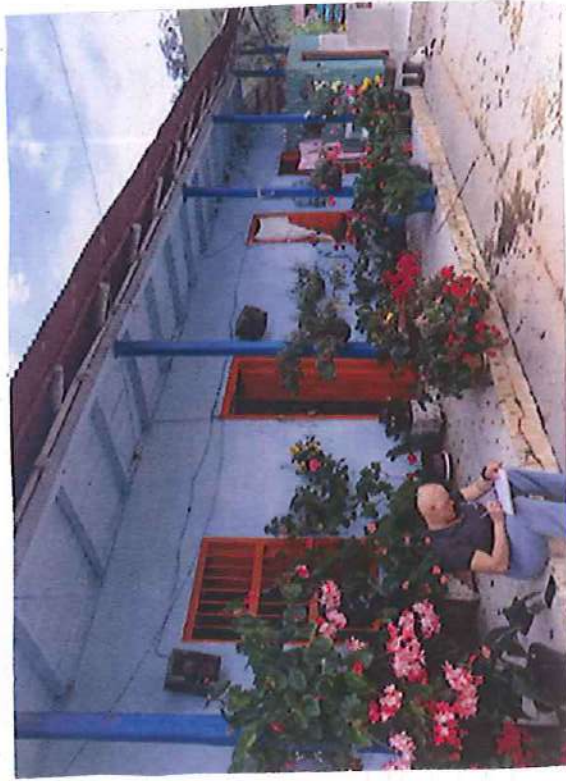

2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote:	<u>Amor madero</u>
Tenencia:	Propietario ☒ Arrendatario ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario:	<u>Amor madero</u>
Dirección:	<u>Antigua</u> No. de pisos <u>1</u>
Departamento:	<u>Antioquia</u> Municipio: <u>Santo Domingo</u>
Zona Urbana:	<u>Zona Rural</u> Vereda: <u>San Francisco</u>
Teléfono:	<u>30256925</u> Long. del frente (mts): <u>10</u>

SERVICIOS PUBLICOS	
1. Agua	SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado	SI ☐ NO ☐
3. Energía	SI ☐ NO ☐
4. Teléfonos	SI ☐ NO ☐
5. Gas	SI ☐ NO ☐
6. Televisión cable	SI ☐ NO ☐
7. Otros	SI ☐ NO ☐

TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	☐
2. Valor Arquitectónico	☐
3. Valor Intermédio	☐
4. Valor normal	☒
5. En construcción	☐
6. Sin edificar	☐
7. Otro	☐
Cual?	<u>Qual?</u>
ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	Cuartos ☐
3. Industrial	El garaje de uso como Comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	Cual? ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
GRUETAS Y FISURAS:	<u>para DUMITRO J</u>
HUMEDADES:	<u>no</u>
HUNDIMIENTO PISO:	<u>no</u>
DESPLAZAMIENTOS:	<u>no</u>
OTRO: Cual?	<u>no</u>
ESTRUCTURA:	
MUROS: <u>para para DUMITRO J pieza</u>	
CUBIERTA:	
PISOS: <u>cimiento liso esmaltado con</u>	
FACHADA:	

 		ACTA DE VECINDAD	
Hoja 1 de ____			
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
DD	MM	AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3			INTERVENTORÍA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
CONTRATO DE OBRA N°:			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
ACTA No.:			MUNICIPIO:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			
			
			

FIRMAS	
Firma: <u>Sebastián Mendoza</u> Nombre: _____ C.C O NIT: _____ Responsable propietario/poseedor	Firma: _____ Nombre: _____ C.C O NIT: _____ Representante de la interventoría
Firma: _____ Nombre: _____ C.C O NIT: _____ Representante del contratista	Firma: _____ Nombre: _____ C.C O NIT: _____ Representante del Municipio



ACTA DE VECINDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G S.A.S.

Hoja 1 de 2

FECHA: DO MM AA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IW

CONTRATO DE OBRA N°:

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARUNTILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

MUNICIPIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Yenny Castro

Dirección: Vda. Santenay

Departamento: Orizaba

Municipio: Santo Domingo

Zona Urbana: 312 668 2590

Vereda: _____

Long. del frente (mts): _____

Teléfono: 219 781 1849

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cul? _____

TIPO DE PREDIO

	SI	NO
1. Monumento Nacional	☐	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	☐
3. Valor Intermedio	☐	☐
4. Valor normal	☒	☐

USO ACTUAL

	SI	NO
1. Residencial	☒	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional	☐	☐

ACCESOS VEHICULARES

	SI	NO
Garaje	☐	☐
Cuartos	☐	☐
El garaje se usa como	☐	☐
Comercio	☐	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

GRUETAS Y FISURAS: NA

HUMEDADES: NA

HUNDIMIENTO PISO: NA

DESPLAZAMIENTOS: NA

OTRO: Cul? NA

ESTRUCTURA: 1

MUROS: adobe sin rebuque

CUBIERTA: teja plancha

PISOS: cemento rustico

FACHADA: adobe + rebuque de maderas

			
ACTA DE VECINDAD			
Hoja 1 de 1			
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	
ACTA No.:		MUNICIPIO:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR")

vivenda en obra gas puros ementado rustico cemento.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

FIRMAS

Firma: <u>Yenny Castro</u> Nombre: <u>Yenny Castro</u> C.C.O NTI: <u>22025726</u> Responsable propietario/poseedor	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NTI: _____ Representante de la interventoria	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NTI: _____ Representante del Municipio
---	--	--

ACTA DE VECINDAD

Objeto del Proyecto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

Acta No.:

Fecha:

DD MM AA

Interventoria: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

Municipio:

Contrato de Obra N°:

Contrato de Interventoria N°:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Daly Andra Henao No. de pisos _____

Dirección: Vda San Pablo

Departamento: Antioquia Municipio: _____

Zona Urbana: X Zona Rural: _____ Vereda: _____

Teléfono: 310 875 1106 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

	USO ACTUAL		Garaje	SI	NO
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	☐	☐
2. Comercial	☐	6. Balido	Cuántos		
3. Industrial	☐	7. Otro	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	Cuál?	Comercio	SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: _____

MUROS: _____

CUBIERTA: _____

PISOS: _____

FACHADA: _____

GRIETAS Y FISURAS: _____

HUMEDADES: _____

HUNDIMIENTO PISO: _____



DESPLAZAMIENTOS: _____

OTRO: Cuál? _____

cosa azul clara
con rojo


			
ACTA DE VECINDAD			
Hoja 1 de 1			
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3		INTERVENTORA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	
ACTA No.:		MUNICIPIO:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR.)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			
			
			

FIRMAS			
Firma: <u>Dorly Henao</u> Nombre: _____ C.C.O NT: <u>43797407</u> Responsable propietario/poseedor	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NT: _____ Representante del contratista	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NT: _____ Representante de la interventoria	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NT: _____ Representante del Municipio

caso blanco ①



ACTA DE VICINIDAD



Hoy a las 10 de		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
FECHA		INTERVENIENTES: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
DD	MM	AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATO DE OBRA N°:		MUNICIPIO:	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lotes: _____
Técnica: _____ Propietario: _____ Otro Cui? Escuela
Nombre del Propietario: Muñoz Gabriel urco R
Dirección: el saltillo No. de pisos: _____
Departamento: Antioquia Municipio: Santo Domingo
Zona Urbana: _____ Vereda: el saltillo
Teléfono: _____ Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PUBLICOS	
SI	NO
☒	☐
1. Agua	
2. Alcantarillado	☐
3. Energía	☐
4. Teléfonos	☐
5. Gas	☐
6. Televisión cable	☐
7. Otros	☐

TIPO DE PREDIO

☐	1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
☐	2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
☐	3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
☒	4. Valor normal	☐	Cuál?	☐

USO ACTUAL

☐	1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
☐	2. Comercial	☐	6. Balcón	☐
☐	3. Industrial	☐	7. Otro	☐
☒	4. Institucional	☐	Cuál?	☐

ACCESOS VEHICULARES

☐	Garaje	☐	SI	☐	NO
☐	Cuartos	☐	El garaje se usa como	☐	
☐	Comercio	☐	SI	☐	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral %, OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: techar

MUROS: _____

CUBIERTA: teja de suc

PISOS: semento wjo

FACHADA: semento u adobe

GRETAS Y FISURAS: _____

HUMEDADES: a cuatro adobe

HUNDIMIENTO PISO: semento

DESPLAZAMIENTOS: n/a

OTRO: Cuál? _____




ACTA DE VICINIDAD

H08 3 de _____

FECHA

DD MM AA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATO DE OBRA N°: _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: _____

MUNICIPIO: _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

unidades en madera y fierro de cinc.

para a edificar sin mover.


5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO











FIRMAS

Firma: Moises Orozco

Nombre: _____

CC O NIT: 20.476.479

Responsable propietario/poseedor

Firma: _____

Nombre: _____

CC O NIT: _____

Representante de la interventoria

Firma: _____


Nombre: _____

CC O NIT: _____

Representante del Municipio



ACTA DE VECINDAD



Hoy a las ____ de ____	
FECHA	
DD	MM
AA	
ACTA No.:	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARITILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	
CONTRATO DE OBRA N°:	
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	
MUNICIPIO:	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	
	
2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote: _____	
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____	
Nombre del Propietario: <u>Enrique Muñoz</u>	
Dirección: <u>Vda. Huancabamba</u> Municipio: <u>El Peñol</u> No. de pisos <u>2</u>	
Departamento: <u>Antioquia</u>	
Zona Urbana: <u>X</u> Zona Rural: <u>X</u> Vereda: _____	
Teléfono: <u>310 6066728</u> Long. del frente (mts): _____	

SERVICIOS PUBLICOS				
SI	NO			
OBSERVACIONES				
1. Agua	☒			
2. Alcantarillado	☒			
3. Energía	☒			
4. Teléfonos	☒			
5. Gas	☒			
6. Televisión cable	☒			
7. Otros	☒			
Cual? <u>Redes</u>				
TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐			
2. Valor Arquitectónico	☐			
3. Valor Intermedio	☐			
4. Valor normal	☐			
5. En construcción	☒			
6. Sin edificar	☐			
7. Otro	☐			
Cual? _____				
ACCESOS VEHICULARES				
USO ACTUAL	Garaje	SI	NO	
1. Residencial	☒	☐	☐	
2. Comercial	☐	☐	☐	
3. Industrial	☐	☐	☐	
4. Institucional	☐	☐	☐	
El garaje se usa como		Comercio	SI	NO
Cual? _____				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
ESTRUCTURA: <u>Caja prefabricada en concreto</u>	
MUROS: <u>Caja con teja de barro</u>	
CUBIERTA: <u>teja de barro</u>	
PISOS: <u>barrota en piedra</u>	
FACHADA: _____	
GRIETAS Y FISURAS: <u>N/A</u>	
HUMEDADES: <u>N/A</u>	
HUNDIMIENTO PISO: <u>N/A</u>	
DESPLAZAMIENTOS: <u>N/A</u>	
OTRO: Cual? _____	

ACTA DE VECINDAD

Hoja 1 de 1

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

DD	MM	AA	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	MUNICIPIO:
ACTA No.:			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/

FIRMAS

Firma: <u>Emilia Muñoz</u> Nombre: _____ C.C.O.N.T.: _____ Responsable propietario/poseedor	Firma: <u>Dorisela Govea</u> Nombre: _____ C.C.O.N.T.: <u>39-552061</u> Representante del contratista	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O.N.T.: _____ Representante de la interventoría	Firma: <u>Mauricio Escoballos</u> Nombre: _____ C.C.O.N.T.: <u>112840373</u> Representante del Municipio
--	--	---	---

ACTA DE VECINDAD



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.
NO. 1000 0000 0000

Hoja 1 de 1

REC-A

DD MM AA

ACTA No.: _____

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

CONTRATO DE OBRA N°: _____

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: _____

MUNICIPIO: _____

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARZILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cuál? _____

Nombre del Propietario: Una Varona Castro

Dirección: Vda. Huancas

Departamento: Antioquia Municipio: El Peñol No. de pisos: 2

Zona Urbana: Vda. Huancas Zona Rural: X Vereda: Vda. Huancas

Teléfono: 3125890426 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	<u>Wifi</u>

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	Garaje	☐ SI ☐ NO
2. Comercial	☐	Cuartos	☐
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Comercio	☐ SI ☐ NO
		Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Julio el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

GRUETAS Y FISURAS: hacer para principal

HUMEDADES: _____

HUNDIMIENTO PISO: _____

DESPLAZAMIENTOS: _____

OTRO: Cuál? _____

ESTRUCTURA: _____

MUROS: teja de barro

CUBIERTA: cerámica en colores rústico

PISOS: moqueta beige para

FACHADA: _____

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

FEC-A		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	MUNICIPIO:
DD	MM AA		

CONTRATO DE OBRAS N.º:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º:
------------------------	--------------------------------

13. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

S. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



FIRMAS

Firma: Lisa M.L.C.
 Nombre:
 CCO NT: 1047.231.669
 Responsable propietario/poseedor

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.O. INT: _____

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.O. INT: _____

Representante de la interventoría

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.O NT: _____
Representante del Municipio

ACTA DE VECINDAD



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

MUNICIPIO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____
 Tenencia: ☒ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Posesor ☐ Otro Cui? _____
 Nombre del Propietario: Dora Castro
 Dirección: _____
 Departamento: _____ Municipio: _____
 Zona Urbana: _____ Vereda: _____
 Teléfono: 752149578 Long. del frente (mts): _____
 No. de pisos: _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cui?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cui?	

ACCESOS VEHICULARES

USO ACTUAL	USO ACTUAL	Garaje	SI	NO
1. Residencial	☐	☐	☐	☐
2. Comercial	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	Comercio	SI	NO
		Cui?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: _____
 MUROS: _____
 CUBIERTA: _____
 PISOS: _____
 FACHADA: _____
 GRIETAS Y FISURAS: _____
 HUMEDADES: _____
 HUNDIMIENTO PISO: _____
 DESPLAZAMIENTOS: _____
 OTRO: Cui? _____

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.
BOGOTÁ - COLOMBIA TEL: 332.14.14

HOB. 1. de ____		FECHA		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
DD	MM	AA	CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
ACTA No.:			CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
					MUNICIPIO:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO



FIRMAS

Firma: Dora Alba Lozano Firma: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
C.C.O NIT: 42840934 C.C.O NIT: _____
Representante propietario/poseedor Representante de la interventoría
Representante del contratista Representante del Municipio




ACTA DE VICINDAD

HOJA 1 de ____
 FECHA: ____/____/____
 DO: ____ MM ____ AA
 ACTA No.: ____

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO
 CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ
 INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
 CONTRATO DE OBRA N°: ____
 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: ____
 MUNICIPIO: ____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivenda construida por mano de 70 años construida de
 faja techo de estera y faja de barro piso de cemento y
 puertas de madera pintura a base cal en paredes interiores y
 exteriores.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO










FIRMAS

Responsable propietario/poseedor
 Firma: Diego J. Marin S
 Nombre: Diego J. Marin S
 C.C. O NIT: 70.950.546

Representante del contratista
 Firma: Derecha Gomez
 Nombre: Derecha Gomez
 C.C. O NIT: 70.950.546

Representante de la interventoria
 Firma: _____
 Nombre: _____
 C.C. O NIT: _____

Representante del Municipio
 Firma: _____
 Nombre: _____
 C.C. O NIT: _____

ACTA DE VICINIDAD



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

Hoja 1 de 1

FECHA

DD

MM

AA

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARTINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

CONTRATO DE OBRA N°:

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

MUNICIPIO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____
 Tenencia: Propietario Arrendatario Posesor Otro Cual?
 Nombre del Propietario: Martín Villegas
 Dirección: Vda Horizontes No. de pisos 2
 Departamento: Antioquia Municipio: Peñol
 Zona Urbana: Vereda Zona Rural: X Vereda: Vd horizontes
 Teléfono: 2172 4702 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	<u>fluido</u>
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Útil al numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Brick en la malla sobre laja
 MUROS: Rebogue liso pintado
 CUBIERTA: Fibrocemento y auto rebote
 PISOS: En cerámica lisa adorno recto
 FACHADA: Rebogue liso pintura



ACTA DE VECINDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.

H013_1 de	
FECHA:	
DD	MM
AA	
ACTA No.:	
CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
MUNICIPIO:	

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCION, EL PEÑOL, GRANADA, MARITILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivenda en buen estado construida en adobe rebuque y pintura a base de agua tienen en el adobe de la vía principal

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

FIRMAS

Firma: <u>Martha Isabel Velazquez</u>	Firma: <u>Luisa Rocha M</u>	Firma: <u>Marleny Escobar</u>
Nombre: <u>Martha Isabel Velazquez</u>	Nombre: <u>Luisa Rocha M</u>	Nombre: <u>Marleny Escobar</u>
C.C.O.N.T.: <u>32501981 de 06</u>	C.C.O.N.T.: <u>1036951973</u>	C.C.O.N.T.: <u>42840373</u>
Responsable propietario/poseedor	Representante del contratista	Representante del Municipio



ACTA DE VICINIDAD



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.
Tel: 316 3972-9

Hoja 1 de 1

FECHA: DD MM AA

ACTA No.: _____

OBJETO DEL PROYECTO: MEDORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARITILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3

CONTRATO DE OBRA N°: _____

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: _____

MUNICIPIO: _____

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Otro Cuiap? _____

Nombre del Propietario: Mariely Ceballos

Dirección: La Horqueta

Departamento: Antioquia

Zona Urbana: Peñol

Teléfono: 314 758 9341

Municipio: El Peñol

Vereda: Vereda Horizontes

Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Qual? _____

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Qual?	_____

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Qual?	_____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	☐	SI	☐	NO	☐
Cuentos	☐				
El garaje se usa como	☐				
Comercio	☐	SI	☐	NO	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: _____

GRIETAS Y FISURAS: NA

MUROS: NA

CUBIERTA: Falta fijamiento

PISOS: Pisos en bandosa bto en buen estado

FACHADA: Debe rebogue liso pintura blanca.

OTRO: Cuiap? _____





ENGINEERING CONSTRUCTION WJ N.A.S.
1400 0000 0000 0000

Hoja 1 de 1		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
FECHA:			
DO	MM	AA	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	
ACTA N°:		MUNICIPIO:	

[illegible]

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

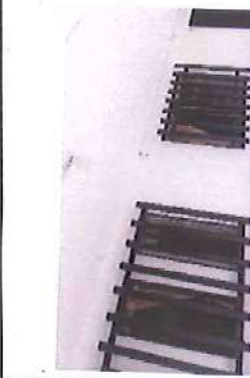

FIRMAS	
Firma: <u>Melodany Ceballos O.</u> Nombre: _____ C.C.O NIT: <u>42840373</u> Responsable propietario/poseedor	Firma: <u>Deruber Goner</u> Nombre: _____ C.C.O NIT: <u>50500080</u> Representante del contratista
Firma: <u>USA Rocha</u> Nombre: _____ C.C.O NIT: <u>93608143</u> Representante de la interventoria	Firma: _____ Nombre: _____ C.C.O NIT: _____ Representante del Municipio

Firma: Ysa Rochall
Nombre: Ysa Rochall
C.C.O NIT: 13895473
Representante de la interventoría

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.O NIT: _____
Representante del Municipio



ACTA DE VICINIDAD


INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.

Hoja 1 de 1	
FECHA	
DD	MM
AA	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3	
CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
MUNICIPIO: Marinilla	

2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote:	
Tenencia:	Propietario ☒ Arrendatario ☒ Otro: <u>Catío</u>
Nombre del Propietario:	<u>Walter Pardo</u>
Dirección:	<u>Antigua</u>
Departamento:	<u>Marinilla</u>
Zona Urbana:	<u>7104367823</u>
Teléfono:	<u>7104367823</u>
Municipio:	<u>Marinilla</u>
Vereda:	<u>Pozos</u>
Long. del frente (mts):	

SERVICIOS PUBLICOS		
SI	NO	OBSERVACIONES
☒	☐	1. Agua
☐	☒	2. Alcantarillado
☒	☐	3. Energía
☐	☒	4. Teléfonos
☐	☒	5. Gas
☒	☐	6. Televisión cable
☐	☐	7. Otros
☐	☐	Cual? <u>Dieta</u>

TIPO DE PREDIO	
☐	1. Monumento Nacional
☐	2. Valor Arquitectónico
☐	3. Valor Intermedio
☒	4. Valor normal
☐	5. En construcción
☐	6. Sin edificar
☐	7. Otro
☐	Cual?
USO ACTUAL	
☒	1. Residencial
☐	2. Comercial
☐	3. Industrial
☐	4. Institucional
☐	5. Recreacional
☐	6. Baldo
☐	7. Otro
☐	Cual?
ACCESOS VEHICULARES	
☐	Garaje
☐	Cuantos
☐	El garaje se usa como
☐	Comercio
☐	NO

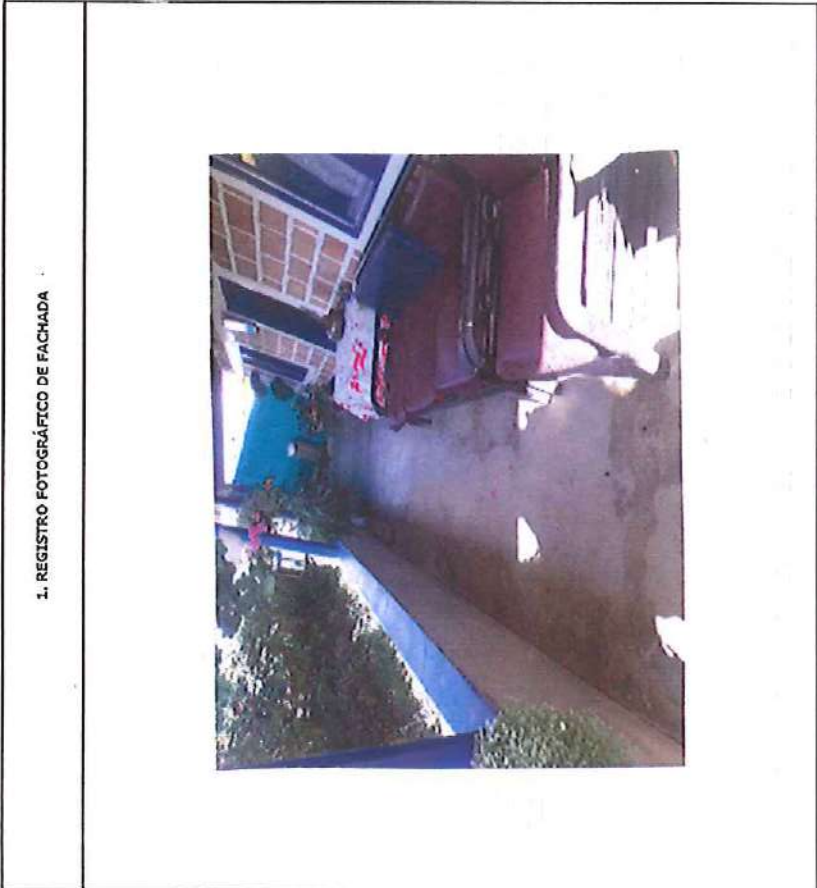

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
ESTRUCTURA:	
MUROS:	
CUBIERTA:	
PISOS:	
FACHADA:	
GRIETAS Y FISURAS:	
HUMEDADES:	
HUNDIMIENTO PISO:	
DESPLAZAMIENTOS:	
OTRO: Cual?	

ACTA DE VECINDAD

H03B_1_1 de ____		FECHA		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARTINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
DD	MM	AA	CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	MUNICIPIO:
ACTA No.:			CONTRATO DE OBRERA N°:		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

FIRMAS

<p>Firma: <u>[Signature]</u></p> <p>Nombre: _____</p> <p>C.C.O.N.T.: <u>110811361</u></p> <p>Responsable propietario/poseedor</p>	<p>FIRMAS</p>	<p>Firma: <u>[Signature]</u></p> <p>Nombre: <u>Derambal Goner</u></p> <p>C.C.O.N.T.: _____</p> <p>Representante del contratista</p>	<p>Firma: <u>[Signature]</u></p> <p>Nombre: <u>Segriet Tobon</u></p> <p>C.C.O.N.T.: <u>11081136 693</u></p> <p>Representante de la interventoria</p>	<p>Firma: <u>Martín Colloco</u></p> <p>Nombre: <u>Martín Colloco</u></p> <p>C.C.O.N.T.: <u>1041232826</u></p> <p>Representante del Municipio</p>
---	---------------	---	--	--



ACTA DE VICINIDAD



INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

HOJA 1 de 1	
FECHA	
DD	MM
ACTA No.:	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
MUNICIPIO: Marinilla	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	
2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote: _____	
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Otro Cui? ☐	Posesión: ☒
Nombre del Propietario: Juliana Gómez D.	
Dirección: Vda. Pura Marinilla	
Departamento: Antioquia	
Municipio: Marinilla	
Zona Urbana: ☒ Zona Rural: ☐	
Vereda: _____	
Teléfono: _____	
Long. del frente (mts): _____	

SERVICIOS PUBLICOS		
SI	NO	OBSERVACIONES
☒	☐	1. Agua
☐	☒	2. Alcantarillado
☒	☐	3. Energía
☐	☒	4. Teléfonos
☐	☒	5. Gas
☐	☒	6. Televisión cable
☐	☒	7. Otros
TIPO DE PREDIO		
☐	☐	1. Monumento Nacional
☐	☐	2. Valor Arquitectónico
☐	☐	3. Valor Intermedio
☒	☐	4. Valor normal
☐	☐	5. En construcción
☐	☐	6. Sin edificar
☐	☐	7. Otro
ACCESOS VEHICULARES		
USO ACTUAL		Garaje SI ☐ NO ☐
☒	1. Residencial	Cuantos ☐
☐	2. Comercial	El garaje se usa como
☐	3. Industrial	Comercio SI ☐ NO ☐
☐	4. Institucional	Cui? ☐
USO REAL		
☒	5. Recreacional	
☐	6. Balcón	
☐	7. Otro	
☐	Cui? ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
GRIETAS Y FISURAS: NA	
HUMEDADES: NA	
HUNDIMIENTO PISO: NA	
DESPLAZAMIENTOS: NA	
OTRO: Cui? Antes a nivel del terreno y en la zona	



ACTA DE VICINIDAD



Hoja 1 de 1		
OBJETO DEL PROYECTO: MEDORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO		
DD	MM	AA
FECHA		
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G		
MUNICIPIO:		
CONTRATO DE OBRAS N°:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			
			
			

FIRMAS	
Responsable propietario/poseedor	Representante del Municipio
Firma: <u>Alfonsa Gómez D.</u>	Firma: <u>Alfonso Gallego</u>
Nombre: <u>Alfonsa Gómez D.</u>	Nombre: <u>Alfonso Gallego</u>
CCO MT: <u>1.045.025.263</u>	CCO MT: <u>1.041.232.626</u>



ACTA DE VECINDAD



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

Hoja 1 de 1	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
ACTA No.:	MUNICIPIO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lotes: _____

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario X Poseedor X Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Aineldo de Jesus Oviedo S.

Dirección: Vda. Poro No. de pisos 1

Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla

Zona Urbana: X Zona Rural: _____ Vereda: poros

Teléfono: 2144119544 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PUBLICOS	
SI	NO
1. Agua	☒
2. Alcantarillado	☒
3. Energía	☒
4. Teléfonos	☒
5. Gas	☒
6. Televisión cable	☒
7. Otros	☒

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cual? _____	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	Garaje	☐
2. Comercial	☐	Cuartos	☐
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Comercio	☐
		Cual? _____	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: _____

MUROS: _____

CUBIERTA: _____

PISOS: _____

FACHADA: _____

GRJETAS Y FISURAS: _____

HUMEDADES: _____

HUNDIMIENTO PISO: _____

DESPLAZAMIENTOS: _____

OTRO: Cual? _____



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

HORA: 1 de _____		OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
FECHA:		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	
DD	MM	AA	MUNICIPIO:
ACTA No.:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			
			
			

FIRMAS	
Firma: <u>Almendra del</u>	Firma: <u>David Gomez</u>
Nombre: <u>Almendra del</u>	Nombre: <u>David Gomez</u>
C.C.O NT: <u>40876242</u>	C.C.O NT: <u>151456693</u>
Responsable propietario/poseedor	Representante del contratista
Firma: <u>Mari sol Callejo</u>	
Nombre: <u>Mari sol Callejo</u>	
C.C.O NT: <u>10412321326</u>	
Representante del Municipio	



ACTA DE VECINDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MO S.A.S.
NIT 900.300.005.0

Objeto del Proyecto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ

Contrato de Obra N°:

Contratista: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

Contrato de Interventoría N°:

Municipio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Pedro Ignacio Restrepo No. de pisos 1

Dirección: Vereda Pozo Municipio: Marinilla

Departamento: Antioquia Vereda: _____

Zona Urbana: _____ Zona Rural: ☒ Long. del frente (mts): _____

Teléfono: _____



SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	<u>Caleta</u>

TIPO DE PREDIO

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Monumento Nacional	☐	☒	
2. Valor Arquitectónico	☐	☒	
3. Valor Intermedio	☐	☒	
4. Valor normal	☒	☐	

USO ACTUAL

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Residencial	☒	☐	
2. Comercial	☐	☒	
3. Industrial	☐	☒	
4. Institucional	☐	☒	

ACCESOS VEHICULARES

	SI	NO	OBSERVACIONES
Garaje	☐	☒	
Cuartos	☐	☒	
El garaje se usa como	☐	☒	
Comercio	☐	☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

GRIETAS Y FISURAS: N/A

HUMEDADES: N/A

HUNDIMIENTO PISO: N/A

DESPLAZAMIENTOS: N/A

OTRO: Cual? N/A

ESTRUCTURA: cada de abata, abajo a arriba

MUROS: refuerzo pintura

CUBIERTA: techo teja de barro y tabilla

PISOS: en ceramica lisa

FACHADA: _____

ACTA DE VECINDAD

Foja 1 de 1

FECHA

DD MM AA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M2

INTERVENIENTOS: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENIENTOS N°:

MUNICIPIO:

ACTA N°:

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENIENTOS N°:

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____
 Terencia: Propietario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____
 Nombre del Propietario: Pedro Ignacio Herrera No. de pisos _____
 Dirección: Vereda Potos Municipio: Manilla
 Departamento: Antioquia Zona Rural: X Vereda: _____
 Zona Urbana: _____ Long. del frente (mz): _____
 Teléfono: _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cable?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cual?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
		Cual?	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Útilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: cada de alba, muros y pinta
 GRIETAS Y FISURAS: N/A
 HUMEDADES: N/A
 Muros: de bloque pinta
 HUNDIMIENTO PISO: N/A
 CUBIERTA: techo teja de barro a tabilla
 DESPLAZAMIENTOS: N/A
 PISOS: en ceramica lisa
 OTRO: Cual?
 FACHADA: N/A



ACTA DE VICINIDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3 S.A.S.

HORA: 1 DE _____		
FECHA:		
DO	MM	AA
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W3		
CONTRATO DE OBRA N°:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G		
MUNICIPIO:		

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote:	Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario: <u>Wda Porzo 85</u>	Nombre del Propietario: <u>Wda Porzo 85</u>
Dirección: <u>Antioquia</u>	Municipio: <u>Marinilla</u>
Departamento: <u>Antioquia</u>	Vereda: <u>vd porzos</u>
Zona Urbana: <u>722658148</u>	Long. del frente (mts): <u>100 mts</u>
Teléfono: <u>3226781808</u>	

SERVICIOS PUBLICOS	
1. Agua	SI ☒ NO ☐
2. Alcantarillado	SI ☐ NO ☒
3. Energía	SI ☒ NO ☐
4. Telefonos	SI ☐ NO ☒
5. Gas	SI ☐ NO ☒
6. Televisión cable	SI ☒ NO ☐
7. Otros	SI ☐ NO ☐

TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	SI ☐ NO ☐
2. Valor Arquitectónico	SI ☐ NO ☐
3. Valor Intermedio	SI ☐ NO ☐
4. Valor normal	SI ☒ NO ☐
5. En construcción ☐	
6. Sin edificar ☐	
7. Otro ☐	
Cual? ☐	
USO ACTUAL	
1. Residencial	SI ☒ NO ☐
2. Comercial	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	SI ☐ NO ☐
4. Institucional	SI ☐ NO ☐
ACCESOS VEHICULARES	
Garaje	SI ☐ NO ☐
Cuantos	☐
El garaje se usa como	
Comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: <u>ninguna</u>
MUROS: <u>muro arenado y pintura</u>	HUMEDADES: <u>NA</u>
CUBIERTA: <u>teja de barro y teastilla</u>	HUNDIMIENTO PISO: <u>4 fisura y levantamiento</u>
PISOS: <u>piso en baldosa lila con hundimiento</u>	DESPLAZAMIENTOS: <u>NA</u>
FACHADA:	OTRO: Cual? ☐



1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

[illegible]

H03_1_36		FECHA		OBJETO DEL PROYECTO: MEMORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
DD	MM	AA	CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ		INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
10	10	22	CONTRATO DE OBRA N°:		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
ACTA N°:			MUNICIPIO:		

[illegible]

FIRMAS	
<p>Firma: <u>E. G. Lardiz E. G. Lardiz E. G. Lardiz</u></p> <p>Nombre: <u>Doroteo Gomez</u></p> <p>C.C.O.N.T.: <u>32552558</u></p> <p>Responsable propietario/poseedor</p>	<p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>Nombre: <u>Quien lo bon</u></p> <p>C.C.O.N.T.: <u>15436493</u></p> <p>Representante de la interventoria</p>
<p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>Nombre: <u>Mavisol Guller</u></p> <p>C.C.O.N.T.: <u>1041232826</u></p> <p>Representante del Municipio</p>	

Firma: Marisol Gallego
Nombre: Marisol Gallego
C.C.O.M.T.: FOU-232826
Representante del Municipio

Firma: [Signature]
Nombre: QUIET TEBON
C.C.O.N.T.: 15.436.693
Representante de la interventoria

Firma: Doreen Gomez
Nombre: _____
C.C.O.N.T.: 3456789
Representante del contratista



ACTA DE VECINDAD



Hoy a las ____ de ____	
FECHA	AA
DO	MM
ACTA No.:	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO	
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:
MUNICIPIO:	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Responsable del predio o lote:	
Tenencia:	Propietario ☒ Arrendatario ☐ Otro Cuál?
Nombre del Propietario:	Arrendatario <u>Armando Perez</u>
Dirección:	<u>Vereda Pozo Manilla</u> No. de pisos <u>1</u>
Departamento:	<u>Antioquia</u> Municipio: <u>Rio Negro Marinilla</u>
Zona Urbana:	Zona Rural: ☒
Teléfono:	<u>3122112211</u> Vereda: <u>POZO</u>
	Long. del frente (mts):
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Agua	SI ☒ NO ☐
2. Alcantarillado	SI ☐ NO ☒
3. Energía	SI ☒ NO ☐
4. Teléfonos	SI ☐ NO ☒
5. Gas	SI ☐ NO ☒
6. Televisión cable	SI ☐ NO ☒
7. Otros	SI ☐ NO ☐
OBSERVACIONES: <u>POZO XPLICO</u>	
TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	☐
2. Valor Arquitectónico	☐
3. Valor Intermedio	☐
4. Valor normal	☒
5. En construcción	☐
6. Sin edificio	☐
7. Otro	☐
Cuál?	
USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐
5. Recreacional	☐
6. Balcón	☐
7. Otro	☐
Cuál?	
ACCESOS VEHICULARES	
Garaje	SI ☐ NO ☒
Cuartos	☐
El garaje se usa como	☐
Comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Uplícase el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)	
ESTRUCTURA: <u>Adobe en estructura agrietada en concreto</u>	
Muros: <u>Reforzados muredda de maderia</u>	
CUBIERTA: <u>techo de concreto estructura maderia</u>	
PISOS: <u>ceramica</u>	
FACHADA: <u>combinacion de maderia y adobe revocado y pintura</u>	
GRIETAS Y FISURAS: <u>Zona levemente vertical</u>	
HUMEDADES: <u>N/A</u>	
HUNDIMIENTO PISO: <u>N/A</u>	
DESPLAZAMIENTOS: <u>N/A</u>	
OTRO: Cuál?	

 		ACTA DE VECINDAD	
OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO			
H018 _ 1 _ 06	FECHA	INTERVENTORIA: CONSTRUCTORES ASOCIADOS H&G	MUNICIPIO:
DO MM AA	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	CONTRATO DE OBRA N°:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR")	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			
			

FIRMAS	
Firma: 	Firma: 
Nombre: Contratable	Nombre: Interventor
C.C.O. NIT: 197991840	C.C.O. NIT: 154566673
Responsable-propietario/poseedor	Representante de la interventoria
Representante del contratista	Representante del Municipio



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

PROYECTO:

**MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de
Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San
Carlos y Santo Domingo.**



INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022

RESPONSABLE:

**JAKELYN ARIAS RAMIREZ
COORDINADORA DE SST.**

Dirección: Calle 56 A N° 52-30, Rionegro (Ant) **Teléfonos:** (4)5771104 - 310 498 9524

E-mail: ingenieriawj@hotmail.es - proyectos@ingenieriawj.com



PRESENTACIÓN

El presente informe indica cómo se desarrolla el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra: **MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos y Santo Domingo**; por parte de la empresa contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. La información descrita en el presente informe obedece a las actividades realizadas en el área de seguridad y salud en el trabajo en la vereda San Pedro del Municipio de Santo Domingo, en la vereda el pozo del Municipio de Marinilla, en la vereda tafetanes del Municipio de Granada, en la vereda la sonadora del Municipio de Concepción, para dar cumplimiento al marco normativo.

INTRODUCCIÓN

La empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S en su marco de actividades se dedica al mejoramiento de vías terciarias, este informe se realiza con el fin de dar a conocer a la empresa contratante, la gestión durante el periodo correspondiente a las actividades realizadas de seguridad y salud en el trabajo en el mes de noviembre.

JUSTIFICACIÓN

Informar la gestión del periodo correspondiente con el fin de mitigar, minimizar y reducir los riesgos, buscando prevenir los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Además, conocer los tipos de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores para garantizar su bienestar físico mental y social.

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Explicar la importancia del SG-SST a todo el personal de la empresa Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S e identificar las condiciones de trabajo en la obra Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Santo Domingo, Marinilla, Concepción y Granada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Identificar los riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa.
- ✓ Priorizar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores tratando de disminuir su impacto.
- ✓ Definir acciones que mejoren las condiciones de trabajo de los colaboradores.



RESUMEN EJECUTIVO

En el siguiente Informe, se detallan todos los temas de las capacitaciones realizadas en el mes, inspecciones realizadas en la obra, vistas a campo, inspecciones a herramientas manuales, inspecciones a vehículos, la lista de equipos de protección personal que se entregaron a los colaboradores durante la obra.

Además, se realizó todas las actividades acordes a la norma actual de seguridad y salud en el trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS

ASPECTO	CONTROL
EPP	Se enfatizó en el uso obligatorio de los EPP durante la jornada de trabajo.
Supervisión	Se efectuó inspecciones visita a campo.
Inspecciones planeadas	Se realizaron diferentes inspecciones de herramientas manuales e inspección de vehículos, con el fin de identificar y analizar aquellas situaciones y actos inseguros, que pueden alterar el funcionamiento de un elemento o equipo de trabajo y causar daño o lesión al trabajador.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Inicialmente se realiza la inducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se socializan algunos temas como:

- ✓ Política del SST.
- ✓ Objetivos de SST
- ✓ Roles y responsabilidades de los trabajadores en SST
- ✓ Inducción y re-inducción SG-SST (evaluación)

Se dieron con la participación de todos los trabajadores, fue activa y se llevó un registro de asistencia por cada capacitación en el área de trabajo.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS Y ENTREGADOS DURANTE LA OBRA EN EL MES DE NOVIEMBRE

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	Guantes de vaqueta	Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos, herramientas, cargas, fresadores, etc.
	Lentes de seguridad	Protección contra el riesgo de lesionar los ojos por contacto directo con polvos, fragmentos proyectados por el desarrollo de alguna tarea.
	Casco de seguridad	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por cargas suspendidas u objetos que puedan impactar o caer desde otros niveles. Caídas, trabajos en altura
	Chaleco reflectivo	Protección e identificación sobre todo en trabajos a campo abierto y en zonas de escasa luminosidad



	Tapa Bocas	Protección a nariz para trabajos con manipulación de sustancias químicas y polvos.
	Tapa Oídos	Protección auditiva para trabajos con exposición al ruido.
	Botas de caucho	Protección para los pies, Son impermeables y sin cordones, proporcionan ergonomía y protegen de la humedad.

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:

- a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
- d. El trabajador manifiesta que: Recibo del empleador, dentro de la fecha establecida por la ley, la dotación idónea para ejecutar las labores contratadas conforme a lo indicado en el artículo 230 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo (CST).
La dotación que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato. En caso de daño de la dotación o parte de ella, reconozco que es mi deber devolverla a la empresa. Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.



RALACION DE PERSONAL TECNICO DEL CONTRATO

Relación personal técnico

Personal Mejoramiento de Vías Terciarias; Personal Técnico			
Numero	Nombre y apellido	Documento	Cargo
1	William Jaramillo	15441658	Residente de Obra
2	Santiago Vanegas	1036954651	Residente de obra
3	José Rodríguez	79560053	Director de obra
4	Alejandra Duque	1098769513	Ing. Ambiental
5	Jakelyn Arias	1036931028	Coord. SST

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

PERSONAL EN OBRA MES DE NOVIEMBRE.

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Santo Domingo			
Numero	Nombre y Apellido	Documento	Cargo
1	Jhon Jaramillo	1036925025	Encargado de obra
2	Pedro Franco	71140421	Oficial
3	Frey Valencia	71142070	Ayudante de obra
4	Wilson Calle	71142485	Ayudante de obra
	Juan Montoya	1044100046	Ayudante de obra



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

ELEMENTO	EVIDENCIA
EPP	
Visita a Campo	



Herramientas manuales



Vehículos



Señalización





MUNICIPIO DE MARINILLA

PERSONAL EN OBRA MES DE NOVIEMBRE MARINILLA.

Personal Mejoramiento de Vías Terciarias; Municipio de Marinilla.			
Numero	Nombre y Apellido	Documento	Cargo
1	Carlos Jaramillo	15455661	Encargado de obra
2	Rubén Quiñonez	9848824	Ayudante de obra
3	Hernán Jaramillo	70115459	Ayudante de obra
4	Rubén A Quiñonez	1036616888	Ayudante de obra
5	Jhon Atehortúa	70953312	Ayudante de obra
6	Jaime Valencia	14248525	Ayudante de obra
7	Gilberto Zurita	71938533	Ayudante de obra
8	Juan Álvarez	1007115534	Ayudante de obra
9	Juan Jaramillo	1039465249	Oficial
10	Carlos Pontón	6893882	Oficial

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MUNICIPIO DE MARINILLA

ELEMENTO	EVIDENCIA
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	



	
EPP	 
Señalización	



Herramientas manuales



ELEMENTOS DE EMERGENCIA





MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



MUNICIPIO DE GRANADA

PERSONAL EN OBRA MES DE NOVIEMBRE GRANADA.

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Granada			
Numero	Nombre y Apellido	Documento	Cargo
1	Carlos Perdomo	1001444293	Encargado de obra
2	Jorge Enrique Muñoz	1037751192	Encargado de obra
3	Jhon Alexander Vélez	1042062435	Oficial
4	Pedro Franco	71140421	Oficial
5	Rubén Chacón	10167723	Oficial
6	Gustavo Sanabria	10170268	Oficial
7	Guillermo Aldana	10189027	Ayudante de obra
8	Iván Téllez	10189040	Ayudante de obra
9	Ramiro Rubio García	104540003	Ayudante de obra
10	Oscar Castellanos	1073322330	Ayudante de obra
11	Carlos López	1073977708	Ayudante de obra
12	Jhoymer Ramírez	1121337582	Ayudante de obra
13	José García	15507695	Ayudante de obra
14	Hernán Chacón	16015422	Ayudante de obra
15	Carlos Parra	70827887	Ayudante de obra
16	Alfredo Parra	70830125	Ayudante de obra
17	Julio Maldonado	71194215	Ayudante de obra
18	Edgardo Suarez	810303601071995	Ayudante de obra
19	Dionni Sánchez	4943084	Ayudante de obra
20	Dionni Sánchez Briceño	5459593	Ayudante de obra
21	Abraham nava	6750696	Ayudante de obra



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MUNICIPIO DE GRANADA

ELEMENTO	EVIDENCIA
CAPACITACIÓN	
EPP	



Herramientas manuales



Equipos eléctricos



Vehículos





	
Elementos de emergencia	
Señalización	



Otros



MUNICIPIO DE CONCEPCION

PERSONAL EN OBRA MES DE NOVIEMBRE DE CONCEPCION

Personal Mejoramiento de vías terciarias; Municipio de Concepción.			
Numero	Nombre y Apellido	Documento	Cargo
1	Camilo Arredondo	71759798	Encargado de obra
2	Luis Suarez	1001142201	Ayudante de obra
3	Rigo Castaño	15453628	Ayudante de obra
4	Otoniel Ceballos	15453402	Ayudante de obra
5	Juan Aguirre	15382477	Ayudante de obra
6	Héctor Serna	15453431	Ayudante de obra
7	Omar Mejía	3364431	Ayudante de obra
8	Dario Humberto Franco	71142615	Ayudante de obra
9	Nilson Johnny Velásquez	98592717	Oficial
10	Uver de Jesús Rojas Castrillón	1007836121	Oficial



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CONCEPCION.

ELEMENTO	EVIDENCIA
Inducción y re inducción	
EPP	
Herramientas manuales	



Equipos eléctricos



Vehículos





Elementos de emergencia



Señalización



Se adjuntan Anexos: Inducciones al personal nuevo, evaluación a la inducción de SST, soporte entrega de EPP, Inspecciones a herramientas manuales, Inspección visita a campo, Registro de asistencia a capacitación del mes de noviembre.

JAKELYN ARIAS RAMIREZ
COORDINADORA DE SST.

PAGADO 23/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S A S		
Documento	NI900355893	Dirección	CL 56A #52 - 30 BARRIO LAURELES
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5771104
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	JARAMILLO HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	Identificación	CC 15441658
Total Afiliados	14	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SVN	IGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARS	Días COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036931028	JAKELYN YAYLU ARIAS RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1036937722	GLORIA DE JESUS IDARRAGA GONZALEZ	01	00	X																0	24	24	24	(230301) PORVENIR	\$ 1.760.000	\$ 281.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.760.000	\$ 70.400	6,960	\$ 1.760.000	\$ 122.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.760.000	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.900
CC 1036954651	SANTIAGO VANEGAS DUQUE	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000
CC 1036956562	JUAN DAVID CASTRO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1037950354	JOHN EDWAR GONZALEZ RIOS	01	00	X	X															0	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 390.000	\$ 62.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 390.000	\$ 15.600	6,960	\$ 390.000	\$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 390.000	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.800
CC 1098769513	ALEJANDRA TOBON DUQUE	01	00	X																0	26	26	26	(230301) PORVENIR	\$ 1.560.000	\$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.560.000	\$ 62.400	6,960	\$ 1.560.000	\$ 108.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.560.000	\$ 62.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.000
CC 1128461340	DAYANA PINEDA RAVE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400
CC 15441658	WILLIAM ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 15455661	CARLOS ARTURO JARAMILLO CANO	01	05																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.600
CC 39452691	DORALBA GOMEZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600
CC 70163856	NELSON DE JESUS GARCIA GARZON	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 71293594	GERMAN DE JESUS ISAZA ISAZA	01	00	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 260.000	\$ 10.400	6,960	\$ 260.000	\$ 18.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.500
CC 79560053	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600
PE 957464925101993	DAYANIZ ANDREINA GONZALEZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	6,960	\$ 1.400.000	\$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.070.000	\$ 23.070.000	\$ 23.070.000	\$ 23.070.000	\$ 3.531.200	\$ 922.800	\$ 1.605.900	\$ 922.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.982.700	\$ 0	\$ 6.982.700



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224 802-8

CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRES ARREDONDO MONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71.759.798**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 29 de Octubre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C71759798	ARREDONDO MONA CAMILO ANDRES	27/10/2022		17616114	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 15:47:29.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226608

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71759798 Nombre: CAMILO ANDRES ARREDONDO MONA Fecha de nacimiento: 08/08/1975 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: CORREGIMIENTO ALEJANDRIA Teléfono celular: 3162486997 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022

savia
SALUD EPS

Widows' Support

 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DARIO HUMBERTO FRANCO ZAPATA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71.142.615**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C71142615	FRANCO ZAPATA DARIO HUMBERTO	27/10/2022		14330r23	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 15:36:03.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57.

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226706

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71142615 Nombre: DARIO HUMBERTO FRANCO ZAPATA Fecha de nacimiento: 10/09/1983 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3158980211 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Horas contratadas al día: 8 Horas contratadas al mes: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 27/10/2022

savia
SALUD EPS

Formulario de inscripción y actualización de datos personales y laborales para afiliados a la AFRACCIÓN INSTITUCIONAL DE SALUD EPS. Incluye secciones para datos del afiliado, datos de identificación, datos de identificación de los miembros del núcleo familiar, datos de identificación del empleador, y datos de identificación de la afiliación colectiva. El formulario está dividido en varias partes numeradas y contiene campos para datos personales, familiares, laborales y de afiliación.

un
million
pychic

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Medellín, 21 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000014 CONCEPCION		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C15453431	SERNA OCAMPO HECTOR LUIS	22/11/2022		16919318	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Alentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/11/2022 13:02:16.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 251781

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 15453431 Nombre: HECTOR LUIS SERNA OCAMPO Fecha de nacimiento: 10/06/1973 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Concepción Dirección: VEREDA LA CRUZ Teléfono celular: 3162486997 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 22/11/2022

Archivos adjuntos

 Trabajador: HECTOR LUIS SERNA OCAMPO

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	CC.pdf	628 KB

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



1. DATOS DEL TRÁMITE (Las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☐

2. Tipo de Afiliación: A. Inicial ☒ B. Continúa ☐ C. Reingreso ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cónyuge de afiliado ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

6. Apellidos y nombres: **Seina, Hector**

7. Tipo de documento de identidad: **CE**

8. Número de documento de identidad: **15453431**

9. Sexo: **Masculino**

10. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

11. Estado civil: **Casado**

12. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

13. Lugar de inscripción: **Medellin**

14. Tipo de documento de identidad: **CE**

15. Número de documento de identidad: **15453431**

16. Sexo: **Masculino**

17. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

18. Estado civil: **Casado**

19. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

20. Lugar de inscripción: **Medellin**

II. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

1. Tipo de documento de identidad: **CE**

2. Número de documento de identidad: **15453431**

3. Sexo: **Masculino**

4. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

5. Estado civil: **Casado**

6. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

7. Lugar de inscripción: **Medellin**

8. Tipo de documento de identidad: **CE**

9. Número de documento de identidad: **15453431**

10. Sexo: **Masculino**

11. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

12. Estado civil: **Casado**

13. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

14. Lugar de inscripción: **Medellin**

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación de los integrantes de la familia)

1. Apellidos y nombres: **Seina, Hector**

2. Tipo de documento de identidad: **CE**

3. Número de documento de identidad: **15453431**

4. Sexo: **Masculino**

5. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

6. Estado civil: **Casado**

7. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

8. Lugar de inscripción: **Medellin**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación de los integrantes de la familia)

1. Apellidos y nombres: **Seina, Hector**

2. Tipo de documento de identidad: **CE**

3. Número de documento de identidad: **15453431**

4. Sexo: **Masculino**

5. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

6. Estado civil: **Casado**

7. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

8. Lugar de inscripción: **Medellin**

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

1. Nombre y razón social: **Seina, Hector**

2. Tipo de documento de identidad: **CE**

3. Número de documento de identidad: **15453431**

4. Sexo: **Masculino**

5. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

6. Estado civil: **Casado**

7. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

8. Lugar de inscripción: **Medellin**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

1. Tipo de documento de identidad: **CE**

2. Número de documento de identidad: **15453431**

3. Sexo: **Masculino**

4. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

5. Estado civil: **Casado**

6. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

7. Lugar de inscripción: **Medellin**

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

2. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

3. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

4. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

5. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

6. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

7. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

8. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

9. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

10. Declaración de la veracidad de los datos suministrados: ☒

VIII. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

1. Tipo de documento de identidad: **CE**

2. Número de documento de identidad: **15453431**

3. Sexo: **Masculino**

4. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

5. Estado civil: **Casado**

6. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

7. Lugar de inscripción: **Medellin**

IX. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

1. Tipo de documento de identidad: **CE**

2. Número de documento de identidad: **15453431**

3. Sexo: **Masculino**

4. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

5. Estado civil: **Casado**

6. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

7. Lugar de inscripción: **Medellin**

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

1. Tipo de documento de identidad: **CE**

2. Número de documento de identidad: **15453431**

3. Sexo: **Masculino**

4. Fecha de nacimiento: **10/01/1971**

5. Estado civil: **Casado**

6. Fecha de inscripción: **10/01/2012**

7. Lugar de inscripción: **Medellin**

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HECTOR LUIS SERNA OCAMPO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía número 15453431**, se encuentra afiliado/a desde **02/11/2001** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de noviembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 19 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000014 CONCEPCION			Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,96 %
C16382477	AGUIRRE TORO JUAN JULIO	20/11/2022		D164u416	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/11/2022 10:39:17.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 246476

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 15382477 Nombre: JUAN JULIO AGUIRRE TORO Fecha de nacimiento: 05/02/1971 Género: Masculino Estado civil: Unión Libre

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Concepción Dirección: VEREDA CARRERA 25AC 42 42 Teléfono celular: 3122511672 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Horas contratadas al día: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 20/11/2022

Archivos adjuntos

 Trabajador: JUAN JULIO AGUIRRE TORO

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	 Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.	



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 25/11/2022, el empleador INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS identificado con NIT número 900355893 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5089119	25/11/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	15382477	JUAN JULIO AGUIRRE TORO	1000000	AYUDANTE DE OBRA	2022-11-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Noviembre del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-9

CERTIFICA QUE:

JUAN JULIO AGUIRRE TORO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **15.382.477**, se encuentra afiliado(a) al
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 22 de Noviembre del 2022.


Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral



Medellín, 19 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000014 CONCEPCION				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1001142201	SUAREZ CASTAÑO LUIS EDUARDO	20/11/2022		m1231251	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/11/2022 10:34:12.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección: IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 246453

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1001142201 Nombre: LUIS EDUARDO SUAREZ CASTAÑO Fecha de nacimiento: 20/08/1998 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Concepcion Dirección: VEREDA CALLE VILLANUEVA Teléfono celular: 3117590817 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 20/11/2022 Fecha de ingreso a la empresa:

Archivos adjuntos

 Trabajador: LUIS EDUARDO SUAREZ CASTAÑO

Tipo de documento Archivo

Cédula de Ciudadanía cc.pdf

Tamaño

92 KB

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



No. de Hoja: 1/1

1. DATOS DEL TRÁMITE (Lee las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades

2. Tipo de Afiliación: ☒ A. Individual - Cotización o cobro de Familia ☐ B. Colectiva - Colectividad o Cobro de Familia

3. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Colectiva ☐ C. Bineficiario

4. Tipo de afiliación: ☒ A. Cotización ☐ B. Cobro de Familia ☐ C. Bineficiario

5. Tipo de afiliación: ☒ A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Paralelo

6. Apellidos y nombres: PEREZ

7. Tipo de documento de identidad: CC

8. Número de documento de identidad: 1001142201

9. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

10. Fecha de nacimiento: 20100821

11. Fecha: 20100821

12. Puntos SISBEN: 1000-000

13. Grupo de población vulnerable: 1

14. Datos complementarios (Datos personales): Suria

15. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

16. Tipo de afiliación: Individual

17. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

18. Apellidos y nombres: PEREZ

19. Tipo de documento de identidad: CC

20. Número de documento de identidad: 1001142201

21. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

22. Fecha de nacimiento: 20100821

23. Fecha: 20100821

24. Puntos SISBEN: 1000-000

25. Grupo de población vulnerable: 1

26. Datos complementarios (Datos personales): Suria

27. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

28. Tipo de afiliación: Individual

29. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

30. Apellidos y nombres: PEREZ

31. Tipo de documento de identidad: CC

32. Número de documento de identidad: 1001142201

33. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

34. Fecha de nacimiento: 20100821

35. Fecha: 20100821

36. Puntos SISBEN: 1000-000

37. Grupo de población vulnerable: 1

38. Datos complementarios (Datos personales): Suria

39. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

40. Tipo de afiliación: Individual

41. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

42. Apellidos y nombres: PEREZ

43. Tipo de documento de identidad: CC

44. Número de documento de identidad: 1001142201

45. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

46. Fecha de nacimiento: 20100821

47. Fecha: 20100821

48. Puntos SISBEN: 1000-000

49. Grupo de población vulnerable: 1

50. Datos complementarios (Datos personales): Suria

51. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

52. Tipo de afiliación: Individual

53. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

54. Apellidos y nombres: PEREZ

55. Tipo de documento de identidad: CC

56. Número de documento de identidad: 1001142201

57. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

58. Fecha de nacimiento: 20100821

59. Fecha: 20100821

60. Puntos SISBEN: 1000-000

61. Grupo de población vulnerable: 1

62. Datos complementarios (Datos personales): Suria

63. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

64. Tipo de afiliación: Individual

65. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

66. Apellidos y nombres: PEREZ

67. Tipo de documento de identidad: CC

68. Número de documento de identidad: 1001142201

69. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

70. Fecha de nacimiento: 20100821

71. Fecha: 20100821

72. Puntos SISBEN: 1000-000

73. Grupo de población vulnerable: 1

74. Datos complementarios (Datos personales): Suria

75. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

76. Tipo de afiliación: Individual

77. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

78. Apellidos y nombres: PEREZ

79. Tipo de documento de identidad: CC

80. Número de documento de identidad: 1001142201

81. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

82. Fecha de nacimiento: 20100821

83. Fecha: 20100821

84. Puntos SISBEN: 1000-000

85. Grupo de población vulnerable: 1

86. Datos complementarios (Datos personales): Suria

87. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

88. Tipo de afiliación: Individual

89. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

90. Apellidos y nombres: PEREZ

91. Tipo de documento de identidad: CC

92. Número de documento de identidad: 1001142201

93. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

94. Fecha de nacimiento: 20100821

95. Fecha: 20100821

96. Puntos SISBEN: 1000-000

97. Grupo de población vulnerable: 1

98. Datos complementarios (Datos personales): Suria

99. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

100. Tipo de afiliación: Individual

101. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

102. Apellidos y nombres: PEREZ

103. Tipo de documento de identidad: CC

104. Número de documento de identidad: 1001142201

105. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

106. Fecha de nacimiento: 20100821

107. Fecha: 20100821

108. Puntos SISBEN: 1000-000

109. Grupo de población vulnerable: 1

110. Datos complementarios (Datos personales): Suria

111. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

112. Tipo de afiliación: Individual

113. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

114. Apellidos y nombres: PEREZ

115. Tipo de documento de identidad: CC

116. Número de documento de identidad: 1001142201

117. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

118. Fecha de nacimiento: 20100821

119. Fecha: 20100821

120. Puntos SISBEN: 1000-000

121. Grupo de población vulnerable: 1

122. Datos complementarios (Datos personales): Suria

123. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

124. Tipo de afiliación: Individual

125. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente coafiliado)

126. Apellidos y nombres: PEREZ

127. Tipo de documento de identidad: CC

128. Número de documento de identidad: 1001142201

129. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

130. Fecha de nacimiento: 20100821

131. Fecha: 20100821

132. Puntos SISBEN: 1000-000

133. Grupo de población vulnerable: 1

134. Datos complementarios (Datos personales): Suria

135. Administración de riesgos laborales - ARL: PREVENIR

136. Tipo de afiliación: Individual

porvenir

Sociedad Anónima de Fomento de Inversiones y Capitalización S.A. N.º 605.147.731-S

[illegible]

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

En(a) Señor(a) VELASQUEZ VANEGAS NILSON JOHNNY identificado(a) con CC número 98.592.717 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN desde el día 01 de julio de 1994 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consignado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 23 de octubre de 2022.

Condicionante:


Laura Patricia Merchán Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 84 - Medellín y Cali 510 96 99
Barranquilla: 319 75 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 82 8000
www.proteccion.com

202210231026
11:26 AM

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C98592717	VELASQUEZ VANEGAS NILSON JOHNNY	27/10/2022		138234d1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 15:04:20.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226765

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 98592717 Nombre: NILSON JOHNNY VELASQUEZ VANEAS Fecha de nacimiento: 18/01/1974 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3046566061 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,500,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



No. de Afiliación: **000102022**

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite
A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☐

2. Tipo de Afiliación
A. Individual - Cabeza o cabeza de familia ☒ B. Colectiva ☐
C. Institucional ☐ D. De oficio ☐

3. Régimen
A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cabeza ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☐ B. Independiente ☒ C. Excedente ☐

Código de registro por la EPS: **01**

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: **Velasquez**

7. Tipo de documento de identidad: **CC**

8. Número de documento de identidad: **98392712**

9. Sexo: **Femenino** ☐ **Masculino** ☒

10. Fecha de nacimiento: **19/08/1974**

11. Estado civil: **Unión Libre**

12. Puntaje SISBEN: **34.44**

13. Grupo de población especial: **NO**

14. Administración de riesgos laborales - ARL: **SURA**

15. Administradora de pensiones: **PERUNY**

16. Ingreso base de cotización - IBC: **1.500.000**

17. Residencia: **Calle 104F 34.44**

18. Correo electrónico: **Nelson**

19. Teléfono fijo: **3044566001**

20. Localidad/Correo: **Bello**

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o pareja y niños(a) permanentemente cohabitante)

19. Apellidos y nombres: **Primera Apellido**

20. Tipo de documento de identidad: ☐

21. Número de documento de identidad: ☐

22. Sexo: **Femenino** ☐ **Masculino** ☐

23. Fecha de nacimiento: ☐

24. Primer Nombre: ☐

25. Segundo Nombre: ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales)

24. Apellidos y nombres: **Primera Apellido**

25. Tipo de documento de identidad: ☐

26. Número de documento de identidad: ☐

27. Sexo: **Femenino** ☐ **Masculino** ☐

28. Fecha de nacimiento: ☐

29. Datos complementarios: ☐

30. Tipo de discapacidad: ☐

31. Datos de residencia: ☐

32. Datos de afiliación: ☐

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS: **IPS**

35. Tipo de documento de identidad: ☐

36. Número de documento de identidad: **400355893**

37. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS): **Empleado**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

38. Tipo de novedad: **Reporte de Novedades**

39. Tipo de afiliación: **Individual**

40. Tipo de afiliado: **Cabeza de familia**

41. Tipo de cotizante: **Independiente**

42. Tipo de afiliación: **Individual**

43. Tipo de afiliado: **Cabeza de familia**

44. Tipo de cotizante: **Independiente**

45. Tipo de afiliación: **Individual**

46. Tipo de afiliado: **Cabeza de familia**

47. Tipo de cotizante: **Independiente**

48. Tipo de afiliación: **Individual**

49. Tipo de afiliado: **Cabeza de familia**

50. Tipo de cotizante: **Independiente**

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐

47. Declaración de no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ☐

48. Declaración de existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales. ☐

50. Autorización para que la EPS realice la selección de la EPS a cargo y entregue copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐

51. Autorización para que la EPS realice la selección de la EPS a cargo y entregue copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐

52. Autorización para que la EPS realice la selección de la EPS a cargo y entregue copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐

53. Autorización para que la EPS realice la selección de la EPS a cargo y entregue copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐

VIII. FIRMAS

54. El afiliado, cotizante o beneficiario o representante de la afiliación colectiva institucional o de oficio: **Nelson Velasquez**

55. El empleador, aportante o pagador pensiones de la afiliación colectiva institucional o de oficio: **[Firma]**

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad. ☐

57. Copia del dictamen de la capacidad permanente emitido por la autoridad competente. ☐

58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

60. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

61. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

62. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

63. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

64. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

65. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

66. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

67. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

68. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

69. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

70. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

71. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la existencia de un núcleo familiar o grupo de personas que impide la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Medellín, 24 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Colizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000014 CONCEPCION				Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,96 %
C3364431	MEJIA CARDONA OMAR ALBERTO	25/11/2022		17150519	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2022 18:57:41.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de reiro.

Dirección IP: 190.250.203.244, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 251753

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 3364431 Nombre: OMAR ALBERTO MEJIA CARDONA Fecha de nacimiento: 09/05/1967 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Concepcion Dirección: VEREDA SANTANDER Teléfono celular: 3114156057 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 25/11/2022 Fecha de ingreso a la empresa:

Archivos adjuntos

 Trabajador: OMAR ALBERTO MEJIA CARDONA


Tipo de documento Archivo

Tamaño

Cédula de Ciudadanía CC.pdf

72 KB

Savia
SALUD EPS



SAVIA
SALUD EPS

Fecha de Registro: **01/01/2011**

II. DATOS DEL TRÁMITE (Lee las instrucciones que se encuentran en el formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

2. Tipo de afiliación: ☐ A. Individual - Dependiente o cabeza de familia ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De fecho

3. Régimen: ☐ A. Contributivo ☐ B. Subsidiado

4. Tipo de afiliado: ☐ A. Cabeza de familia ☐ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario

5. Tipo de afiliado: ☐ A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado

III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del beneficiario o cabeza de familia)

6. Apellido y nombre: **OMAR MEJIA**

7. Tipo de documento de identidad: ☒ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

8. Número de documento de identidad: **3364431**

9. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

10. Fecha de nacimiento: **10/01/1961**

11. Etnia: **Indígena**

12. Ocupación: **Trabajador**

13. Fecha de inscripción: **10/01/2011**

14. Grupo de pertenencia: **1**

15. Actividad de riesgo laboral: **1**

16. Actividad de riesgo: **1**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente)

17. Apellido y nombre: **CONCEPCION SANTANDER**

18. Tipo de documento de identidad: ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

19. Número de documento de identidad: **3364431**

20. Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino

21. Fecha de nacimiento: **10/01/1961**

22. Etnia: **Indígena**

23. Ocupación: **Trabajador**

24. Fecha de inscripción: **10/01/2011**

25. Grupo de pertenencia: **1**

26. Actividad de riesgo laboral: **1**

27. Actividad de riesgo: **1**

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE FECHO

28. Nombre o razón social: **SAVIA SALUD EPS**

29. Tipo de documento de identidad: ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

30. Número de documento de identidad: **3364431**

31. Tipo de aportante o pagador pensiones: **1**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

32. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de riesgo cibernético ☐ V. Cambio de actividad de riesgo digital ☐ W. Cambio de actividad de riesgo virtual ☐ X. Cambio de actividad de riesgo online ☐ Y. Cambio de actividad de riesgo internet ☐ Z. Cambio de actividad de riesgo web ☐

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

33. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de riesgo cibernético ☐ V. Cambio de actividad de riesgo digital ☐ W. Cambio de actividad de riesgo virtual ☐ X. Cambio de actividad de riesgo online ☐ Y. Cambio de actividad de riesgo internet ☐ Z. Cambio de actividad de riesgo web ☐

VIII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

34. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de riesgo cibernético ☐ V. Cambio de actividad de riesgo digital ☐ W. Cambio de actividad de riesgo virtual ☐ X. Cambio de actividad de riesgo online ☐ Y. Cambio de actividad de riesgo internet ☐ Z. Cambio de actividad de riesgo web ☐

IX. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

35. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de riesgo cibernético ☐ V. Cambio de actividad de riesgo digital ☐ W. Cambio de actividad de riesgo virtual ☐ X. Cambio de actividad de riesgo online ☐ Y. Cambio de actividad de riesgo internet ☐ Z. Cambio de actividad de riesgo web ☐

X. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

36. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de riesgo cibernético ☐ V. Cambio de actividad de riesgo digital ☐ W. Cambio de actividad de riesgo virtual ☐ X. Cambio de actividad de riesgo online ☐ Y. Cambio de actividad de riesgo internet ☐ Z. Cambio de actividad de riesgo web ☐

XI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

37. Tipo de novedad: ☐ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades ☐ C. Retiro ☐ D. Cambio de afiliación ☐ E. Cambio de régimen ☐ F. Cambio de grupo de pertenencia ☐ G. Cambio de actividad de riesgo ☐ H. Cambio de actividad de riesgo laboral ☐ I. Cambio de actividad de riesgo profesional ☐ J. Cambio de actividad de riesgo social ☐ K. Cambio de actividad de riesgo ambiental ☐ L. Cambio de actividad de riesgo cultural ☐ M. Cambio de actividad de riesgo deportivo ☐ N. Cambio de actividad de riesgo recreativo ☐ O. Cambio de actividad de riesgo artístico ☐ P. Cambio de actividad de riesgo científico ☐ Q. Cambio de actividad de riesgo tecnológico ☐ R. Cambio de actividad de riesgo informático ☐ S. Cambio de actividad de riesgo electrónico ☐ T. Cambio de actividad de riesgo telemático ☐ U. Cambio de actividad de



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224 802-8

CERTIFICA QUE:

OMAR ALBERTO MEJIA CARDONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 3.364.431, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 28 de Noviembre del 2022.


Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



copy

Medellín, 19 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estatus
Centro de trabajo: 0000000014 CONCEPCION		Clase: 5		Porcentaje Colización: 6,96 %		
C16453402	CEBALLOS GUARIN OTONIEL ANTONIO	20/11/2022		15124918	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/11/2022 10:36:36.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 246468

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 15453402 Nombre: OTONIEL ANTONIO CEBALLOS GUARIN Fecha de nacimiento: 24/06/1975 Género: Masculino Estado civil: Soltero

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Concepcion Dirección: VEREDA BARRIO LETICIA Teléfono celular: 3146455065 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 20/11/2022

Archivos adjuntos

 Trabajador: OTONIEL ANTONIO CEBALLOS GUARIN

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
-------------------	---------	--------

Cédula de Ciudadanía	 Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.	
----------------------	---	--

savia
SALUD EPS

[illegible]

15. Actividades y nombres		Unidad básica de identificación de los beneficiarios y de los aliados relacionados			
	Primer Nombre	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	
01					
02					
03					
04					
05					

26. Tipo de documento de identidad				27. Número de documento de identidad				27. Sexo Femenino Masculino		28. Fecha de nacimiento								29. Datos complementarios																	
D1										D D M A A A A								30. Fecha de nacimiento				31. Etnia													
D2																																			
D3																																			
D4																																			
D5																																			
D6																																			
D7																																			
32. Diversidades												33. Datos de residencia																							
Tipo				Residencia				Municipio / Distrito				Zona				Departamento				Número de hijos/as				34. Valor de la UVC del autocondicional (a registrar por la EPS)											
E H M				T P								Adm. Rural																							
D1																																			
D2																																			
D3																																			
D4																																			
D5																																			

Selección de la IPS Población		Código de la IPS (ver distingo en la EPS)
34. Miembro de la Selección prestadora de servicios de salud - IPS		
Col		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO			
25. Nombre y razón social Inguma y Conhue SA	26. Tipo de documento de identificación 14	27. Número del documento de identificación 400355893	28. Tipo de aportante a pagar por prestación (a regular por la EPS) 1
29. Domicilio Calle 56A Arica 52 30	30. Teléfono 5711004	31. Correo electrónico info@inguma.cl	32. Tipo de representante Administrador

[illegible]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD									
41. Datos básicos de identificación		Seguridad Pública		Nueva Mesra		Seguridad Pública			
42. Tipo de documento de identidad		Número de documento de identidad		Fecha de nacimiento		Fecha de nacimiento			
43. EPS afiliado		44. Rol de afiliado		45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones					

[illegible]

<p>otomiel ceballos</p> <p>El Encuentro, cabecera de la zona de estudio</p>		<p>55. El explorador, registrado o no, debe ser propietario del terreno que se va a explorar y de los Códigos</p>
---	--	---

[illegible]

ENCUESTA A SER ENVIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL							
06. Identificación de la entidad territorial Código del municipio Código del departamento		07. Datos del SISBEN Número de la ficha Puntaje Edad		08. Fecha de registro		09. Fecha de verificación	
				D M A / D M A		D M A / D M A	
10. Datos del funcionario que realiza la verificación Nombre y C.C.O.		Especialización		01-01-2012		Superintendente	
Tipo de documento de identidad Número de documento de identidad		OBSERVACIONES:					
11. Firma del Encuestado		25 NOV 2012					

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **OTONIEL ANTONIO CEBALLOS GUARIN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **15453402**, se encuentra afiliado/a desde **16/02/2007** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 11 de diciembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones

Medellín, 19 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000014 CONCEPCION		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C16453628	CASTAÑO RIGO ALBERTO	20/11/2022		15213917	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/11/2022 10:32:10.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.18.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 246460

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 15453628	RIGO ALBERTO CASTAÑO	21/04/1979	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	Concepción	VEREDA VILLANUEVA	3217273612		

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000 8	192	20/11/2022	

Archivos adjuntos

 Trabajador: RIGO ALBERTO CASTAÑO

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
-------------------	---------	--------

Cédula de Ciudadanía	 Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.	
----------------------	---	--

savia
SALUD EPS

College of Arts and Sciences

01

salvia
SALUD EPS

Código de registro EPS: **01**

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de afiliación
 A. Afiliación ☒ **B. Repatriación de beneficiarios** ☐

2. Tipo de afiliación
 A. Individual ☒ **B. Colectiva** ☐ **C. Subordinada** ☐ **D. Decretada** ☐

3. Régimen
 A. Contributivo ☒ **B. Subsidiado** ☐

4. Tipo de afiliado
 A. Cotizante ☒ **B. Cotizante de familia** ☐ **C. Beneficiario** ☐

5. Tipo de cotización
 A. Dependiente ☒ **B. Subordinada** ☐ **C. Paralela** ☐

A. AFILIACIÓN **B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN** (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Cuadernos

7. Tipo de documento de identidad
C

8. Número de documento de identidad
15453678

9. Sexo
 Masculino ☒ Femenino ☐

10. Fecha de nacimiento
02/01/1979

11. Etnia
12. Domicilio
Calle 1000-000

13. Puntaje SISBEN
14. Grupo de población especial
15. Adscripción de grupos laborales - ARL
16. Adscripción de pensiones
Colpers ncs

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Valores básicos de identificación del cotizante o cabeza de familia)

17. Apellidos y nombres
Primer Apellido **Segundo Apellido** **Tercer Apellido**

18. Tipo de documento de identidad
19. Número de documento de identidad
20. Sexo
 Masculino ☐ Femenino ☐

21. Fecha de nacimiento
22. Tipo de documento de identidad
23. Fecha de nacimiento
24. Tipo de documento de identidad
25. Fecha de nacimiento

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS ALIADOS ECONÓMICOS

26. Apellidos y nombres
Primer Apellido **Segundo Apellido** **Tercer Apellido**

27. Tipo de documento de identidad
28. Número de documento de identidad
29. Sexo
 Masculino ☐ Femenino ☐

30. Fecha de nacimiento
31. Tipo de documento de identidad
32. Fecha de nacimiento
33. Tipo de documento de identidad
34. Fecha de nacimiento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS ALIADOS ECONÓMICOS

35. Apellidos y nombres
Primer Apellido **Segundo Apellido** **Tercer Apellido**

36. Tipo de documento de identidad
37. Número de documento de identidad
38. Sexo
 Masculino ☐ Femenino ☐

39. Fecha de nacimiento
40. Tipo de documento de identidad
41. Fecha de nacimiento
42. Tipo de documento de identidad
43. Fecha de nacimiento

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

44. Apellidos y nombres
45. Tipo de documento de identidad
46. Número de documento de identidad
47. Sexo
 Masculino ☐ Femenino ☐

48. Fecha de nacimiento
49. Tipo de documento de identidad
50. Fecha de nacimiento
51. Tipo de documento de identidad
52. Fecha de nacimiento

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

53. Apellidos y nombres
54. Tipo de documento de identidad
55. Número de documento de identidad
56. Sexo
 Masculino ☐ Femenino ☐

57. Fecha de nacimiento
58. Tipo de documento de identidad
59. Fecha de nacimiento
60. Tipo de documento de identidad
61. Fecha de nacimiento

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

62. Declaración de dependencia económica
63. Declaración de dependencia económica
64. Declaración de dependencia económica
65. Declaración de dependencia económica
66. Declaración de dependencia económica
67. Declaración de dependencia económica
68. Declaración de dependencia económica
69. Declaración de dependencia económica
70. Declaración de dependencia económica
71. Declaración de dependencia económica
72. Declaración de dependencia económica
73. Declaración de dependencia económica
74. Declaración de dependencia económica
75. Declaración de dependencia económica
76. Declaración de dependencia económica
77. Declaración de dependencia económica
78. Declaración de dependencia económica
79. Declaración de dependencia económica
80. Declaración de dependencia económica
81. Declaración de dependencia económica
82. Declaración de dependencia económica
83. Declaración de dependencia económica
84. Declaración de dependencia económica
85. Declaración de dependencia económica
86. Declaración de dependencia económica
87. Declaración de dependencia económica
88. Declaración de dependencia económica
89. Declaración de dependencia económica
90. Declaración de dependencia económica
91. Declaración de dependencia económica
92. Declaración de dependencia económica
93. Declaración de dependencia económica
94. Declaración de dependencia económica
95. Declaración de dependencia económica
96. Declaración de dependencia económica
97. Declaración de dependencia económica
98. Declaración de dependencia económica
99. Declaración de dependencia económica
100. Declaración de dependencia económica

91. Declaración de dependencia económica
92. Declaración de dependencia económica
93. Declaración de dependencia económica
94. Declaración de dependencia económica
95. Declaración de dependencia económica
96. Declaración de dependencia económica
97. Declaración de dependencia económica
98. Declaración de dependencia económica
99. Declaración de dependencia económica
100. Declaración de dependencia económica

VIII. FIRMAS

101. Firma del afiliado
102. Firma del afiliado
103. Firma del afiliado
104. Firma del afiliado
105. Firma del afiliado
106. Firma del afiliado
107. Firma del afiliado
108. Firma del afiliado
109. Firma del afiliado
110. Firma del afiliado
111. Firma del afiliado
112. Firma del afiliado
113. Firma del afiliado
114. Firma del afiliado
115. Firma del afiliado
116. Firma del afiliado
117. Firma del afiliado
118. Firma del afiliado
119. Firma del afiliado
120. Firma del afiliado
121. Firma del afiliado
122. Firma del afiliado
123. Firma del afiliado
124. Firma del afiliado
125. Firma del afiliado
126. Firma del afiliado
127. Firma del afiliado
128. Firma del afiliado
129. Firma del afiliado
130. Firma del afiliado
131. Firma del afiliado
132. Firma del afiliado
133. Firma del afiliado
134. Firma del afiliado
135. Firma del afiliado
136. Firma del afiliado
137. Firma del afiliado
138. Firma del afiliado
139. Firma del afiliado
140. Firma del afiliado
141. Firma del afiliado
142. Firma del afiliado
143. Firma del afiliado
144. Firma del afiliado
145. Firma del afiliado
146. Firma del afiliado
147. Firma del afiliado
148. Firma del afiliado
149. Firma del afiliado
150. Firma del afiliado
151. Firma del afiliado
152. Firma del afiliado

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Use Sub=Hf

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **RIGO ALBERTO CASTAÑO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **15453628**, estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es **TRASLADADO A OTRO FONDO**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de noviembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 806.224 602-8

CERTIFICA QUE:

UVER DE JESUS ROJAS CASTRILLON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.836.121**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 29 de Octubre del 2022.


Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1007836121	ROJAS CASTRILLON UVER DE JESUS	27/10/2022		h1825216	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 15:16:47.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226641

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1007836121 Nombre: UVER DE JESUS ROJAS CASTRILLON Fecha de nacimiento: 25/12/1990 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: CORREGIMIENTO ALEJANDRIA Teléfono celular: 3115347889 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,500,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022 Fecha de ingreso a la empresa:



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/10/2022, el empleador INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS identificado con NIT número 900355893 registró la siguiente solicitud de reintegro en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4994756	27/10/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1007836121	UVERDE JESUS ROJAS	1500000	OFICIAL DE CONSTRUCCION	2022-10-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-12, 08:36:09 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1050303094

Periodo Cotización:

noviembre de 2022

Periodo Servicio:

diciembre de 2022

PAGADO 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN FREDDY SANABRIA POLANIA			
Documento	CC10181643		Dirección	CL 25 #53 - 06
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	6044995628
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO		Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal			Identificación	
Total Afiliados	18		ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001444293	CARLOS ALBERTO PERDOMO MALDONADO	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 10167723	RUBEN DARIO CHACON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 10170268	GUSTAVO SANABRIA POLANIA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 10189027	GUILLERMO ALDANA GARZON	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 10189040	IVAN REYNEL TELLEZ DELGADO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 1054540003	RAMIRO RUBIO GARCIA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 1073322330	OSCAR ANDRES CASTELLANOS TRUJILLO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 1073977708	CARLOS MARIO LOPEZ TORRES	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 1121337582	JHOYMER JAVIER RAMIREZ JIMENEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 33.334	\$ 5.400	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 15507695	JOSE DAVID GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 16015422	HERNAN DARIO CHACON SANABRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 70827887	CARLOS URIEL PARRA PARRA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 70830125	ALFREDO DE JESUS PARRA GIRALDO	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 71194215	JULIO ENRIQUE MALDONADO TRUJILLO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
PE 810303601071995	EDGARDO ENRIQUE SUAREZ RINCON	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
PT 4943084	DIONNI GABRIEL SANCHEZ ALVAREZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
PT 5459593	DIONNI JOSE SANCHEZ BRICEÑO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
PT 6750696	ABRAHAM JOSUE NAVA BELLO	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.500.010	\$ 3.500.010	\$ 3.500.010	\$ 3.500.010	\$ 561.000	\$ 141.000	\$ 244.800	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.087.800	\$ 0	\$ 1.087.800

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOHN ALEXANDER VELEZ ZAPATA identificado(a) con C.C No. 1.042.062.435, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 22 de noviembre del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Medellín, 01 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 MONTEBELLO			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	8.98 %
C1042062435	VELEZ ZAPATA JOHN ALEXANDER	02/11/2022		5845U242	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asl como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/11/2022 11:07:22.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 232650

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 1042062435	JOHN ALEXANDER VELEZ ZAPATA	02/06/1990	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	Montebello	VEREDA SAN ISIDRO	3207001410		

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000	8	192	02/10/2022

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

Ministerio de Salud Pública - República de Colombia

No. de Registro	Fecha de Registro

1. DATOS DEL TRABAJADOR: Para las inscripciones que se realicen por primera vez, debe diligenciar este formulario.

1.1. Tipo de Afiliación	1.2. Tipo de Afiliación	1.3. Tipo de Afiliación	1.4. Tipo de Afiliación
A. Trabajador	B. Dependiente	C. Voluntario	D. Otro
☐	☐	☐	☐
1.5. Tipo de Afiliación	1.6. Tipo de Afiliación	1.7. Tipo de Afiliación	1.8. Tipo de Afiliación
A. Trabajador	B. Dependiente	C. Voluntario	D. Otro
☐	☐	☐	☐

2. DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR (Por diligenciar el afiliado o representante legal)

2.1. Apellido y Nombre	2.2. Apellido y Nombre	2.3. Apellido y Nombre	2.4. Apellido y Nombre
Velez	Zapata	Jhon	Alexander
2.5. Tipo de Documento	2.6. Tipo de Documento	2.7. Tipo de Documento	2.8. Tipo de Documento
CC	1042062435	Residencia	1021061191910

3. DATOS DE CONTACTO DEL TRABAJADOR

3.1. Dirección	3.2. Dirección	3.3. Dirección	3.4. Dirección
Sua	Pavarr	1.000.000	

4. DATOS DE CONTACTO DEL TRABAJADOR

4.1. Dirección	4.2. Dirección	4.3. Dirección	4.4. Dirección
San Isidro	3203001410	N/A	
Montabelló		Antioquia	

5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR PRIVADO

5.1. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.2. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.3. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.4. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.5. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.6. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.7. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.8. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.9. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.10. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.11. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.12. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.13. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.14. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.15. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.16. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.17. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.18. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.19. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.20. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.21. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.22. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.23. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.24. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.25. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.26. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.27. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.28. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.29. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.30. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.31. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.32. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.33. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.34. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.35. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.36. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.37. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.38. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.39. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.40. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.41. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.42. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.43. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.44. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.45. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.46. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.47. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.48. Datos de identificación de los empleados del sector privado

5.49. Datos de identificación de los empleados del sector privado

Recibido
20315487

6. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS ABOGADOS DE LAS EMPRESAS ABOGADAS DE LA OPERACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE GRUPO	6.1. Datos de identificación del empleador	6.2. Datos de identificación del empleador	6.3. Datos de identificación del empleador
Ingeniería y Construcciones	W7 SAS	900355893	
6.4. Datos de identificación del empleador	6.5. Datos de identificación del empleador	6.6. Datos de identificación del empleador	6.7. Datos de identificación del empleador
Calle 56A 52 20	571104	Antioquia	Antioquia

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 01/11/2022, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• No. RADICADO:	28315487
• RÉGIMEN:	Contributivo
• TIPO DE TRÁMITE:	Adición de relación laboral
• FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:	2022-11-02
• TD AFILIADO:	CC
• NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:	1042062435
• TD EMPLEADOR:	NIT
• NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:	900355893
• FONDO DE PENSIÓN:	PORVENIR
• IBC:	\$1.000.000,00
• No. ADJUNTOS:	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.

2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.

3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 1 días del mes de Noviembre de 2022.

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR

Subdirector Nacional de Aseguramiento

COOSALUD EPS SA



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JORGE ENRIQUE MUÑOZ ACOSTA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1037751192**, se encuentra afiliado/a desde **08/09/2014** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de noviembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Medellín, 27 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S:

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 MONTEBELLO			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1037751192	MUÑOZ ACOSTA JORGE ENRIQUE	28/10/2022		229L1382	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2022 08:33:44.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226738

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1037751192 Nombre: JORGE ENRIQUE MUÑOZ ACOSTA Fecha de nacimiento: 13/11/1992 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3166486997 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 27/10/2022

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.



Número de Solicitud

61_3127

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 1037751192 JORGE ENRIQUE MUÑOZ ACOSTA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,000,000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de Ingreso	27/10/2022
Fecha de radicación	27/10/2022 04:31:01 p.m.
Código de Transacción	146729293
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 11/2022

Fecha de generación

27/10/2022

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **PEDRO LEON FRANCO ZAPATA** identificado/a con documento de Identidad **Cédula de Ciudadanía** número **71140421**, se encuentra afiliado/a desde **23/03/1994** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 29 de octubre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C71140421	FRANCO ZAPATA PEDRO LEON	27/10/2022		35332S35	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 16:21:12.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226659

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71140421 Nombre: PEDRO LEON FRANCO ZAPATA Fecha de nacimiento: 05/07/1962 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3103857147 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,500,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022 Fecha de ingreso a la empresa:

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite
A. Afiliación ☒ B. Reporte de novedades ☐

2. Tipo de afiliación
A. Individual - Cotizante o cabeza de familia ☒ B. Cotizante ☐ C. Cotizante ☐ D. De otro ☐

3. Régimen
A. Cotizante ☒ B. Subsidio ☐ C. Beneficiario ☐

4. Tipo de cotización
A. Cotizante ☒ B. Cotizante ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotización
A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: **Francisco**

7. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

8. Número de documento de identidad: **71140421**

9. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

10. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

11. Estado: **Verde**

12. Ocupación: **Empleado**

13. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

14. Grupo de población especial: **Verde**

15. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

16. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

17. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

18. Realización: **Verde**

19. Tipo de afiliación: **Individual**

20. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

21. Localidad: **Verde**

22. Teléfono: **3103857111**

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

23. Apellidos y nombres: **Leon**

24. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

25. Número de documento de identidad: **71140421**

26. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

27. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

28. Estado: **Verde**

29. Ocupación: **Empleado**

30. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

31. Grupo de población especial: **Verde**

32. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

33. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

34. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

35. Realización: **Verde**

36. Tipo de afiliación: **Individual**

37. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

38. Localidad: **Verde**

39. Teléfono: **3103857111**

IV. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

40. Apellidos y nombres: **Francisco**

41. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

42. Número de documento de identidad: **71140421**

43. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

44. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

45. Estado: **Verde**

46. Ocupación: **Empleado**

47. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

48. Grupo de población especial: **Verde**

49. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

50. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

51. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

52. Realización: **Verde**

53. Tipo de afiliación: **Individual**

54. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

55. Localidad: **Verde**

56. Teléfono: **3103857111**

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

57. Nombre o razón social: **Intergimnasio S.A.S.**

58. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

59. Número de documento de identidad: **71140421**

60. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

61. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

62. Estado: **Verde**

63. Ocupación: **Empleado**

64. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

65. Grupo de población especial: **Verde**

66. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

67. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

68. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

69. Realización: **Verde**

70. Tipo de afiliación: **Individual**

71. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

72. Localidad: **Verde**

73. Teléfono: **3103857111**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

74. Apellidos y nombres: **Francisco**

75. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

76. Número de documento de identidad: **71140421**

77. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

78. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

79. Estado: **Verde**

80. Ocupación: **Empleado**

81. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

82. Grupo de población especial: **Verde**

83. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

84. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

85. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

86. Realización: **Verde**

87. Tipo de afiliación: **Individual**

88. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

89. Localidad: **Verde**

90. Teléfono: **3103857111**

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

91. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

92. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

93. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

94. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

95. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

96. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

97. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

98. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

99. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

100. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria por parte de la EPS: ☒ Afirmativa ☐ Negativa

VIII. FIRMAS

101. Firma del afiliado: **Pedro Leon Franco**

102. Firma del representante legal de la entidad cotizante: **[Firma]**

IX. ANEXOS

103. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

104. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

105. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

106. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

107. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

108. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

109. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

110. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

111. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

112. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

113. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

114. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

115. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

116. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

117. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

118. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

119. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

120. Copia del documento de identidad: ☒ Original ☐ Copia

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

121. Identificación de la entidad territorial: **Verde**

122. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

123. Número de documento de identidad: **71140421**

124. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

125. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

126. Estado: **Verde**

127. Ocupación: **Empleado**

128. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

129. Grupo de población especial: **Verde**

130. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

131. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

132. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

133. Realización: **Verde**

134. Tipo de afiliación: **Individual**

135. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

136. Localidad: **Verde**

137. Teléfono: **3103857111**

Medellín, 11 de Noviembre de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL ANTIOQUIA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1 5455661	JARAMILLO CANO CARLOS ARTURO	07/09/2020		2352S151	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C154416582131543488

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/11/2021 12:04:51.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.247, 198.143.41.17, 172.16.42.57



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado EPS SURA

CERTIFICA

Que CARLOS ARTURO JARAMILLO CANO identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANIA número 15455661, aparece registrado(a) en EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 15455661
NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS ARTURO JARAMILLO CANO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	18/08/2010
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	491
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	51
EMPLEADOR(ES)	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S DESDE 07/09/2020

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 03/12/2022

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

EPS SURAMERICANA S.A

Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla: 605 319 7901, Cali: 602 380 8941,

Medellín: 604 448 61 15, Bogotá: 601 448 7941

Línea Nacional: 01 8000 519 519

epssura.com

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS ARTURO PONTON GUTIERREZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **6893882**, se encuentra afiliado/a desde **14/10/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de diciembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Medellín, 03 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S, en el centro de trabajo 0000000007 - CARACOLÍ, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C6893882	PONTON GUTIERREZ CARLOS ARTURO	12/01/2022		18022914	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10369310282233729279

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/12/2022 08:07:59.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.21, 192.230.104.10, 172.16.42.57



comfama

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Carlos Arturo Ponton Gutierrez con cédula 6893882, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente por intermedio del(los) empleador(es):

Razón social	Nit	Fecha afiliación	Fecha ingreso empresa*
Ingenieria Y Construcciones Wj S.A.s.	900355893	2022-01-12	2022-01-12

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 5 de diciembre de 2022 a solicitud del trabajador.

Cordialmente,

SANDRA ISABEL PALACIO BETANCUR
Responsable Operación Afiliaciones

VIGILADO SuperSubsidio



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) CARLOS ARTURO PONTON GUTIERREZ identificado(a) con CC 6893882 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	30/06/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	E.S.E. HOSPITAL SAN PIO X
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 3 días del mes de diciembre del año 2022.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,




Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **GILBERTO ZURITA TAPIAS** identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **71938533**, se encuentra afiliado/a desde **08/02/1990** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 25 de mayo de 2022.



Blanca Nubla Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 31 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000013 MARINILLA			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
071038533	ZURITA TAPIAS GILBERTO	01/11/2022		92096144	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2022 16:34:14

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

Envío exitoso No. 109619

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 71938533	GILBERTO ZURITA TAPIAS	23/12/1968	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	San Luis	CARRETERA LA ESPERANZA	3127879295		

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000	8	192	21/05/2022

Archivos adjuntos

 Trabajador: GILBERTO ZURITA TAPIAS

Tamaño

Tipo de documento Archivo

Cédula de Ciudadanía  Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.

Fecha y hora de Radicado 24/05/2022, 10:00:30

Radicado a través de: Empleador

Por: Paola Andrea Blandon Henao

2022

nue
eps

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 24/05/2022, el empleador INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS identificado con NIT número 900355893 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.


NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4475802	24/05/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	BC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71938533	GILBERTO ZURITA TAPIAS	1000000	AYUDANTE DE OBRA	2022-05-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Mayo del año 2022.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

Medellín, 20 de septiembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000006 SAN LUIS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,98 %
C70115459	JARAMILLO GAND HERNAN DE JESUS	21/09/2022		20262962	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/09/2022 15:17:31.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección: IP: 190.146.153.224, 192.230.104.8, 172.16.42.5

Registro de afiliación individual

Envío exitoso No. 195681

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

☒ Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 70115459	HERNAN DE JESUS JARAMILLO CANO	08/08/1955	Masculino	Soltero/a

☒ Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	San Luis	CORREGIMIENTO CARRERA 82 95 21	3234224235		

☒ Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000 8	192	20/09/2022	

Archivos adjuntos

Trabajador: HERNAN DE JESUS JARAMILLO CANO

Tamaño

Archivo

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía  Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.

Fecha y hora de Radicado 20/09/2022, 15:26:07
Radicado a través de: Empleador
Por: Paola Andrea Blandon Henao

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

No de Radicación
4008955908

Fecha de Radicación
21/09/2012

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación	B. Reporte de Novedades	A. Individual	B. Colectiva	A. Contributivo	B. Subsidado
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante	B. Cabeza de Familia	C. Beneficiario	A. Dependiente	B. Independiente	C. Pensionado

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

7. Tipo documento de identidad		8. Número del documento de identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
CC		70115459		Femenino	Masculino	09/08/1955	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
15. Administradora de Pensiones				17. Ingreso base de cotización - IBC			
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.				1000000			
16. Residencia		18. Pertenencia		19. Correo electrónico		20. Departamento	
CL 79B 55 13 Dirección		3234224235 Teléfono celular		HERNANJARAMILLO@GMAIL.COM		ANTIOQUIA	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

21. Número documento identidad		22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
		Femenino		Masculino	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

24. Tipo documento de identidad		25. Número de identidad		26. Sexo		27. Fecha de nacimiento	
				Femenino		Masculino	

28. Etnia		29. Discapacidad		30. Tipo		31. Condición	

32. Municipio/Distrito		33. Zona		34. Departamento		35. Teléfono Fijo y/o celular		36. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	

37. Nombre de la institución Prestadora de Salud - TPS		38. Código de la TPS (a registrar por la EPS)	
VS UAB VILLANUEVA - VS UOB VILLANUEVA		VSVILLANUE - VSODVILLAN	

39. Tipo de identificación		40. Número de documento de identificación		41. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S A S		500355893		01	

42. Dirección		43. Correo electrónico		44. Municipio/Distrito		45. Departamento	
CR 79 B 55 15		LINDAGRANJACECILIA@GMAIL.COM		MEDELLIN		ANTIOQUIA	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐		Fecha de nacimiento		42. Fecha 20/09/2012	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: ☐		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la emisión del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva Institucional o de oficio
--	---

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TL. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐Total: ☐ 0

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		Código del Departamento		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre		71. Firma del funcionario	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad							
Observaciones									

Recuerde que la firma, el final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JAIME DANILO VALENCIA CARDONA** identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **14248525**, se encuentra afiliado/a desde **07/12/1982** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de noviembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

m/a

Medellín, 16 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000013 MARINILLA			Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,96 %
C14248525	VALENCIA CARDONA JAIME DANILO	17/11/2022		Hs146e16	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/11/2022 10:07:10.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.149.153.150, 192.230.104.11, 172.18.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 242412

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 14248525 Nombre: JAIME DANILO VALENCIA CARDONA Fecha de nacimiento: 13/04/1962 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Dirección: VEREDA VEREDA POZOS Teléfono celular: 3117376592 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Fijo Horas contratadas al día: 192 Fecha de ingreso a la empresa: 16/11/2022

Archivos adjuntos

2 Trabajador JAIME DANILO VALENCIA CARDONA


Tamaño

355 KB

Tipo de documento Archivo

Cédula de Ciudadanía cc.j.pdf

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 61-753279500

Por favor imprimir este comprobante como constancia de la novedad registrada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900355093 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 14248525 JAIME DANILO VALENCIA CARDONA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1.000.000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de ingreso	16/11/2022
Fecha de radicación	16/11/2022 10:21:37 a.m.
Código de Transacción	147613296
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 12/2022

Fecha de generación

16/11/2022

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOHN JAIRO ATEHORTUA SIERRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **70953312**, se encuentra afiliado/a desde **26/06/2002** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 11 de diciembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Medellín, 16 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estatus
Centro de trabajo: 0000000013 MARINILLA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C70953312	ATEHORTUA SIERRA JOHN JAIRO	17/11/2022		198W2231	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/11/2022 10:08:14.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

confama

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

NIT 9003558939

Envío exitoso No. 242422

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento:

CC 70953312

Nombre:

JOHN JAIRO ATEHORTUA SIERRA

Fecha de nacimiento:

04/09/1971

Género:

Masculino

Estado civil:

Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:

Antioquia

Municipio:

Marinilla

Dirección:

VEREDA LA PRIMAVERA

Teléfono celular:

3147485099

Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario:

Fijo

Fijo

\$1,000,000 8

Horas contratadas al día: Horas contratadas al mes: Fecha de ingreso a la empresa:

192

16/11/2022

Archivos adjuntos


Trabajador JOHN JAIRO ATEHORTUA SIERRA

Tamaño

Tipo de documento Archivo

☒ Cédula de Ciudadanía Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.

Resultados del registro de novedades de reintegro



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud: 61-783279654

Por favor confirme este comprobante con la constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 70953312 JOHN JAIRO ATEHORTUA SIERRA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1.000.000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de ingreso	16/11/2022
Fecha de radicación	16/11/2022 10:24:58 a.m.
Código de Transacción	147613442
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 12/2022

Fecha de generación

16/11/2022

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) JARAMILLO GIRALDO JUAN DIEGO identificado(a) con CC número 1.039.465.249 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 26 de marzo de 2014 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 17 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com

70021017-0000

Medellín, 16 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Contingente	Estado
Centro de trabajo: 0000000013 MARINILLA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1039465249	JARAMILLO GIRALDO JUAN DIEGO	17/11/2022		94P20234	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación impositiva. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/11/2022 10:09:25.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

comfama

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 242455

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1039465249 Nombre: JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO Fecha de nacimiento: 23/09/1995 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Dirección: VEREDA LA PRIMAVERA Teléfono celular: 3104659774 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 16/11/2022 \$1,000,000 8


Archivos adjuntos

Trabajador: JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
-------------------	---------	--------

Cédula de Ciudadanía	 Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.	
----------------------	---	--

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 81 753279663

Por favor imprimir este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 1039465249 JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,000,000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de ingreso	16/11/2022
Fecha de radicación	16/11/2022 10:26:15 a.m.
Código de Transacción	147613499
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 12/2022

Fecha de generación

16/11/2022

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN PABLO ALVAREZ AGUDELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.115.534**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 27 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Colizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000013 MARINILLA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1007115534	ALVAREZ AGUDELO JUAN PABLO	28/10/2022		k1013019	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2022 12:50:13.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226792

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

☒ Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 1007115534	JUAN PABLO ALVAREZ AGUDELO	11/08/2001	Masculino	Soltero/a

☒ Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	El Peñol	VEREDA CARRERA 23A	3104112080		

☒ Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000 8	192	27/10/2022	

Archivos adjuntos


 Trabajador: JUAN PABLO ALVAREZ AGUDELO

Tipo de documento Archivo

Tamaño

Cédula de Ciudadanía cedula.pdf

74 KB



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/10/2022, el empleador INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS identificado con NIT número 900355893 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4994769	27/10/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1007115534	JUANPABLO ALVAREZ AGUDELO	1000000	AYUDANTE DE OBRA	2022-10-28

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **RUBEN ALEXANDER QUIÑONES IBARRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1036610888**, se encuentra afiliado/a desde **23/11/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de noviembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 21 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000013 MARINILLA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1036610888	QUINONES IBARRA RUBEN ALEXANDER	22/11/2022		16223020	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/11/2022 10:14:21.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 251785

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1036610888 Nombre: RUBEN ALEXANDER QUIÑONES IBARRA Fecha de nacimiento: 13/06/1997 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Dirección: VEREDA PICACHO Teléfono celular: 3205046110 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 22/1 1/2022

Archivos adjuntos

 Trabajador: RUBEN ALEXANDER QUIÑONES IBARRA

Tipo de documento


Archivo

Tamaño

Cédula de Ciudadanía

CC.pdf

135 KB



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 21/11/2022, el empleador INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS identificado con NIT número 900355893 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5071197	21/11/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1036610888	RUBENALEXANDER QUIÑONES IBARRA	1000000	AYUDANTE DE OBRA	2022-11-22

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de Noviembre del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, ella señora **RUBEN EMILIO QUIRIONES**, identificada con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **98480624**, se encuentra afiliada desde **01/03/2009** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMD) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 15 de abril de 2022.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 11 de junio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Colizante
Centro de trabajo: 0000000006 SAN LUIS		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C98480824	QUINONES RUBEN EMILIO	12/06/2022		14514120	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/06/2022 10:08:10.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.77, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Medellín, 25 de mayo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000006 SAN LUIS		Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,96 %
C98480624	QUINONES RUBEN EMILIO	26/05/2022		42121321	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 16:37:09.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.77, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

Envío exitoso No. 110865

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 98480624	RUBEN EMILIO QUINONES	09/04/1967	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	San Luis	CR 85 # 101C - 26	3205046110		

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,000,000	8	192	25/05/2022

Archivos adjuntos

 **Trabajador: RUBEN EMILIO QUINONES**

Tipo de documento Archivo

Tamaño

Cédula de Ciudadanía  Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.

Fecha y hora de Radicado 25/05/2022, 16:48:01
Radicado a través de: Empleador
Por: Paola Andrea Blandon Henao

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Número de Solicitud 61 7476

Reingreso 1	
Empleador	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 98480624 RUBEN EMILIO QUINONES
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,000,000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de ingreso	25/05/2022
Fecha de radicación	25/05/2022 04:43:22 p.m.
Código de Transacción	139149552
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 06/2022

Fecha de generación

25/05/2022

Protección

Fondo de Cesantías Protección

NIT 800.170.454

Hace constar que:

Se(a) Su(s) FREY GONZABA VALENCIA CIL (clasificada) con CC número 71.142.879 es recurrente afiliada al FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN, desde el 07 de Enero de 2018.

Esta constancia se emite a petición del interesado(a) el día 29 de octubre de 2022.

Continuando,

Laura Patricia Merchan Metaute
Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 310 90 89
Barranquilla: 319 79 90 - Cartagena: 642 49 98 - Nacional 01 8000 62 6300
www.proteccion.com

2022102911:00

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C71142070	VALENCIA GIL FREY GONZAGA	27/10/2022		1389MC18	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 15:32:11.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226693

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71142070 Nombre: FREY GONZAGA VALENCIA GIL Fecha de nacimiento: 24/02/1975 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3057439725 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,000,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022

Archivos adjuntos

Trabajador: FREY GONZAGA VALENCIA GIL

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	cdula.pdf	61 KB

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

Ministerio de Salud Pública

No. de Afiliación	Fecha de Emisión

1. DATOS DEL TRAMITE: Para las personas que se afiliaron por primera vez al sistema de salud

1.1. Tipo de afiliación	1.2. Tipo de afiliación	1.3. Tipo de afiliación	1.4. Tipo de afiliación
☐ A. Afiliación	☐ B. Afiliación	☐ C. Afiliación	☐ D. Afiliación
☐ E. Afiliación	☐ F. Afiliación	☐ G. Afiliación	☐ H. Afiliación
☐ I. Afiliación	☐ J. Afiliación	☐ K. Afiliación	☐ L. Afiliación

2. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (Los datos de identificación de la persona)

2.1. Apellido y nombre	2.2. Apellido y nombre	2.3. Apellido y nombre	2.4. Apellido y nombre
Valencia	611	Fier	Gonzalez
2.5. Tipo de documento	2.6. Número de documento	2.7. Fecha de emisión	2.8. Lugar de emisión
CC	31142030		

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL TRAMITANTE

3.1. Tipo de documento	3.2. Número de documento	3.3. Fecha de emisión	3.4. Lugar de emisión
3.5. Tipo de documento	3.6. Número de documento	3.7. Fecha de emisión	3.8. Lugar de emisión

4. DATOS DE IDENTIFICACION DEL TRAMITANTE

4.1. Tipo de documento	4.2. Número de documento	4.3. Fecha de emisión	4.4. Lugar de emisión
4.5. Tipo de documento	4.6. Número de documento	4.7. Fecha de emisión	4.8. Lugar de emisión

5. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL PROCESO FAMILIAR

5.1. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.1.1. Tipo de documento	5.1.2. Número de documento	5.1.3. Fecha de emisión	5.1.4. Lugar de emisión
5.1.5. Tipo de documento	5.1.6. Número de documento	5.1.7. Fecha de emisión	5.1.8. Lugar de emisión

5.2. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.2.1. Tipo de documento	5.2.2. Número de documento	5.2.3. Fecha de emisión	5.2.4. Lugar de emisión
5.2.5. Tipo de documento	5.2.6. Número de documento	5.2.7. Fecha de emisión	5.2.8. Lugar de emisión

5.3. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.3.1. Tipo de documento	5.3.2. Número de documento	5.3.3. Fecha de emisión	5.3.4. Lugar de emisión
5.3.5. Tipo de documento	5.3.6. Número de documento	5.3.7. Fecha de emisión	5.3.8. Lugar de emisión

5.4. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.4.1. Tipo de documento	5.4.2. Número de documento	5.4.3. Fecha de emisión	5.4.4. Lugar de emisión
5.4.5. Tipo de documento	5.4.6. Número de documento	5.4.7. Fecha de emisión	5.4.8. Lugar de emisión

5.5. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.5.1. Tipo de documento	5.5.2. Número de documento	5.5.3. Fecha de emisión	5.5.4. Lugar de emisión
5.5.5. Tipo de documento	5.5.6. Número de documento	5.5.7. Fecha de emisión	5.5.8. Lugar de emisión

5.6. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.6.1. Tipo de documento	5.6.2. Número de documento	5.6.3. Fecha de emisión	5.6.4. Lugar de emisión
5.6.5. Tipo de documento	5.6.6. Número de documento	5.6.7. Fecha de emisión	5.6.8. Lugar de emisión

5.7. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.7.1. Tipo de documento	5.7.2. Número de documento	5.7.3. Fecha de emisión	5.7.4. Lugar de emisión
5.7.5. Tipo de documento	5.7.6. Número de documento	5.7.7. Fecha de emisión	5.7.8. Lugar de emisión

5.8. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.8.1. Tipo de documento	5.8.2. Número de documento	5.8.3. Fecha de emisión	5.8.4. Lugar de emisión
5.8.5. Tipo de documento	5.8.6. Número de documento	5.8.7. Fecha de emisión	5.8.8. Lugar de emisión

5.9. Datos de identificación de los miembros del proceso familiar

5.9.1. Tipo de documento	5.9.2. Número de documento	5.9.3. Fecha de emisión	5.9.4. Lugar de emisión
5.9.5. Tipo de documento	5.9.6. Número de documento	5.9.7. Fecha de emisión	5.9.8. Lugar de emisión

B. REPORTE DE NOVEDADES

<p>10. Tipo de Novedad:</p> <p>☐ 1. Modificación de datos: Nombres de identificación.</p> <p>☐ 2. Corrección de datos: Nombres de identificación.</p> <p>☐ 3. Actualización del documento de identidad.</p> <p>☐ 4. Actualización y renovación de datos complementarios.</p> <p>☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.</p> <p>☐ 6. Inscripción en la EPS.</p> <p>☐ 7. Inscripción de beneficiarios en el Seguro Social.</p> <p>☐ 8. Exclusión de beneficiarios de el Seguro Social.</p> <p>☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para el trabajo.</p> <p>☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir trabajando.</p>	<p>☐ 11. Vinculación a una entidad especializada para recibir atención especializada.</p> <p>☐ 12. Desvinculación de una entidad especializada para recibir atención especializada.</p> <p>☐ 13. Novedad: ☐ A. Regimen Específico</p> <p>☐ 14. Novedad: ☐ B. Régimen Subordinado</p> <p>☐ 15. Novedad: ☐ A. Mismo Régimen</p> <p>☐ 16. Novedad: ☐ B. Diferente Régimen</p> <p>☐ 17. Reporte de fallecimiento.</p> <p>☐ 18. Reporte del fuero de protección al trabajo.</p> <p>☐ 19. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.</p> <p>☐ 20. Reporte de la calidad de pensionado.</p>
--	--

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

11. Datos básicos de identificación		12. Datos de identificación		13. Datos de identificación		14. Datos de identificación	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Fecha de nacimiento		Fecha de inscripción	
15. EPS anterior		16. Códigos de relación		17. Tipo de Contribución Familiar a pagar por los beneficiarios			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

<p>☐ 18. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y el/los afiliados.</p> <p>☐ 19. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.</p> <p>☐ 20. Declaración de no tener a cargo a otras personas que estén a cargo de los asegurados que acrediten la condición de beneficiarios.</p> <p>☐ 21. Declaración de no tener a cargo a otras personas que acrediten la condición de beneficiarios.</p> <p>☐ 22. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 23. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 24. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 25. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p>	<p>☐ 26. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 27. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 28. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 29. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p> <p>☐ 30. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del afiliado o de los beneficiarios a efectos de afiliación.</p>
--	--

VIII. FIRMAS

<p>Frey Valencia</p> <p>31. Firmante: padre o madre o beneficiario</p>	<p>JAR</p> <p>32. El emisor de la presente es responsable de la veracidad de la información.</p>
---	---

IX. ANEXOS


<p>☐ 33. Anexos de documentos de identidad.</p> <p>☐ 34. Copia del documento de inscripción permanente emitido por la administración competente.</p> <p>☐ 35. Copia del registro del seguro social o de la tarjeta pública para la inscripción en el seguro social.</p> <p>☐ 36. Copia de la historia clínica o historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 37. Copia del certificado de inscripción o de inscripción en el seguro social.</p> <p>☐ 38. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 39. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 40. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p>	<p>☐ 41. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 42. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 43. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 44. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p> <p>☐ 45. Copia de la historia clínica o de la historia clínica que declare la condición de beneficiario o de los beneficiarios.</p>
---	--

X. DATOS A SER ORIGINADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

36. Identificación de la Entidad Territorial	37. Datos del SUSAN	38. Fecha de notificación	39. Fecha de inscripción
Código del Municipio	Código del SUSAN	Fecha de notificación	Fecha de inscripción
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad	

Observaciones:

<p>Observaciones:</p>	<p>Procedido</p> <p>28175505</p>
-----------------------	--



CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 28/10/2022, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• No. RADICADO:	28175505
• RÉGIMEN:	Contributivo
• TIPO DE TRÁMITE:	Movilidad al régimen contributivo
• FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:	2022-10-27
• TD AFILIADO:	CC
• NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:	71142070
• TD EMPLEADOR:	NIT
• NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:	900355893
• FONDO DE PENSIÓN:	PORVENIR
• IBC:	\$1.000.000,00
• No. ADJUNTOS:	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
 2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
 3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.
- Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 28 días del mes de Octubre de 2022.

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR

Subdirector Nacional de Aseguramiento

COOSALUD EPS SA

COOSALUD EPS SA



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos:

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	Número de Ident.	Nombres	Apellidos	Fecha de Afiliación	Departamento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Regimen	Estado
CC	71142070	FREY GONZAGA	VALENCIA GIL	2018-12-03	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	BARRIO SIMON BOLIVAR 3137021517 3105430768		C	Activo

Información del Aportante				
NIT/CC	Razon Social	Estado	Rango Cotizante	Fecha Vinculacion
900355893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J SAS	N	A	27/10/2022

a anterior certificación se expide y firma, a los 22 días del mes de Noviembre de 2022, a solicitud del interesado y es válida hasta los 22 días del mes de Diciembre de 2022

Carlos Torres Salazar
CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON WILLIAM JARAMILLO FRANCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.036.925.025**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 12 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 02 de diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ANTIOQUIA				Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,95 %
C1036925025	JARAMILLO FRANCO JHON WILLIAM	03/12/2022		225111*2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2022 10:04:36.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.21, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 258466

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

☒ Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 1036925025	JHON WILLIAM JARAMILLO FRANCO	11/05/2004	Masculino	Soltero/a

☒ Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:	Correo electrónico:
Antioquia	Marínilla	VEREDA LAS ACACIAS	3147810490		

☒ Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	\$1,600,000 8	192	03/12/2022	


Archivos adjuntos

 Trabajador: JHON WILLIAM JARAMILLO FRANCO

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
-------------------	---------	--------

Cédula de Ciudadanía	CC.pdf	37 KB
----------------------	--------	-------

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Numero de Folio: 61.95503

Por favor imprimir este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900355893 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W J S.A.S
Afiliado	CC 1036926025 JHON WILLIAM JARAMILLO FRANCO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1.600.000
Cargo	OTRO
Sucursal	RIONEGRO CL 56 A # 52 30
Fecha de ingreso	03/12/2022
Fecha de radicación	03/12/2022 11:36:09 a.m.
Código de Transacción	146420509
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 01/2023

Fecha de generación

03/12/2022

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN DAVID MONTOYA ZAPATA** identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **1044100046**, se encuentra afiliado/a desde **17/10/2006** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 11 de diciembre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

certificado

Medellín, 25 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000018	SANTO DOMINGO		Clase: 5	Porcentaje Colización:	6,98 %
C1044100046	MONTOYA ZAPATA JUAN DAVID	26/11/2022		15218443	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/11/2022 10:37:49.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.86.3, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 252178

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 1044100046 Nombre: JUAN DAVID MONTOYA ZAPATA Fecha de nacimiento: 01/02/1986 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Santo Domingo Dirección: VEREDA SANTO DOMINGO Teléfono celular: 3115157715 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 26/11/2022 Fecha de ingreso a la empresa:

Archivos adjuntos

 Trabajador: JUAN DAVID MONTOYA ZAPATA

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
-------------------	---------	--------

Cédula de Ciudadanía	 Ten en cuenta: el documento soporte se encuentra en nuestra base de datos, será revisado y te informaremos sobre su aceptación o rechazo.	
----------------------	---	--

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



Datos de Afiliación
 1. Tipo de afiliación:
 A. Afiliación a la Seguridad Social en Salud ☒
 B. Reporte de novedad ☐
 2. Tipo de afiliación:
 A. Individual ☒
 B. Colectiva ☐
 C. Colectiva a cargo de familia ☐
 D. Colectiva a cargo de entidad ☐
 3. Régimen:
 A. Contributivo ☒
 B. Subsidiado ☐
 4. Tipo de afiliado:
 A. Ciudadano ☒
 B. Ciudadano de la zona ☐
 C. Beneficiario ☐
 5. Tipo de afiliante:
 A. Dependiente ☒
 B. Independiente ☐
 C. Pensionado ☐

Datos Básicos de Identificación
 6. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 7. Tipo de documento de identidad: CE
 8. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 9. Sexo: M
 10. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 11. Etnia: Mestizo
 12. Tipo de documento de identidad: CE
 13. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 14. Sexo: M
 15. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 16. Etnia: Mestizo
 17. Tipo de documento de identidad: CE
 18. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 19. Sexo: M
 20. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 21. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 22. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 23. Tipo de documento de identidad: CE
 24. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 25. Sexo: M
 26. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 27. Etnia: Mestizo
 28. Tipo de documento de identidad: CE
 29. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 30. Sexo: M
 31. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 32. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 33. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 34. Tipo de documento de identidad: CE
 35. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 36. Sexo: M
 37. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 38. Etnia: Mestizo
 39. Tipo de documento de identidad: CE
 40. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 41. Sexo: M
 42. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 43. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 44. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 45. Tipo de documento de identidad: CE
 46. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 47. Sexo: M
 48. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 49. Etnia: Mestizo
 50. Tipo de documento de identidad: CE
 51. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 52. Sexo: M
 53. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 54. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 55. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 56. Tipo de documento de identidad: CE
 57. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 58. Sexo: M
 59. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 60. Etnia: Mestizo
 61. Tipo de documento de identidad: CE
 62. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 63. Sexo: M
 64. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 65. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 66. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 67. Tipo de documento de identidad: CE
 68. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 69. Sexo: M
 70. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 71. Etnia: Mestizo
 72. Tipo de documento de identidad: CE
 73. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 74. Sexo: M
 75. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 76. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 77. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 78. Tipo de documento de identidad: CE
 79. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 80. Sexo: M
 81. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 82. Etnia: Mestizo
 83. Tipo de documento de identidad: CE
 84. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 85. Sexo: M
 86. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 87. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 88. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 89. Tipo de documento de identidad: CE
 90. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 91. Sexo: M
 92. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 93. Etnia: Mestizo
 94. Tipo de documento de identidad: CE
 95. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 96. Sexo: M
 97. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 98. Etnia: Mestizo

Datos de Identificación de los Miembros del Núcleo Familiar
 99. Apellidos y nombres: Montoya Zapata
 100. Tipo de documento de identidad: CE
 101. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 102. Sexo: M
 103. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 104. Etnia: Mestizo
 105. Tipo de documento de identidad: CE
 106. Número de documento de identidad: 1044 100 046
 107. Sexo: M
 108. Fecha de nacimiento: 01/01/1976
 109. Etnia: Mestizo

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **PEDRO LEON FRANCO ZAPATA** identificado/a con documento de Identidad **Cédula de Ciudadanía** número **71140421**, se encuentra afiliado/a desde **23/03/1994** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 29 de octubre de 2022.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 26 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000012 MONTEBELLO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C71140421	FRANCO ZAPATA PEDRO LEON	27/10/2022		35332S35	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/10/2022 16:21:12.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226659

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71140421 Nombre: PEDRO LEON FRANCO ZAPATA Fecha de nacimiento: 05/07/1962 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3103857147 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Fijo Tipo de salario: Fijo Salario: \$1,500,000 8 Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022 Fecha de ingreso a la empresa:

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

2. Tipo de afiliación: ☒ A. Individual - Cotizante o cabeza de familia ☐ B. Cotizante ☐ C. Cotizante ☐ D. De otro

3. Régimen: ☒ A. Cotizante ☐ B. Subsidio ☐ C. Beneficiario

4. Tipo de afiliado: ☒ A. Cotizante ☐ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario

5. Tipo de cotizante: ☒ A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: **Francisco**

7. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

8. Número de documento de identidad: **71140421**

9. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

10. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

11. Estado: **Verde**

12. Ocupación: **Empleado**

13. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

14. Grupo de población especial: **Verde**

15. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

16. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

17. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

18. Realización: **Verde**

19. Tipo de afiliación: **Individual**

20. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

21. Localidad: **Verde**

22. Teléfono: **3103857111**

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

23. Apellidos y nombres: **Leon**

24. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

25. Número de documento de identidad: **71140421**

26. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

27. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

28. Estado: **Verde**

29. Ocupación: **Empleado**

30. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

31. Grupo de población especial: **Verde**

32. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

33. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

34. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

35. Realización: **Verde**

36. Tipo de afiliación: **Individual**

37. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

38. Localidad: **Verde**

39. Teléfono: **3103857111**

IV. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

40. Apellidos y nombres: **Primera Apellido**

41. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

42. Número de documento de identidad: **71140421**

43. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

44. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

45. Estado: **Verde**

46. Ocupación: **Empleado**

47. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

48. Grupo de población especial: **Verde**

49. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

50. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

51. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

52. Realización: **Verde**

53. Tipo de afiliación: **Individual**

54. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

55. Localidad: **Verde**

56. Teléfono: **3103857111**

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

57. Nombre o razón social: **Intergimnasio S.A.S.**

58. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

59. Número de documento de identidad: **71140421**

60. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

61. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

62. Estado: **Verde**

63. Ocupación: **Empleado**

64. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

65. Grupo de población especial: **Verde**

66. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

67. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

68. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

69. Realización: **Verde**

70. Tipo de afiliación: **Individual**

71. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

72. Localidad: **Verde**

73. Teléfono: **3103857111**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

74. Tipo de novedad: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

75. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

76. Número de documento de identidad: **71140421**

77. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

78. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

79. Estado: **Verde**

80. Ocupación: **Empleado**

81. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

82. Grupo de población especial: **Verde**

83. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

84. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

85. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

86. Realización: **Verde**

87. Tipo de afiliación: **Individual**

88. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

89. Localidad: **Verde**

90. Teléfono: **3103857111**

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

91. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: ☒ A. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐ B. Declaración de independencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

92. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria: ☒ A. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria. ☐ B. Declaración de haber sido objeto de sanción disciplinaria.

93. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria: ☒ A. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria. ☐ B. Declaración de haber sido objeto de sanción disciplinaria.

94. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria: ☒ A. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria. ☐ B. Declaración de haber sido objeto de sanción disciplinaria.

95. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria: ☒ A. Declaración de no haber sido objeto de sanción disciplinaria. ☐ B. Declaración de haber sido objeto de sanción disciplinaria.

VIII. FIRMAS

96. Firma del afiliado: **Pedro Leon Franco**

97. Firma del empleador: **[Firma]**

IX. ANEXOS

98. Copia del documento de identidad: ☒ A. Copia del documento de identidad. ☐ B. Copia del documento de identidad.

99. Copia del documento de identidad: ☒ A. Copia del documento de identidad. ☐ B. Copia del documento de identidad.

100. Copia del documento de identidad: ☒ A. Copia del documento de identidad. ☐ B. Copia del documento de identidad.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

101. Tipo de documento de identidad: ☒ C ☐ P

102. Número de documento de identidad: **71140421**

103. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

104. Fecha de nacimiento: **10/03/1971**

105. Estado: **Verde**

106. Ocupación: **Empleado**

107. Fecha de inscripción: **10/03/1971**

108. Grupo de población especial: **Verde**

109. Admisión de riesgos laborales - ARL: **Sura**

110. Admisión de riesgos de tránsito: **Paracur**

111. Ingresos base de cotización - IBC: **1.500.000**

112. Realización: **Verde**

113. Tipo de afiliación: **Individual**

114. Zona: ☒ Urbana ☐ Rural

115. Localidad: **Verde**

116. Teléfono: **3103857111**

XI. OBSERVACIONES:

117. Observaciones: **[Observaciones]**

XII. FIRMAS

118. Firma del afiliado: **Pedro Leon Franco**

119. Firma del empleador: **[Firma]**

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) WILSON DE JESUS CALLE ARENAS identificado(a) con C.C No. 71.142.485, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 29 de octubre del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Medellín, 27 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número de identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 MONTEBELLO			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%
071142485	CALLE ARENAS WILSON DE JESUS	28/10/2022		22591991	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2022 08:46:40.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.153.150, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Registro de afiliación individual

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | NIT 9003558939 | Envío exitoso No. 226752

Ya completaste el registro de afiliación del trabajador y/o su grupo familiar. Revisaremos esta información y, en un término máximo de tres días hábiles, te informaremos el resultado.

Datos del trabajador

Información general

Documento: CC 71142485 Nombre: WILSON DE JESUS CALLE ARENAS Fecha de nacimiento: 16/01/1982 Género: Masculino Estado civil: Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento: Antioquia Municipio: Montebello Dirección: VEREDA EL CARMELO Teléfono celular: 3164486997 Teléfono fijo: Correo electrónico:

Datos laborales

Tipo de contrato: Tipo de salario: Salario: Fijo Horas contratadas al día: 192 Horas contratadas al mes: 27/10/2022

savia
SALUD EPS

Formulario de inscripción y datos de identificación para el Seguro Social en Salud (EPS). Incluye secciones para datos del afiliado, datos de identificación, datos de identificación de los miembros del núcleo familiar, datos de identificación del empleador y otros aportantes, y datos de identificación de la EPS. El formulario está dividido en varias partes con campos para nombres, direcciones, fechas, y otros datos personales y laborales.

SECCIÓN I: DATOS DEL AFILIADO

1. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

2. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

3. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

4. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

5. Tipo de afiliación: ☒ A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedades

SECCIÓN II: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

6. Apellidos y nombres: **WILSON**

7. Tipo de documento de identidad: **CC**

8. Número de documento de identidad: **1142485**

9. Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

10. Fecha de nacimiento: **14/05/1971**

11. Edad: **31**

12. Diferencia de edad: **0**

13. Estado civil: **1**

14. Grupo de población especial: **0**

15. Adscripción de riesgo laboral: **0**

16. Adscripción de riesgos laborales: **0**

17. Ingresos base de cotización - IBC: **1.000.000**

18. Residencia: **4**

19. Lugar de nacimiento: **Medellín**

20. Lugar de nacimiento: **Medellín**

21. Lugar de nacimiento: **Medellín**

22. Lugar de nacimiento: **Medellín**

23. Lugar de nacimiento: **Medellín**

24. Lugar de nacimiento: **Medellín**

25. Lugar de nacimiento: **Medellín**

26. Lugar de nacimiento: **Medellín**

27. Lugar de nacimiento: **Medellín**

28. Lugar de nacimiento: **Medellín**

29. Lugar de nacimiento: **Medellín**

30. Lugar de nacimiento: **Medellín**

31. Lugar de nacimiento: **Medellín**

32. Lugar de nacimiento: **Medellín**

33. Lugar de nacimiento: **Medellín**

34. Lugar de nacimiento: **Medellín**

35. Lugar de nacimiento: **Medellín**

36. Lugar de nacimiento: **Medellín**

37. Lugar de nacimiento: **Medellín**

38. Lugar de nacimiento: **Medellín**

39. Lugar de nacimiento: **Medellín**

40. Lugar de nacimiento: **Medellín**

41. Lugar de nacimiento: **Medellín**

42. Lugar de nacimiento: **Medellín**

43. Lugar de nacimiento: **Medellín**

44. Lugar de nacimiento: **Medellín**

45. Lugar de nacimiento: **Medellín**

46. Lugar de nacimiento: **Medellín**

47. Lugar de nacimiento: **Medellín**

48. Lugar de nacimiento: **Medellín**

49. Lugar de nacimiento: **Medellín**

50. Lugar de nacimiento: **Medellín**

51. Lugar de nacimiento: **Medellín**

52. Lugar de nacimiento: **Medellín**

53. Lugar de nacimiento: **Medellín**

54. Lugar de nacimiento: **Medellín**

55. Lugar de nacimiento: **Medellín**

56. Lugar de nacimiento: **Medellín**

57. Lugar de nacimiento: **Medellín**

58. Lugar de nacimiento: **Medellín**

59. Lugar de nacimiento: **Medellín**

60. Lugar de nacimiento: **Medellín**

61. Lugar de nacimiento: **Medellín**

62. Lugar de nacimiento: **Medellín**

63. Lugar de nacimiento: **Medellín**

64. Lugar de nacimiento: **Medellín**

65. Lugar de nacimiento: **Medellín**

66. Lugar de nacimiento: **Medellín**

67. Lugar de nacimiento: **Medellín**

68. Lugar de nacimiento: **Medellín**

69. Lugar de nacimiento: **Medellín**

70. Lugar de nacimiento: **Medellín**

71. Lugar de nacimiento: **Medellín**

72. Lugar de nacimiento: **Medellín**

73. Lugar de nacimiento: **Medellín**

74. Lugar de nacimiento: **Medellín**

75. Lugar de nacimiento: **Medellín**

76. Lugar de nacimiento: **Medellín**

77. Lugar de nacimiento: **Medellín**

78. Lugar de nacimiento: **Medellín**

79. Lugar de nacimiento: **Medellín**

80. Lugar de nacimiento: **Medellín**

81. Lugar de nacimiento: **Medellín**

82. Lugar de nacimiento: **Medellín**

83. Lugar de nacimiento: **Medellín**

84. Lugar de nacimiento: **Medellín**

85. Lugar de nacimiento: **Medellín**

86. Lugar de nacimiento: **Medellín**

87. Lugar de nacimiento: **Medellín**

88. Lugar de nacimiento: **Medellín**

89. Lugar de nacimiento: **Medellín**

90. Lugar de nacimiento: **Medellín**

91. Lugar de nacimiento: **Medellín**

92. Lugar de nacimiento: **Medellín**

93. Lugar de nacimiento: **Medellín**

94. Lugar de nacimiento: **Medellín**

95. Lugar de nacimiento: **Medellín**

96. Lugar de nacimiento: **Medellín**

97. Lugar de nacimiento: **Medellín**

98. Lugar de nacimiento: **Medellín**

99. Lugar de nacimiento: **Medellín**

100. Lugar de nacimiento: **Medellín**

101. Lugar de nacimiento: **Medellín**

102. Lugar de nacimiento: **Medellín**

103. Lugar de nacimiento: **Medellín**

104. Lugar de nacimiento: **Medellín**

105. Lugar de nacimiento: **Medellín**

106. Lugar de nacimiento: **Medellín**

107. Lugar de nacimiento: **Medellín**

108. Lugar de nacimiento: **Medellín**

109. Lugar de nacimiento: **Medellín**

110. Lugar de nacimiento: **Medellín**

111. Lugar de nacimiento: **Medellín**

112. Lugar de nacimiento: **Medellín**

113. Lugar de nacimiento: **Medellín**

114. Lugar de nacimiento: **Medellín**

115. Lugar de nacimiento: **Medellín**

116. Lugar de nacimiento: **Medellín**

117. Lugar de nacimiento: **Medellín**

118. Lugar de nacimiento: **Medellín**

119. Lugar de nacimiento: **Medellín**

120. Lugar de nacimiento: **Medellín**

121. Lugar de nacimiento: **Medellín**

122. Lugar de nacimiento: **Medellín**

123. Lugar de nacimiento: **Medellín**

124. Lugar de nacimiento: **Medellín**

125. Lugar de nacimiento: **Medellín**

126. Lugar de nacimiento: **Medellín**

127. Lugar de nacimiento: **Medellín**

128. Lugar de nacimiento: **Medellín**

129. Lugar de nacimiento: **Medellín**

130. Lugar de nacimiento: **Medellín**

131. Lugar de nacimiento: **Medellín**

132. Lugar de nacimiento: **Medellín**

133. Lugar de nacimiento: **Medellín**

134. Lugar de nacimiento: **Medellín**

135. Lugar de nacimiento: **Medellín**

136. Lugar de nacimiento: **Medellín**

137. Lugar de nacimiento: **Medellín**

138. Lugar de nacimiento: **Medellín**

139. Lugar de nacimiento: **Medellín**

140. Lugar de nacimiento: **Medellín**

141. Lugar de nacimiento: **Medellín**

142. Lugar de nacimiento: **Medellín**

143. Lugar de nacimiento: **Medellín**

144. Lugar de nacimiento: **Medellín**

145. Lugar de nacimiento: **Medellín**

146. Lugar de nacimiento: **Medellín**

147. Lugar de nacimiento: **Medellín**

148. Lugar de nacimiento: **Medellín**

149. Lugar de nacimiento: **Medellín**

150. Lugar de nacimiento: **Medellín**

151. Lugar de nacimiento: **Medellín**

152. Lugar de nacimiento: **Medellín**

153. Lugar de nacimiento: **Medellín**

154. Lugar de nacimiento: **Medellín**

155. Lugar de nacimiento: **Medellín**

156. Lugar de nacimiento: **Medellín**

157. Lugar de nacimiento: **Medellín**

158. Lugar de nacimiento: **Medellín**

159. Lugar de nacimiento: **Medellín**

160. Lugar de nacimiento: **Medellín**

161. Lugar de nacimiento: **Medellín**

162. Lugar de nacimiento: **Medellín**

163. Lugar de nacimiento: **Medellín**

164. Lugar de nacimiento: **Medellín**

165. Lugar de nacimiento: **Medellín**

166. Lugar de nacimiento: **Medellín**

167. Lugar de nacimiento: **Medellín**

168. Lugar de nacimiento: **Medellín**

169. Lugar de nacimiento: **Medellín**

170. Lugar de nacimiento: **Medellín**

171. Lugar de nacimiento: **Medellín**

172. Lugar de nacimiento: **Medellín**

173. Lugar de nacimiento: **Medellín**

174. Lugar de nacimiento: **Medellín**

175. Lugar de nacimiento: **Medellín**

176. Lugar de nacimiento: **Medellín**

177. Lugar de nacimiento: **Medellín**

178. Lugar de nacimiento: **Medellín**

179. Lugar de nacimiento: **Medellín**

180. Lugar de nacimiento: **Medellín**

181. Lugar de nacimiento: **Medellín**

182. Lugar de nacimiento: **Medellín**

183. Lugar de nacimiento: **Medellín**

184. Lugar de nacimiento: **Medellín**

185. Lugar de nacimiento: **Medellín**

186. Lugar de nacimiento: **Medellín**

187. Lugar de nacimiento: **Medellín**

188. Lugar de nacimiento: <

2. Background

152490 SUPG=343431



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INFORME PAPSO

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,
EL PEÑOL, MARINILLA, GRANADA, SAN CARLOS Y SANTO DOMINGO”**



CONTRATO DE OBRA

COP-003-2022

NOVIEMBRE 2022



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se establecen las actividades que se llevaron a cabo para cumplir con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra – PAPSO, el cual tiene como objetivo responder a las necesidades de bioseguridad emergentes a partir de la aparición del Coronavirus Covid-19.

JUSTIFICACIÓN

Debido a la aparición del Covid-19 se establecen medidas de bioseguridad emergentes, sin embargo la emergencia actualmente ha disminuido y el tapabocas no es de uso obligatorio a excepción de tres escenarios: transporte público, servicios médicos y hogares geriátricos. Por lo tanto en el presente informe se establecen las medidas sanitarias que aplican actualmente.

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las medidas necesarias para el control del contagio y la propagación del Covid-19 en el marco del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias de los Municipios de Oriente, Antioquia”, atendiendo a las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Promover las medidas necesarias en las diferentes áreas y lugares de trabajo para la prevención del contagio y propagación del Covid-19.
- Realizar seguimiento y monitoreo al personal que presente síntomas asociados a Covid-19.
- Verificar el cumplimiento de las medidas contempladas en el PAPSO.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

PRESENTACIÓN

Debido a la pandemia que tuvo lugar en el año 2022 y al Virus del Covid-19 se implementa en obra un protocolo de bioseguridad para los trabajadores con el fin de garantizar la salud del personal. Para tal fin el presente informe muestra las actividades realizadas en relación al Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra – PAPS en el proyecto cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo”.

De acuerdo a las actividades planteadas en el PAPS se realizó la entrega de elementos de bioseguridad en cada uno de los municipios, así mismo también se realizan charlas acerca del protocolo y las acciones que deben cumplir. Se continúa con la desinfección de algunos elementos de protección personal y se verifica el estado de camillas y botiquín en las instalaciones de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Imagen 1. Inspección camilla y botiquín	Imagen 2. Inspección camilla y botiquín.	Imagen 3. Desinfección
		
Imagen 4. Entrega de elementos de bioseguridad	Imagen 4. Capacitación	Imagen 5. Capacitación.

Jakelyn Arias

Coordinadora SST

Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S

PAGADO 23/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S A S		
Documento	NI900355893	Dirección	CL 56A #52 - 30 BARRIO LAURELES
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5771104
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	JARAMILLO HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	Identificación	CC 15441658
Total Afiliados	14	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SVN	IGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARS	Dias COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036931028	JAKELYN YAYLU ARIAS RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1036937722	GLORIA DE JESUS IDARRAGA GONZALEZ	01	00	X																0	24	24	24	(230301) PORVENIR	\$ 1.760.000	\$ 281.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.760.000	\$ 70.400	6,960	\$ 1.760.000	\$ 122.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.760.000	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.900
CC 1036954651	SANTIAGO VANEGAS DUQUE	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000
CC 1036956562	JUAN DAVID CASTRO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1037950354	JOHN EDWAR GONZALEZ RIOS	01	00	X	X															0	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 390.000	\$ 62.400	(ESSC91) ECOOPSOS	\$ 390.000	\$ 15.600	6,960	\$ 390.000	\$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 390.000	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.800
CC 1098769513	ALEJANDRA TOBON DUQUE	01	00	X																0	26	26	26	(230301) PORVENIR	\$ 1.560.000	\$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.560.000	\$ 62.400	6,960	\$ 1.560.000	\$ 108.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.560.000	\$ 62.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.000
CC 1128461340	DAYANA PINEDA RAVE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400
CC 15441658	WILLIAM ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 15455661	CARLOS ARTURO JARAMILLO CANO	01	05																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.600
CC 39452691	DORALBA GOMEZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600
CC 70163856	NELSON DE JESUS GARCIA GARZON	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 71293594	GERMAN DE JESUS ISAZA ISAZA	01	00	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 260.000	\$ 10.400	6,960	\$ 260.000	\$ 18.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.500
CC 79560053	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARREÑO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600
PE 957464925101993	DAYANIZ ANDREINA GONZALEZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	6,960	\$ 1.400.000	\$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.070.000	\$ 23.070.000	\$ 23.070.000	\$ 23.070.000	\$ 3.531.200	\$ 922.800	\$ 1.605.900	\$ 922.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.982.700	\$ 0	\$ 6.982.700



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

GRR311

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10028007117

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

COLORADO

MODELO:

2020

COLOR:

PLATA SABLE

NÚMERO DE SERIE:

9BG148MK0LC415225

NÚMERO DE MOTOR:

LWN F192071027

NÚMERO DE CHASIS:

9BG148MK0LC415225

NÚMERO DE VIN:

9BG148MK0LC415225

CILINDRAJE:

2776

TIPO DE CARROCERÍA:

DOBLE CABINA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **22/10/2019**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
30911977	 24/11/2022	 25/11/2022	 24/11/2023	231	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	 VIGENTE
27459815	 12/10/2021	 13/10/2021	 12/10/2022	231	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	 NO VIGENTE
25402422	 30/09/2020	 13/10/2020	 12/10/2021	231	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	 NO VIGENTE
77003970	 12/10/2019	 13/10/2019	 12/10/2020	231	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad



Garantías a Favor De



Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)



Normalización y Saneamiento



Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028007117

PLACA GRR311	MARCA CHEVROLET	LÍNEA COLORADO	MODELO 2020
CILINDRADA CC 2.776	COLOR PLATA SABLE	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROGERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 710 - 5
NÚMERO DE MOTOR LWN F192071027		REG. VIN N 9BG148MK0LC415225	
NÚMERO DE SERIE 9BG148MK0LC415225		REG. NÚMERO DE CHASIS N 9BG148MK0LC415225	REG. N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS		IDENTIFICACIÓN NTT 900355893	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482019000685807

VE FECHA IMPORT.

I 06/09/2019

PUERTAS

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

22/10/2019

20/12/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT03005819372

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO | MES | DÍA
2022 | 10 | 12

VIGENCIA
DESDE
AÑO | MES | DÍA
2022 | 10 | 13
HASTA
LAS 23:59
HORAS
DEL

AÑO | MES | DÍA
2023 | 10 | 12



ASEGURADORA

sura

890.903.407 - 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
30157839	THX063	CAMIONETA	PARTICULAR	2999	2012
PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA			
4	CHEVROLET				
LÍNEA VEHÍCULO	LUVDMAX				
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
177155	8LBETF3E7C0137593	8LBETF3E7C0137593	1.0		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILLIAM ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ			CEDULA	15441658	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1318	248	4999			
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
232	\$ 689,700	\$ 358,600	\$ 2,100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
TOTAL A PAGAR \$ 1,050,400				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 ²
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180
					750

FIRMA AUTORIZADA

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10026046877

PLACA

THX063

MARCA

CHEVROLET

LÍNEA

LUV D MAX

MODELO

2012

CILINDRADA CC

2.999

COLOR

BLANCO OLIMPICO

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO

CAMIONETA

TIPO CARROCERIA

DOBLE CABINA

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD kg/PSJ

1000 - 4

NÚMERO DE MOTOR

177155

REG

VIN

N

8LBETF3E7C0137593

NÚMERO DE SERIE

8LBETF3E7C0137583

REG

NÚMERO DE CHASIS

N

8LBETF3E7C0137593

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

JARAMILLO HERNANDEZ WILLIAM ARTURO

IDENTIFICACION

C.C. 15441658

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE FECHA IMPORT.

PUERTAS

372011000024864

I 22/12/2011

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

28/03/2012

10/05/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT02007136228




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162029815

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL CORDOBS

NIT: 901151055

Nº. de Certificado de
Acreditación: 18-OIN-069-005

Fecha de expedición: 2022/10/11

Fecha de vencimiento: 2023/10/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: THX063

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2012

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2999

NRO. MOTOR: 177155

NRO. CHASIS: 8LBETF3E7C0137593

VIN: 8LBETF3E7C0137593

LÍNEA: LUV D MAX

COLOR: BLANCO OLIMPICO

NOMBRE PROPIETARIO: WILLIAM A. JARAMILLO H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027433329

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JNY067	TOYOTA	LAND CRUISER 200	2021
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
4.461	GRIS	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	DIESEL	8
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
05249921VD	N	JTMHV02J404302104	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
JTMHV02J404302104	N	JTMHV02J404302104	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900355893

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

II

235

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

192021000016654

I 01/03/2021

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2021

11/10/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03005442991

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO MES DÍA
2022-04-28

VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2022-05-04

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2023-05-03



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

No. DE PÓLIZA 14025500001970		PLACA No. JNY067	CLASE VEHICULO VEHICULO PARA 6 O MAS	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VOL. 4461	MODELO 2021
PASAJER No.	MARCA TOYOTA	LÍNEA VEHICULO LAND CRUISER 200		CARROCERÍA WAGON		
No. MOTOR 05249921VD	No. CHASIS o No. SERIE JTMHV02J404302104		No. VIN JTMHV02J404302104		CAPACIDAD 0.00	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR VELASQUEZ VIEIRA, JULIANA			TELÉFONO DEL TOMADOR 3104161672	TIPO DE DOCUMENTO DEL CC	No. DE DOCUMENTO DEL 1128474994	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR MEDELLIN
CÓDIGO DE ASEGURADORA AT1329	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA 65	CLAVE PRODUCTOR 164234	No. FORMULARIO 0	CIUDAD EXPEDICIÓN MEDELLIN		
TARIF 624	PRIMA SOAT \$ 577600	CONTRIBUCIÓN \$ 300300	TASA RUNT \$ 1900	AMPAROS POR A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS		HASTA 800 180 750 10 SALARIO S MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
TOTAL A PAGAR \$ 879800						

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Recuerde validar que su póliza está vigente acérrese multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requiriendo por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 160 Decreto Ley 563 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Foyega lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales.

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencias nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedoras, intermediarias de Seguros, entidades de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, líneas comerciales y para ser contactado directamente a través de sus canales de comercialización.

Sera facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas: www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
Sitio web: A través de las páginas: www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
Contactarnos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.439.770

MARTINEZ GUARIN

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1977

RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-FEB-1996 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 0121400-00399791-M-0015439770-20120914 0031146659A 1 2332004200



Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
107453-T
CARLOS ANDRES
MARTINEZ GUARIN
C.C. 15439770
RESOLUCION INSCRIPCION 257
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
FECH 2004/12/12
PRESIDENTE
RIGUEL TIQUE-PEÑA
13720



FIRM DEL TITULAR
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.
 LOGOFORMAS CONN 2002/556



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

02FE6603566FFCF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ANDRES MARTINEZ GUARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15439770 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 107453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



AVAL

Yo, YURY MARCELA VALENCIA VELÁSQUEZ, en mi calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S. identificada con NIT 900.383.986-4 en cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 del 2002.

HAGO CONSTAR:

Que verificada la información; la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. identificada con NIT 900.355.893-9, quien obra en calidad de CONTRATISTA del convenio interadministrativo con código BPIN 2022003050053, suscrito por la Gobernación de Antioquia y Municipios Asociados de la Subregión de Embalses Rio Negro y Nare – MASER, para el Mejoramiento de Vías Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo; se encuentra a paz y salvo en el relacionado con los pagos de bienestar social y aportes parafiscales así:

- * Sistema de Salud
- * Riesgos profesionales
- * Pensiones
- * Servicio Nacional de Aprendizaje
- * Caja de compensación familiar

El presente certificado se firma el día 13 de diciembre de 2022 en el municipio de Rio Negro, Antioquia.

YURY MARCELA VALENCIA VELÁSQUEZ
CC 1.036.397.709
Representante legal



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
Nit: 900.355.893-9

Rionegro, 12 de diciembre de 2022

Señores:
MASER

Referencia: Mejoramiento de Vías Terciarias en los Municipios de Concepción, El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo”, identificado con código BPIN 2022003050053

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

El suscrito Contador Público **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GUARÍN** y el Representante legal **WILLIAM ARTURO JARAMILLO HERNÁNDEZ** certifican que **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses. De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto 1828 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
	Si ()	No ()	Si (X)	No ()
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados				

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GUARÍN
Revisor Fiscal T.P. 107453-T
C.C. 15.439.770

WILLIAM A. JARAMILLO HERNÁNDEZ
Representante Legal
C.C. 15.441.658

Cordialmente

JAKELYN ARIAS RAMÍREZ
Coordinadora de SST
