

NO APLICA	ACTA DE APROBACION DEL PROGRAMA	
F DC 705-001		
Rev.: 0		
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN		

OBJETO: CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL AMB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO:	\$650.707.522,00	CONTRATISTA:	CONSORCIO NESCO - JP
FECHA DE INICIACIÓN:	FEBRERO 15/2023	INTERVENTOR:	SHARIS MARIA ARENAS RAMIREZ
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 14/2023	ACTA No.:	02
CONTRATO DE OBRA No.:	293/2022	FECHA ACTA:	FEBRERO 15 DE 2023

ACTA DE APROBACION DEL PROGRAMA

ASISTENTES:

Los señores: **NESTOR CONTRERAS RAMIREZ**, en representación del **CONSORCIO NESCO - JP**, Contratista; y **SHARIS MARIA ARENAS RAMIREZ**, Interventor en representación de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. Que el Contratista ha presentado el programa de actividades requerido para la ejecución del Contrato.
2. Que la Interventoría del Contrato revisó el programa de actividades y lo encontró ajustado a las necesidades del Contrato de Obra No. 293/2022.

ACUERDAN:

1. Dar cumplimiento al programa de actividades aprobado a partir de la fecha de iniciación del Contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta.


NESTOR CONTRERAS RAMIREZ
 R/L CONSORCIO NESCO – JP
Contratista


SHARIS MARIA ARENAS RAMIREZ
Interventor

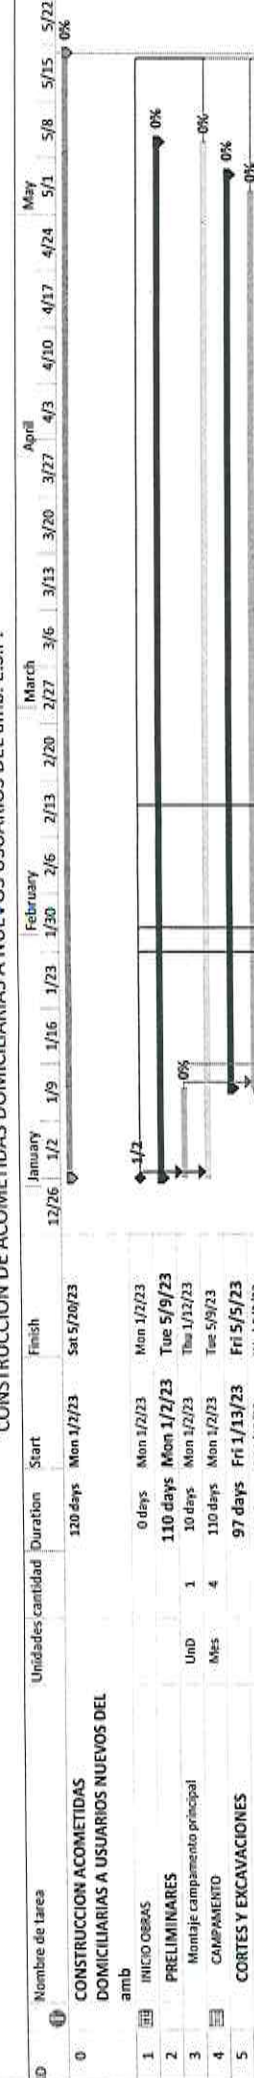

SERGIO JAVIER BLANCO PEREZ
Vo. Bo. Gerente Comercial

Proyecta/Elabora: Edwin Arturo Carrillo Pedraza
 Revisa/Aprueba: Sharis María Arenas Ramírez

Controla: SGC
 01/06/06

CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A NUEVOS USUARIOS DEL amb. E.S.P.

ID	Nombre de tarea	Unidades/cantidad	Duration	Start	Finish
0	CONSTRUCCION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A USUARIOS NUEVOS DEL amb		120 days	Mon 1/2/23	Sat 5/20/23
1	INICIO OBRAS		0 days	Mon 1/2/23	Mon 1/2/23
2	PRELIMINARES		110 days	Mon 1/2/23	Tue 5/9/23
3	Montaje campamento principal	Und	1	Mon 1/2/23	Thu 1/12/23
4	CAMPAMENTO	Mes	4	Mon 1/2/23	Tue 5/9/23
5	CORTES Y EXCAVACIONES		97 days	Fri 1/13/23	Fri 5/5/23
6	CORTE DE PAVIMENTO Y ANDENES CON MAQUI	m-cm	157	Fri 1/13/23	Wed 5/3/23
7	ROTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES CON COMPRESOR DIESEL Y MARTILLO PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS, INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL, ANCHO HASTA 0.40m	Ml	157	Mon 1/16/23	Fri 5/5/23
8	EXCAVACION MANUAL EN ZANIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL	m3	1583	Mon 1/16/23	Fri 5/5/23
9	INSTALACION DE ACOMETIDAS		90 days	Mon 1/30/23	Sat 5/13/23
10	ACOMETIDA DOMICILIARIA COMPLETA L-HASTA 3m EN TUBERIA PEAD PN16 PEBO RDE9 (INCLUYE MATERIALES) NO INCLUYE ACOMETIDA DOMICILIARIA SIN CAJILLA DE SEGURIDAD L-HASTA 3m EN TUBERIA PEAD PN16 PEBO RDE9 (INCLUYE MATERIALES) NO INCLUYE MEDIDOR	UND	657	Mon 1/30/23	Sat 5/13/23
11	CORTE Y DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E-20 CM, CON ACABADO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m2	4.31	Mon 3/27/23	Wed 4/12/23
13	ACOMETIDA DOMICILIARIA COMPLETA CON CAJILLA TIPO APARTAMENTO L-HASTA 3m EN TUBERIA PEAD PN16 PEBO RDE9 (INCLUYE MATERIALES) NO INCLUYE MEDIDOR	UND	9	Wed 3/29/23	Thu 4/20/23
14	TUBERIA PEAD PN16 PEBO RDE9 (INCLUYE MATERIALES)	GL	500	Mon 1/30/23	Sat 5/13/23
15	CONCRETOS Y RESANES		93 days	Thu 2/2/23	Sat 5/20/23
16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y DE PRESTAMO (INCLUYE MATERIAL)	M3	563	Thu 2/2/23	Wed 5/17/23
17	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	59	Thu 2/2/23	Wed 5/17/23
18	RESANE MURO EN MAMPOSTERIA H-10 LAJILLO COCIDO (100X30X20CM)	GL	6	Fri 4/21/23	Fri 4/28/23
19	CONSTRUCCION MURO EN MAMPOSTERIA H-10 LAJILLO COCIDO (100X30X20CM) (INCLUYE MATERIALES)	m2	9	Fri 4/21/23	Fri 4/28/23
20	CONSTRUCCION DE ANDEN O ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI E-10, ACABADO ESCOBILLADO Y RATONADO (INCLUYE MATERIALES)	M2	1846.8	Fri 2/17/23	Sat 5/20/23
21	ENTREGA		0 days	Sat 5/20/23	Sat 5/20/23



CONSORCIO NESCOIP
CONTRATISTA

