

	EPUXUA		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000093

Nit: 901511522-4

jueves, 13 de abril de 2023			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000081	13-abr.-23
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA	CC o NIT	901587366	DV	8
DIRECCION	CL 44C 45 53 IN 2 AP 601	TELEFONO	3016341049		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA			
CHEQUE N	5	VALOR PAGO	448,322,441.00		

DESCRIPCION
SEXTO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 88,37% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100609		CTA 9347 - CTO INTER. No. 3443 INTERVENTORIA	00.00	448,322,441.00			
240101	3.2.4.5.02.09	Bienes y servicios	448,322,441.00	00.00			
SUMAS IGUALES			448,322,441.00	448,322,441.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2023000011	2023000011	3.2.4.5.02.09.007.91119.00 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002- Recursos en Administración	484,672,910.00	

TOTAL PRESUPUESTO			484,672,910.00
Elabor ADRIANA Aprobo:  NOMBRE APROBO EGR CONTADOR	Modifico: Reviso: NOMBRE TESORERO Tesorero	Firma y Sello Beneficiario c.c o Nit	



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO SEXTO CTO 2022-024 CONSORCIO GAMER SOACHA - 88.37 POR CEN	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	45225184		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300309347		
Fecha de Creacion	13/04/2023	Fecha de Pago	13/04/2023 17:46
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 484.672.910,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 484.672.910,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0242029015873668	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 36.350.469,00	Pago Exitoso	
9015873668	0000009015873668	Ahorros	9900345746	DAVIVIENDA	\$ 448.322.441,00	Pago Exitoso	

	EPUXUA		Código: COM-2023000081	
	PROCESO FINANCIERO		Versión 1	
			Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2023000081

Nit: 901511522-4

jueves, 13 de abril de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA	CC o NIT	901587366	DV	8
DIRECCION	CL 44C 45 53 IN 2 AP 601	TEL	3016341049		
DESCRIPCION	SEXTO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 88,37% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243625	Contratos de construcción	00.00	9,693,458.00
79001	Retención	00.00	2,423,365.00
24072203	Fondo de seguridad	00.00	24,233,646.00
29020108	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3443 - 2021	484,672,910.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	448,322,441.00
SUMAS IGUALES		484,672,910.00	484,672,910.00
Documento	Valor a Girar	448,322,441.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000011	2023000011	3.2.4.5.02.09.007.91119.00 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002- Recursos en Administración	484,672,910.00

TOTAL PRESUPUESTO

484,672,910.00


NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

JOHANA
Elaboró

Modificó



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPMUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	COM-2023000081	FECHA	13 de abril de 2023
NUMERO FACTURA	CGS 7	FECHA FACTURA	10 de abril de 2023
NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA		
NIT	901587366-8		
PROVEEDOR	CONSORCIO GAMER SOACHA		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 - CONTRATO DE OBRA 024-2022		
FECHA INICIO			
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA N° 024-2022		
	CDP	RP	

PAGO DE		SEXTO PAGO: CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 88,37% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION			
	CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
	SEXTO PAGO: CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 88,37% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION	1	\$ 372.825.315,00		
			\$ 89.478.076,00		
	A= 24%		\$ 3.728.253,00		
	I= 1%		\$ 18.641.266,00		
	U= 5%			\$ 9.693.458,00	
	RETEFUENTE 2%			\$ 2.423.365,00	
	RETE ICA (5 * 1000) 0,5%			\$ -	
	Estampilla Pro Cultura (1%) 1%			\$ -	
	Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%) 3%			\$ 24.233.646,00	
	Fondo de seguridad- Art 138. Acuerdo 030 5%				
	TOTAL		\$ 484.672.910,00	\$ 36.350.469,00	\$ 448.322.441,00

Nota: La empresa según lo informado
Actividad economica 4290

Contador:

Roger Andres Guiza
Contador

Revisó:

César Torres
Subgerente Administrativa, Financiero y Gestión Humana

Bogotá, 10 de Abril de 2023

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Calle 12 No. 8ª-36
Soacha-Cundinamarca

	CITAR NUMERO DE RADICADO 090839	
	FECHA DE RECEPCIÓN 2023-04-11	
	11:58:34	
	TIPO: EXTERNO	
	REMITENTE: EDGAR EDUARDO URIBE	
CARDENAS	DESTINATARIO: JUAN PABLO CAÑON	

Referencia: Contrato 025 de 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

Asunto: Aprobación Acta parcial N°6 Contrato de Obra 024 de 2022.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la cuenta **Parcial N° 06** con un valor de \$ 484.672.910 equivalente al 10.76% % del valor total del contrato de obra 024 de 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Dando cumplimiento a la circular externa 002 adjunto la siguiente documentación:

- Informe técnico aval de interventoría para cuenta de cobro N° 5 del contratista de obra
- factura o cuenta.
- Acta parcial N° 6 con memorias de Calculo.
- Informe de actividades Contratista de Obra.
- Informe de Supervisión.
- Certificado de Cumplimiento.
- Certificado de Pago de aportes a seguridades Social y parafiscales.
- Formato de Seguimiento.
- Descripción Actividades.

Numero de Folios Acta parcial N°6 : Carpeta 1:14 Folios

Cordialmente,


Edgar Eduardo Uribe Cardenas
Director de Interventoria.
COCOSERING SAS.

CONTRATO 025 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

**EL CAMBIO
AVANZA**




Alcaldía Municipal de Soacha

XUÁ

**INFORME TÉCNICO AVAL DE INTERVENTORIA No. 6 DE LA CUENTA DE CONTRATO
DE OBRA**

PERIODO: 05 DE MARZO DE 2023 AL 08 DE ABRIL DE 2023

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA

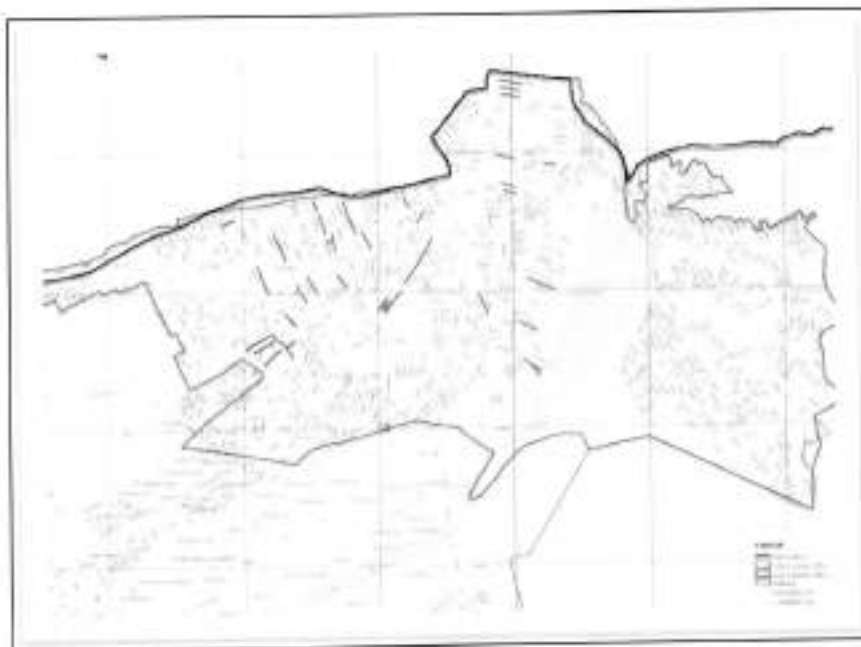

SOACHA- ABRIL 2023.



CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022
COCOSERING SAS.

CONTRATISTA
CONSORCIO GAMER SOACHA
CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

INFORME TÉCNICO AVAL DE INTERVENTORIA No. 6 DE LA CUENTA DE CONTRATO
DE OBRA

PERIODO: 05 DE MARZO DE 2023 AL 08 DE ABRIL DE 2023

Responsables	Nombre	Cargo	Firma
Responsable residente Técnico	Sandra Lorena Cifuentes Fuentes.	Residente Técnico	
Responsable Aprobación Interventoría	Edgar Eduardo Uribe Cárdenas	Director Interventoría	
Responsable Aprobación Epurua	Juan Pablo Cañón	Supervisión Epurua	

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	No de Paginas
01		Versión inicial	
02		Versión corregida	
03			

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
2.1 OBJETIVO GENERAL	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	6
3. ÁREA TÉCNICA	7
3.1 GENERALIDADES	7
3.2 LOCALIZACIÓN SEGMENTO VIAL CONTRACTUAL	8
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	9
3.3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	9
4. DATOS DE LOS CONTRATOS	12
5. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS	14
6. ADMINISTRATIVO	19
6.1 ÁREA ADMINISTRATIVA	19
6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20
6.3 ACTA DE INICIO	20
7. FINANCIERO	21
7.1 PRESUPUESTO CONSORCIO GAMER SOACHA	21
7.2 ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022	26
7.3. ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022.	27
7.4. PAGOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATO DE OBRA	28
8. AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	28
8.1 ACTAS DE COMITÉ	28
8.2 OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS	29
8.3 ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	30
8.4 VÍAS COMUNA 4- BARRIO LUIS CARLOS GALAN II- BARRIO LUIS CARLOS GALAN I Y VILLAS DE CASA LOMA.	30
Actividades de obra:	30
8.5 CRONOGRAMA	32
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO	32
10. CALIDAD DE MATERIALES	35
11. ACCIONES DE EMERGENCIA	35



12.	CONCLUSIONES.....	35
13.	ANEXOS	35

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2	Perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca	8
---------------	--	---

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	Vías a Intervenir	9
Tabla 2	Datos del contratista de obra.....	12
Tabla 3	Datos de la Interventoría	13
Tabla 4	Pólizas Interventoría	14
Tabla 5	Pólizas Contratista	15
Tabla 6	Personal Administrativo Interventoría.....	20
Tabla 7	Personal administrativo CONSORCIO GAMER SOACHA	20
Tabla 8	avance financiero	26
Tabla 10	Actas de comité.....	28
Tabla 11	Correspondencia Enviada	29
Tabla 12	Correspondencia Recibida	29

1. INTRODUCCIÓN

La COMUNA 4 (Cazuca): Se encuentra en el nororiente y es el sector más pobre respecto a equipamientos. Los establecimientos educativos y de salud no cubren las necesidades de sus pobladores es también una de las Comunas del municipio con mayor déficit de infraestructura vial. Razón por la cual la administración municipal dentro del marco de su plan de desarrollo municipal "el CAMBIO AVANZA" incluye el ARTÍCULO 16. PROGRAMA 1.1. MALLA VIAL EFICIENTE Programa tiene como objetivo transformar la infraestructura de Soacha a partir de procesos de articulación, fortalecimiento de vías, facilitación del fluido de transporte masivo y de carga y mejoramiento de movilización de los habitantes dentro y fuera del municipio.

Este informe técnico aval de interventoría No. 6 de la cuenta del contrato de obra, que contiene las actividades correspondientes al desarrollo del contrato de interventoría No. 025 de 2022 suscrito entre LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA y COCOSERING SAS, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021" del 05 DE MARZO DE 2023 AL 08 DE ABRIL DE 2023 de la misma manera contiene las actividades desarrolladas DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA contrato No 024 DE 2022 , EJECUTADAS POR EL CONSORCIO GAMER SOACHA, cuyo objeto es "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA", Que el presupuesto oficial inicial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.

El presente informe de avance es presentado en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe tiene como objeto describir las actividades realizadas por parte de la interventoría en referencia a las actividades de obra desarrolladas por contratista CONSORCIO GAMER SOACHA en el municipio de SOACHA durante el periodo comprendido 05 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023.

. En sus diferentes áreas (TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL), registrando las actividades propias desarrolladas por el Contratista y la Interventoría, junto con las observaciones, recomendaciones y gestiones adelantadas, con el fin de efectuar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.

Cumplir con las exigencias del cliente, respetando la opinión de la comunidad e informando a cabalidad las acciones y ejecuciones concernientes al contrato de obra 024 de 2022. Contestando los derechos de petición solicitados y solucionando los PQR presentados.

Verificar, controlar y revisar que EL CONSORCIO GAMER SOACHA, ejecute las actividades de obra con calidad y respetando a cabalidad las normas establecidas por el Instituto de Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del IVIAS y demás normas que se aplican para la debida ejecución de este proyecto . Asimismo siguiendo los Diseños y estudios entregados por la empresa pública de Soacha EPUXUA y por la Secretaria de Infraestructura de Soacha.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Realizar la entrega de los informes periódicamente y como está establecido en las obligaciones del contrato de interventoría.
- Inspeccionar, asesorar, supervisar, comprobar y evaluar las labores objeto del contrato.
- Exigir al contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales.
- Informar a la empresa pública del municipio de Soacha, Epuxua avanza en forma continua y periódica, sobre el avance, problemas y soluciones presentadas en el desarrollo del contrato.
- Controlar la calidad de los materiales empleados por el contratista.
- Realizar la entrega de los informes periódicamente y como está establecido en las obligaciones del contrato de interventoría.
- Exigir el cumplimiento de las normas técnicas en el desarrollo del contrato de obra.


3. ÁREA TÉCNICA

3.1 GENERALIDADES

El alcance específico del contrato de obra 024 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, busca disminuir el déficit de infraestructura vial existente en la COMUNA 4 - CAZUCA.

En cuanto al contrato de interventoria 025 de 2022 ,tiene como objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021"

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4- Cazuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracoli (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

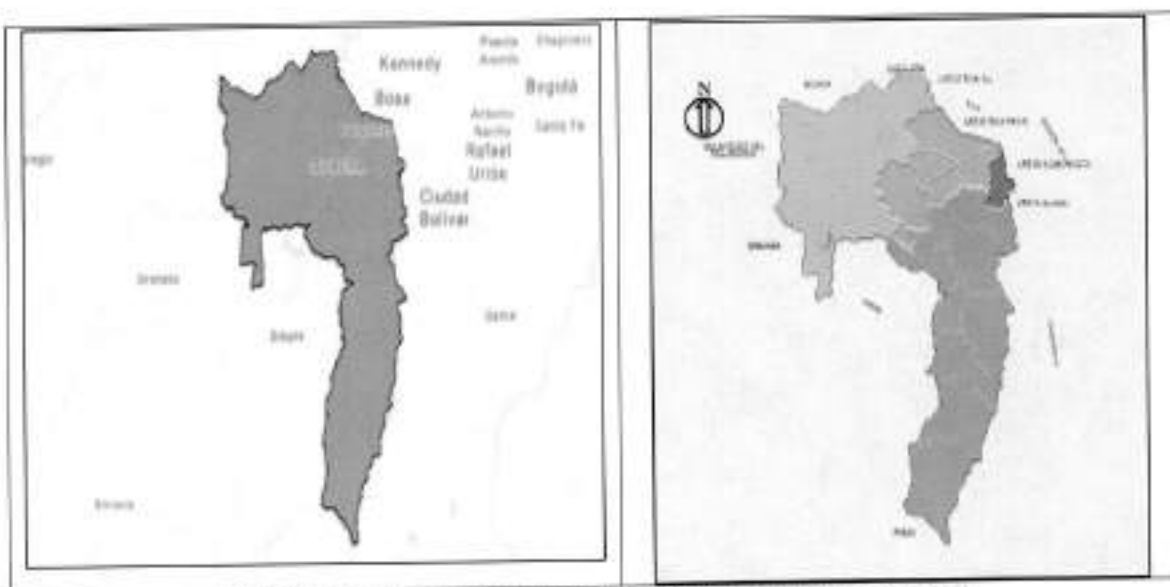

Fuente: <https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d998bc253f>


3.2 LOCALIZACIÓN SEGMENTO VIAL CONTRACTUAL.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

- Calle 48 (Cazucá)
- Transversal 9 este - Carrera 1 (Julio Rincón - Cazucá)
- Avenida Terreros (Calle 38)
- Calles 41 y 42 (El Oasis - Los Robles - Caracoli)
- Transversal 33 Este / Diagonal 40 I (Los Pinos - Rincón del Lago - La Isla)
- Carrera 39 Este.

A continuación se ilustra el perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca Soacha.

Ilustración 1 Perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca

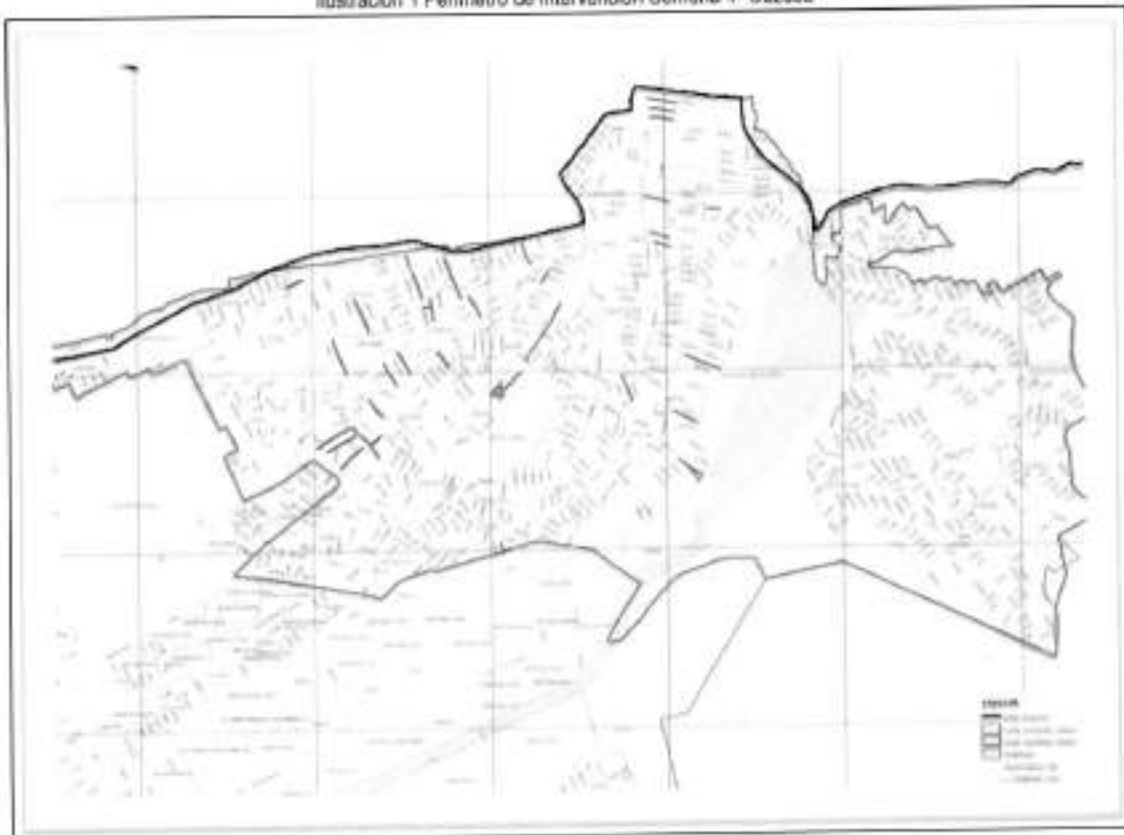

Fuente: Secretaría de Infraestructura

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo este una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- Inventario de vías Comuna 4.

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención:

Tabla 1 Vías a intervenir.

VIAS ENTREGADAS EN SANTO DOMINGO	
1	KRA 32A ESTE CALLE 59 Y CALLE 54
2	KRA 32A ESTE CALLE 54 Y CALLE 53
3	KRA 32A ESTE CALLE 53 Y CALLE 50
4	KRA 32A ESTE CALLE 50 Y CALLE 48
5	KRA 32A ESTE CALLE 48 Y CALLE 44
6	CALLE 53 KRA 32A ESTE Y KRA 32 ESTE
7	KRA 32 ESTE CALLE 53 Y CALLE 54
8	CALLE 50 KRA 32A ESTE Y KRA 31 ESTE
9	CALLE 48 KRA 32A ESTE Y KRA 32 ESTE
10	CALLE 48 KRA 32 ESTE Y KRA 31 ESTE
11	TRANSV 35 ESTE DG 44B Y DG 44A
12	TRANSV 35 ESTE DG 44A Y DG 43J
13	DG 44A TRANSV 35 ESTE Y KRA 37 ESTE
14	KRA 37 ESTE DG 43J Y DG 44A
15	KRA 37 ESTE DG 44A Y DG 44B
16	TRANS 34 ESTE DG 44A Y DG 44B
17	TRANS 34 ESTE DG 44A Y DG 43J
18	DG 44A TRANS 34 ESTE Y KRA 33A ESTE
19	KRA 28 ESTE CALLE 56A Y CALLE 59

20	KRA 32 ESTE CALLE 44 Y CALLE 48
VIAS PARA ASFALTO EN SANTO DOMINGO	
21	KRA 33A ESTE DG 43J Y DG 44A
22	KRA 33A ESTE DG 44A Y TRANSV 34 ESTE
23	KRA 33A ESTE TRANSV 34 ESTE TRANSV 35 ESTE
24	KRA 33A ESTE TRANSV 34 ESTE Y CALLE 59
25	KRA 33 ESTE CALLE 43J Y CALLE 44
26	KRA 33 ESTE CALLE 44 Y CALLE 53
27	KRA 33 ESTE CALLE 53 Y CALLE 59
VIAS ENTREGADAS EN LUIS CARLOS GALAN II	
21	CALLE 48 KRA 30 ESTE Y KRA 31 ESTE
22	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 48
23	KRA 30 ESTE CALLE 48 Y CALLE 53
24	CALLE 53 KRA 30 ESTE Y KRA 29 ESTE
25	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
26	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
27	CALLE 43F KRA 30 ESTE Y KRA 28 ESTE
28	CALLE 43F KRA 28 ESTE Y KRA 27F ESTE
29	CALLE 43F KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
30	CALLE 43F KRA 27D ESTE Y KRA 27B ESTE
31	KRA 28 ESTE CALLE 43F
32	KRA 27F ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
33	KRA 27F ESTE CALLE 43F Y CALLE 43D
34	KRA 27F ESTE CALLE 43D Y CALLE 43C
35	KRA 27F ESTE CALLE 43C Y CALLE 43B
36	CALLE 43C KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
37	CALLE 43D KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
38	KRA 27D ESTE CALLE 43D Y CALLE 43F
39	KRA 27D ESTE CALLE 43F Y CALLE 44
40	KRA 27 ESTE CALLE 43D Y CALLE 43F
41	CALLE 43D KRA 27 ESTE
42	KRA 27D ESTE CALLE 44 Y CALLE 50
43	CALLE 51 KRA 27D ESTE Y KRA 27 ESTE
44	KRA 27 ESTE CALLE 53 Y CALLE 51
VIAS ENTREGADAS EN VILLAS DE CASA LOMA	
40	KRA 17 ESTE CALLE 60A Y CALLE 61
41	KRA 17A ESTE CALLE 60A Y CALLE 61
42	KRA 17B ESTE CALLE 60A Y CALLE 61

VIAS EN LUIS CARLOS GALAN 1

6	CALLE 56B Y KRAS 27 Y 27A ESTE
7	KRA 24B ESTE CALLE 59 Y CALLE 60
8	KRA 26A ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
9	KRA 26B ESTE CALLE 59 Y CALLE 58A
10	KRA 26C ESTE CALLE 58A Y CALLE 57
11	KRA 26C ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
12	KRA 27A ESTE CALLE 56A Y CALLE 57
13	KRA 27A ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
14	KRA 24B ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
15	KRA 26C ESTE CALLE 53 Y CALLE 53A
16	KRA 26C ESTE CALLE 53A Y CALLE 55
17	KRA 26A ESTE CALLE 56B Y CALLE 58
18	KRA 26A ESTE CALLE 58 Y CALLE 59
19	CALLE 56B KRAS 26 ESTE Y 26A ESTE
20	KRA 26 ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
21	CALLE 57 KRAS 26C ESTE Y 26B ESTE
22	CALLE 58 KRAS 26A ESTE Y 26B ESTE
23	KRA 26 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
24	KRA 25 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
25	KRA 25 ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
26	KRA 24 ESTE CALLE 59 Y CALLE 60
27	KRA 24 ESTE CALLE 60 Y CALLE 61
28	KRA 24 ESTE CALLE 59 Y CALLE 58A
29	KRA 24 ESTE CALLE 58A Y CALLE 58
30	KRA 24 ESTE CALLE 58 Y CALLE 57
31	CALLE 56A KRAS 27 ESTE Y 26C ESTE
32	CALLE 56A KRAS 26C ESTE Y 26B ESTE
33	CALLE 56A KRAS 26B ESTE Y 26 ESTE
34	CALLE 53A KRAS 26C ESTE Y 26 ESTE

Fuente: COCOSERIN SAS

4. DATOS DE LOS CONTRATOS

Tabla 2 Datos del contratista de obra

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3443-2021
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
PRORROGA N° 1	01 FEBRERO DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	4 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	\$ 649.376.068
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	\$ 727.213.483
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	\$ 1.003.532.431
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	\$ 451.030.329,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	\$ 666.543.027,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 3.497.695.338
VALOR POR COBRAR	\$ 1.008.872.560,67

Fuente: COCOSERIN SAS

Tabla 3 Datos de la Interventoría

NOMBRE DEL CONTRATISTA	COCOSERING SAS.
NO. CONVENIO	3443-2021
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 900104779-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 79.782.553. de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE MAYO 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N° 1	01 FEBRERO DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$223.888.395) M/CTE
VALOR PAGO N° 1	\$ 32.262.317,00
VALOR PAGO N° 2	\$ 36.135.586,00
VALOR PAGO N° 3	\$ 49.859.945,57
VALOR PAGO N° 4	\$ 22.406.750,57
VALOR PAGO N° 5	\$ 33.113.093,62
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 173.777.692,76
VALOR POR PAGAR	\$ 50.110.702,24

Fuente: COCOSERING SAS



5. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS

Para el periodo del 05 de Marzo de 2023 al 08 de Abril de 2023, se encuentran con las siguientes pólizas del contrato de obra 024 de 2022 y el contrato de interventoría 025 de 2022, aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua.

Tabla 4 Pólizas Contrato Interventoría 025 de 2022.

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008851	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/05/2022	17/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$200.000.000,00	17/05/2022	17/11/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 0 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	\$134.333.037,00	17/05/2022	18/05/2022
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$44.777.679,00	17/05/2022	17/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$22.388.839,50	17/05/2022	17/11/2025
	Estabilidad de la obra.		\$67.166.518,50	17/11/2022	17/05/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 1 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/11/2022	31/01/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$200.000.000,00	17/11/2022	31/01/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 2 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	\$134.333.037,00	05/08/2022	05/08/2022
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$44.777.679,00	01/08/2022	31/07/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		\$22.388.839,50	01/08/2022	31/01/2026
	Estabilidad de la obra		\$67.166.518,50	17/11/2022	31/01/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/06/2023	30/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$200.000.000,00	17/06/2023	30/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	\$134.333.037,00	01/08/2022	17/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$44.777.679,00	01/08/2022	17/12/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$22.388.839,50	01/08/2022	17/06/2026
	Estabilidad de la obra.		\$67.166.518,50	17/11/2022	17/06/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	31/01/2023	30/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$200.000.000,00	31/01/2023	30/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	\$134.333.037,00	01/08/2022	30/06/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$44.777.679,00	01/08/2022	30/12/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$22.388.839,50	01/08/2022	30/06/2026
	Estabilidad de la obra.		\$67.166.518,50	17/11/2022	30/06/2028

Fuente: Cocosering SAS

Tabla 5 Pólizas Contrato de Obra 024 de 2022

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
Coberturas	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Fuente: Coosering SAS

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Coosering SAS



TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101005792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Cocosering SAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Cocosering SAS

6. ADMINISTRATIVO

Mediante este informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, Lo cual se da cabalidad para la entidad contratante que es la alcaldía de Soacha, en el cual el contratista CONSORCIO GAMER SOACHA da exactitud a lo estipulado y la interventoría COCOSERING SAS realiza la inspección diaria al contratista.

6.1 AREA ADMINISTRATIVA

El contrato de interventoría 025 de 2022 fue adjudicado el 17 de mayo de 2022 y tuvo acta de inicio el día 01 de Agosto de 2022 mediante acta de iniciación del proyecto.

6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta la invitación a preseleccionados de OC 013-2022, se relaciona a continuación el personal administrativo del proyecto durante cada mes de ejecución.

Tabla 6 Personal Administrativo Interventoría

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 025 DE 2022 COCOSERING S.A.S.						
NOMBRE			CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	
EDGAR CARDENAS.	EDUARDO URIBE		DIRECTOR INTERVENTORIA	DE 40 %	Interxua0252022@gmail.com	
SANDRA FUENTES.	LORENA CIFUENTES		RESIDENTE INTERVENTORIA	DE 100 %	Interxua0252022@gmail.com	
CARLOS CORTES	REINALDO CONTRERAS		INSPECTOR DE OBRA	100 %	Interxua0252022@gmail.com	
ALBERTO RIVERA			MAESTRO	100 %	Interxua0252022@gmail.com	
GUSTAVO MARTIN			MAESTRO	100 %	Interxua0252022@gmail.com	
Olga Stella Céspedes Soto			PROFESIONAL SISO	100 %	Interxua0252022@gmail.com	

Fuente: Cocoserling SAS

Tabla 7 Personal administrativo CONSORCIO GAMER SOACHA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.						
NOMBRE			CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	
MILTON RINCON.	EDUARDO RIVERA		DIRECTOR DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com	
ILMER ENRIQUE POLO	CARMONA		RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com	
NUBIA RINCON	CONSUELO RIVERA		INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com	
SERGIO DARIO TORRES	RIVERA		INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com	
DEICY LORENA BELLO	RIVERA		PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com	
CATHERINE MUÑOZ	MANCIPE		TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com	

Fuente: Cocoserling SAS

6.3 ACTA DE INICIO

El contrato de interventoría 025 de 2022 fue suscrito en el municipio de Soacha el día 17 de Mayo del 2022 en las instalaciones de la EPUXUA, se reunieron DARLIN LENIS ESPITIA en calidad de gerente y representante la empresa pública del municipio de Soacha, Epuxua avanza; por parte del COCOSERING SAS, identificado con el NIT 900104779-0 el representante legal JOSÉ JOAQUÍN CONTRERAS CORTÉS, con C.C. 79.782.553. de Bogotá y de esta forma iniciar la ejecución del contrato.



De esta forma se inician las obras por parte del municipio de Soacha con el contrato de obra 024 de 2022 y el contrato de interventoría 025 de 2022, teniendo como acta de inicio el día 01 de Agosto de 2022.

7. FINANCIERO

7.1 PRESUPUESTO CONSORCIO GAMER SOACHA

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CAN	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	1	\$ 11 419.00	\$ 11 419.00
2	1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	\$ 18 397.00	\$ 18 397.00
3	1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1	\$ 28 043.00	\$ 28 043.00
4	1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	\$ 46 104.00	\$ 46 104.00
5	1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	\$ 285 090.00	\$ 285 090.00
6	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	\$ 10 110.00	\$ 10 110.00
7	4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	\$ 160 620.00	\$ 160 620.00
8	16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMUN	M3	1	\$ 6 242.00	\$ 6 242.00
9	16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	\$ 33 159.00	\$ 33 159.00
10	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	\$ 54 134.00	\$ 54 134.00
11	16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO	M3	1	\$ 62 173.00	\$ 62 173.00



		DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				
12	16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0	\$ 106 162.00	\$ -
13	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	\$ 23 110.00	\$ 23 110.00
14	16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0	\$ 70 034.00	\$ -
15	16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	\$ 68 748.00	\$ 68 748.00
16	16.1	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0	\$ 169 782.00	\$ -
17	16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	\$ 64 443.00	\$ 64 443.00
18	16.12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	M3	1	\$ 143 715.00	\$ 143 715.00
19	16.13	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	M3	1	\$ 164 131.00	\$ 164 131.00
20	3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1	\$ 89 046.00	\$ 89 046.00
21	2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	1	\$ 12 930.00	\$ 12 930.00
22	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	\$ 173 358.00	\$ 173 358.00



23	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	\$ 60 755.00	\$ 60 755.00
24	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	\$ 10 724.00	\$ 10 724.00
25	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	\$ 37 319.00	\$ 37 319.00
26	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	\$ 9 838.00	\$ 9 838.00
27	220.1	TERRAPLENES	M3	1	\$ 16 634.00	\$ 16 634.00
28	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	1	\$ 14 575.00	\$ 14 575.00
29	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	1	\$ 8 398.00	\$ 8 398.00
30	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	1	\$ 538.00	\$ 538.00
31	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	1	\$ 14 340.00	\$ 14 340.00
32	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	\$ 23 279.00	\$ 23 279.00
33	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	\$ 69 968.00	\$ 69 968.00
34	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5	M3	1	\$ 86 694.00	\$ 86 694.00



		KM)				
35	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	\$ 21 165.00	\$ 21 165.00
36	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	\$ 34 893.00	\$ 34 893.00
37	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	1	\$ 595 230.00	\$ 5 230.00
38	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1	\$ 710 725.00	\$ 710 725.00
39	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1	\$ 7 832.00	\$ 7 832.00
40	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1	\$ 478 443.00	\$ 478 443.00
41	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1	\$ 377 439.00	\$ 377 439.00
42	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	\$ 387 723.00	\$ 387 723.00
43	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	\$ 396 324.00	\$ 396 324.00
44	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	\$ 402 949.00	\$ 402 949.00
45	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	\$ 411 550.00	\$ 411 550.00
46	681.1	GAVIÓN	M3	1	\$ 191 010.00	\$ 91 010.00
47	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	1	\$ 195 311.00	\$ 195 311.00
48	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN	ML	1	\$ 46 667.00	\$ 46 667.00



		CONCRETO CLASE E, 2500 PSI				
49	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	\$ 7 922.00	\$ 7 922.00
50	311.1	AFIRMADO	M3	1	\$ 64 443.00	\$ 64 443.00
51	***	AFIRMADO (EQUIPOS MENORES)	M3	1	\$ 52 770.00	\$ 52 770.00
52	****	AFIRMADO MANUAL	M3	1	\$ 80 625.00	\$ 80 625.00
53	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1	\$ 687 261.00	\$ 687 261.00
54	5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	m2	1	\$ 80 087.00	\$ 80 087.00

Fuente: Coocsering SAS

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Para el presente periodo del 05 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023, se continúan con las mismas actividades no previstas ya aprobadas.

NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1	\$ 3 825.00	\$ 3 825.00
NP 2	MORTERO 1:4	M3	1	\$ 475 586.00	\$ 475 586.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO DE B=20CM, H=35CM (A-80).	UN	1	\$ 72 370.00	\$ 72 370.00
NP4	CONCRETOS CLASE D, F'C =3500 PSI (BASES)	M3	1	\$ 597 667.70	\$ 597 667.70
NP 5	CONCRETOS CLASE D, F'C =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	1	\$ 713 258.00	\$ 713 258.00
NP 6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 E=15 CM	KG	1	\$ 9 986.00	\$ 9 986.00
NP 7	CAJA INSECCION 60*60	UN	1	\$ 285 348.00	\$ 285 348.00
NP 8	REPARACION ACOMETIDA	UN	1	\$ 74 291.00	\$ 74 291.00



NP 9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRETAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3/K	1	\$ 1 444.00	\$ 1 444.00
NP 10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	\$ 250. 235	\$ 250. 235.00
NP 11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1	\$ 759.999	\$ 759.999.00
NP 12	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	1	\$ 33.539	\$ 33.539.00

Fuente: Cocosring SAS

7.2 ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022

Que el presupuesto oficial inicial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO, se resalta que dentro de la minuta del contrato de obra 024 de 2022 el contrato no cuenta con anticipo y/o pago anticipado.

Tabla 8 avance financiero Contrato de Obra

AVANCE FINANCIERO	
Valor total del contrato de Obra	\$ 4.506.567.898,67
Acta pagada No. 1	\$ 649.376.068
Acta pagada No. 2	\$ 727.213.483
Acta pagada No. 3	\$ 1.003.532.431
Acta Pagada No.4	\$451.030.329,00
Acta Pagada No.5	\$ 666.543.027,00



Valor total Pagado	\$ 3.497.695.338
Saldo Actual	\$ 1.008.872.560,67
Valor a cobrar acta 6	\$ 484.672.910

Fuente: Coosering SAS

7.3. ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022.

Que el presupuesto oficial inicial destinado para el presente proceso de contratación de Interventoría corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$223.888.395).

Tabla 9 avance financiero Contrato de Interventoría 024 de 2022.

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor total del contrato de Interventoría	\$ 223.888.395
Acta pagada No. 1	\$ 32.262.317,00
Acta pagada No. 2	\$ 36.135.586,00
Acta pagada No. 3	\$ 49.859.945,57
Acta pagada No. 4	\$ 22.406.750,57
Acta pagada No. 5	\$ 33.113.093,62
Valor total Pagado	\$ 173.777.692,76
Saldo Actual	\$ 50.110.702,24

Fuente: Coosering SAS

7.4. PAGOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATO DE OBRA

Al presente periodo se ha registrado el pago N° 1, 2,3,4 y pago N° 5 para el contrato de interventoria y para el Contrato de obra.

8. AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONSORCIO GAMER SOACHA.

El contratista encargado del Contrato No. 024 de 2022 a cargo de CONSORCIO GAMER SOACHA presenta a la fecha la terminación de Cintas en concreto en las cuadras:

CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 59-61, CRA 26 CALLE 59-61, CRA 25 CALLE 59-61, CRA 24B ENTRE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58, CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-57, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 50 ENTRE 17-21D.

8.1 ACTAS DE COMITÉ

En el periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023. Se realizó las siguientes actas de comité ver en el Anexo actas de Comité de Obra.

Tabla 9 Actas de comité

COMITÉ N.	FECHA
24	13/03/2023
25	12/03/2023
26	30/03/2023

Fuente: Cocosering SAS



8.2 OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

A La fecha la interventoría ha realizado los siguientes oficios para EPUXUA y al contratista de obra CONSORCIO GAMER SOACHA con contrato de obra 024 de 2022 en el cual se han enviado respuestas a la interventoría COCOSERING SAS en el periodo comprendido entre 05 de marzo de 2023 y 08 de abril de 2023.

Tabla 10 Correspondencia Enviada

No CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	16-03-2023	EPUXUA- CONSORCIO GAMER SOACHA	TOPOGRAFIA CRA 27F ENTRE CLL 43F
CORREO ELECTRONICO	16-03-2023	EPUXUA- CONSORCIO GAMER SOACHA	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE VÍAS PROYECTADAS PARA ADICIÓN.
CORREO ELECTRONICO	30-03-2023	EPUXUA-	SOLICITUD DE ADICIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022

Fuente: Cocoserling SAS

Tabla 11 Correspondencia Recibida
CONTRATO INT. N° 025 2022

No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CORREO ELECTRONICO	13- 03- 2022	COCOSERING SAS	ENTREGA DEL REFERENCIA. ARO TAPA PARA POZO D. 1.20.	CONSORCIO GAMER SOACHA-EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	13- 03- 2022	COCOSERING SAS	SOPORTES DE PAGO	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	14- 03- 2022	COCOSERING SAS	ACTAS DE REUNIÓN 03 Y 13 DE MARZO 2023	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	21- 03- 2022	COCOSERING SAS	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTRATO 3443-2021.	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	27- 03- 2022	COCOSERING SAS	REUNION AJUSTE DE PRECIOS CTO 3443-2021	EPUXUA
	28- 03- 2022		RESPUESTA	



CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CORREO ELECTRONICO		COCOSERING SAS	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE VÍAS PROYECTADAS PARA ADICIÓN	CONSORCIO GAMER SOACHA
CORREO ELECTRONICO	04- 04- 2022	COCOSERING SAS	ENTREGA DE DISEÑO ESCALERAS COMUNALES CRA 27 F CON CALLE 43D	EPUXUA

Fuente: Cocoserling SAS

8.3 ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS

Durante este periodo no se entregaron topografía de vías. La topografía ha sido tomada por el contratista de Obra.

8.4 VÍAS COMUNA 4- BARRIO LUIS CARLOS GALAN II- BARRIO LUIS CARLOS GALAN I Y VILLAS DE CASA LOMA.

Actividades de obra:

- Excavación manual en las vías: CRA 26B ESTE ENTRE 56-61, CRA 26A ENTRE 59-61, CRA 26 ESTE ENTRE 59-61, CRA 25 ESTE ENTRE 59-61, CRA 24 B ESTE ENTRE 59-61, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 58, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 58-59, CRA 26A ENTRE 57-59, CRA 26A ENTRE 58, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 43D CON CRA 27, CALLE 53 A CRA 26-26C, CRA 55 ENTRE 26C 27, CALLE 55 CRA 26-26C, CALLE 56A CRA 27-26, CRA 26C ENTRE 53-56 A, CALLE 43C ENTRE 27F 27D, CALLE 43 DE ENTRE 27F -27D, CALLE 43D ENTRE 27 ESTE, CRA 27 DE ENTRE 43F Y 44,
- Se realizó reparación de cunetas en las siguientes vías: CRA 53A ENTRE 26C -26, CALLE 55 ENTRE 26C 26, CALLE 55 ENTRE 26C-27, CALLE 56A ENTRE 26-27, CRA 26 C ENTRE 55-56 A, CRA 26 C ENTRE 55-56 A, CALLE 26C ENTRE 53-55, CRA 26 B ENTRE 57-59, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 57-58.




- Se realizó fundida de cunetas en las siguientes vías: CRA 26B ESTE ENTRE 59-61, CRA 26 A ENTRE 59-61, CRA 26 ESTE ENTRE 59 -61, CRA 25 CALLE 59-61, CRA 24B ENTRE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58, CRA 26 A ENTRE 57-59, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 57-59, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 57-58, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 43D CON CRA 27, CALLE 50 ENTRE 17-21D.
- Reparación de acometidas en las vías: CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON 59-61, CALLE 26 ESTE CON 59-61, CRA 25 CALLE 59-61, CRA 24 B CALLE 59-61, CRA 25 BIS CALLE 57-59, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 43D CON CRA 27,
- Instalación de Sub base granular por re nivelación: CRA 26B ESTE ENTRE 56-61, CRA 26 A ENTRE 59-61, CRA 26 ESTE ENTRE 56-61, CRA 25 CALLE 59-61, CRA 24B CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58 -59, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 56 a-59, CALLE 56A ENTRE 26-27, CALLE 24 B ESTE CON CALLE 57-58, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CRA 27 ENTRE 50-51, CRA 27D ENTRE 51-44, CALLE 49 ENTRE 17B 19, CRA 19 ENTRE 49-50, CALLE 43D CON CRA 27, CALLE 27 E CON 43 D, CALLE 50 ENTRE 17-21D. Estas re nivelaciones se presentaron por las lluvias del mes de diciembre que afectaron la subbase ya instalada.
- Instalación de Sub base granular: BASE GRANULAR CRA 9,
- Se realizó fundida de cintas de 60 cms en las siguientes vías: CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 59-61, CRA 26 CALLE 59-61, CRA 25 CALLE 59-61, CRA 24B ENTRE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58, CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-57, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 50 ENTRE 17-21D.
- Concreto ciclópeo: CALLE 26A ESTE CON CALLE 58.
- Instalación de bordillo: CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26 ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 25 ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-61, CALLE 26A ESTE CON CALLE 58 -59, CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-57, CRA 26C CON CALLE 53ª, CALLE 53A ENTRE 26-26C, CRA 27 ENTRE CLL 53-51, CRA 51 ENTRE 27D 27, CALLE 43D CON CRA 27, CALLE 43C ENTRE 27F -27D, CALLE 43 ENTRE 27F 27D, CALLE 43DE ENTRE 27 ESTE, CRA 27 D ENTRE 43F -44, CRA 27 F ENTRE 43 -44,
- Se realizó en transporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha.

8.5 CRONOGRAMA.

Se han realizado las intervenciones de las vías que ha venido entregando la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se especifica que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras requeridas en la Comuna 4 y ordenadas por la entidad. A la fecha se cuenta con un Cronograma por Barrios presentado por el contratista de Obra, el cual se evidencia dentro de los anexos del presente Informe.


9. REGISTRO FOTOGRAFICO

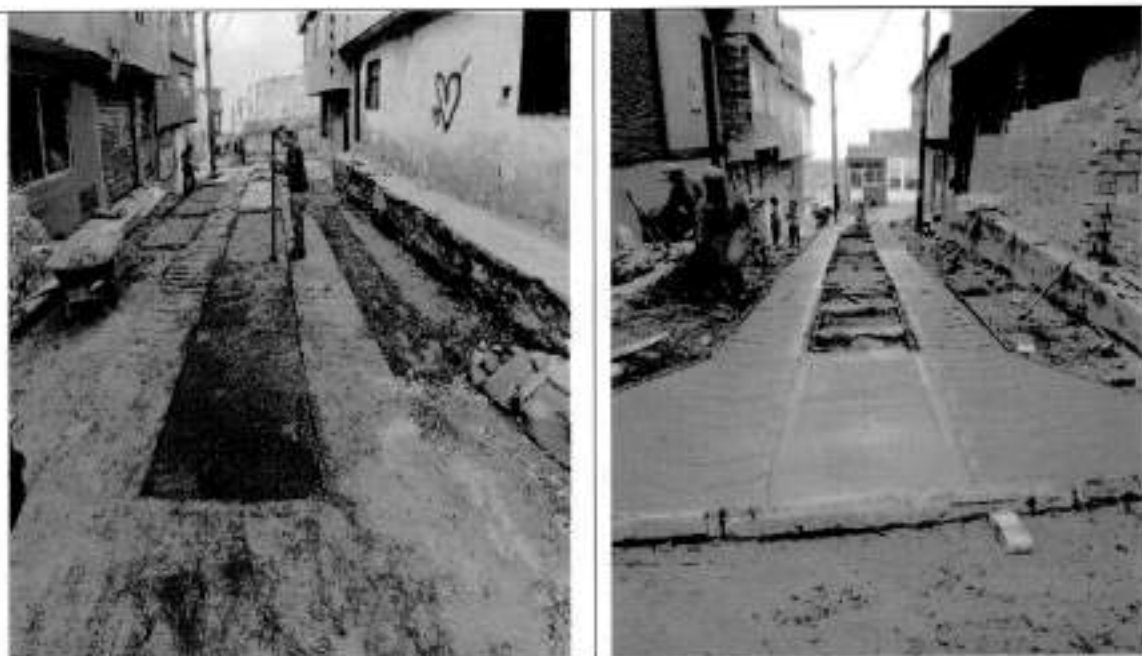

FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61 y CRA26 ESTE CLL 59



FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO CRA 25B ESTE CLL 59 y Cra 27 este cl 53

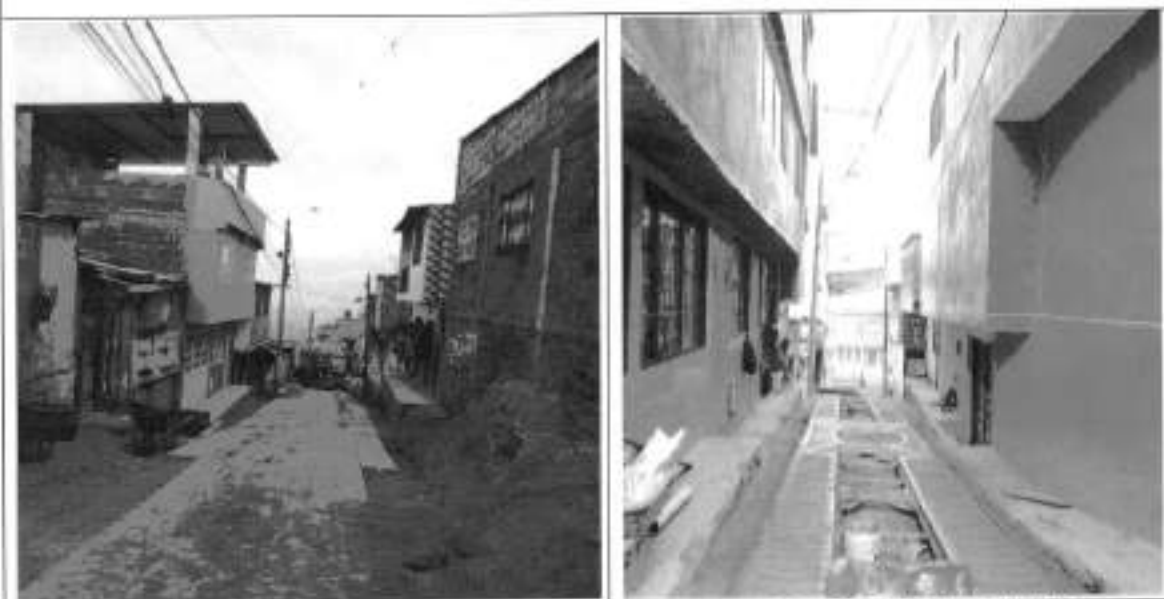

FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO CRA 24B ESTE CLL 59 Y CRA25 ESTE CLL 59



25.



10. CALIDAD DE MATERIALES

El contratista hace entrega de los certificados de calidad y Laboratorios realizados a los materiales de Sub base, Concretos de 3000 psi, Aceros, Bordillo prefabricado, Adoquín. Estos certificados se pueden observar en el Anexo Certificados de Calidad de Materiales.

11. ACCIONES DE EMERGENCIA

En el presente periodo que comprende del 05 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023, NO se presentaron acciones de emergencia.

12. CONCLUSIONES

- Se realiza el seguimiento a cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Se requiere de una topografía constante tanto de la entidad como del contratista de obra, ya que se evidencian constantes cambios de terreno.
- Se le solicita al Contratista de obra el aseo constante en los frentes de trabajo.

13. ANEXOS

- Informe Social.
- Pagos de parafiscales.
- Informes semanales.
- Actas de Comité Técnico.



INFORME SOCIAL.

CONTRATO 025 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

EL CAMBIO
AVANZA



GESTION SOCIAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORIA/INTERVENTORIA 025-2022



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.-
COCOSERING S.A.S



5 de marzo al 8 Abril 2023

1. CUADRO DE ASPECTOS CONTRACTUALES: Información general del Contrato

NOMBRE DEL CONTRATISTA	COCOSERING SAS.
No CONVENIO	3443-2021
No. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 900104779-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 79.782.553. de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE MAYO 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$223.888.395) M/CTE

Fuente: COCOSERING SAS



NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA
No.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3443-2021
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTO N EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica



2 REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de Revisión: 0	
Responsable por elaboración: RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA	 Nombre: T.S. Olga Stella Céspedes Soto
Responsable por Revisión: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nombre: Edgar Eduardo Uribe Cárdenas
Responsable Aprobación Epuxua	Nombre: Juan Pablo Cañón

TABLA DE CONTENIDO

3. INTRODUCCIÓN	6
4. OBJETIVOS DE GESTIÓN SOCIAL.....	6
4.1 OBJETIVO GENERAL	6
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
5. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL.....	7
5.1 Componente Identificación Territorial.....	10
5.2 Componente de Comunicación, información y acompañamiento social.....	10
5.3 Componente de Mano de obra no calificada.....	11
5.4 Componente de Seguimiento y Evaluación.....	11
CONCLUSIONES	

1. INTRODUCCIÓN

El Contrato de Consultoría Interventoría 025-2022 cuyo objeto es * INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA FINANCIERA, CONTABLE SOCIAL y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDIAMARCA, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE- DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 presenta en este informe de manera consolidada las actividades, procedimientos y acciones realizadas para asegurar controlar, y vigilar el cumplimiento y desarrollo idóneo del contrato 024 2022 en el ámbito de Gestión Social, de acuerdo a lo establecido contractualmente.

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN SOCIAL

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las labores de la Interventoría Social realizadas durante el periodo 5 marzo al 8 de abril 2023, con el fin de verificar y garantizar que los procesos desarrollados por el Contratista, se hayan realizado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y documento de caracterización =C 011-2022

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar que a través del seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación realizada por la Interventoría, la labor desarrollada por el Contratista, en la ejecución de las actividades sociales se ajustaron a los requerimientos contractuales.
- Informar al el alcance y las dificultades que surgieron en el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social que ejecuto el Contratista.

3. PROGRAMAS PLAN DE GESTION SOCIAL

3.1 Componente Identidad Territorial

El área de intervención se encuentra localizada en la Comuna 4 del Casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca "Cazuca".

"Es la cuarta de las 6 comunas del casco urbano de este municipio, localizado al extremo oriente de la ciudad de Bogotá. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazuca del que comparte su territorio con la UPZ 69 Ismael Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar Tiene 72.800 habitantes.

Gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá). Depende únicamente del transporte urbano de Soacha, así como de las rutas del sur de Bogotá en el límite oriental (SITP Ruta SITP 10 - 10 Cazuca - Portal Sur) y se espera la construcción del sistema de transporte de cable aéreo conocido como Cazucable, que uniría esta comuna y el barrio Quintanares de su vecina, la Comuna 5 de San Mateo, finalizando en la estación Transmilenio de Terreros." 1

Límites:



Suroeste: Corregimiento 1
 (Vereda Panamá)

Sur: Corregimiento 1
 (Vereda Panamá)

Sureste: Localidad de Ciudad
 Bolívar
 Bogotá, D.C.
 (Vereda Quiba Baja)

"Cazuca es una zona de extrema vulnerabilidad social, es una zona de mezcla de Pobreza, desempleo, desplazamiento forzado, violencia. Pandillas, degradación ambiental, informalidad urbana. Es una de las Comunas del municipio con mayor déficit de infraestructura vial. Razón por la cual la administración municipal dentro del marco de su plan de desarrollo municipal "el CAMBIO AVANZA" incluyó el programa MALLA VIAL EFICIENTE. Programa tiene como objetivo transformar la infraestructura de Soacha a partir de procesos de articulación y fortalecimiento de vías, facilitación del flujo de transporte masivo y de carga y mejoramiento de movilización de los habitantes dentro y fuera del municipio y así mejorar la calidad de vida a la población de este sector. Las vías de esta comuna son:

Barrio Villa Mercedes	CRA 21B ENTRE CLL 48 Y CLL 50	86.4 ML
	CLL 48B ENTRE CRA 19 Y CRA 21A	60 ML
	CRA 18 ENTRE CLL 48C Y CLL 49	
	CRA 24 ENTRE CLL 49 Y CLL 50	
	CLL 48C ENTRE CRA 17B Y CRA 17C	40 ML
	CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 48	132 ML
Loma Linda	CRA 22B ENTRE CLL 50 Y CLL 54	61 ML
	CRA 23 ENTRE CLL 50 Y CLL 54	76.3 ML
	CLL 49 ENTRE CRA 19 Y CRA 17B	130 ML
	CLL 50 ENTRE CRA 19 Y CRA 17B	71 ML
	CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 50	29 ML
Carlos Pizarro	CRA21A ENTRE CLL 54 Y CLL58A	177 ML
Casa Loma	CLL 59D ENTRE CRA 21A Y CLL 60	80.65 ML
Luis Carlos Galán I	CRA 24B ENTRE CLL 59 Y CLL 60	63.5 ML
	CRA 24B ENTRE CLL 59 Y CLL 57	78.3 ML
	CRA 26 ENTRE CLL 59 Y CLL 56B	135.6 ML
	CRA 26 C ENTRE CLL 53 Y CLL 55	88.6 ML
Luis Carlos Galán II	CLL 43F ENTRE CRA 30Y CRA 27B	222.2 ML



	CLL 48 CON CRA 31 Y 31A	58.20 ML
	CLL 43 FD/CRA 27	82.30 ML
Villa Mercedes II	CRA 25 ENTRE CLL 57 Y CLL 58	75.5 ML
	CLL 56 B ENTRE CRA 24A Y CRA 25	24.5 ML
Minuto de Dios	CRA 22B ENTRE CLL59 Y CLL 56A	
El progreso	CRA 26B ENTRE CLL 38 Y CLL 40	78.6 ML
	CRA 30 ENTRE CLL 40A Y CLL 41	148.62 ML
	CRA 28 ENTRE CLL 40A Y CLL 41	123.6 ML
Villa Sandra	CLL 43 ENTRE CRA 19 Y RESERVA FORESTAL	45 ML
El Oasis	CRA 35 ENTRE CLL 42	
	CRA 36 ENTRE CLL 42 Y CLL 42A	61.2 ML
	CRA 39 ENTRE CLL 40J	49.2 ML
	CRA 39 ENTRE CLL 42 Y CLL 42A	112.1 ML
Los Robles	CRA 48 ENTRE CLL 41 Y CLL 42	
	CRA 47 ENTRE CLL 41 Y CLL 42	
	CRA 49 ENTRE CLL 41 Y CLL 42	107.50 ML
Altos del Pino	TRASV 28 CON CLL 42A	
Santo Domingo	CRA 32A CON CLL 53	
	TRASV 34A DG 43J Y CRR 33B.	
	CLL 48 CON 32A ESTE Y 31 ESTE	
	DIAGONAL 44A TRASV 34 ESTE.	
	CRA 33B ESTE DG 43J Y DG 44A.	
	CLL 50 CRA 31 ESTE Y 32A ESTE.	
	CRA 32A ESTE CALLE 50 Y CALLE 44.	
	CLL 53 CRA 30E Y 33E.	
	TRASV 35 ESTE DG 44B Y DG 43J.	
	DG 44A TV ESTE Y CRR 27 ESTE.	
	CLL 54 ESTE CRA 32A Y 32.	
	CRR 32 Y CLL 54 Y 53.	
	CRR 28 ESTE CLL 59- 56A.	

Fuente: COCOSERIN SAS

Ubicación:



3.1. Recorridos de obra

Durante este periodo, la interventoría Social realizo acompañamiento al contrato GAMER 024, en la entrega a la JAC barrio Santo Domingo Soacha y JAC Santo Domingo 2° sector (Ciudad Bolívar) de la vía ubicada en la Dg 44ª con cra 37 (Vía cerrada) paralela al parque Santo Domingo. Dicha vía había sido prestada al contratista para entrada de volqueta con material de construcción a utilizar en las vías que se intervinieron en el barrio Santo Domingo (Soacha). Ambas JAC la recibieron a satisfacción ya que el contratista mejoro las condiciones en que la recibió.

Anexo 1: Acta de Registro de Condiciones Físicas de Espacio Público y Registro fotográfico



3.2. Componente Mano de obra en la zona

La interventoría durante el presente periodo verifico el cumplimiento por parte del contratista de contratar mano de obra no calificada de la zona donde se interviene El contrato. Para este periodo la contratación de MONC fue de veinte (20) personas, residentes en el Área de Influencia del Contrato, cinco (5) oficiales, tres operarios y tres (3) conductores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría cumplió con las obligaciones contractuales mediante el seguimiento evaluación y control de las actividades realizadas por el contratista en cada uno de los programas del componente de gestión social de acuerdo al pliego de condiciones logrando que el Contratista cumpliera con el objeto y demás obligaciones del Contrato.

La interventoría social insiste en que se apruebe lo antes posible la contratación de la profesional social del contratista, ya que se deben levantar Actas de vecindad de los nuevos frentes entregados al contratista para intervenir, igualmente hay varias actividades del componente social por realizar, gestión que debe realizar el componente social del contratista.



ANEXO 1

**Acta de Condiciones Físicas de Espacio Público y de Registro
fotográfico**

ALL-STAR NATIONAL LEAGUE





Pagos de parafiscales

**CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES**

Bogotá, abril 10 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8**; y yo **ADRIANA BONILLA** en mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **diez (10)** días del mes de **abril** de 2023.



MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal



ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora



CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
Certificación Decreto 1070 de 2013, Clasificación de Personas Naturales

Soacha, 10 de abril de 2023

Señores

Yo MILTON EDUARDO RIVERA RINCON, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 79.205.702, expedida en Soacha, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 1 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por dicho periodo fiscal: SI (x) NO ()

Mis ingresos en el año inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos en dicho periodo fiscal: SI () NO (x)

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior: SI (x) NO ()

Mi patrimonio bruto en el último día del año gravable 2021 excedía de 4.500 UVT (\$ 163.386.000). SI (x) NO ()

Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI () NO (x)

Mis consumos mediante tarjeta de crédito excedieron de 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI (x) NO ()

El valor total de mis compras y consumos supero las 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedió de 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

Que en la ejecución del presente contrato no he subcontratado 2 o más trabajadores. SI (x) NO ()



Nombre: MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
CC. 79.205.702 de Soacha

Informes semanales

FORMATO Informe semanal																																					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																			
SUTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0																																			
EPURUA AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecutiva de Proyectos																																					
SEMANA N° <u>02</u> DEL <u>6/03/2023</u> AL <u>11/03/2023</u>																																					
CONTRATO N° <u>024 DE 2022</u>																																					
1. ANTECEDENTES																																					
OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"																																					
<small>Resolución de la Junta de Vigilancia de la Construcción</small>																																					
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO <u>CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022</u>																																					
CONTRATISTA <u>CONSORCIO CAMER ECUACHA</u>		NIT <u>981.581.386-2</u>																																			
<small>Entidad de derecho público que presta servicios de ingeniería y arquitectura</small>		<small>Entidad de derecho público que presta servicios de ingeniería y arquitectura</small>																																			
INTERVENTOR <u>COOPERATIVA S.A.S</u>		NIT <u>880.104.779-0</u>																																			
<small>Entidad de derecho público que presta servicios de ingeniería y arquitectura</small>		<small>Entidad de derecho público que presta servicios de ingeniería y arquitectura</small>																																			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DU																																					
<small>Resolución de la Junta de Vigilancia de la Construcción</small>																																					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO																																			
1 DE AGOSTO DE 2022		31 DE MAYO DE 2023																																			
Contrato de Obra		Contrato de Interventoría																																			
Valor Inicial <u>4505567898.87</u> Valor Actualizado <u>2505567898.87</u> No. empleos Directos generados <u>34</u> No. empleos Indirectos generados <u> </u>		Valor Inicial <u>223888395</u> Valor Actualizado <u>223888395</u> No. empleos Directos generados <u>6</u> No. empleos Indirectos generados <u> </u>																																			
2. PERSONAL DESAMPENANDO LABORES EN OBRA																																					
PERSONAL CONTRATO DE OBRA		PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Director de Obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Residente de Obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Topógrafo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Profesional Sgo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Inspección</td><td>3</td></tr> <tr><td>Oficina</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ayudantes</td><td>10</td></tr> <tr><td>Cocineros</td><td>2</td></tr> <tr><td>Coleccioneros</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		PERSONAL	CANTIDAD	Director de Obra	1	Residente de Obra	1	Topógrafo	1	Profesional Sgo	1	Inspección	3	Oficina	3	Ayudantes	10	Cocineros	2	Coleccioneros	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Director de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Residente de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Inspector de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Maestro</td><td>2</td></tr> <tr><td>Profesional social</td><td>1</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		PERSONAL	CANTIDAD	Director de Interventoría	1	Residente de Interventoría	1	Inspector de Interventoría	1	Maestro	2	Profesional social	1	Otros	0
PERSONAL	CANTIDAD																																				
Director de Obra	1																																				
Residente de Obra	1																																				
Topógrafo	1																																				
Profesional Sgo	1																																				
Inspección	3																																				
Oficina	3																																				
Ayudantes	10																																				
Cocineros	2																																				
Coleccioneros	3																																				
PERSONAL	CANTIDAD																																				
Director de Interventoría	1																																				
Residente de Interventoría	1																																				
Inspector de Interventoría	1																																				
Maestro	2																																				
Profesional social	1																																				
Otros	0																																				
3. ESTADO DEL CLIMA																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6/03/2023</td><td>0h Solado</td></tr> <tr><td>7/03/2023</td><td>0h Solado</td></tr> <tr><td>8/03/2023</td><td>0h Lluvioso</td></tr> <tr><td>9/03/2023</td><td>0h Solado</td></tr> <tr><td>10/03/2023</td><td>0h Lluvioso</td></tr> <tr><td>11/03/2023</td><td>0h Lluvioso</td></tr> </tbody> </table>				FECHA	DESCRIPCIÓN	6/03/2023	0h Solado	7/03/2023	0h Solado	8/03/2023	0h Lluvioso	9/03/2023	0h Solado	10/03/2023	0h Lluvioso	11/03/2023	0h Lluvioso																				
FECHA	DESCRIPCIÓN																																				
6/03/2023	0h Solado																																				
7/03/2023	0h Solado																																				
8/03/2023	0h Lluvioso																																				
9/03/2023	0h Solado																																				
10/03/2023	0h Lluvioso																																				
11/03/2023	0h Lluvioso																																				
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 02																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBREROS CON EL DISEÑO DE PROYECCIÓN</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM</td></tr> <tr><td>BASE GRANULAR (BOMBA) 100</td></tr> <tr><td>INVESTIGACIÓN DE POCOS</td></tr> <tr><td>REPARACIÓN A CORRIENTE EN MANGUERA 1/2"</td></tr> <tr><td>CONCRETOS 3000 PSI BARES 14.11 LAS (BOSTRAS)</td></tr> <tr><td>INSTALACIÓN DE ACCIÓN PLACA HUELLAS</td></tr> <tr><td>SUMINISTRO-INSTALACIÓN DE ACCIÓN NO INCLUYE MORTERO (BARES DE ACCIÓN)</td></tr> <tr><td>CURAT FUNDIDA IN SITU</td></tr> <tr><td>INSTALACIÓN DE ACCIÓN</td></tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBREROS CON EL DISEÑO DE PROYECCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM	BASE GRANULAR (BOMBA) 100	INVESTIGACIÓN DE POCOS	REPARACIÓN A CORRIENTE EN MANGUERA 1/2"	CONCRETOS 3000 PSI BARES 14.11 LAS (BOSTRAS)	INSTALACIÓN DE ACCIÓN PLACA HUELLAS	SUMINISTRO-INSTALACIÓN DE ACCIÓN NO INCLUYE MORTERO (BARES DE ACCIÓN)	CURAT FUNDIDA IN SITU	INSTALACIÓN DE ACCIÓN																						
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD																																					
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBREROS CON EL DISEÑO DE PROYECCIÓN																																					
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM																																					
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H-2.8 INCLUYE RETIRO DE SOBREPES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM																																					
BASE GRANULAR (BOMBA) 100																																					
INVESTIGACIÓN DE POCOS																																					
REPARACIÓN A CORRIENTE EN MANGUERA 1/2"																																					
CONCRETOS 3000 PSI BARES 14.11 LAS (BOSTRAS)																																					
INSTALACIÓN DE ACCIÓN PLACA HUELLAS																																					
SUMINISTRO-INSTALACIÓN DE ACCIÓN NO INCLUYE MORTERO (BARES DE ACCIÓN)																																					
CURAT FUNDIDA IN SITU																																					
INSTALACIÓN DE ACCIÓN																																					

FORMATO			
Informe mensual			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUSTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	
EPXUA AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos			
SEMANA N.º	DEL	AL	
32	09/03/2023	11/03/2023	
CONTRATO No.	826 DE 2022		
B. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA			
UNIDAD DEL CONTRATO		VALOR MONEDAS	
VALOR MONEDAS		VALOR TOTAL ACTUAL	
1.036.000.000,00		1.036.000.000,00	
C. PRECIOS NO PREVISTOS			
N/A			
D. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA			
<p>1. El día 06/03/2023. Se inicia actividades a las siete de la mañana se continúa con excavación Manual y a Máquina en la calle 48 con Carrera 17 B se realiza reparación de acometida en la 25, 48 y 45 se continúa con la fundición de cinta de concreto de 60 cm de ancho reforzadas con malla electrosoldada se realizan Muestras para confinamiento de Cuanta, se revisa la fundición de cintas de confinamiento en la carrera 26 B con calle 60 cada 3 m con un espesor de 0.15 cm.</p> <p>3. El día 07/03/2023. A las siete de la mañana se continúa con excavación manual y a máquina en la calle 48 con carrera 17 B se empieza con nivelación de su base en la carrera 26 B con calle 59 para garantizar el nivel de marbillo para la instalación de adoquines se realiza nivelación de piso en la abscisa 15 y 55, se continúa con la fundición de cintas de confinamiento en la Carrera 26 B con calle 60, se presentan daños en las cintas por día es al día anterior se les presenta merca se procede a su reparación se solicita la ayuda de la comunidad para evitar el tránsito de vehículos en esta calle.</p> <p>4. El día 08/03/2023. A las siete de la mañana se continúa con excavación Manual y a máquina en la calle 48 con carrera 17 B, se inicia con la nivelación y compactación de la subbase en toda la longitud ya excavada. En la carrera 24 B con calle 58 se realiza entrega de material para mampara e instalación de adoquín inicio con la excavación de su base para fundición de concretos armados. Se presentan lluvias en el frente de Obra a las 12 P.M. hasta las 2.30 se inicia con nivelación y compactación de sub base en la carrera 25 con calle 58.</p> <p>5. El día 09/03/2023. Se inician actividades a las siete de la mañana, se continúa con la excavación manual y a máquina en la calle 48 con carrera 17 B se continúa con la nivelación y compactación restante, se procede a nivelar el material para iniciar con la nivelación y compactación de sub base. En la Carrera 25 con calle 58 se inicia con la fundición de cintas de concreto cada 3 m. En la Carrera 26 B con calle 60 se continúa con la profundidad de carreras de concreto de 40 cm de ancho. Se realiza nivelación de subbase en la carrera 27 con calle 53 ya que esta fue afectada por la lluvia.</p> <p>6. El día 10/03/2023. Se inician actividades a las siete de la mañana, se termina la excavación en la calle 48 con carrera 17 B, se procede a la nivelación y compactación en la sub base y se sube sub base para iniciar con la nivelación y compactación de la misma. Se termina la fundición de cuantas en la Carrera 26 B con calle 60 y en la carrera 25 con calle 59 se completa la fundición de cintas de concreto y se realiza nivelación de subbase en la calle 61 con carrera 27 ya que esta fue afectada por las lluvias.</p> <p>8. El día 11/03/2023. A las siete de la mañana se continúa con la nivelación y compactación de sub base en la calle 48 con carrera 17 B, se realiza Excavación Manual en la calle 56 con carrera 17 C, en la Carrera 25 con calle 59 se inicia la nivelación de sub base para la instalación de adoquín, se realizará nivelación de pisos en las abscisa 16 y 48 se inicia con la fundición de cintas de confinamiento en la carrera 26 con calle 60.</p>			
E. RECOMENDACIONES Y OTROS			
<p>1. Se solicita al contratista no trabajar con la subbase expuesta por las lluvias presentadas.</p> <p>2. Se le solicita al contratista realizar la instalación de la arena para los patios adoquín.</p> <p>3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades es obvio por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.</p>			
F. REGISTRO FOTOGRAFICO			
Luchita cuenta tra carrera 26 B con calle 60 (Foto 1)			

FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO SUS-TEC_001_03	PROCESO Ejecución de Proyecto	VERSIÓN 0	
EPUXUA AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos			
SEMANA N.º <u>32</u> DEL <u>6/03/2023</u> AL <u>11/03/2023</u> CONTRATO No. <u>024 DE 2023</u> <small>(aprobado por el Comité)</small>			

FORMATO			XUA
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_001_00	Ejecución de Proyecto	0	
EPUXUA AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos			
SEMANA N. <u>32</u> DEL <u>01/03/2023</u> AL <u>11/03/2023</u> CONTRATO No. <u>824 DE 2022</u>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Descripción Foto 3: Descripción Foto 4: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Fundido Cueva CALLE 24 D. ESTE CON CALLE 57 BR (Ver foto 3) Fundido Cueva CALLE 26C ENTRE 53-55 (Foto 4) </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Descripción Foto 5: Descripción Foto 6: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Nivelación de pozos 26 con calle 60 (Foto 5 y 6) </div>			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Soacha, a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>ONCE</u> <small>(Día en letra)</small> </div> <div> <u>11</u> <small>(Día en número)</small> </div> <div> días del mes de <u>MARZO</u> de <u>2023</u> <small>(Mes en letra) (Año)</small> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <small>Interventoría de Proyectos</small> <small>Departamento de Ingeniería</small> <small>COCCOBRAS S.A.</small> </div>			

60


FORMATO			XUA
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_001_00	Ejecución de Proyecto	0	
EPUXUA AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos			
SEMANA N°	33	DEL 12/03/2023 AL 18/03/2023	
CONTRATO N°	004 DE 2021		
II. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRAS			
VALOR DEL CONTRATO		4.500.507.258,00	
VALOR PAGADO		3.487.856.238,00	
VALOR TOTAL ACTUAL		8.000.000.000,00	
III. PRECIOS NO PRIORITARIOS			
N/A			
IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA			
<p>1. El día 12/03/2023, se inicia actividades a las siete de la mañana en el frente de obra se presentan adecuaciones por lluvias del fin de semana, se continúa con la excavación Manual y a Maquina en la calle 50 con carrera 17. En la carrera 25 con calle 58 se hace entrega a comunidad de material de mortero de nivelación para que la comunidad inicie la instalación de Adique. Se continúa con la fundición de cintas de confinamiento en la carrera 26 con calle 60, se inicia la nivelación de sub base en la carrera 26 con calle 58 para iniciar el armado de rejas para fundición de cintas de concreto.</p> <p>2. El día 14/03/2023, A las siete de la mañana se continúa con excavación a Maquina y Manual en la calle 50 con Carrera 17, se realiza reparación de aceras en las Adecuas 10, 25 y 30 se inicia con la nivelación y compactación en la Subestación. Se inicia con la fundición de cintas de concreto en la carrera 26 con calle 58 (junto con rejas cada 6 metros). En la carrera 26 con calle 60 se termina la fundición de cintas de confinamiento y se inicia excavación lateral para sumos de esta vía. En la carrera 24 con calle 58 de la comunidad comienza la instalación de adoquín para que el contratista empiece con la fundición de concreto.</p> <p>4. El día 15/03/2023 se continúan actividades a las siete de la mañana, se continúa la excavación manual y a Maquina en la calle 50 con carrera 17, se continúa con la nivelación de Sub Base, se continúa con la fundición de cintas de concreto en la Carrera 26 con calle 60, en la Carrera 26 con calle 58 se termina de fundir cintas de concreto junto con las rejas y se realiza la nivelación de pisos en las alcantarillas 5 y 30, se inicia la nivelación de las sub bases en la carrera 26 con calle 58 ya que está fue afectada por la lluvia.</p> <p>5. El día 15/03/2023, se continúan actividades a las siete de la mañana se presentan lluvias en el frente de Obra de 7 a 9 de la mañana. Se continúan con excavación Manual y a Maquina en la calle 50 con carrera 17, se realizan reparaciones de las aceras 25 y 40. Se inicia con la nivelación de sub base para la instalación de adoquín en la Carrera 26 con calle 58. Se inicia con la fundición de cintas de confinamiento en la carrera 26 con calle 60 para permitir el confinamiento al adoquín instalado por la comunidad. Se realiza carga de material de excavación de las alcantarillas de la carrera 26 con calle 60.</p> <p>6. El día 17/03/2023, se continúan actividades a las siete de la mañana se continúa con la calle 50 con carrera 17, se continúa con la nivelación, se realiza reparación de acera en la Adecua 30. Se realiza entrega de material para rejas en la carrera 26 con calle 58 para que la comunidad inicie con la instalación de adique. Se continúa con la fundición de cinta de confinamiento en la carrera 26 con calle 60. Se realiza nivelación de pisos en las Adecuas 15 y 30. Se continúa con la fundición de cintas de concreto en la carrera 26 con calle 58.</p> <p>6. El día 18/03/2023, A las 7 de la mañana se presentan lluvias en el frente de obra desde las siete de la mañana a las 8:30 de la mañana. Se continúa con la excavación Manual en la calle 50 con carrera 17. Se continúa con la fundición de cintas de concreto para confinamiento de la carrera 24 con calle 60, se inicia excavación lateral en las bases para la cuneta. Se inicia nivelaciones afectada por la lluvia en la Carrera 26 con calle 58 para iniciar el armado para la fundición de rejas de concreto.</p>			
V. RECOMENDACIONES Y OTROS			
1. Se solicita al contratista trabajar con la subestación afectada por las lluvias presentadas. 2. Se le solicita al contratista iniciar la instalación de la reja para los pozos adique. 3. Se le pide al contratista el cumplimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.			
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Fundición de cintas de Concreto, de la carrera 26 con calle 58 (Foto 1)			

FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO SUOTED_001_00	PROCESO Ejecución de Proyecto	VERSIÓN 0	

EXPLOSA AVANZA E.I.C.E
 Dirección Ejecución de Proyectos

SEMANA N° 00 **DEL** 10/03/2023 **AL** 18/03/2023

CONTRATO N° 004 DE 2023

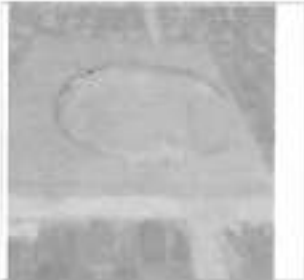

Descripción Foto 3:



Descripción Foto 4:

Revisión de pozos Cerrito 25 con cable 29 (Ver Foto 3 y 4).



Descripción Foto 5:



Descripción Foto 6:

Fandita de control de Control de la zona 240 COTE CLL 59 (Foto 5 y 6).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente solo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría, en Soacha, a los:

DESIGNO

(18)

días del mes de

MARZO

de

2023

Interventor: JUAN CARLOS PEREZ GARCIA

Dirección de Interventoría

COLOMBIA S.A.S.

FORMATO																																					
Informe general																																					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																			
MUTEC_001_00	Ejecución de Proyecto	3																																			
EPURUA AVANCA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos																																					
SEMANA N° <u>34</u> DEL <u>30/03/2023</u> AL <u>25/04/2023</u> CONTRATO N° <u>014 DE 2022</u>																																					
1. ANTECEDENTES																																					
OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BOLCHA CUNDINAMARCA"																																					
CONTRATO DE OBRA 014 DE 2022																																					
CONTRATISTA CONCEPCIO GABRIEL BOACHA		NIT 901 837 306-8																																			
INTERVENIOR CONCEPCION SAS		NIT 900 124 778-8																																			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN (EU) (Firma y sello de la entidad contratante)																																					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>1</u> DE <u>AGOSTO</u> DE <u>2022</u>		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>31</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2023</u>																																			
Contrato de Obra Valor inicial: <u>4504507896.67</u> Valor Actualizado: <u>4504507896.67</u> No. empleos Directos generados: <u>24</u> No. empleos Indirectos generados: <u>0</u>		Contrato de Interventoría Valor inicial: <u>221688396</u> Valor Actualizado: <u>221688396</u> No. empleos Directos generados: <u>5</u> No. empleos Indirectos generados: <u>0</u>																																			
2. PERSONAL DESARROLLANDO LABORES EN OBRA																																					
PERSONAL CONTRATO DE OBRA		PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Director de Obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Asesoría de Obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Topógrafo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Proyector de S.O</td><td>1</td></tr> <tr><td>Inspeccion</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oficiales</td><td>3</td></tr> <tr><td>Asistentes</td><td>13</td></tr> <tr><td>Operarios</td><td>2</td></tr> <tr><td>Conductores</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	PERSONAL	CANTIDAD	Director de Obra	1	Asesoría de Obra	1	Topógrafo	1	Proyector de S.O	1	Inspeccion	2	Oficiales	3	Asistentes	13	Operarios	2	Conductores	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Director de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Asesoría de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Inspector de Interventoría</td><td>1</td></tr> <tr><td>Asesor</td><td>2</td></tr> <tr><td>Profesional social</td><td>1</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>			PERSONAL	CANTIDAD	Director de Interventoría	1	Asesoría de Interventoría	1	Inspector de Interventoría	1	Asesor	2	Profesional social	1	Otros	3
PERSONAL	CANTIDAD																																				
Director de Obra	1																																				
Asesoría de Obra	1																																				
Topógrafo	1																																				
Proyector de S.O	1																																				
Inspeccion	2																																				
Oficiales	3																																				
Asistentes	13																																				
Operarios	2																																				
Conductores	3																																				
PERSONAL	CANTIDAD																																				
Director de Interventoría	1																																				
Asesoría de Interventoría	1																																				
Inspector de Interventoría	1																																				
Asesor	2																																				
Profesional social	1																																				
Otros	3																																				
3. ESTADO DEL CLIMA																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30/03/2023</td><td>Día Soleado</td></tr> <tr><td>31/03/2023</td><td>Día Lluvioso</td></tr> <tr><td>22/04/2023</td><td>Día Soleado</td></tr> <tr><td>23/04/2023</td><td>Día Lluvioso</td></tr> <tr><td>24/04/2023</td><td>Día Lluvioso</td></tr> <tr><td>25/04/2023</td><td>Día Soleado</td></tr> </tbody> </table>				FECHA	DESCRIPCIÓN	30/03/2023	Día Soleado	31/03/2023	Día Lluvioso	22/04/2023	Día Soleado	23/04/2023	Día Lluvioso	24/04/2023	Día Lluvioso	25/04/2023	Día Soleado																				
FECHA	DESCRIPCIÓN																																				
30/03/2023	Día Soleado																																				
31/03/2023	Día Lluvioso																																				
22/04/2023	Día Soleado																																				
23/04/2023	Día Lluvioso																																				
24/04/2023	Día Lluvioso																																				
25/04/2023	Día Soleado																																				
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 34																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PUNTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO DE 40x30x30 (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN (RET) MANUAL A MANO EN CLASIFICACIÓN (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)</td></tr> <tr><td>BASE ORILLAS (APORTEAR 200)</td></tr> <tr><td>REPLANTEO DE PUNTOS</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN ACERQUE EN MANEJO DE 10'</td></tr> <tr><td>CONCRETOS MOLDEADOS (MOLDEAR, BOMBATEAR)</td></tr> <tr><td>REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'</td></tr> <tr><td>REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10' (PORTERO (PUNTO DE ADQUISICIÓN))</td></tr> <tr><td>REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'</td></tr> <tr><td>REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'</td></tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PUNTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO DE 40x30x30 (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)	EXCAVACIÓN (RET) MANUAL A MANO EN CLASIFICACIÓN (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)	BASE ORILLAS (APORTEAR 200)	REPLANTEO DE PUNTOS	EXCAVACIÓN ACERQUE EN MANEJO DE 10'	CONCRETOS MOLDEADOS (MOLDEAR, BOMBATEAR)	REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'	REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10' (PORTERO (PUNTO DE ADQUISICIÓN))	REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'	REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'																						
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD																																					
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PUNTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN																																					
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO DE 40x30x30 (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)																																					
EXCAVACIÓN (RET) MANUAL A MANO EN CLASIFICACIÓN (INCLuye RETIRO DE SORRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 1 KM)																																					
BASE ORILLAS (APORTEAR 200)																																					
REPLANTEO DE PUNTOS																																					
EXCAVACIÓN ACERQUE EN MANEJO DE 10'																																					
CONCRETOS MOLDEADOS (MOLDEAR, BOMBATEAR)																																					
REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'																																					
REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10' (PORTERO (PUNTO DE ADQUISICIÓN))																																					
REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'																																					
REPLANTEO DE PUNTOS EN MANEJO DE 10'																																					

FORMATO			XUA
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
EPURAC_001_00	Ejecución de Proyecto	1	
EPURUA, AVANZA E.I.C.E Dirección Operaciones de Proyectos			
SEMANA N°: 34	DEL 26/03/2023	AL 26/03/2023	
CONTRATO N° 004 DE 2023			
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA			
VALOR DEL CONTRATO		1.430.517.828,00	
VALOR PAGADO		3.837.855.338,00	
VALOR TOTAL ACTUAL		1.008.872.555,00	
4. PREVISIONES RELEVANTES			
N/A			
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA			
<p>1. Desde 20/03/2023, Día lunes</p> <p>2. El día 21/03/2023, a las 06:00 de la mañana continúa con la nivelación y compactación de subrasante en la calle 50 con carrera 17 E, para seguir con la nivelación y compactación de subrasante en toda la longitud de esta vía, se realizó sello de la base con cemento tipo 5000 PSI. Se inicia la fundición de concreto en la carrera 24 E con calle 60, se realiza instalación de vigas sumiderales por la Avenida en la carrera 27 con calle 60 queda pendiente la limpieza del Filtro.</p> <p>3. El día 22/03/2023 a las 06:00 de la mañana se continúa con la fundición de concreto en la calle 50 con carrera 26 ya que la comunidad ha terminado con la instalación de adoquín. En la calle 50 con Carrera 25 se realiza confinamiento de la vía con Bordillo de A-60. En la carrera 26 G con calle 54 se termina la fundición de chapa de concreto de 60 cm. Se inicia con la nivelación de subbase en la carrera 27 con calle 52 para iniciar con el armado en concreto en la carrera 24 con calle 60.</p> <p>4. El día 23/03/2023, a las 06:00 de la mañana en la Carrera 26 E se realiza confinamiento de la vía con Bordillo, para garantizar la estabilidad del adoquín. En la Carrera 26 E con calle 50 se inicia con la nivelación y compactación de sub-base para la futura instalación del adoquín. En la carrera 24 E con calle 54 se realiza la fundición de panel lateral para el filtro. Se inicia fundición de chapa de concreto en la carrera 27 con calle 52 y se realiza nivelación de pozo en las Alcantarillas 2 y 26 de esta misma vía.</p> <p>5. El día 24/03/2023 a las 06:00 de la mañana se inicia excavación en la carrera 27 con calle 50 para instalar el pozo de las redes de servicio público en la calle. En la C/ 27 con calle 53 se inicia con la elevación de quibasa para la instalación de adoquín por parte de la comunidad. En la calle 50 con Carrera 26 se realiza instalación de Bordillo para el confinamiento de la vía. En la carrera 24 E con calle 50 se continúa con la fundición de la pared lateral para el filtro.</p> <p>6. El día 25/03/2023 a las 06:00 de la mañana se continúa con la excavación. Manos en la carrera 20 a con calle 50 se realiza reparación de aceras de 6 y 20. Se inicia la nivelación en sub-base en la calle 51 con carrera 27 para iniciar con la fundición de chapa de concreto de 60 cm por último se realiza chequeo de material de excavación en la carrera 21 a con calle 60.</p>			
6. RECOMENDACIONES Y OTROS:			
<p>1. Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.</p> <p>2. Se le solicita al contratista realizar la instalación del letrero para los peajes aquí.</p> <p>3. Se ha verificado el cumplimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.</p>			
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
INSTALACION ADOQUIN POR LA COMUNIDAD E INSTALACION DE BORDILLO POR PARTE DEL CONTRATISTA. (Fotografía)			

FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO SUBTOS_001_03	PROCESO Ejecución de Proyecto	VERSIÓN 0	
EPISODIO AVANZA E.I.C.E Dirección Ejecución de Proyectos			
SERIAL N.º 34 DEL 20/03/2023 AL 25/03/2023			
CONTRATO N.º 004 DE 2021 <small>CONTRATO DE OBRAS</small>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <small>Descripción Foto 3</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Descripción Foto 4</small> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO CRA 26R ESTE DLI 53 y CRA 27 ESTE CON DLI 53 (Ver foto 3 y 4). </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <small>Descripción Foto 5</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Descripción Foto 6</small> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO DLI 11 CRA 27 ESTE (Foto 5 y 6) </div>			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente ante la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> VEINTIDOS <small>Diez en letras</small> </div> <div> 1291 <small>Diez en números</small> </div> <div> días del mes de </div> <div> MARZO </div> <div> de </div> <div> 2023 <small>Por extenso en año</small> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <small>Interventoría</small> CONTRATO DE OBRAS </div>			

Actas de Comité Técnico.



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO: 2:30 pm.
FECHA: 13 de Marzo 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoría.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar estado actual contrato de Obra 025 de 2021.

AGENDA PROPUESTA

1. Verificación Compromisos del acta anterior.
2. Estado Actual Contratos Obra e Interventoría.
3. Estado Solicitudes NPS.
- 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité de obra revisando los compromisos del acta anterior. Solicitando la entrega de topografía de la Cra 27 D con dll 43 F. la cual será enviada a la entidad a más tardar el día 14 de marzo.

Se revisa y se solicita a la Secretaría de Infraestructura la carta de Gestión de riesgo a la vía Cra 27 B, ya que con las lluvias presentadas se está afectando la vía.

Se habla de la construcción de los gaviones en la Cra 50 entre Cra 32 A este y Cra 31, el contratista informa que se iniciarán actividades en este sector en cuanto seces las lluvias para no inestabilizar más la vía.

Se solicita un cronograma con la totalidad de las vías y las vías de la adición.

Se da claridad de que en la Cra 22 B este se va a realizar el arreglo de la vía en sistema de puros de adoquin.

Se solicita un balance con lo ejecutado, en ejecución y por ejecutar de las vías entregadas y las de proyección para adición. (Solicitud realizada por la entidad al contratista)

Se realiza una presentación donde se evidencian las afectaciones por lluvias del mes de marzo a la fecha.

La entidad informa que actualmente están realizando entregas de adoquin en las Carlos Bolán 1.

La arquibruja informa que la comunidad no está realizando correctamente el mortero ya que no se está pizando antes de la instalación del adoquin.



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton E. Rincón R.	Contratista	315.346.70.36	
Laura Ofantes.	R. Mantenencia	3105700086	
Guido Tulcan	Dircc. Equipam.	3112657489	
Juan Pablo Cárdenas	Epoxua	3124821154	
Diego Puentes	EPUXUA	3166216313	
Alfonso	Contratista	3102935197	
Alejandro Yate	D.E.V	313-8421566	

LUGAR DE REUNIÓN: <i>Epuxua.</i>	HORA DE INICIO: <i>2:45 pm.</i>
FECHA: <i>21 de Mayo 2023</i>	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: <i>Intenstoria.</i>	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VERIFICACION. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

AGENDA PROPUESTA


1. *Verificación del acta anterior.*
2. *Validación del estado actual de las vías intermedias.*
3. *[Handwritten mark]*
4. *[Handwritten mark]*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité a las 2:45 pm, se inicia hablando de la csa 9 donde se está instalando Sardinel por parte del certificador de obra, la inspectora de Obras describe los diseños de los cordones que se van a construir. y se va a hacer una visita por parte de epuxua y la entidad para definir los diseños de los cordones. Se retomaron actividades el día jueves por validaciones de topografía y desngies.

Se valora el estado actual de las vías intermedias en las carter gñm I. en el barrio Las carter galon II ~~días~~ D no se ha instalado adobes por parte de la comunidad.

Se describe el concepto de riesgo en la csa 27 D.





EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Nubia Roca	Contratista	362935197	
Lorena Cruzantes	Intenatfora	3105709086	
Guido Tulcan	Direcc. Equipam.	3112657489	
Alvaro A. Pardo	EPUXUA.	3166216313	
Alexandro Yate	Dirección Equipam.	313 23121556	



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 8:20 AM.
FECHA: 30 de Marzo 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Epuxua (Interventoría).	NÚMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación del estado actual de la obra. Contrato 025 y contrato 024 de 2022.

AGENDA PROPUESTA

1. Verificación del Acta anterior
2. Estado actual del contrato de obra e Interventoría
- 3.
- 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité a las 8:20 am, revisando los compromisos del acta anterior y se valida el estado de la obra que, donde se define que a la fecha solo se realiza la instalación del Barilnel.

Se habla del estado actual de la solicitud de los NPS, la secretaria informa que para esta semana dará respuesta.

Se revisará la vía allí es desde la 24 de este. y con 26 este. para validar su intervención.

Se realiza una presentación del estado actual de las vías y los frentes de trabajo con los que se están realizando las actividades por parte de la Interventoría.

Se informa que ya se retomarán actividades el el barrio Loma Linda.

Se realizará la verificación de la topografía para realizar el
diseño de las escaleras de la Cua 27 D con alt 43 F
Según las instrucciones dadas por la Secretaría de
Infraestructura y Obras.

Factura Electrónica De Venta No**CGS No. 7**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764031299403 que habilita desde CGS 1 hasta CGS 200. Vence 2023-07-16**CONSORCIO GAMER SOACHA****Nit 901587366 - 8**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXU					POR CONCEPTO DE				
NIT 901511522 4					ACTA N° 6 CONTRATO 024-2022				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CL 12 8 A 36		Soacha							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
10/04/2023			15/04/2023		VENDY ESTEFANIA ZULUAGA GONZALEZ			Credito	
m	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C.D.	ACTA N° 6 - CTO N. 024-2022 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA COSTO DIRECTO		1	Und.	372.825.315	0%	0	372.825.315
2	C.I.	COSTO INDIRECTO		1	Und.	111.847.595	0%	0	111.847.595
ADMINISTRACION 24%						SUBTOTAL		484.672.910	
REVISITOS 1%						DESCUENTO		0	
UTILIDAD 5%						TOTAL MENOS RETENCIONES		484.672.910	


Total líneas o ítems: 2

Valor en LetrasCUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**


Fecha y Hora de Generación: 10/04/2023 15:01:45

CL 44 C 45 53 Teléfono 3016341049 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadgrupoica@gmail.comFabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 691716771ef80d24f6e79c235839c2ece988a1a8be7e53b0e7a26ae5a54d2831a90cd159754ad373d0260eb9813f1 --Fecha y Hora de Expedición: 13/04/2023 2:42:18 p. m.

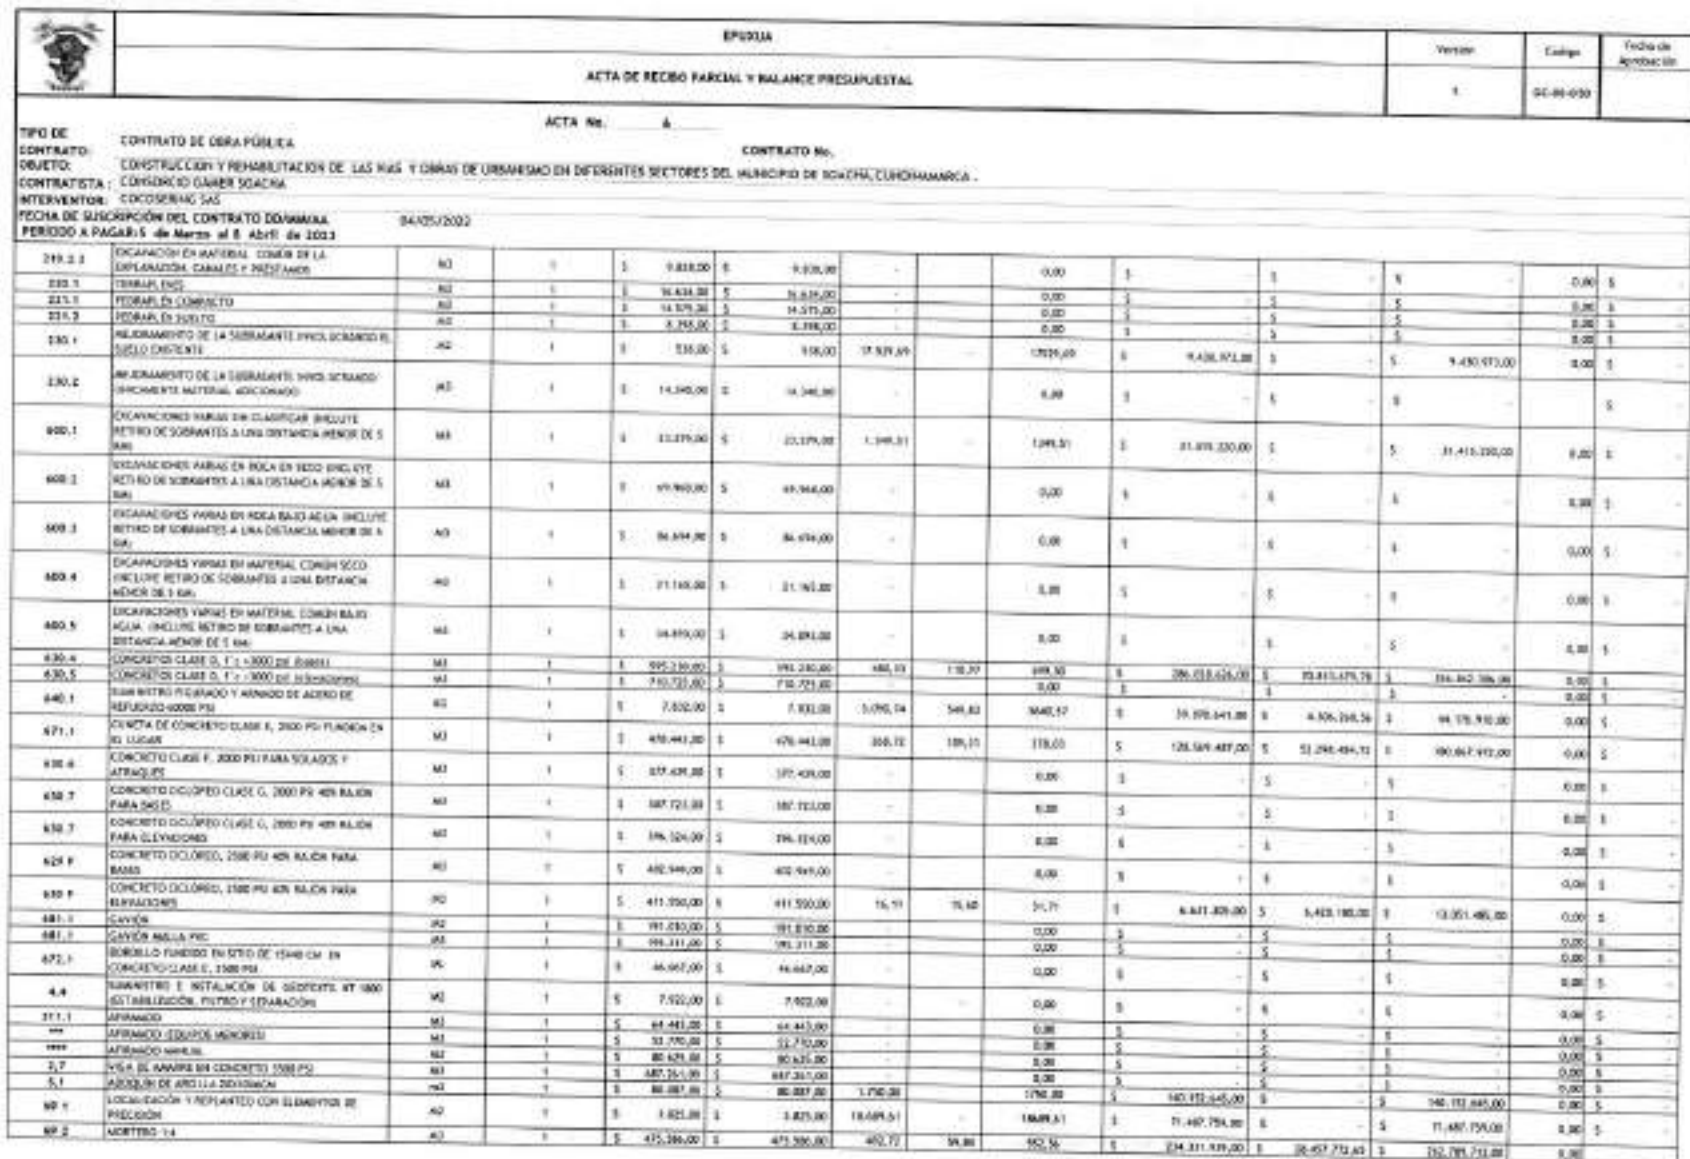

王 强

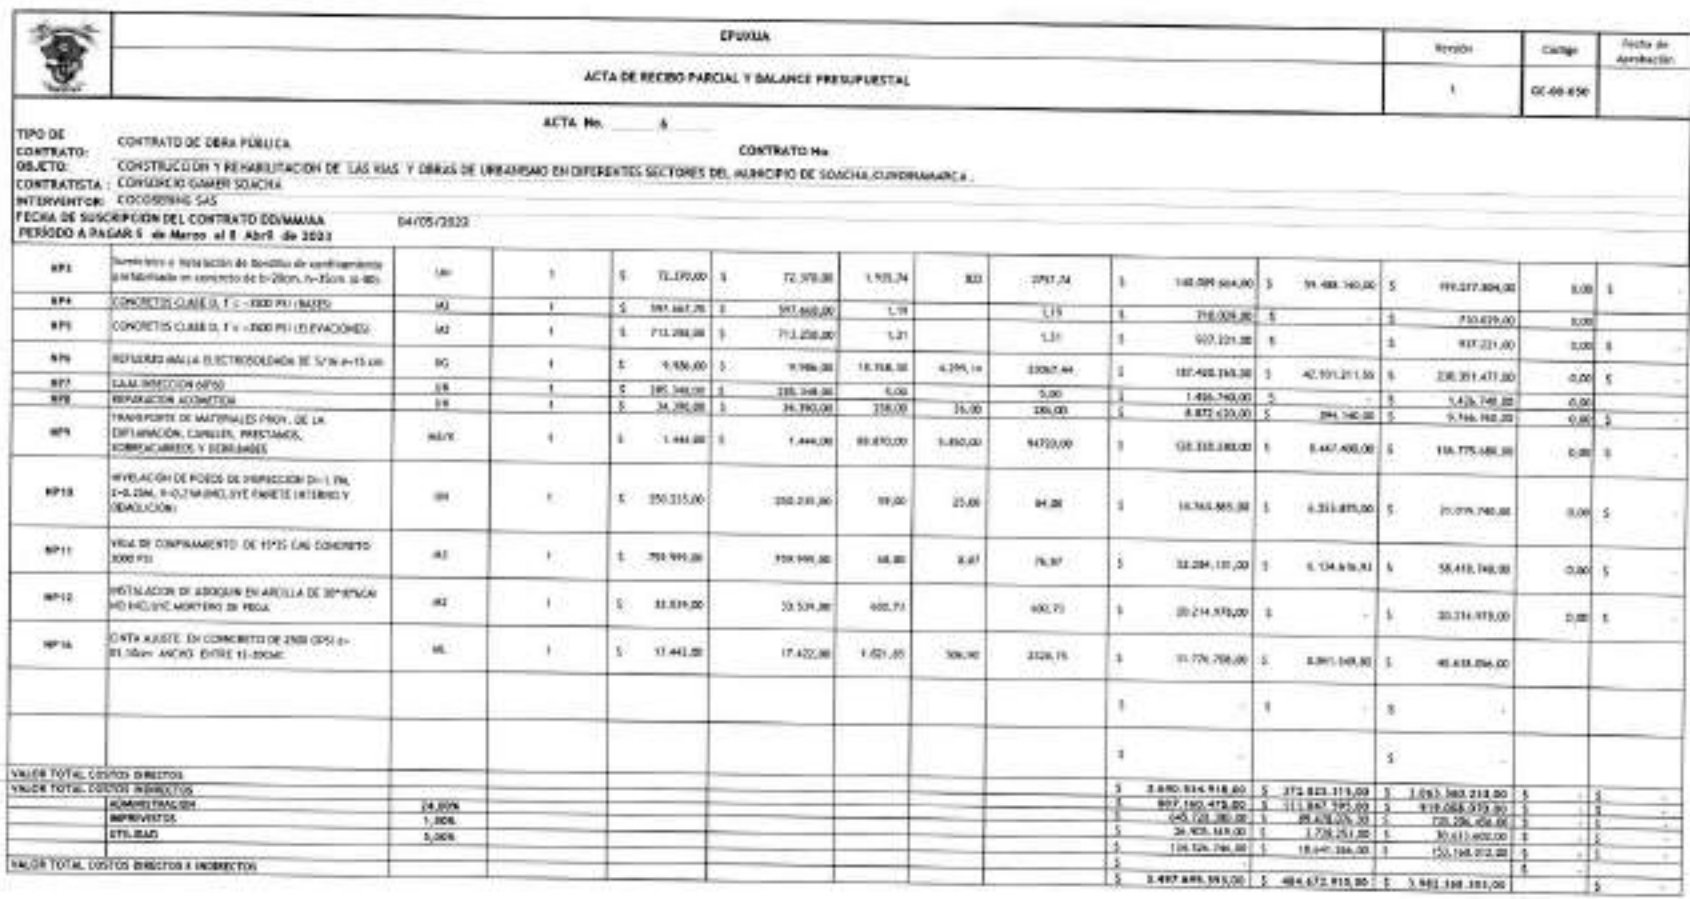

五五五

Página 4 de 4



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA									
INTERVENTOR	COCOSRING SAS				MIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				MIT O.C.C.	901.587.344-8	CONTRATO N°	004 DE 2022		
ACTIVIDAD	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		14,5		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		UNID.	M2		
		CRA 248 ESTE ENTRE 56-61								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho	Espeor (m)					
			CUNETAS	19,10	0,40			0,150	2,00	3,29
			VIGA CONFINAMIENTO	3,80	0,15			0,250	3,00	0,43
BORDILLO	5,00	0,40	0,30	1,00	1,00					
OBSERVACIONES:		TOTAL								
		3,72								
ACTIVIDAD	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		14,5		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		UNID.	M2		
		CRA 384 ENTRE 50-61								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho	Espeor (m)					
			CUNETAS	32,00	0,15			0,35	3,00	3,36
			VIGA CONFINAMIENTOS	32,00	0,15			0,25	6,00	7,30
BORDILLO	5,00	0,40	0,50	1,00	1,00					
OBSERVACIONES:		TOTAL								
		11,56								

FLIP

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	14,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3				
				CRA 34 ESTE ENTRE 55-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				CUNETAS	43,30	0,40	0,150	2,00	5,30
				VIGA CONFINAMIENTO	2,20	0,15	0,250	8,00	0,66
				BORDILLO FINAL	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:				TOTAL		6,96			
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	14,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3				
				CRA 35 ESTE ENTRE 61-63					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				CUNETAS	51,00	0,40	0,150	2,00	6,12
				VIGA CONFINAMIENTO	1,20	0,15	0,250	9,00	1,08
				BORDILLO FINAL	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:				TOTAL		8,20			

54013

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	15,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	#3		
		CALLE 24 E ENTRE 59-61					
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
		CUNETA	58,00	0,40	0,150	1,00	3,48
		CUNETA	58,00	0,50	0,400	1,00	11,60
		VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,250	8,00	1,08
		BORDILLO FINAL	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:		TOTAL				17,16	
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	#3		
		CALLE 34 E ENTRE 60-62					
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
		CUNETAS	72,00	0,40	0,200	2,00	11,52
		CINTAS LONGITUDINAL	72,00	0,20	0,150	1,00	2,16
		CINTAS TRANSVERSALES	7,80	0,15	0,250	21,00	2,43
		BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:		TOTAL				17,10	

34/05

[Handwritten signature]


ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	14,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	
	CALLE 24 B, ESTE CONCRETO H=0.0-2.0 M					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
	CUNETAS	33,00	0,20	0,200	2,00	2,64
		33,00	0,40	0,120	2,00	3,17
	EXCAVACIÓN RAMPA	33,00	1,00	0,25	1,00	8,25
BORDILLO	0,80	0,40	0,500	120,00	19,20	

324.13

324.13

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	M3			
			C/A 36A ENTRE 30					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
			CUNETAS	55,00	0,40	0,15	3,80	7,56
			VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	11,00	1,24
OBSERVACIONES:			TOTAL				8,80	
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	M3			
 			C/A 27 ENTRE C/L 53-57					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
			CUNETAS	26,00	0,40	0,150	2,00	3,12
			VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	4,00	0,46
BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00			
OBSERVACIONES:			TOTAL				4,57	
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	M3			
 			C/A 51 ENTRE 270-27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
			CUNETAS	52,00	0,40	0,150	2,00	6,24
			VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	4,00	0,46
BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00			
OBSERVACIONES:			TOTAL				7,70	

Handwritten signature and date: 20/05/2018

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.3-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.3-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UMD.	M3		
		TALLE 430 CONCRE 37					
		OBSERVACIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)			
		CUNETAS	80	0,40	0,150	2,00	9,60
		CINTAS TRANSVERSALES	3	0,15	0,25	29,00	2,81
CINTA LONGITUDINAL	82	0,20	0,25	1,00	4,10		
BORDILLO	104	0,45	0,150	2,00	12,76		
OBSERVACIONES:		TOTAL					
		49,27					
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.3-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.3-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UMD.	D		
 		CIVIL CENTRO SMOCHA					
		OBSERVACIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)			
		BORDILLO	405	0,40	0,500	1,00	85,00
		OBSERVACIONES:		TOTAL			
		85,00					
Firma: Director de obra:		Firma de Interventor:					
							
Nombre: MILTON RIVERA		Nombre: EDGAR URIBE					



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENTOR	COCOSERING SAS										
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.		900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222		
							901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022		
ACTIVIDAD	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				16,5		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		UNID.	M3	



CALLE 53 A CRA 36-26C

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
CUNETAS	84,00	0,40	0,150	2,00	10,08
VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,250	15,00	1,80
BORDILLO	5,00	0,40	0,50	1,00	1,00
TOTAL					12,88

OBSERVACIONES:


ACTIVIDAD	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3
-----------	---	------	---	-------	----




CRA 55 ENTRE 26C 27

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
CUNETAS	25,00	0,15	0,35	2,00	2,63
VIGA CONFINAMIENTOS	3,20	0,15	0,25	5,00	0,60
BORDILLO	16,00	0,40	0,50	1,00	3,20

Handwritten signatures and initials.

							
OBSERVACIONES:		TOTAL					6,43

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3				
				CALLE 55 CRA 26-26C					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				CUNETA	82,00	0,40	0,150	2,00	9,84
				VIGA CONFINAMIENTO	4,80	0,15	0,250	18,00	3,24
				BORDILLO FINAL	16,00	0,40	0,500	1,00	3,20
OBSERVACIONES:				TOTAL			16,28		
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3				
				CALLE 56A CRA 27-26					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				CUNETA	110,00	0,40	0,150	2,00	13,20
				VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,250	20,00	2,40
				BORDILLO FINAL	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:				TOTAL			16,60		

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3			
			CRA 26C ENTRE 53-56A					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUNETA	83,00	0,50	0,150	1,00	6,23
			CUNETA	83,00	0,30	0,150	1,00	3,74
			VIGA CONFINAMIENTO	4,00	0,15	0,250	12,00	1,80
BORDILLO FINAL	28,00	0,40	0,500	1,00	5,60			
OBSERVACIONES:			TOTAL			17,36		
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3			
			CALLE 43C ENTRE 27F 27G					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUNETAS	25,00	0,60	0,150	1,00	2,25
			CINTAS TRANSVERSALES	2,00	0,15	0,250	5,00	0,38
			BORDILLO	4,00	0,40	0,500	1,00	0,80
OBSERVACIONES:			TOTAL			3,43		

FIDIS

WTH


ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3			
			CALLE 43 DE ENTRE 27F -27D					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUNETAS	35,00	0,40	0,150	2,00	4,20
			VIGA CONFINAMIENTO	35,00	0,15	0,250	6,00	7,88
			BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			13,08		
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3			
			CALLE 43D ENTRE 27 ESTE					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUNETA	25,00	0,45	0,35	1,00	3,94
			CINTA CENTRAL	25,00	0,15	0,250	2,00	1,88
			CINTAS TRANSV	2,80	0,15	0,250	5,00	0,53
			BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			7,34		



ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3			
			CRA 27 DE ENTRE 43ª Y 44					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUNETA	30,00	0,45	0,35	1,00	4,73
			CINTA CENTRAL	30,00	0,15	0,250	2,00	2,25
CINTAS TRANSV	2,80	0,15	0,250	5,00	0,53			
BORDILLO	5,00	0,40	0,500	1,00	1,00			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					



MEMORIA DE CÁLCULO



OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA
---------------------	--

INTERVENTOR	COCOSERING SAS
-------------	----------------

NIT O C.C.	900.104.779-0
------------	---------------

CONTRATO N°

025 DE 20222

CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA
-------------	------------------------

NIT O.C.C.	901,587,366-8
------------	---------------

CONTRATO N.º

024 DE 2022

ACTIVIDAD	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
-----------	--

16,7

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

UNID.

M3



CRA 9 CENTRO SOACHA

OBSERVACIONES

Dimensiones

[illegible]MEDIDA
TOTAL

Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)
--------------	-------	-------------

RELENO CRA 9

425,00

0,50

0,500

1.00

106,25

BORDILLO

OBSERVACIONES:

TOTAL

106.25

TOTAL

106,25

Firma: Director de obra:

Firma de interventoria:

Nombre: MILTON RIVERA

NOMBRE: EDGAR LIRIBE

**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSEJUNG SAS			NIT O.C.C.			900.104.779-0			CONTRATO N°	025 DE 20222	
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			NIT O.C.C.			901.587.366-8			CONTRATO N°	024 DE 2022	
ACTIVIDAD	BASE GRANULAR BGT INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)			16,13			BASE GRANULAR BGT INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)			UNID.	M3	
				CRA 9 CENTRO SOACHA								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)					
				BASE GRANULAR CRA 9			14,000	7,00	98,00			
OBSERVACIONES:				TOTAL								
Firma: Director de obra:				TOTAL								
Nombre: MILTON RIVERA				Firma de Interventoria:								
												
				NOMBRE: EDGAR URIBE								



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS											
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA											
ACTIVIDAD	BASE GRANULAR BGT INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	16,13	NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222						
					CONTRATO N°	024 DE 2022						
			NIT O.C.C.	901.587.366-B	UNID.	M3						
			DCRA 9 CENTRO SOACHA									
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
				Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)						
			BASE GRANULAR CRA 9			14,000	7,00	98,00				
OBSERVACIONES:			TOTAL			98,00						
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:			TOTAL						
Nombre: WILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE			98,00						



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA						
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA												
INTERVENIOR	COCOSERING SAS				NIT O.C.C.	900.194.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022					
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.355-8	CONTRATO N°	024 DE 2022					
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				UNID.	671.1		
 						CRA 53A ENTRE 36C - 36							
						OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espejo (m)					
						REPARACION CUNETAS LLUVIAS	47,15	0,40	0,150	1,00	2,83		
						TOTAL							
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				UNID.	671.1		
 						CALLE 55 ENTRE 36C - 36							
						OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espejo (m)					
						REPARACION CUNETAS LLUVIAS	55,30	0,50	0,150	1,00	4,15		
						TOTAL							

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA									
INTERVENIOR	COOSGERING SAS				NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.386-8	CONTRATO N°	024 DE 2022		
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	671.1		
 		CALLE 35 ENTRE 34C-37								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			REPARACION CUNETA LLUVIAS	24,95	0,50			0,150	2,00	3,74
OBSERVACIONES:		TOTAL								
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	671.1		
 		CALLE 35A ENTRE 36-37								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			REPARACION CUNETA LLUVIAS	21,85	0,50			0,150	1,00	1,64
				21,80	0,50			0,15	1,00	1,64
	24,30	0,50	0,15	1,00	1,84					
OBSERVACIONES:		TOTAL								
		3,11								

Handwritten signature and stamp



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA						
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA												
INTERVENIOR	COCOSERB S.A.S				NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022					
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.386-8	CONTRATO N°	024 DE 2022					
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1			
						CRA 26 L ENTRE 55-56 A							
						OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)					
						REPARACION CUNETAS LLUVIAS	28.30	0.50	0.150		2.14		
						TOTAL							2.14
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1			
 						CALLE 20C ENTRE 53-55							
						OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)					
						CUNETAS LATERALES	17.80	0.65	0.15		1.74		
						TOTAL							1.74

[Handwritten signatures]



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENIOR	COCOSERING SAS				NIT D.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT D.C.C.	901.587.166-8	CONTRATO N°	004 DE 2022			
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	671.1		
 						CRA 36 B ENTRE 57-58					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
							REPARACIÓN CUNETA LLUVIAS	42.60	0.30		
OBSERVACIONES:						TOTAL					
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	671.1		
						CALLE 34 B ESTE CON CALLE 57-58					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
							CUNETA CAJON PARED	21.80	0.20		
CUNETA CAJON BASE	16.50	0.40	0.120	2.00	1.58						
OBSERVACIONES: POR LLUVIAS PRESENTADAS SE VE AFECTADA CUNETAS SEGUN REGISTRO FOTOGRAFICO						TOTAL					
						TOTAL					
Firma: Director de obra:						Firma de Interventoría:					
Nombre: MILTON RIVERA						Nombre: EDGAR URIBE					



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	4	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERHO SAS						NET O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NET O.C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022		
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		671.1		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.		M3			
		CRA 248 ESTE ENTRE 59-61										
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
			Longitud (m)	Ancho (m)	Epesor (m)							
			CUNETAS	19,10	0,40			0,150	2,00	2,20		
OBSERVACIONES:		TOTAL										
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		671.1		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.		M3			
		CRA 26 A ENTRE 59-61										
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
			Longitud (m)	Ancho (m)	Epesor (m)							
			CUNETAS	32,00	0,50			0,150	2,00	4,80		
OBSERVACIONES:		TOTAL										

[Handwritten signature]



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA.										
INTERVENIOR	COCOSERIB SAS				NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.366-B	CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
						CRA 26 ESTE ENTRE 59-61					
						Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
						OBSERVACIONES	42,00	0,45	0,150	2,00	5,67
						CUNETAS					
OBSERVACIONES:						TOTAL					
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
						CRA 35 CALLE 59-61					
						Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
						OBSERVACIONES	52,00	0,45	0,150	2,00	7,02
						CUNETAS					
OBSERVACIONES:						TOTAL					

FILIPES




CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	4	CONSORCIO GAMER SOACHA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENTOR	CD COSORING SAS				MIT D.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				MIT D.C.C.	901.567.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
						CRA 24B ENTRE: 59-67					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
						CUNETA	58,20	0,40	0,150	1,00	3,49
						CUNETA PARED	58,00	0,30	0,120	1,00	2,09
CUNETAS BASE	58,00	0,40	0,120	1,00	2,78						
OBSERVACIONES:						TOTAL					
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
						CALLE 33A ESTE CON CALLE 33					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
						CUNETAS	63,00	0,40	0,150	2,00	7,56
						OBSERVACIONES:					
						7,56					






FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	4	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA									
INTERVENTOR	COCDSEING SAS				MIT O.C.C.	900 104.779-0		CONTRATO N°	025 DE 20223	
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				MIT O.C.C.	901 587.386-B		CONTRATO N°	004 DE 2022	
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.	M3	
					CRA 26 A ENTRE 57-59					
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
					CUNETAS	82,20	0,35	0,150	1,00	4,32
						82,20	0,40	0,150	1,00	4,93
OBSERVACIONES:					TOTAL					
ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.	M3	
					CALLE 34 B ESTE CON CALLE 57-59					
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
					CUNETAS	72,00	0,40	0,150	2,00	8,64
OBSERVACIONES:					TOTAL					

FLOR



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENTOR	CSC OSERING SAS				NIT D.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	015 DE 2022			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT D.C.C.	901.387.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
 						CALLE 34 B ESTE CON CALLE 57-58					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
						CUNETA CAJON PARED	33,00	0,20	0,200	2,00	2,64
						CUNETA CAJON BASE	33,00	0,40	0,120	2,00	3,17
OBSERVACIONES:						TOTAL					
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR				671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR		UNID.	M3		
						CRA 27 ENTRE CLL 53-51					
						OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
							Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
						CUNETAS	28,00	0,40	0,150	2,00	3,12
						OBSERVACIONES:					
						3,12					

FILIPPE



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA							
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA															
INTERVENTOR	COOPERING SAS			MIT O.C.C.		900.104.779-0		CONTRATO N°		025 DE 2022						
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			MIT O.C.C.		901.387.366-0		CONTRATO N°		004 DE 2002						
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			671.1		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.		M3					
				CRA 51 ENTRE 270 Y 27												
				OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
				Longitud (m)			Ancho (m)		Espesor (m)							
				CUNETAS			52,00		0,40		0,150		2,00		6,24	
OBSERVACIONES:				TOTAL								6,24				
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			671.1		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.		M3					
				CALLE 430 CON CRA 37												
				OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
				Longitud (m)			Ancho (m)		Espesor (m)							
				CUNETAS			80,00		0,40		0,150		2,00		9,60	
OBSERVACIONES:				TOTAL								9,60				

FILAS



**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERRES SAS			NIT O.C.C.		980.104.779-0		CONTRATO N°	025 DE 2022			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			NIT O.C.C.		991.587.366-8		CONTRATO N°	004 DE 2022			
ACTIVIDAD	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			671.1		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.	M3		
				calle 50 entre 17-21d								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				CUNETAS	50.00	0.40	0.150	2.00	6.00			
OBSERVACIONES:				TOTAL			TOTAL		6.00			
Firma: Director de obra:				Firma de Interventoría:			TOTAL		84.35			
Nombre: MILTON RIVERA				Nombre: EDGAR URIBE								

**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20223			
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022			

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>							
CRA 26B ESTE ENTRE 58-61							
OBSERVACIONES			Dimensiones				
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RENIVELACION FALLOS LLUVIAS			9,10	4,60	0,10	1,00	4,19
OBSERVACIONES:			TOTAL 4,19				
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>							
CRA 26 A ENTRE 59-61							
OBSERVACIONES			Dimensiones				
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RENIVELACION FALLOS LLUVIAS			32,00	4,00	0,05	1,00	6,40
OBSERVACIONES:			TOTAL 6,40				

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	14, 12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3			
			CALLE 26A ESTE CON CALLE 36-39					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RENIVELACION FALLOS LLUVIAS	50,00	2,35	0,050	1,00	5,88
OBSERVACIONES:			TOTAL					5,88
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16, 12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3			
			CALLE 24 B ESTE CON CALLE 36 a-39					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RENIVELACION FALLOS LLUVIAS	72,00	2,20	0,05	1,00	7,92
OBSERVACIONES:			TOTAL					7,92



ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16, 12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3		
			CALLE 56A ENTRE 26-27				
OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
REHUELACION FALLAS LLUVIAS			62,00	2,50	0,10	1,00	15,50
LATERALES			62,00	1,95	0,15	2,00	36,27
INTERIOR CAJON			62,00	0,93	0,05	1,00	2,88
			20,00	0,93	0,05	1,00	0,93
OBSERVACIONES:			TOTAL				55,58
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16, 12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3		
			CALLE 24B ESTE CON CALLE 57-58				
OBSERVACIONES			Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
REHUELACION FALLAS LLUVIAS			25,00	3,00	0,070	1,00	5,25
OBSERVACIONES:			TOTAL				5,25

FLORIBELT

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3	
 		CRA 27 ENTRE CLL 53-57				
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	Epesor (m)			
	RENIVELACION FALLOS LLUVIAS	21,00	3,50	0,05	1,00	3,68
OBSERVACIONES:		TOTAL				3,68
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3	
 		CRA 51 ENTRE 270-27				
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	Epesor (m)			
	RENIVELACION FALLOS LLUVIAS	45,00	3,50	0,070	1,00	11,03
OBSERVACIONES:		TOTAL				11,03

FIRMA 

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3			
			CALLE 49 ENTRE 170 Y 171					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RENOVELACION FALLOS LLUVIAS	126,00	3,50	0,050	1,00	22,05
OBSERVACIONES:			TOTAL			22,05		
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3			
			CALLE 19 ENTRE 40-50					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RENOVELACION FALLOS LLUVIAS	25,00	4,00	0,050	1,00	5,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			5,00		

ELABORADO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3
			CALLE 430 CON CUA 27		
			OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m)	CANTIDAD MEDIDA TOTAL
			REHVELACION FALLAS LLUVIAS	80,00 3,50 0,050	1,00 14,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		
ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3
			CALLE 37 E CON 43 D		
			OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m)	CANTIDAD MEDIDA TOTAL
			REHVELACION FALLAS LLUVIAS	50,00 3,50 0,050	1,00 8,75
OBSERVACIONES:			TOTAL		

32412

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA	UNID.	M3		
calle 50 entre 17-210							
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
		RENOVELACION FALLAS LLUVIAS	50,00	5,00	0,050	1,00	12,50
OBSERVACIONES:		TOTAL					12,50
Firma: Director de obra:							244,34
		Firma de Interventoria:					
Nombre: MILTON RIVERA							
		NOMBRE: EDGAR URIBE					



OBSERVACIONES:

TOTAL					6,83

F. J. B.

[Signature]

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CRA 26 CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
			CUADRO POZO	2,50	3,00	0,150	1,00	1,13
			CUADRO CAJA	2,40	1,20	0,150	1,00	0,43
			CINTA CONCRETO	38,40	1,20	0,150	1,00	6,91
OBSERVACIONES:			TOTAL			8,47		

MEMORIA DE CÁLCULO




ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID,	M3	
	CRA 25 CALLE 59-61					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
	CUADRO INICIO	0,90	1,00	0,150	2,00	0,27
	CUADRO POZO	2,70	2,10	0,150	1,00	0,85
	CUADRO POZO	2,90	2,10	0,150	1,00	0,91
	CINTA CONCRETO	46,00	1,20	0,150	1,00	8,28
OBSERVACIONES:	TOTAL					
	10,31					

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CRA 24B ENTRE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO INICIO	1,00	1,30	0,150	2,00	0,39
			CUADRO POZO 1-2-3	2,10	2,10	0,150	3,00	1,98
			CINTA CONCRETO	46,00	1,20	0,150	1,00	8,28
OBSERVACIONES:			TOTAL			10,65		
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 26A ESTE CON CALLE 58					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO POZO	2,65	2,38	0,150	2,00	1,89
			CUADRO POZO	3,65	3,50	0,150	1,00	1,92
			CINTA CONCRETO	56,00	1,20	0,150	1,00	10,08
OBSERVACIONES:			TOTAL			13,89		

F212B

3/11/13

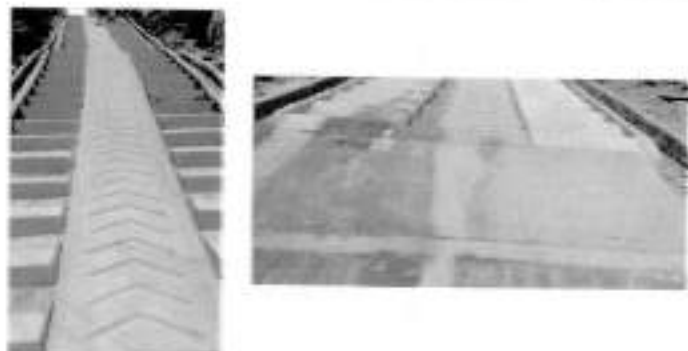ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 psi (bases)	630,4	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 248 ESTE CON CALLE 59-57					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO 1 CARGUE	1,75	2,00	0,15	1,00	0,53
			CUADRO 1 CARGUE	1,75	2,00	0,15	1,00	0,53
			CUADRO 1 CARGUE	3,16	2,45	0,15	1,00	1,16
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,21		
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 psi (bases)	630,4	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 248 ESTE CON CALLE 59-57 ESCALERA					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RAMPA ESCALERA	33,00	1,00	0,15	1,00	4,95
			PLACAS CONCRETO	1,10	3,20	0,15	1,00	0,53
			PLACAS CONCRETO	2,76	1,25	0,15	1,00	0,52
			PLACAS CONCRETO POZO	2,00	2,76	0,15	1,00	0,83
OBSERVACIONES:			TOTAL			6,82		

F2/13

WAT

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3							
				CRA 27 ENTRE CLL 53-51								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
					CONCRETO CARGUES 2	5,20	3,00			0,15	2,00	4,68
					CINTAS CONCRETO	26,00	1,20			0,150	1,00	4,68
OBSERVACIONES:			TOTAL			9,36						
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3							
				CRA 51 ENTRE 27D 27								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
					CINTAS CONCRETO	52,00	1,20			0,150	1,00	9,36
					OBSERVACIONES:					TOTAL		
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3							
				calle 50 entre 17-21d								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
					CINTAS CONCRETO	50,00	1,20			0,150	1,00	9,00
					OBSERVACIONES:					TOTAL		

Firma: Director de obra:	TOTAL	
	Firma de Interventoría:	93,82
Nombre: MILTON RIVERA	EDGAR URIBE	
	NOMBRE: EDGAR URIBE	



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENIOR	COCOSERIG SAS										
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA										
					NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°		025 DE 20223		
					NIT O.C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°		024 DE 2022		

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630,4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3
-----------	---	-------	---	-------	----



OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CUADRO 1 INICIO	2,62	1,20	0,15	1,00	0,51
CUADRO 2 FINAL	2,50	1,20	0,15	1,00	0,45
CINTAS CONCRETO	16,50	1,20	0,15	2,00	5,94
TOTAL					6,90

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630,4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3
-----------	---	-------	---	-------	----




OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CUADRO 1 CARGUE	2,65	2,10	0,15	1,00	0,81
CUADRO 2 FINAL	0,80	1,00	0,15	2,00	0,24
CINTAS CONCRETO	32,00	1,20	0,150	1,00	5,76
TOTAL					6,83

OBSERVACIONES:

ELABORADO



ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CRA 26 - CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO POZO	2,50	3,00	0,150	1,00	1,13
			CUADRO CAJA	2,40	1,20	0,150	1,00	0,43
CINTA CONCRETO	38,40	1,20	0,150	1,00	6,91			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			8,47					
MEMORIA DE CÁLCULO 								
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CRA 25 - CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO INICIO	0,90	1,00	0,150	2,00	0,27
			CUADRO POZO	2,70	2,10	0,150	1,00	0,85
CUADRO POZO	2,90	2,10	0,150	1,00	0,91			
CINTA CONCRETO	46,00	1,20	0,150	1,00	8,28			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			10,31					




ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UMD.	M3			
			CRA 348 ENTRE 89-91					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO INICIO	1,00	1,30	0,150	2,00	0,39
			CUADRO POZO 1-2-3	2,10	2,10	0,150	3,00	1,98
			CINTA CONCRETO	46,00	1,20	0,150	1,00	8,28
OBSERVACIONES:			TOTAL			10,65		
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UMD.	M3			
			CALLE 25A ESTE CON CALLE 5B					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO POZO	2,65	2,38	0,150	2,00	1,89
			CUADRO POZO	3,65	3,50	0,150	1,00	1,92
			CINTA CONCRETO	56,00	1,20	0,150	1,00	10,08
OBSERVACIONES:			TOTAL			13,89		

FLPIS

FLPIS

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 348 ESTE CON CALLE 39-37					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CUADRO 1 CARGUE	1.75	2.00	0.15	1.00	0.33
			CUADRO 1 CARGUE	1.75	2.00	0.15	1.00	0.33
CUADRO 1 CARGUE	3.16	2.45	0.15	1.00	1.16			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			2.21					
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 348 ESTE CON CALLE 39-37 ESCALERA					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			RAMPA ESCALERA	33.00	1.00	0.15	1.00	4.95
			PLACAS CONCRETO	1.50	3.20	0.15	1.00	0.33
PLACAS CONCRETO	2.76	1.25	0.15	1.00	0.52			
PLACAS CONCRETO POZO	2.00	2.76	0.15	1.00	0.83			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			5.82					

7/1/15


ESTC

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	430.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3					
		CRA 27 ENTRE CLL 50-51								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			CONCRETO CARGUES 2	5.20	3.00			0.15	2.00	4.68
			CINTAS CONCRETO	26.00	1.20			0.150	1.00	4.68
OBSERVACIONES:		TOTAL								
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3					
		CRA 51 ENTRE 270-27								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			CINTAS CONCRETO	52.00	1.20			0.150	1.00	9.36
			OBSERVACIONES:		TOTAL					
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3					
		calle 50 entre 17-21d								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			CINTAS CONCRETO	50.00	1.20			0.150	1.00	9.00
			OBSERVACIONES:		TOTAL					
Firma: Director de obra:		Firma de interventoria:								
Nombre: MILTON RIVERA		Nombre: EDGAR URIBE								



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA										
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA																
INTERVENTOR	COCOSERING SAS					NIT O.C.C.	900.104.779-0			CONTRATO N°	023 DE 2022						
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA					NIT O.C.C.	901.587.366-8			CONTRATO N°	024 DE 2022						
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)					630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)					UNID.	M3				
							CALLE 546 ENTRE 35 Y 27										
							OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
								Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)							
							AJUSTE CONCRETO ACTA 6										
							CONCRETOS CAJAS Y POZOS	7,00	1,90	0,15	4,00	7,98					
							CINTAS CONCRETO	105,00	1,20	0,15	1,00	18,90					
												26,88					
							CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	107,03	0,60	0,150	2,00	19,27					
OBSERVACIONES:							TOTAL										7,81
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)					630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)					UNID.	M3				
							CRA 28C CALLES 56A Y 55										
							OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
								Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)							
							AJUSTE CONCRETO ACTA 6										
							CONCRETOS CUADROS Y POZO	2,25	2,20	0,15	3,00	2,23					
							CINTAS CONCRETO	25,00	1,20	0,15	1,00	4,50					
												6,73					
							CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	24,15	0,60	0,150	2,00	4,35					
OBSERVACIONES:							TOTAL										7,81

3213

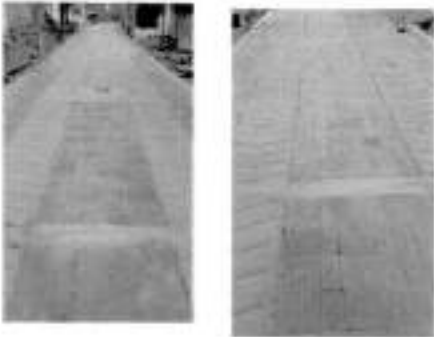ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CALLE 53A ENTRE 26-260					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			AJUSTE CONCRETO ACTA 6 CONCRETOS CAJAS Y POZOS	4,00	2,60	0,15	2,00	3,12
			CINTAS CONCRETO	82,00	1,20	0,15	1,00	14,76
			17,88					
CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	80,39	0,60	0,150	2,00	14,47			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			3,41					
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3			
			CRA 34C ENTRE CLL 63-65					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			AJUSTE CONCRETO ACTA 6 CONCRETOS CAJAS Y POZOS	4,00	5,00	0,15	2,00	6,00
			CINTAS CONCRETO	3,00	4,00	0,15	2,00	3,60
			9,48					
CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	52,65	1,20	0,15	1,00	9,48			
			15,48					
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			6,00					
			TOTAL					
			25,15					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:					
								
Nombre: WILTON RIVERA			Nombre: EDGAR URIBE					

[illegible]

ACTIVIDAD		640.1		SUMINISTRO FUNDIDO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		UNID.		KG	
OBSERVACIONES:									
						OBSERVACIONES: LONGITUDINAL 1/2 0.72 22.00 0.35 8.00 25.44 29.34			
SUMINISTRO FUNDIDO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 640.1						UNID. KG			
OBSERVACIONES:									
						OBSERVACIONES: LONGITUDINAL 1/2 0.72 21.00 0.35 7.00 22.36 24.79			
SUMINISTRO FUNDIDO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 640.1						UNID. KG			
OBSERVACIONES:									
						OBSERVACIONES: LONGITUDINAL 1/2 0.72 22.00 0.35 11.00 25.48 36.85			
SUMINISTRO FUNDIDO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 640.1						UNID. KG			
OBSERVACIONES:									
TOTAL 32.70									

137

[illegible]

CH

		MEMORIA DE CÁLCULO			
FECHA DD MM AA 10 04 2023		CORTE N° 6		CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA			
INTERVENTOR		COCOSERING SAS		CONTRATO N° 025 DE 2022	
CONTRATISTA		CONSORCIO GAMER SOACHA		CONTRATO N° 024 DE 2022	
ACTIVIDAD		RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE		UNID. M3	
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE		3,22		RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	
OBSERVACIONES		<div>ARREGLA VIA c/raza entre 59-56a</div> <div>65,00 2,00 0,100 1,00 13,00</div> <div>LONGITUD (m) ALTO (m) ESPESOR (m) CANTIDAD MEDIDA TOTAL</div>			
OBSERVACIONES:		<div></div> <div></div>			
Firma de Director de obra:		Firma de Interventor:			
Nombre: MILTON RIVERA		Nombre: EDGAR URIBE			

104

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

		MEMORIA DE CALCULO		ONSORCIO GAMER SOACHA	
FECHA 08 DI 10 ME 4 AA 2023	OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA		INTERVENION COLOSORIOS SAS ONSORCIO GAMER SOACHA		
CONTRATO N° 005 DE 2022 CONTRATO N° 004 DE 2022			MT O C.C. 900, 904, 779-0 MT O C.C. 901, 947, 346-8		
ACTIVIDAD Saneamiento e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80)		MP3	UNID. UN TOTAL 5.00		
OBSERVACIONES BORDO TEMPORALES					
ACTIVIDAD Saneamiento e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80)		MP3	UNID. UN TOTAL 5.00		
OBSERVACIONES BORDO TEMPORALES					
ACTIVIDAD Saneamiento e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80)		MP3	UNID. UN TOTAL 4.00		
OBSERVACIONES BORDO TEMPORALES					
ACTIVIDAD Saneamiento e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80)		MP3	UNID. UN TOTAL 4.00		
OBSERVACIONES BORDO TEMPORALES					



ACTIVIDAD		OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
Sumidero e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP1	Sumidero e instalación de Bordo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UN	UN	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
CALLE 25 ESTE CON CALLE 19-45		CALLE 34B ESTE CON CALLE 19-45		CALLE 34B ESTE CON CALLE 19-45		CALLE 34B ESTE CON CALLE 19-45		CALLE 34B ESTE CON CALLE 19-45	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
Dimensiones		Dimensiones		Dimensiones		Dimensiones		Dimensiones	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

OBSERVACIONES:							
ACTIVIDAD	MP3	Suministro e instalación de Bordo de contrahierro prefabricado en concreto de b=20cm, h=25cm (A-80).	UNID.	UN	4.00		
OBSERVACIONES:		TOTAL		4.00			
		BOQUELLO TERMINACIONES		4.00			
		OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	ESPAESOR (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		CALLE 31A ENTRE CALLE 31A Y 31B					
ACTIVIDAD	MP3	Suministro e instalación de Bordo de contrahierro prefabricado en concreto de b=20cm, h=25cm (A-80).	UNID.	UN	4.00		
OBSERVACIONES:		TOTAL		4.00			
		BOQUELLO TERMINACIONES		4.00			
		OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	ESPAESOR (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		CALLE 31A ENTRE CALLE 31A Y 31B					
ACTIVIDAD	MP3	Suministro e instalación de Bordo de contrahierro prefabricado en concreto de b=20cm, h=25cm (A-80).	UNID.	UN	4.00		

124

[illegible]

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

OBSERVACIONES:					
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de contrahierro prefabricado en concreto de b=20cm, h=10cm (A-80).	MPS	Suministro e instalación de Bordillo de contrahierro prefabricado en concreto de b=20cm, h=10cm (A-80).	UN	
OBSERVACIONES:				TOTAL	
				5.00	



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENIENTE	CONSORCIO GAMER SOACHA						
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						
	MIT O C.C. 900.104.779-0						
	MIT O C.C. 901.587.366-8						
	CONTRATO N°						
	025 DE 2022						
	024 DE 2022						

ACTIVIDAD	REFUEZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 Ø=15 CM	NP6	REFUEZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 Ø=15 CM	UNID.	KG
CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-67					
OBSERVACIONES		Dimensiones		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)		
		p/k			
MALLAS PARA :					
CUADRO 1 INICIO		2.62	1.30	4.303	1.00
CUADRO 2 FINAL		2.50	1.20	4.303	1.00
CINTAS CONCRETO		16.50	1.20	4.303	1.00
CUNETAS		19.10	0.35	4.303	2.00
TOTAL					170.30
OBSERVACIONES: 					

ACTIVIDAD	REFUEZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUEZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG	
CRA 26A ENTRE 59-64						
OBSERVACIONES:						
<div></div>						
OBSERVACIONES		Dimensiones		p/k	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)			
MALLAS PARA :						
CUNETA		32.00	0.35	4.303	1.00	48.19
CINTAS CONCRETO		32.00	0.60	4.303	2.00	165.24
CUADRO 1 CARGUE		2.65	2.10	4.303	1.00	21.95
CUADRO 2 FINAL		0.80	1.00	4.303	2.00	6.88
TOTAL						244.26

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MALLAS PARA :			
CUADRO INICIO	1.00	1.30	4.303
CUADRO POZO 1-2-3	2.10	2.10	4.303
CINTA CONCRETO	46.00	1.20	4.303
CUNETTA	58.00	0.40	4.303
CUNETTA FILTRO	58.00	0.32	4.303
MALLAS PARA :			
CUADRO INICIO	1.00	1.30	4.303
CUADRO POZO 1-2-3	2.10	2.10	4.303
CINTA CONCRETO	46.00	1.20	4.303
CUNETTA	58.00	0.40	4.303
CUNETTA FILTRO	58.00	0.32	4.303

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 4-15 cm	UNID.	KG	445.62
OBSERVACIONES:						



MALLAS PARA :			
CUADRO INICIO	0.90	1.00	4.303
CUADRO POZO	2.70	2.10	4.303
CUADRO POZO	2.90	2.10	4.303
CINTA CONCRETO	46.00	1.20	4.303
CUNETTAS	51.00	0.35	4.303
MALLAS PARA :			
CUADRO INICIO	0.90	1.00	4.303
CUADRO POZO	2.70	2.10	4.303
CUADRO POZO	2.90	2.10	4.303
CINTA CONCRETO	46.00	1.20	4.303
CUNETTAS	51.00	0.35	4.303

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 4-15 cm	UNID.	KG	308.16
OBSERVACIONES:						



MALLAS PARA :			
CUADRO POZO	2.50	3.00	4.303
CUADRO CALA	2.40	1.20	4.303
CINTA CONCRETO	38.40	1.20	4.303
CUNETTAS	43.30	0.35	4.303
MALLAS PARA :			
CUADRO POZO	2.50	3.00	4.303
CUADRO CALA	2.40	1.20	4.303
CINTA CONCRETO	38.40	1.20	4.303
CUNETTAS	43.30	0.35	4.303

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 4-15 cm	UNID.	KG	308.16
-----------	---------------------------------------	-----	---	-------	----	--------

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

CALLE 36 ESTE CON CALLE 59-61

Dimensiones

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

161

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES:						TOTAL				409.93
 										

450

[Handwritten signature] *[Handwritten text]*

OBSERVACIONES:					
					
CUNETAS ADOQUIN					
72,00	0,35	4,303	2,00	216,87	
TOTAL					540,41

A52

[illegible]

Handwritten signatures and initials.

CONSORCIO GAMER SOACHA										MEMORIA DE CÁLCULO																									
FECHA		DD		10		MM		4		AA		2023		CORTE N°		6		CONSORCIO GAMER SOACHA																	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										CONTRATO N°		025 DE 2022		INTERVENTOR		COCOSERIN SAS		CONTRATISTA		CONSORCIO GAMER SOACHA													
NIT O C.C.		900.104.779-0		CONTRATO N°		024 DE 2022		NIT O C.C.		901.587.366-8		CONTRATO N°				UNID.		M3																	
ACTIVIDAD		MORTERO 1:4		NP 2		MORTERO 1:4		UNID.		M3		CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61		OBSERVACIONES		Longitud (m)		2.40		19.10		Espesor (m)		0.04		1.00		1.83		0.92		TOTAL		2.75	
OBSERVACIONES:																																			
ACTIVIDAD		MORTERO 1:4		NP 2		MORTERO 1:4		UNID.		M3		CALLE 36A ESTE CON 59-68		OBSERVACIONES		Longitud (m)		32.00		2.05		0.04		1.00		2.62		1.31		TOTAL		3.94			
OBSERVACIONES:																																			






554



इति

96,96	TOTAL					96,96

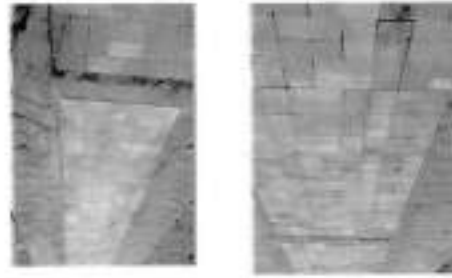

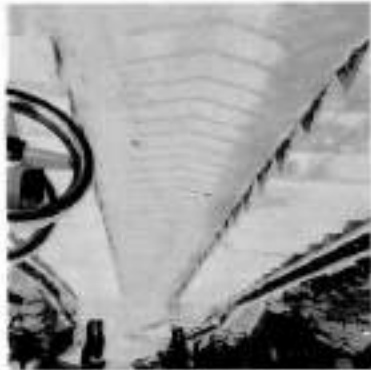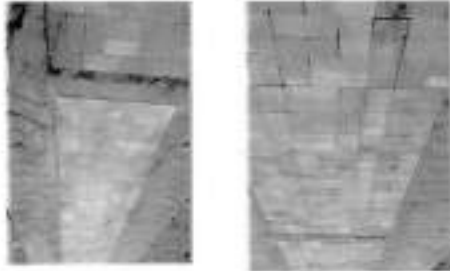ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3
OBSERVACIONES:					
					
OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
MORTERO PEGA	25,00	0,80	0,04	2,00	1,60
MORTERO SELLO	25,00	0,80	0,02	2,00	0,80
TOTAL					
2,40					
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3
OBSERVACIONES:					
					
OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
MORTERO SELLO	82,00	2,50	0,02	1,00	4,10
TOTAL					
4,10					
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3
OBSERVACIONES:					
					
OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
MORTERO PEGA	56,00	1,60	0,04	1,00	3,58
MORTERO SELLO	56,00	1,60	0,04	1,00	3,58
TOTAL					
7,16					

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.17	TOTAL	OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 24 B ENTRE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO SELLO	72,00	3,20	0,02	1,00	4,61
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,61		

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 27 ENTRE CLL 53-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	26,00	1,60	0,04	1,00	1,66
			MORTERO SELLO	26,00	1,60	0,02	1,00	0,83
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,50		




ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 51 ENTRE 270 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	52,00	1,60	0,04	1,00	3,33
			MORTERO SELLO	52,00	1,60	0,02	1,00	1,66
			TOTAL			4,99		
OBSERVACIONES:								
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CALLE 43D CON CRA 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	80,00	2,40	0,04	1,00	7,68
			MORTERO SELLO	80,00	2,40	0,02	1,00	3,84
			TOTAL			11,52		
OBSERVACIONES:								
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
								



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION , REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOVERING SAS				NIT O.C.C.		900.104.779-0		CONTRATO N°	005 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.		901.587.366-8		CONTRATO N°	024 DE 2022		
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)				NP10		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)		UNID.	UN		
				CALLE 26A ESTE CON 59-61								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				POZOS	1,00				1,00			
OBSERVACIONES:				TOTAL							1,00	
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)				NP10		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)		UNID.	UN		
 				CALLE 26 ESTE CON 59-61								
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				POZOS					2,00			
OBSERVACIONES:				TOTAL							2,00	

FIRME

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN			
CALLE 25 ESTE CON 56-61								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			POZOS					

F.2/215

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN		
CALLE 34B ESTE CON CALLE 35-57							
			Dimensiones				
			OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD
POZOS							3,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			3,00	
CRA 25A ENTRE 56-59							
			Dimensiones				
OBSERVACIONES			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
POZOS							2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,00	
CRA 26A ENTRE 58-							
			Dimensiones				
OBSERVACIONES			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
POZOS							3,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			3,00	

FLP/B

ADJ

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN					
			CALLE 34B ESTE CON CALLE 59-57 ESCALERA							
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
				POZOS						1,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			1,00				
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN					
			CRA 26 B ENTRE 57-59							
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
				POZOS						4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,00				
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN					
			CRA 27 ENTRE CALLE 63-61							
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
				POZOS						2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,00				

324.3

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN					
			CALLE 430 CON CBA 27							
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)				
				POZOS						2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL							
			TOTAL							
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:							
										
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE							





FECHA	DD	TO	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA									
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REPARACION ACONETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UH			
 			CALLE 28B ESTE CON CALLE 59-81					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			REPARACION ACOMETIDAS	-	-	-	2.00	2.00
			TOTAL		2.00			

OBSERVACIONES:			TOTAL					
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
<div></div>			CALLE 25A ESTE, COR 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		4,00			

FLP/B 

CONSORCIO GAMER SOACHA			MEMORIA DE CÁLCULO					
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
 			CALLE 26 ESTE COR 54-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	2,00	2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL 2,00					
ACTIVIDAD			REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN	
  			CRA 25 CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	3,00	3,00
OBSERVACIONES:			TOTAL 3,00					




 CONSORCIO GAMER SOACHA			MEMORIA DE CÁLCULO					
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
  			CRA 34 B CALLE 59-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS				3,00	3,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				3,00	
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
 			CRA 25 Bx CALLE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS				4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				4,00	

1574

31/12/15



724.8

164

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UH			
CALLE 430 COR CRA 37								
  			Dimensiones					
			OBSERVACIONES	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	3,00	3,00
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			OBSERVACIONES:			TOTAL		
Firma: Director de obra:			TOTAL					
Nombre: WILTON RIVERA			Firma de Interventoria:					
			Nombre: EDGAR URIBE					



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O.C.C.		900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222				
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			NIT O.C.C.		901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022				
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			NP11		VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI		UNID.	M3			
							CRA 26B ENTRE 5-61					
							OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
								Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
							VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	3,00	0,34
OBSERVACIONES:							TOTAL			0,34		
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			NP11		VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI		UNID.	M3			
							CRA 26A ENTRE 59-57					
							OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
								Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
							VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,25	8,00	0,96
OBSERVACIONES:							TOTAL			0,96		

F.P.B.

ATT

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3			
			CRA 26 ENTRE 59-57					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,25	8,00	0,96
OBSERVACIONES:			TOTAL			0,96		
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3			
			CRA 25 ENTRE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA	3,00	0,15	0,25	7,00	0,79
OBSERVACIONES:			TOTAL			0,79		
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3			
			CRA 24 B CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	3,25	0,15	0,25	11,00	1,34
OBSERVACIONES:			TOTAL			1,34		


5/1/13

ATC

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3						
			CALLE 24B ESTE CON CALLE 58-59								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15			0,25	2,00	0,23
OBSERVACIONES:			TOTAL			0,23					
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3						
			CRA 26A ENTRE CALLES 58-59								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				VIGA CONFINAMIENTO	2,70	0,15			0,25	11,00	1,11
OBSERVACIONES:			TOTAL			1,11					
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3						
			CRA 51 ENTRE 27D 27								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
				VIGA CONFINAMIENTO	2,20	0,15			0,25	4,00	0,33
OBSERVACIONES:			TOTAL			0,33					

FAB

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3			
			CRA 51 ENTRE 270-27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	2,30	0,15	0,25	6,00	0,52
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			0,52					
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000	UNID.	M3			
			calle 30 entre 17-210					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	4,00	0,15	0,25	10,00	1,50
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			1,50					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:					
								
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					

MEMORIA DE CÁLCULO




FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAWER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERIN SAS			NIT O.C.C.		900.104.779-0		CONTRATO N°	025 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO GAWER SOACHA			NIT O.C.C.		901.387.366-8		CONTRATO N°	004 DE 2023

ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 CPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	NP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 CPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	ML		
CALLE 36A ESTE CON CALLE 58-59							
 		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
		LONGITUDINAL	81.00			1.00	81.00
		TRANS	2.75			24.00	66.00
TOTAL							147.00

OBSERVACIONES:		CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	NP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	ML	
		CRA 24B ENTRE 59-57					
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)		
		LONGITUDINAL	72,00			1,00	72,00
		TRANS	3,10			19,00	58,90
OBSERVACIONES:		TOTAL				130,90	

32P1B

32P1B

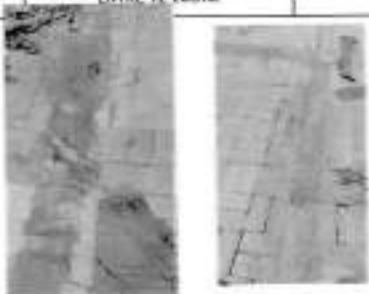ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPCI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	MP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPCI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	M.			
			CALLE 430 CON CRA 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CINTA LONGITUDINAL	80,00			1,00	80,00
			TRANSVERSALES	2,70			25,00	67,50
OBSERVACIONES:			TOTAL			147,50		
ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPCI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	NP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPCI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	M.			
			CALLE 388 ENTRE 37-39					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			CINTA LONGITUDINAL	26,50			1,00	26,50
			TRANSVERSALES	7,00			5,00	35,00
	4,00			5,00	20,00			
OBSERVACIONES:			TOTAL			81,50		
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:					
								
Nombre: WILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					



**"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA
CUNDINAMARCA"**



CONSORCIO GAMER SOACHA

**INFORME TÉCNICO N° 05
5 MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2023**

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÁREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES.....	1
1. INTRODUCCION.....	3
2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA.....	4
1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022.....	4
2.2. GENERALIDADES.....	5
3. OBJETIVOS.....	6
4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.....	7
2.1 LOCALIZACIÓN.....	7
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	9
6. POLIZAS DEL CONTRATO.....	9
7. CAPITULO FINANCIERO.....	12
8. VIAS ASIGNADAS.....	13
9. ACTIVIDADES REALIZADAS.....	16
9. CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	¡Error! Marcador no definido.
10. CONCLUSIONES.....	22
11. ANEXOS.....	22

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localizacion.....	4
Ilustración 2. Localizacion general.....	6
Ilustración 3. Localización Cazuca.....	6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quienes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3443-2021
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ 79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	<u>04 DE MAYO DE 2022</u>
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica
MODIFICATORIO 1	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUSION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	11 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA	4 MESES 31 ENERO DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	31 MAYO DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

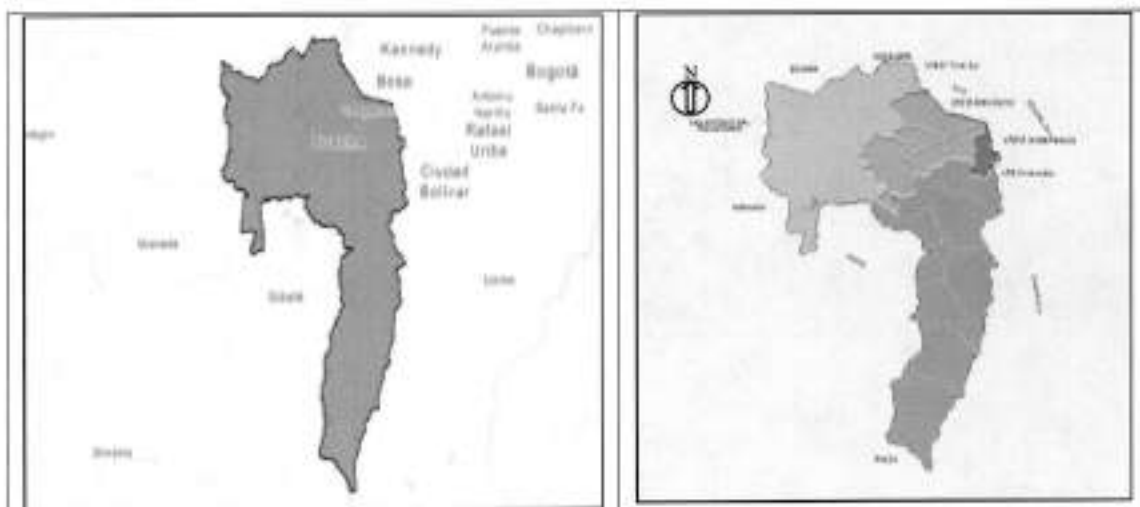


Ilustración 1. Localización

Fuente: <https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f>

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA**" donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 06, durante al periodo comprendido entre 5 Marzo del 2023 al 8 abril de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte del acta N° 6 del contrato de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.


3. OBJETIVOS

Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el periodo de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".

4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto **"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"**. El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).² Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

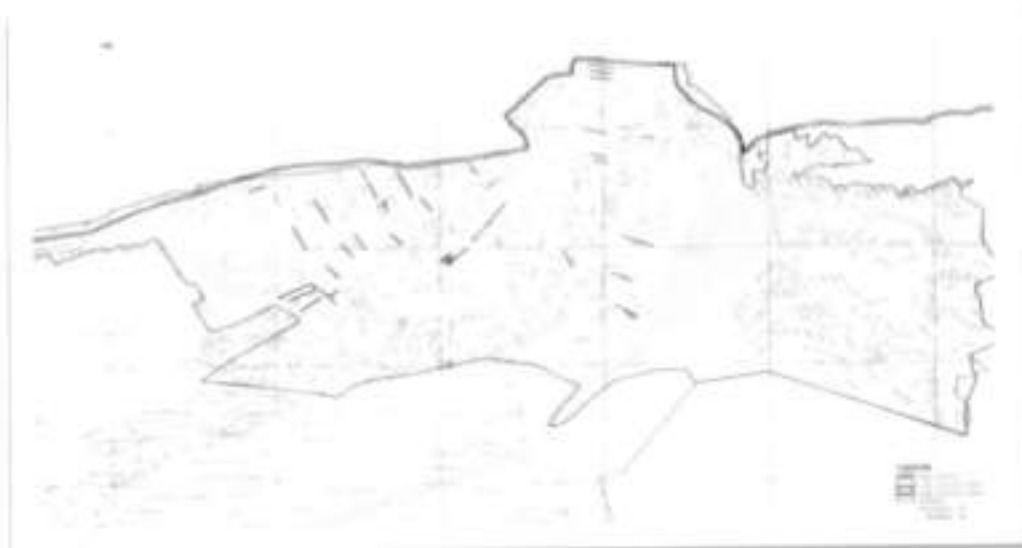

Lustración 2.Localización General



Lustración 3. Localización Cazuca
CAZUCA COMUNA 4.

BARRIO SANTO DOMINGO

Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 E 59-61
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 27 CON 39A -CURA
5	CALLE 27 E 43 D
6	CALLE 43D CON 27
7	CALLE 49 ENTRE 17C-19
8	CRA 19 ENTRE 59-51
9	CALLE 50 17C -21
10	CALLE 51 ENTRE 27-27D
11	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME
12	CRA 21 A ESTE 59-77 C -BOGOTA

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6. POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosereng SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
Coberturas	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

7. CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA, COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	\$ 4.506.567.898,67
Acta por cobrar No. 1	\$ 649.376.068,00
Acta por cobrar No. 2	\$ 727.213.483,00
Acta por cobrar No. 3	\$ 1.003.532.431,00
Acta por cobrar No. 4	\$ 451.030.346
Acta por cobra No .5	\$ 666.543.025
Acta por cobra No .6	\$4864.672.910
Saldo Actual	\$ 524.199.595.67
Avance ejecutado financiero	88.37%

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8. VIAS ASIGNADAS 7

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados. Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

A corte del acta N° 6 en reporte, se relaciona las vías en intervención e intervuidas a la fecha corte .

Tabla 4. Vías en intervención

NUM. CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 55-58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CRA 23A ESTE 55-56 A	SIN INTERVENIR
4	CRA 23 ESTE ENTRE 50 Y 54	SIN INTERVENIR
5	CALLE 59D CON CRA 28 A - 21	SIN INTERVENIR
6	CALLE 40 CRA 29 E -17	INTERVENIDA
7	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
9	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
10	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
11	CRA 24 ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	SIN INTERVENIR
12	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
13	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
14	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
15	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
16	CRA 41 C ESTE ENTRE CALLE 42-41	SIN INTERVENIR
17	CRA 40 ESTE CALLE 41-42	SIN INTERVENIR
18	CRA 26 C ESTE ENTRE 53-57	INTERVENIDA
19	CRA 26 ESTE ENTRE CALLE 58-59	INTERVENIDA
20	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
21	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
22	CALLE 58 ENTRE 26A ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 26 C ESTE ENTRE 53-57	INTERVENIDA
24	CALLE 48 B ENTRE CR 19-21	SIN INTERVENIR
25	CALLE 42 A ENTRE TV 28-28	SIN INTERVENIR
26	CRA 26 C ENTRE CALLE 59 CRA 27C	SIN INTERVENIR
27	CRA 19 ESTE CON 40-50	INTERVENIDA
28	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 30 A SUR VIA CURA	INTERVENIDA
29	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
30	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA
31	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
32	CRA 27D ESTE CON CALLE 44 -50	INTERVENIDA
33	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
34	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
35	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
36	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
37	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
38	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
39	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
40	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
41	CALLE 56 A CRA 26-27	INTERVENIDA
42	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA
43	CALLE 59B CRA 27 ESTE -CRA 27A ESTE	INTERVENIDA
44	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
45	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
46	CALLE 43 BIS ENTRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
47	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
48	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
49	CARRERA 32 A-CU 44 59	FINALIZADA

51	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
52	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
53	CRA 37 ESTE DG 43J-DG 45	FINALIZADA
54	CALLE 50 CRA 32 A CRA 34	FINALIZADA
55	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
56	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43J	FINALIZADA
57	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
58	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA
59	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
60	CRA 28 ESTE CL 56A CL 59	FINALIZADA
61	CALLE 53 30-29	FINALIZADA
62	CRA 30 ESTE-CL 53 - CLLE 44	FINALIZADA
63	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
64	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
65	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
66	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
67	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 B Y 43F	FINALIZADA
68	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
69	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
70	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA
71	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
72	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
73	CRA 17 B-ESTE ENTRE CALLE 60A-61	FINALIZADA
74	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A-61	FINALIZADA
75	CRA 17 A-ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
77	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
78	CRA 26 C este CLL 59	ENTREGADA
79	CRA 21 B este desde CLL 61 hasta CLL 90	ENTREGADA
80	CRA 33 A este hasta CLL 44	ENTREGADA
81	CRA 33 este hasta CLL 44	ENTREGADA
82	CRA 27 B este CLL 59	ENTREGADA
83	CRA 23A ESTE ENTRE CALLE 59 -73C-8TA	ENTREGADA
84	CRA 19 ENTRE CALLE 48-50	INTERVENIDA

Fuente: consorcio gamer Soacha

9. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas en los barrios Santo Domingo, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán I y Villas de Casa Loma, relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 B ENTRE 59-61
2	CRA 24B ENTRE 57-59
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 26 A ENTRE 59-61
5	CRA 26ª ENTRE 57-59
6	CRA 26 B ENTRE 57-61
7	CALLE 27 E 43 D
8	CALLE 43D CON 27
9	CALLE 49 ENTRE 17C-19
10	CRA 19 ENTRE 59-51
11	CALLE 50 17C -21
12	CALLE 51 ENTRE 27-27D
13	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME

ACTIVIDADES DE OBRA EN REPORTE DEL ACTA N° 6

- Excavaciones :



EXCAVACION CONGLOMERADO

- Fundida de las cunetas:



- Sub base granular




- Concretos clase D 3000 psi





- Acero de refuerzo.

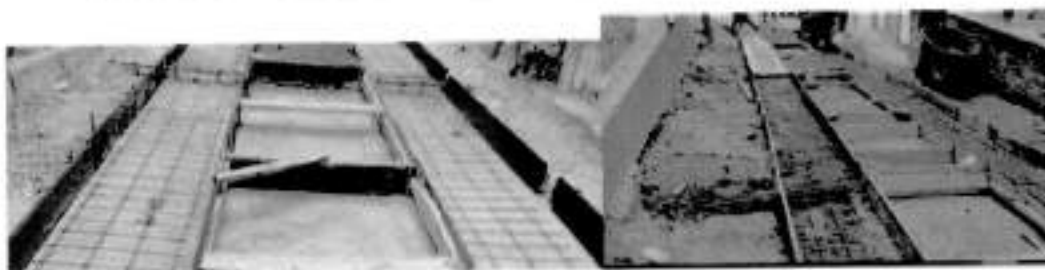


- Concreto ciclópeo 2500 psi



- Bordillo de confinamiento



- Malla electrosoldada de 5/16 e=15

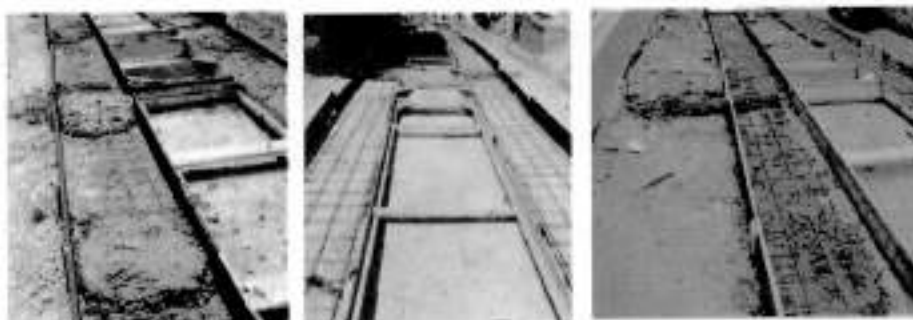


- Mortero 1:4



- Nivelación de pozos de inspección



- Viga de confinamiento de 15*25cm de 3000 psi



- Cintas de ajuste e concreto de 2500 psi



Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 7. Comités

COMITÉ N.	FECHA
24	13/03/2023
25	12/03/2023
26	30/03/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.
- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.
- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos items de la presente acta.

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales
Reporte de afectaciones por lluvia
Relación de material para disposición final
RUT
RIT



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

LEYENDA

VIAS_TOTALES_MARZO2023

EJECUCIÓN

- ENTREGADA
- FINALIZADA
- INTERVENIDA
- SIN INTERVENIR



ANEXOS
CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS


CONSORCIO GAMER SOACHA

**CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES**


Bogotá, abril 10 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8**; y yo **ADRIANA BONILLA** en mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **diez (10)** días del mes de **abril** de 2023.



MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal



ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
Certificación Decreto 1070 de 2013, Clasificación de Personas Naturales

Soacha, 10 de abril de 2023

Señores

Yo MILTON EDUARDO RIVERA RINCON, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 79.205.702, expedida en Soacha, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 1 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por dicho periodo fiscal: SI (x) NO ()

Mis ingresos en el año inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos en dicho periodo fiscal: SI () NO (x)

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior: SI (x) NO ()

Mi patrimonio bruto en el último día del año gravable 2021 excedía de 4.500 UVT (\$ 163.386.000). SI (x) NO ()

Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI () NO (x)

Mis consumos mediante tarjeta de crédito excedieron de 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI (x) NO ()

El valor total de mis compras y consumos supero las 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedió de 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

Que en la ejecución del presente contrato no he subcontratado 2 o más trabajadores. SI (x) NO ()



Nombre: MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
CC. 79.205.702 de Soacha

**ACTAS DE COMITÉ
TÉCNICOS**
CONSORCIO GAMER SOACHA



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: EPUXUA.

HORA DE INICIO: 8:00 a.m.

FECHA: 03-03-2023

HORA DE TERMINACIÓN:

ELABORADO POR:

NÚMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión de obra para verificación de avances de obra y compromisos planteados.

AGENDA PROPUESTA

1.

2.

3.

4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité verificando compromisos del acta anterior. En la tra 20 con el 451 se depende de una visita por parte de merjos para tener un concepto para continuar con la construcción de la vía que en la actualidad se encuentra en subleas. En la vía se plantea canal a ambos costados en concreto las aguas a la caga en la esquina de la tra 27 a.

En la tra 27 a este con el 51 va en paros de ardoquin hasta el canto (ardoguin pendiente) después del canto se instala sistema en cintas de concreto.

En la tra 26 a este el 51 entrega presupuesto con caminos de ardoquin por parte del conchato.

En la Cra 24 este con ell 5a definir templan para dar acceso a los garages de la vivienda, pero estos trabajos salen del perimetro de la via por lo cual no se realizaran estas actividades.

En la Cra 24 este con ell 5a se realizan trabajos en cintas de concreto presenten presupuesto con todas las actividades ejecutadas por el contratista.

Presentar presupuesto para la via de la Cra 22c hasta la ell 5a. biallas de 40cm de ancho con espesas de 20 cm con doble malla #7, subbase de 25 cm.

En la Cra 21a este entre ell 5a y Cra 22c hacer presupuesto de via para pavicacion en cinta de concreto.


En la Cra 17a este con ell 60, se presenta un dano en tuberia de aguas negras, para este arreglo el contratista presentar presupuesto a la propiedad para el arreglo sin afectar la via.


Para la instalacion de adoquin por parte de la comunidad, se da un tiempo de 40 dias para la instalacion, si esta instalacion no se cumple en el plazo, la comunidad asumira la construcccion de canchales y cintas de confinamiento.

Borro tanto Domingo, presentar presupuesto de Cra 32a este y Cra 33 este, en cintas de 60 cm en concreto. Cra 27b este con ell 3a presupuesto en pisos de adoquin.

Proyectar la ell 3a con Cra 27a este, en cintas de concreto de 60 cm.

En la via ell 43d con Cra 27 se abarca la instalacion de bordillo para el confinamiento de la via. bordillo 17-80.

	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
San Pablo Cárdenas	EPUXUA	3124821154	
Diego Puentes	EPUXUA	3166216513	
Alejandro Yule	DEV	313-8421156	
Guido Tulcan	Egoipamiento	318-2657489	
Milton Rivas	Contratista	318-3467636	
Sebastián Ospina	Interventor Cocosem	3105709036	
Gerardo Quintero	Contratista	321-2759255	



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

208



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epxuca	HORA DE INICIO: 2:30 pm.
FECHA: 13 de Marzo 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoría.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar estado actual contrato de Obra 025 de 2020.

AGENDA PROPUESTA

1. Verificación Compromisos del acta anterior.
2. Estado Actual Contratos Obra e Interventoría.
3. Estado Solicitud NPS.
- 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité de obra revisando los compromisos del acta anterior. Solicitando la entrega de topografía de la Cra 27 D con oll 43 F. la cual será enviada a la entidad a más tardar el día 14 de marzo.

Se reusa y se solicita a la Secretaría de Infraestructura la carta de Gestión de riesgo a la vía Cra 27 B, ya que con las lluvias presentadas se está afectando la vía.

Se habla de la continuación de los gaviones en la Cra 50 entre Cra 32 A este y Cra 31, el contratista informa que se iniciarán actividades en este sector en cuanto seces las lluvias para no inestabilizar más la vía.

Se solicita un cronograma con la totalidad de las vías y las vías de la adición.

Se da claridad de que en la Cra 22 B este se va a realizar el arreglo de la vía en sistema de puros de adoquin.

Se solicita un balance con lo ejecutado, en ejecución y por ejecutar de las vías entregadas y las de proyección para adición. (cantidad realizada por la entidad al contratista)

Se realiza una presentación donde se evidencian las afectaciones por lluvias del mes de marzo a la fecha.

La entidad informa que actualmente están realizando entregas de adoquin en las Carlos Bolán 1.

La arquitecta informa que la comunidad no está realizando correctamente el mortero ya que no se está pizando antes de la instalación del adoquin.



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton E. Rivera R.	Contratista	315.346.76.36	
Laura Ospina	R. Inmuentona	3105709086	
Guido Tulcan	Direc. Equipam.	3112657489	
Juan Pablo Carr	Epoxua	3124821154	
Diego Fuentes	EPUXUA	3166216313	
Néstor	Contratista	3102935197	
Alejandro Yate	D.E.V	313-8421556	


	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 2:45 pm.
FECHA: 21 de Mayo 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Intenstoma.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	VERIFICACION. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	Validación del estado actual de las vías intervinientes.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>Se inicia el comité a las 2:45 pm, se inicia hablando de la ctra 9 donde se está instalando Sardinell por parte del certificador de obra, la inspectora de obras solicita los diseños de los cuneros que se van a construir y se va a hacer una visita por parte de epuxua y la entidad para definir los diseños de los cuneros. Se retomaron actividades el día jueves por validaciones de topografía y desvíos.</p> <p>Se valora el estado actual de las vías intervinientes en los carter qum I. en el barrio Los Carter galon II donde no se ha instalado adecan por parte de la comunidad.</p> <p>Se solicita el concepto de riesgo en la ctra 27 D.</p>	



ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Nubia Roca	Contratista	362935157	
Laura Ospina	Interventora	3105709036	
Guido Tulcain	Direcc. Equipam.	3112657189	
Yanis A. Rojas	EPUXUA	3166216313	
Alexandro Yate	Dirección Ejecutiva	313-24121556	

LUGAR DE REUNIÓN: <i>Epuxua.</i>	HORA DE INICIO: <i>8 20 am.</i>
FECHA: <i>30 de Mayo 2023.</i>	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: <i>Epuxua (Interventora).</i>	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación del estado actual de la obra. Contrato 025 y Contrato 024 de 2022.

AGENDA PROPUESTA

- Verificación del Acta Anterior*
- Estado actual del Contrato de Obra e Interventoría*
-
-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité a las 8:20 am, revisando los compromisos del acta anterior y se valida el estado de la obra q, donde se define que a la fecha solo se realiza la instalación del baril.

Se habla del estado actual de la Solicitud de los NPS, la secretaria informa que para esta semana dares respuesta.

Se revisa la vía el es desde la 24h este. y era 26 este. para validar su intervención.

Se realiza una presentación del estado actual de las vías y los frentes de trabajo con los que se están realizando las actividades por parte de la Interventoría.



Se informa que ya se retoman actividades el el barrio Loma Linda.

Se realizará la verificación de la topografía para realizar el
diseño de las escaleras de la Crea 27 D con alt 43 F
Según las instrucciones dadas por la Secretaría de
Infraestructura y Obras.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
EDGAR E. HERRERA	INTERVENCIÓN COORDINADORA	310 803 29 25	
Guido Tulcan	Dircc. Equip	311 26 57 48 9	
Alejandro Yule	DEV	313 842 15 56	
MARCO A. RESTES	EPUXUA	316 621 63 13	
Carlo Ines Caceres	Residente Interventora.	3105 700 30	
Juan Pablo Caceres	Epuxua	312 48 21 54	
/	/	/	/
/	/	/	/





ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

[illegible]

INFORME
FACTOR CLIMATICO
CONSORCIO GAMER SOACHA

REPORTE LLUVIAS- RENIVELACION SUBBASE	
Contrato 024 del 2022	marzo del 2023
Informe Técnico de Lluvia y su impacto en el Material de Subbase	
<p>Introducción: Las lluvias presentadas durante el mes de marzo y principios de abril del 2023 reflejaron un impacto significativo en el material de subbase en las vías del barrio Luis Carlos Galán I y II al igual que en casa loma. Los efectos de la lluvia incluyen socavación, erosión, arrastre de finos y pérdida de material por el agua, generando la necesidad de reacondicionar el material de subbase.</p> <p>Análisis: Debido a la acción de las corrientes de agua que fluyen a lo largo de las superficies de la vía, se genera socavación en la superficie de la subbase, esto evidenciado en la pérdida de material (en su mayoría material fino) generando zanjas y exponiendo el material grueso. Otro de los factores mas significativos en la subbase, fue la erosión generada por el impacto del agua lluvia de las casas hacia la superficie, debilitando la subbase hasta que el constante impacto rompe la estabilidad del material, generando así que la subbase pierda su densidad y empiece a saturarse por la filtración del agua. Se ha solicitado por parte del contratista la canalización de las aguas lluvias, en las vías afectadas se ha echo caso omiso a esta petición. Las vías afectadas por estos fenómenos fueron:</p>	

Cra 24 B entre 59-61	
	
<p>ver memoria</p> <p>« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso. « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación</p>	
CRA 24 B esta CLL 55-56a	
	
<p>ver memorias</p>	

- « Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la Cra 24b , el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas en la subbase.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 25 este CLL 58 61



ver memorias

- « Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la cra 25, el agua se acumula generando daños y afectaciones en la subrasante
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua q provocando saturación y fallos en el material
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la excavación del material saturado y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 26 este CLL 61



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que ha generado saturación y fallos en el material
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la excavación del material saturado y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación en la subrasante

CRA 26 A este desde CLL 55 hasta CLL 57



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que ha generado saturación y fallos en el material
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 26 A este CLL 61



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la edición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

calle 17 este con cra 43d



ver memorias

294

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 26 H este CLL 59-61



ver memorias :

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CLL 43 H Cra 27



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

28

cra 19 con calle 49-50	
	
ver memoria	
<p>« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.</p> <p>« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.</p> <p>« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación</p>	

cra 27 entre 50-51	
	
ver memorias	
<p>« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.</p> <p>« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.</p> <p>« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genere saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.</p> <p>« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación</p>	

CLL 56 A con CRA 26 C este		
		
ver memorias		

226

« Debido a la elevada pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la CRA 56 a este, el agua se acumula generando un caudal elevado que genera ranjas en la subbase y revelando la subrasante.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación nuevamente por la demora en instalación de adoquín por parte de la comunidad, el cual a la fecha aun no ha sido terminada.

CLL 56 A con CRA 26 C este



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación, compactación y estabilización por debajo de cintas con rajón.

cra 51 entre 27d 27



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación

272

Conclusión:

Ante los efectos negativos generados por la lluvia en el material de subbase, se llevó a cabo una solución eficaz para garantizar su estabilidad y durabilidad. Se realizó el levantamiento del material afectado en algunas vías, se eliminó el material que ya no tenía presencia de finos o se encontraba saturado, se llevó a cabo la nivelación de subbase, que se encontraba por debajo del nivel requerido, se agregó más material de subbase y finalmente se compactó. De esta manera, se logró resolver los problemas generados por la lluvia en el material y garantizar la estabilidad de la estructura.

leonardo devia
reporte

228

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

CARGUES marzo 5 a abril 8

CONTRATO	UBICACIÓN OBRA	N°de RECIBO	METROS ³
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46180	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46201	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46179	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46196	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46197	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46176	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46177	15
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46195	7
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46194	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46178	15
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46193	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46192	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46175	15
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46174	15
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46191	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46170	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46167	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46175	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46169	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46166	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46168	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46198	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46199	7

Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46202	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46203	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46200	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46221	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46223	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46222	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46224	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46225	7
	para comunidad via social blanca		45
			390
		M/K	15
			5850



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escritura Municipal
17.410.000.000
Alcaldía Municipal de
Nariño 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46180

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escritura Municipal
17.410.000.000
Alcaldía Municipal de
Nariño 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46201

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escritura Municipal
17.410.000.000
Alcaldía Municipal de
Nariño 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46179

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP



Servicio de Disposición
Final de Escombros

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46196

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46197

FECHA

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46176

FECHA

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR



CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Sr. Alcalde
El Ayuntamiento
Alcaldía Municipal de
San Carlos, 2902001
11 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46195

ORDEN CLIENTE No.

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Sr. Alcalde
El Ayuntamiento
Alcaldía Municipal de
San Carlos, 2902001
11 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46194

ORDEN CLIENTE No.

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Alcalde Municipal
El Señor Ramón
Alcalde Municipal de
Nacha 1201-01
23 de Diciembre de 2016

FECHA
ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46178

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPEJADO POR:

RECIBIDO POR: **MAGIR SAS. ESP**
Servicio de Disposición
Final de Escombros



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Alcalde Municipal
El Señor Ramón
Alcalde Municipal de
Nacha 1201-01
23 de Diciembre de 2016

FECHA
ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46193

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

RECIBIDO POR: **MAGIR SAS. ESP**



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Alcalde Municipal
El Señor Ramón
Alcalde Municipal de
Nacha 1201-01
23 de Diciembre de 2016

FECHA
ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46192

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

RECIBIDO POR: **MAGIR SAS. ESP**

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46175

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPOCHADO POR:



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombros Municipal
El Alamo, Recumbur
Alcaldía Municipal de
Sancho (202 del
21 de Diciembre de 2010

FECHA

ORDEN CLIENTE Nº

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46174

CLIENTE

OBRA


DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPOCHADO POR:



MAGIR SAS. ESP

Escombros Municipal
El Alamo, Recumbur
Alcaldía Municipal de
Sancho (202 del
21 de Diciembre de 2010

FECHA

ORDEN CLIENTE Nº

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46191

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Municipal
El Alcaide, Pineda
Alcalde Municipal de
Sancho 120, del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46170

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPEJADO POR:	

RECIBIDO POR **MAGIR SAS. ESP**
SERVICIO DE DISPOSICION
FINAL DE ESCOMBROS



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Municipal
El Alcaide, Pineda
Alcalde Municipal de
Sancho 120, del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46167

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Municipal
El Alcaide, Pineda
Alcalde Municipal de
Sancho 120, del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46172

ORDEN CLIENTE Nº

--

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Finca de ExplotaciónInspección Municipal
C/Alfonso Rodríguez
Alameda Municipal de
Sancho 1.002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

21	12	2016
----	----	------

ORDEN CLIENTE No

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No 46169

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
En Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Finca de ExplotaciónInspección Municipal
C/Alfonso Rodríguez
Alameda Municipal de
Sancho 1.002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

21	12	2016
----	----	------

ORDEN CLIENTE No

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No 46166

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Finca de ExplotaciónInspección Municipal
C/Alfonso Rodríguez
Alameda Municipal de
Sancho 1.002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

21	12	2016
----	----	------

ORDEN CLIENTE No

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No 46168

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fiscal de ExpendidosExpendido Municipal
El Alamo, Brevetas
Avenida Municipal de
Sancho 1203 44
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

No 46198

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESTACHADO POR:

RECIBIDO

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fiscal de ExpendidosExpendido Municipal
El Alamo, Brevetas
Avenida Municipal de
Sancho 1203 44
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

No 46199

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fiscal de ExpendidosExpendido Municipal
El Alamo, Brevetas
Avenida Municipal de
Sancho 1203 44
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

No 46202

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46203

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECEBIDO POR MAGIR SAS. ESP

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Distribución
Final de EscombrosExcmo. Alcalde Municipal
El Alamo, Resolución
Alcaldía Municipal de
Soncha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46200

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECEBIDO POR MAGIR SAS. ESP

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Distribución
Final de EscombrosExcmo. Alcalde Municipal
El Alamo, Resolución
Alcaldía Municipal de
Soncha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46221

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
Edificio Municipal de
Servicio 1204 del
11 de Diciembre de 2014

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46223

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBI

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
Edificio Municipal de
Servicio 1204 del
11 de Diciembre de 2014

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46222

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
Edificio Municipal de
Servicio 1204 del
11 de Diciembre de 2014

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46224

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Transitorio Municipal
El Alcazar, Restricción
Alcalde Municipal de
Sancho 1200 del
21 de noviembre de 2010

FECHA

3/4/22

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46225

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE	Carmelo Gómez Sánchez	
OBRA	Pavimentación C/A 2072	
DIRECCION	Carmelo Gómez Sánchez	
MATERIAL	Pavimentación	
PLACA VEHICULO	PLA 103	MJ
CONDUCTOR	Luis	
DESPECHADO POR:	Luis	
RECIBIDO	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros	

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14855262869



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 8 7 3 6 6

8

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO GAMER SOACHA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601

42. Correo electrónico

gamevng.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 6 3 4 1 0 4 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 2 2 0 4 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8

07- Retención en la fuente o título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogenea

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2022-06-26 / 09:21:28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

584. Nombre RINCON ACOSTA DANIELA

585. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14855262869



(415)71672124855262869

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 8 7 3 6 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuesto de Renta

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

65. Fondo

68. Sin personería jurídica

3

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2 0 4 0 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 2 0 4 2 2

77. No. Matricula mercantil

0

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

89. Desde

2 0 2 2 0 4 2 2

91. Hasta

2 0 2 4 1 0 2 2

Entidad de vigilancia y control

98. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855262869



1415177072124598640010 0000014855262869

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Succión electrónica

9 0 1 5 8 7 3 6 6 8

Impuesto de Timbre

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 4 2 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 0 6 7 0 2	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RIVERA	105. Segundo apellido RINCON	106. Primer nombre MILTON	107. Otros nombres EDUARDO
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL.	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 4 2 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 0 5 4 3 8 0 4	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BELLO	105. Segundo apellido RIVERA	106. Primer nombre DEICY	107. Otros nombres LORENA
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855262869



(415)7707212489984(8020) 000001485526286 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

13. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 8 7 3 6 6 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 0 8 2 1 7 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social GAMEVING CONSTRUCCION SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 4 2 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	112. Número de identificación 1 3 7 9 2 0 5 7 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido RIVERA	116. Segundo apellido RINCON	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 4 2 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA



SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Secretaría
de Hacienda

Dirección de
Impuestos Municipales

01

**FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA**

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. DIFUSIÓN INICIAL		
1. Impugnación ☒	2. Negociación ☐	3. Caso de Actividades ☐
B. EL USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS AJENALES, TÉCNICO, TECNOLÓGICO O PROFESIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO SI ☐ NO ☒		
4. Nombre de la Entidad		
5. Dirección de la entidad		
6. Número de contrato		
7. Fecha del Contrato		
C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
8. Tipo de Documento		
9. Número de Documento		
10. Fecha de nacimiento		
11. Régimen Tributario		
12. Régimen Tributario		
13. Régimen Tributario		
14. Régimen Tributario		
15. Régimen Tributario		
16. Régimen Tributario		
17. Régimen Tributario		
18. Régimen Tributario		
19. Régimen Tributario		
20. Régimen Tributario		
21. Régimen Tributario		
22. Régimen Tributario		
23. Régimen Tributario		
24. Régimen Tributario		
25. Régimen Tributario		
26. Régimen Tributario		
27. Régimen Tributario		
28. Régimen Tributario		
29. Régimen Tributario		
30. Régimen Tributario		
31. Régimen Tributario		
32. Régimen Tributario		
33. Régimen Tributario		
34. Régimen Tributario		
35. Régimen Tributario		
36. Régimen Tributario		
37. Régimen Tributario		
38. Régimen Tributario		
39. Régimen Tributario		
40. Régimen Tributario		
41. Régimen Tributario		
42. Régimen Tributario		
43. Régimen Tributario		
44. Régimen Tributario		
45. Régimen Tributario		
46. Régimen Tributario		
47. Régimen Tributario		
48. Régimen Tributario		
49. Régimen Tributario		
50. Régimen Tributario		
51. Régimen Tributario		
52. Régimen Tributario		
53. Régimen Tributario		
54. Régimen Tributario		
55. Régimen Tributario		
56. Régimen Tributario		
57. Régimen Tributario		
58. Régimen Tributario		
59. Régimen Tributario		
60. Régimen Tributario		
61. Régimen Tributario		
62. Régimen Tributario		
63. Régimen Tributario		
64. Régimen Tributario		
65. Régimen Tributario		
66. Régimen Tributario		
67. Régimen Tributario		
68. Régimen Tributario		
69. Régimen Tributario		
70. Régimen Tributario		
71. Régimen Tributario		
72. Régimen Tributario		
73. Régimen Tributario		
74. Régimen Tributario		
75. Régimen Tributario		
76. Régimen Tributario		
77. Régimen Tributario		
78. Régimen Tributario		
79. Régimen Tributario		
80. Régimen Tributario		
81. Régimen Tributario		
82. Régimen Tributario		
83. Régimen Tributario		
84. Régimen Tributario		
85. Régimen Tributario		
86. Régimen Tributario		
87. Régimen Tributario		
88. Régimen Tributario		
89. Régimen Tributario		
90. Régimen Tributario		
91. Régimen Tributario		
92. Régimen Tributario		
93. Régimen Tributario		
94. Régimen Tributario		
95. Régimen Tributario		
96. Régimen Tributario		
97. Régimen Tributario		
98. Régimen Tributario		
99. Régimen Tributario		
100. Régimen Tributario		

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!



Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

247

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA[illegible]

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

4. FORMA DE UNO		5. Tipo de Actividad	
1. Inscripción ☒		2. Novedades ☐	
3. Caso de Actividades ☐			
6.1 Sujeto Pasivo ICA? ☐		6.2 Agente de retención ☒	
6.3 Impuesto Delineado Urbana ☐		6.4 Otro ☐	
6.5 Impuesto Delineado Exterior Visual ☐		6.6 Cui? ☐	
7. ES UN PRESTADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI ☐ NO ☒			
8. Nombre de la Entidad		9. Dirección de la entidad	
10. Número de contrato		11. Fecha del Contrato	
12. DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
13. Tipo de Documento		14. Naturaleza Jurídica	
15. Número de Documento		16. Régimen Tributario	
17. Fecha de Emisión		18. Régimen Tributario	
19. Régimen Tributario		20. Régimen Tributario	
21. Nombre y Apellido del Representante			
22. Número de Registro Mercantil			
23. Fecha de Emisión			
24. Estado del Registro Mercantil			
25. Departamento			
26. Municipio			
27. Calle			
28. Teléfono			
29. Correo Electrónico			
30. Tipo de Establecimiento			
31. Dirección del Establecimiento			
32. Número de Registro Mercantil Establecimiento			
33. Fecha de Emisión del Establecimiento			
34. Estado del Registro Mercantil			
35. Tipo de Actividad			
36. Fecha de Inicio de Actividades en el Municipio de Soacha			
37. Código y Descripción de la Actividad Económica (Código CNAE que aparece en el RUT)			
38. Construcción de obras de ingeniería civil			
39. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO			
40. Nombre y Apellido			
41. Tipo y Número de Identificación			
42. No. Tarjeta Profesional			
43. No. Tarjeta Profesional			
44. NOVEDADES (TRANSITO - CAMBIO RUTOS Y/O CNAE - CAMBIO DIRECCIÓN - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACIÓN DE DATOS)			
45. Tipo de Documento			
46. Tipo de Documento			
47. Tipo de Documento			
48. Tipo de Documento			
49. Tipo de Documento			
50. Tipo de Documento			
51. Tipo de Documento			
52. Tipo de Documento			
53. Tipo de Documento			
54. Tipo de Documento			
55. Tipo de Documento			
56. Tipo de Documento			
57. Tipo de Documento			
58. Tipo de Documento			
59. Tipo de Documento			
60. Tipo de Documento			
61. Tipo de Documento			
62. Tipo de Documento			
63. Tipo de Documento			
64. Tipo de Documento			
65. Tipo de Documento			
66. Tipo de Documento			
67. Tipo de Documento			
68. Tipo de Documento			
69. Tipo de Documento			
70. Tipo de Documento			
71. Tipo de Documento			
72. Tipo de Documento			
73. Tipo de Documento			
74. Tipo de Documento			
75. Tipo de Documento			
76. Tipo de Documento			
77. Tipo de Documento			
78. Tipo de Documento			
79. Tipo de Documento			
80. Tipo de Documento			
81. Tipo de Documento			
82. Tipo de Documento			
83. Tipo de Documento			
84. Tipo de Documento			
85. Tipo de Documento			
86. Tipo de Documento			
87. Tipo de Documento			
88. Tipo de Documento			
89. Tipo de Documento			
90. Tipo de Documento			
91. Tipo de Documento			
92. Tipo de Documento			
93. Tipo de Documento			
94. Tipo de Documento			
95. Tipo de Documento			
96. Tipo de Documento			
97. Tipo de Documento			
98. Tipo de Documento			
99. Tipo de Documento			
100. Tipo de Documento			

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO
AVANZA ▶▶

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326906 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasocha.gov.co

20



SOACHA
MUNICIPIO MUNICIPAL
CALLE 100 No. 100

Secretaría
de Hacienda

Dirección de
Impuestos Municipales

01

**FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA**

FORMULARIO No. 2210010585

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

1. Inscripción ☒		2. Renovación ☐		3. Cese de Actividades ☐	
1.1 Sujeto Pasivo IVA ☐		1.2 Agente de retención ☒		1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual ☐	
1.4 Impuesto Delineación Urbana ☐		1.5 Otro ☐		Cual ☐	
4. ES OTRO PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? ☐ SI ☒ NO					
2. Nombre de la Entidad		4. Número de contrato		5. Fecha del Contrato	
3. Dirección de la entidad					
C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE					
6. Tipo de Documento: 11. ☐ 12. ☒ 13. ☐ No. 001587366		7. Naturaleza jurídica: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒ Sociedad de Facto ☐		8. Régimen Tributario: Régimen Preconstituido ☐ Régimen Común ☐ Régimen Simple de Tributación ☐ Sujeto de Tributación ☐	
9. Nombre y apellido o Razón Social: CONSORCIO GAMER SOACHA					
10. Número de Registro Mercantil: BOGOTÁ		11. Fecha de matrícula: 01/08/2012		12. Estado del registro mercantil: Vigente ☐ Revocado ☐	
13. Dirección de constitución jurídica: CL 44C 45 53 IN 2 AP 601		14. Departamento: CUNDINAMARCA		15. Municipio: SOACHA	
16. Dirección comercial:		17. Municipio: SOACHA		18. Barrio: CENTRO	
19. Teléfono fijo a móvil: 3150358463		20. Teléfono celular: 3183660028		21. Correo Electrónico: CONTABILIDADGRUPOICA@GMAIL.COM	
22. ¿EXISTE OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? ☐ SI ☒ NO					
23. Nombre del establecimiento comercial:					
24. Dirección del establecimiento comercial: CL 44C 45 53 IN 2 AP 601		25. Barrio:		26. Correo:	
27. Número de Registro Mercantil del establecimiento: Unidad		28. Fecha de matrícula del establecimiento: 01/08/2012		29. Estado del registro mercantil: Vigente ☐ Revocado ☐	
D. ACTIVIDAD ECONOMICA					
30. Tipo de actividad: Industria ☐ Comercio ☐ Servicios ☒ Otro ☐					
31. Fecha de inicio de actividades en el Municipio de Soacha: 01/08/2012					
32. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el MAP): Código del Principal: 4290 Descripción: Construcción de obras de ingeniería civil.					
E. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO					
33. Nombres y Apellidos: 1. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON 2. ADRIANA BONELA BERNAL		34. Tipo y Número de identificación: 1. CC: 75005792 2. CC: 51920508		35. CP: 1. 1 2. 2	
				36. No. Tarjeta Profesional: 1. 66341-T	
F. NOVEDADES (TRANSPIE) CAMBIO RAZÓN SOCIAL CAMBIO DIRECCIÓN CAMBIO RÉGIMEN ACTUALIZACIÓN DE DATOS					
37. Inscripción ☐		38. Cambio Razón Social ☐		39. Cambio Dirección ☐	
40. Cambio Régimen ☐		41. Cambio de datos ☐		42. Otro ☐	
43. Tipo de documento: 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐					
44. Nombre y Apellidos del Nuevo Propietario:		45. Nombre Razón social:		46. Número de Registro Mercantil:	
47. Fecha de matrícula:		48. Cambio de régimen: Régimen Preconstituido ☐ Régimen Común ☐ Régimen Simple de Tributación ☐ Sujeto de Tributación ☐		49. Barrio:	
50. Nueva Dirección:		51. Barrio:		52. Correo:	
53. Si atiende la causa, si diligencia ante campo la información a actualizar:		54. Fecha:			
G. Cese de Actividades					
55. Causa: Fuerza ☐ Excesión ☐ Liquidación ☐ Cese de actividad ☐ Cierre del establecimiento ☐ Otro ☐					
56. Fecha de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio:		57. Fecha de Cierre del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha:			
58. Firma:		59. Firma del Representante Legal:			
60. Fecha:		61. Fecha:			

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO

**¡El pago oportuno de sus impuestos
genera Bienestar para todos!**

**EL CAMBIO
AVANZA**

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

CONTRATO No.		024 2022		FECHA		4/05/2022		PLAZO DE EJECUCION		360	
CONTRATISTA		CONSORCIO GAMER SOACHA									
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA									
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIAN PABLO CAÑON									
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	1/06/2022
	DESDE	1/06/2022
	HASTA	31/05/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	129
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	60

PRORROGA No. 01	FECHA	PRORROGA EN DIAS	120
PRORROGA No. 02	FECHA	PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 03	FECHA	PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	TOTAL PRORROGAS EN DIAS	120
	FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/05/2023
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	120

VALOR DEL CONTRATO			\$ 4,506,567,896.00
ADICION No. 01	FECHA		
ADICION No. 02	FECHA		
ADICION No. 03	FECHA		
VALOR TOTAL ADICIONES			SIN ADICIONES
VALOR TOTAL CONTRATO			\$ 4,506,567,896.00


[illegible]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	4.505.567.898,00	100%
TOTAL EJECUTADO	\$	3.982.368.305,00	88,37%
TOTAL POR EJECUTAR	\$	524.199.593,00	11,63%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		300	100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		240	80%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		60	20%

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



Juan Pablo Cañon
JUAN PABLO CAÑON

JUAN PABLO CAÑON
Nombre y Firma Supervisor

10/04/2023
Fecha



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO



SOACHA

EL CAMBIO
AVANZA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 3443-2021

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato de obra No. 024 - 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 024-2022	CONSORCIO GAMER SOACHA	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No 6 , Certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre 5 marzo de 2023 al 8 de abril de 2023 , relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
88.37%	07	\$ 484.672.910

fuelle, Contrato N. 3443 DE 2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria de Infraestructura – Obra, Interventoria

SUBTOTAL FACTURA	\$ 484.672.910
IVA	\$ 0
TOTAL, FACTURA	\$ 484.672.910

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.


JUAN PABLO CAÑON
Supervisor Contrato N° 024 DE 2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		024-2022	CDP RP	044-2022 2022-0077	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 4.506.57.898.67			
NOMBRE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO GAMER SOCHA					IDENTIFICACIÓN: 901.587.366 8					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado								
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.					FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
					DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
					01	08	2022	31	MAYO	2023
SUBGERENCIA		Administrativa		Centro de Costo (área)			Administrativa			
VALOR ADICIONES				N° CDP-FECHA						
PRORROGAS				FECHA						
MODIFICACIONES:				Agosto 12 de 2022						

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON
CARGO	SUPERVISOR	CARGO	SUPERVISOR

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 484.672.910	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (3/3/2023)	CUENTA DE COBRO No.	CGS No 7
	HASTA (08/04/2023)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	10 abril 2023

ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE

EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$3.982.368.303	SALDO POR EJECUTAR	\$ 524.199.597,57
----------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Se ejecutan según cronograma de obra
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Se realiza durante el inicio de obra
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSPORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMIENTAS, OBRA DE MANO, MANEJO, VIGILANCIA, Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES, ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Se verifica con interventoría, según acta 6
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS, RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Se verifica con interventoría, personal utilizado en cada uno de los frentes de vías ejecutadas según acta 6
SUMINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS, TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA, CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS, AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. POR LO TANTO ESTE DEBERA REPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUASAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Se verifica con interventoría, y se entregan certificados calidad, según acta 6

REALIZAR PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS, TODAS LAS PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGISTRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA. SI FUESE PRECISO, A JUICIO DE LA INTERVENTORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA, CUALQUIERA POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO BUENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DE DICHAS PRUEBAS

Se verifica con interventoría, y se entregan certificados calidad

SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUSUA AVANCE E.I.C.E. TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO, QUE SE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR

Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.

Se expide a los 10 días del mes de abril de 2023


 FIRMA CONTRATISTA
 CONSORCIO GAMER SOACHA
 NIT 901587366-8


 FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
 JUAN PABLO CAÑON

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. INFORME DE SUPERVISIÓN	 
--	--	---

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 024 DE 2021

Informe: Mensual Parcial x Final ____
No. Del Informe: 06
Periodo del Informe: 05 de marzo de 2023 al 08 de abril 2023
Fecha de informe: 08 de abril de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO GAMER SOCHA
NIT / C.C.	901.587.366 8
Supervisor	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción de Contrato:	04/05/2022
Fecha de inicio del Contrato:	01/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal <small>Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones</small>	044-2022
Registro presupuestal <small>Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones</small>	2022-0077
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	\$ 4.506.567.898.67
Plazo de ejecución	DIEZ MESES
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha del corte de periodo	Ejecución de vías desde el 1 de febrero del 2023 hasta la fecha del periodo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS O MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENDES DE OBRA	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Pólizas.	Garantías aprobadas y en firme contemplando la última actualización debido a la prorroga
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSPORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMIENTAS, OBRA DE MANO, MANEJO, VIGILANCIA Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDIENTE CUADRO DE CANTIDADES, ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Ejecución de cantidades de acuerdo a los pactado contractualmente	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS, RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
SUMINISTRAR CON ANTICIPACION SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS, TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA, CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS, AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, POR LO TANTO ESTE DEBERA REPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUOSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
REALIZAR PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS, TODAS LAS PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGISTRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
CARGO DEL CONTRATISTA. SI FUESE PRECISO A JUICIO DE LA INTERVENTORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA. EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS		
SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUUA AVANCE E.I.C.E. TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO, QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 febrero hasta la fecha en corte del acta

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	88.37%
Financiero	88.37%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

5. ANEXOS

INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS, ENTREGABLES




JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ
Supervisor Cto 024-2022

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3	
CALL 53A ENTRE 26-266						
 	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	AJUSTE CONCRETO ACTA 6					
	CONCRETOS CAJAS Y POZOS	4,00	2,60	0,15	2,00	3,12
	CINTAS CONCRETO	82,00	1,20	0,15	1,00	14,76
						17,88
CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	80,39	0,60	0,150	2,00	14,47	
TOTAL					3,41	
OBSERVACIONES:						
ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	UNID.	M3	
CRA 24C ENTRE CLL 93-95						
 	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	AJUSTE CONCRETO ACTA 6					
	CONCRETOS CAJAS Y POZOS	4,00	3,00	0,15	2,00	6,00
		3,00	4,00	0,15	2,00	3,60
	CINTAS CONCRETO	52,65	1,20	0,15	1,00	9,48
					15,48	
CINTAN CONCRETO COBRADA ACTA 4	52,65	0,60	0,150	2,00	9,48	
TOTAL					6,00	
TOTAL					25,15	
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:			
						
Nombre: MILTON RIVERA			Nombre: EDGAR URIBE			

CONSORCIO GAMER SOACHA		MEMORIA DE CÁLCULO									
FECHA	DO	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	5	CONSORCIO GAMER SOACHA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENTOR	COCONERINO SAS			NIT O C.C.			900.104.779-0			CONTRATO N°	025 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.			901.587.366-8			CONTRATO N°	004 DE 2022
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		UNID.		KG		
			CALLE 36B ESTE, CON CALLE 59-61								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k					
			FLEJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	21,00	0,25	3,00	22,54			
				3,20	4,00	0,99	3,00	13,50			
OBSERVACIONES:			TOTAL								36,04
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		UNID.		KG		
			CALLE 36A ESTE, CON CALLE 59-61								
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k					
			FLEJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	21,00	0,25	6,00	22,08			
				3,00	4,00	0,99	6,00	21,82			
OBSERVACIONES:			TOTAL								43,90

FLP, B



ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			CRA 25 - CALLE 50-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
			FLEJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	22,00	0,25	8,00	23,44
				3,20	4,00	0,99	8,00	29,34
OBSERVACIONES:			TOTAL			52,78		
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			CRA 25 ENTRE 50-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
			FLEJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	21,00	0,25	7,00	22,26
				3,00	4,00	0,99	7,00	24,79
OBSERVACIONES:			TOTAL			47,05		
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			CRA 24 ENTRE 50-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
			FLEJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	22,00	0,25	11,00	21,48
				3,20	4,00	0,99	11,00	38,83
OBSERVACIONES:			TOTAL			60,31		


7/4/13

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG				
				CALLE 36A ESTE CON CALLE 38					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
				FLAJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	20,00	0,25	11,00	21,98
					3,90	4,00	0,99	11,00	35,58
OBSERVACIONES:				TOTAL	57,56				
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG				
				CALLE 34B ESTE CON CALLE 36-37					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
				FLAJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	22,00	0,25	2,00	22,36
					3,20	4,00	0,99	2,00	16,34
OBSERVACIONES:				TOTAL	38,70				
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG				
				CALLE 36A ESTE CON CALLE 38					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
				FLAJES LONGITUDINAL 1/2	0,72	21,00	0,25	11,00	22,98
					3,00	4,00	0,99	11,00	36,67
OBSERVACIONES:				TOTAL	59,65				

FLP/BS


3/11/15

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	69	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			CRA 17 ENTRE CLL 53-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	0,72	15,00	0,25	4,00	15,72			
	2,20	4,00	0,99	4,00	12,71			
OBSERVACIONES:			TOTAL			28,43		
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	69	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			CRA 51 ENTRE STD 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	0,72	17,00	0,25	7,00	18,26			
	2,50	4,00	0,99	7,00	21,33			
OBSERVACIONES:			TOTAL			39,59		
ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	69	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG			
			calle 50 entre 17-210					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	0,72	34,00	0,25	10,00	35,80			
	5,00	4,00	0,99	10,00	53,50			
OBSERVACIONES:			TOTAL			89,30		
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
								
Nombre: MILTON RIVERA			Nombre: EDGAR URIBE					

**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA									
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0			CONTRATO N°	025 DE 20222	
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8			CONTRATO N°	024 DE 2022	
ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES			630.7			CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES		UNID.	M3
				CALLE 26A ESTE CON CALLE 58						
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
				ARREGLO VIA FALLOS LLUVIAS	60.00	2.00	0.130	1.00	15.60	
OBSERVACIONES:				TOTAL			15,60			
Firma: Director de obra:				Firma de Interventoria:			TOTAL			
							15,60			
							15,60			
Nombre: MILTON RIVERA				NOMBRE: EDGAR URIBE						

**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0			CONTRATO N°	025 DE 20222			
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8			CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE		3,22		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE			UNID.	M3			
 					OBSERVACIONES		Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
							Longitud (m)	Alto (m)	Espesor (m)			
					ARREGLO VIA cra26a entre 59-56a	65,00	2,00	0,100	1,00	13,00		
OBSERVACIONES:					TOTAL			13,00				
Firma: Director de obra:					Firma de Interventoria:			TOTAL				
												
Nombre: MILTON RIVERA					NOMBRE: EDGAR URIBE							

 CONSORCIO GAMER SOACHA		MEMORIA DE CÁLCULO						
FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	0	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA.							
INTERVENIENTE	CONSORCIO GAMER		NET O.C.C.	900.104.779-0		CONTRATO N°	015 DE 2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA		NET O.C.C.	901.587.366-8		CONTRATO N°	024 DE 2022	
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN			
			CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	ESP		
			BORDILLO TERMINACIONES				5,00	5,00
			TOTAL					
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN			
			CALLE 24A ESTE CON CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	ESP		
			BORDILLO TERMINACIONES				4,00	4,00
			TOTAL					
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN			
			CALLE 25 ESTE CON CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	ESP		
			BORDILLO TERMINACIONES				4,00	4,00
			TOTAL					

FLP

AI

14/01

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN				
			CALLE 25 ESTE CON CALLE 35-61						
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
			BORDILLO TERMINACIONES					5,00	5,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				5,00		
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN				
			CALLE 34B ESTE CON CALLE 35-61						
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
			BORDILLO TERMINACIONES					4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				4,00		
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN				
			CALLE 34A ESTE CON CALLE 35-61						
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
			BORDILLO TERMINACIONES					5,00	5,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				5,00		

F.P.B.

ATV

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	HP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN	
	CALLE 2da ESTE CON CALLE 59-57					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	BORDILLO TERMINACIONES				5,00	5,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			
			5,00			
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	HP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN	
	CRA 3da CON CALLE 3da					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	BORDILLO TERMINACIONES				8,00	8,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			
			4,00			
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	HP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN	
	CALLE 3da ENTRE 3da-2da					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	BORDILLO TERMINACIONES				4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			
			4,00			

FLA 05


3/11/15



ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UND.	LN
	CRA 37 ENTRE CLL 93-91				
	OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m) Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	BORDILLO TERMINACIONES			4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		4,00
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UND.	LN
	CRA 31 ENTRE ETS 27				
	OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m) Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	BORDILLO TERMINACIONES			4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		4,00
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UND.	LN
  	CRA 9 CENTRO SOACHA				
	OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m) Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	BORDILLO TERMINACIONES			531	531
	REINSTALACION BORDILLOS POR DAÑO 82 UNIDADES (COBRA 60%)			49,00	49,00
	USADOS POR LA ENTIDAD CARICANO			32,00	32,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		612,25

FL/213

STK

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN		
	OBSERVACIONES			CALLE 43B CONTOR 27			
				Dimensiones	Ancho (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Espeor (m)		
				BORDILLO TERMINACIONES		134	134
				TOTAL			
OBSERVACIONES:							
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN		
	OBSERVACIONES			CALLE 43C ENTRE 27F-27G			
				Dimensiones	Ancho (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Espeor (m)		
				BORDILLO TERMINACIONES		5	5
				TOTAL			
OBSERVACIONES:							
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UNID.	UN		
	OBSERVACIONES			CALLE 43 ENTRE 27F-27G			
				Dimensiones	Ancho (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Espeor (m)		
				BORDILLO TERMINACIONES		4	4
				TOTAL			
OBSERVACIONES:							




ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UND.	UN			
			CALLE 43DE ENTRE 27-287E					
			OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			BORDILLO TERMINACIONES				4	4
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,00		
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UND.	UN			
			CALLE 27 ENTRE 43F-44					
			OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			BORDILLO TERMINACIONES				5	5
OBSERVACIONES:			TOTAL			5,00		
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=15cm (A-80).	UND.	UN			
			CALLE 27 ENTRE 43F-44					
			OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espeor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			BORDILLO TERMINACIONES				8	8
OBSERVACIONES:			TOTAL			8,00		
Firma: Director de obra:			Firma de interventoría:					
								
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDOAR URIBE					



MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA										
INTERVENTOR	COCOSERING SAS							NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA							NIT O.C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	HP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG
-----------	--	-----	---	-------	----

	CALLE 26B ESTE CON CALLE 99-61					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
	MALLAS PARA ;					
	CUADRO 1 INICIO	2.62	1.30	4.303	1.00	14.66
	CUADRO 2 FINAL	2.50	1.20	4.303	1.00	12.91
CINTAS CONCRETO	16.50	1.20	4.303	1.00	85.20	
CUNETAS	19.10	0.35	4.303	2.00	57.53	
OBSERVACIONES:	TOTAL				170.30	

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG
-----------	--	-----	---	-------	----

	CRA 26A ENTRE 59-61					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
	MALLAS PARA :					
	CUNETA	32.00	0.35	4.303	1.00	48.19
	CINTAS CONCRETO	32.00	0.60	4.303	2.00	165.24
	CUADRO 1 CARGUE	2.65	2.10	4.303	1.00	23.95
	CUADRO 2 FINAL	0.80	1.00	4.303	2.00	6.88
OBSERVACIONES:	TOTAL					244.26

OBSERVATIONS:

TOTAL

246.26

417

王冲臣

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG				
				CALLE 26 ESTE CON CALLE 59-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					Longitud (m)	Ancho (m)			p/k
				MALLAS PARA :					
				CUADRO POZO	2,50	3,00	4,303	1,00	32,27
				CUADRO CAJA	2,40	1,20	4,303	1,00	12,39
				CINTA CONCRETO	38,40	1,20	4,303	1,00	198,28
				CUNETAS	43,30	0,35	4,303	1,00	65,21
OBSERVACIONES:			TOTAL			308,16			
ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG				
				CRA 25 BS CALLE 59-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					Longitud (m)	Ancho (m)			Espesor (m)
				MALLAS PARA ;					
				CUADRO INICIO	0,90	1,00	4,303	1,00	3,87
				CUADRO POZO	2,70	2,10	4,303	1,00	24,40
				CUADRO POZO	2,90	2,10	4,303	1,00	26,21
				CINTA CONCRETO	46,00	1,20	4,303	1,00	237,53
				CUNETAS	51,00	0,35	4,303	2,00	153,62
OBSERVACIONES:			TOTAL			445,62			
ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG				
 				CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					Longitud (m)	Ancho (m)			Espesor (m)
				MALLAS PARA ;					
				CUADRO INICIO	1,00	1,30	4,303	2,00	11,19
				CUADRO POZO 1-2-3	2,10	2,10	4,303	3,00	56,93
				CINTA CONCRETO	46,00	1,20	4,303	1,00	237,53
				CUNETA	58,00	0,40	4,303	1,00	99,83
				CUNETA FILTRO	58,00	0,32	0,12	2,00	4,45

OBSERVACIONES:		TOTAL				409,93

524.35

[Handwritten signature]



ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
			CALLE 26A ESTE CON CALLE 58					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA :					
			CUADRO POZO	2,65	2,38	4,303	2,00	54,28
			CUADRO POZO	3,65	3,50	4,303	1,00	54,97
			CINTA CONCRETO	56,00	1,20	4,303	1,00	289,16
			CUNETA	63,00	0,35	4,303	2,00	189,76
OBSERVACIONES:			TOTAL			588,17		

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
 			CALLE 26A ESTE CON CALLE 58-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA :					
			CUNETA LATERAL	81,00	0,30	4,303	1,00	104,56
			CUNETA LATERAL	81,00	0,35	4,303	1,00	121,99
			CUADRO 1 CARGUE	1,75	2,00	4,303	1,00	15,06
			CUADRO 1 CARGUE	1,75	2,00	4,303	1,00	15,06
			CUADRO CONCRETO	3,16	2,45	4,303	1,00	33,31
OBSERVACIONES:			TOTAL			289,99		

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
			CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-57 ESCALERA-ADOQUIN					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA :					
			RAMPA ESCALERA	33,00	1,00	4,303	1,00	142,00
			PLACAS CONCRETO	1,10	3,20	4,303	1,00	15,15
			PLACAS CONCRETO	2,76	1,25	4,303	1,00	14,85
			PLACAS CONCRETO POZO	2,00	2,76	4,303	1,00	23,75
			CUNETAS ESCALERA	33,00	0,45	4,303	2,00	127,80
OBSERVACIONES:			TOTAL			127,80		


	CUNETAS ADOQUIN	72,00	0,35	4,303	2,00	216,87
OBSERVACIONES:	TOTAL					540,41

[Handwritten signatures]

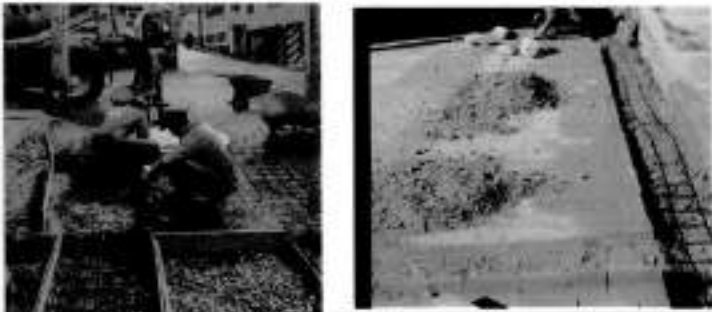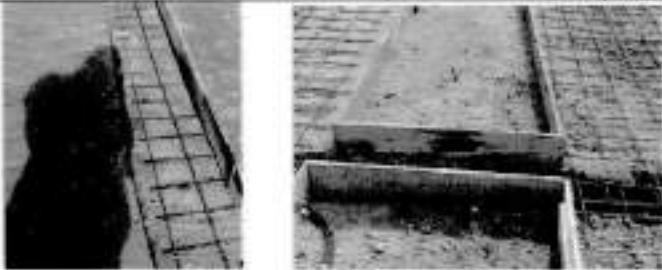ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
			CRA 27 ENTRE CALLE 53-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA ;					
			CONCRETO CARGUES 2	5,20	3,00	4,30		67,13
			CINTAS CONCRETO	26,00	1,20	4,30		134,25
			CUNETAS	26,00	0,40	5,30		55,15
OBSERVACIONES:			TOTAL			256,53		
ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
			CRA 51 ENTRE 37D 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	p/k		
			MALLAS PARA					
			CINTAS CONCRETO	52,00	1,20	4,30		268,51
			CUNETAS	52,00	0,40	5,30		110,30
OBSERVACIONES:			TOTAL			378,81		
ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG			
			CRA 26B ESTE ENTRE 59-57					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA ;					
			CUNETA LATERAL	110,00	0,25	4,303	2,00	236,67
OBSERVACIONES:			TOTAL			236,67		

152

378,81

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 a=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 a=15 cm	UNID.	0			
			calle 50 entre 17-21d					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MALLAS PARA :					
			CUNETA LATERALES	50,00	0,60	4,303	2,00	258,18
	CUNETA LATERALES	50,00	0,40	4,303	2,00	172,12		
OBSERVACIONES:			TOTAL			430,30		
			TOTAL			4799,14		
Firma: Director de obra:			Firma de interventoria:					
								
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					



FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS				NIT O.C.C.	900.104.779-0		CONTRATO N°	025 DE 20222			
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.366-8		CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4		NP 2		MORTERO 1:4		UNID.	M3				
					CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-61							
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
					MORTERO PEGA	19,10	2,40	0,04	1,00	1,83		
						19,10	2,40	0,02	1,00	0,92		
OBSERVACIONES:					TOTAL				2,75			
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4		NP 2		MORTERO 1:4		UNID.	M3				
					CALLE 26A ESTE CON 59-61							
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
					MORTERO PEGA	32,00	2,05	0,04	1,00	2,62		
					MORTERO SELLO	32,00	2,05	0,02	1,00	1,31		
OBSERVACIONES:					TOTAL				3,94			

[Handwritten signatures]

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 26 BIS CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	43,30	0,92	0,04	1,00	1,59
			MORTERO SELLO	43,30	0,92	0,04	1,00	1,59
OBSERVACIONES:			TOTAL			3,19		
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 25 BIS CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	46,00	2,00	0,04	1,00	3,68
			MORTERO SELLO	51,00	2,00	0,02	1,00	2,04
OBSERVACIONES:			TOTAL			5,72		
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 24 B CALLE 59-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	58,00	2,00	0,04	1,00	4,64
			MORTERO SELLO	58,00	2,00	0,02	1,00	2,32

FLP.B

5/11

OBSERVACIONES:	TOTAL					6,96

51215

51215

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CALLE 26A ESTE CON CALLE 58-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO SELLO	82,00	2,50	0,02	1,00	4,10
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,10		
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CALLE 24B ESTE CON CALLE 59-57 ESCALERA					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	25,00	0,80	0,04	2,00	1,60
			MORTERO SELLO	25,00	0,80	0,02	2,00	0,80
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,40		
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
 			CALLE 26A ESTE CON CALLE 58					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	56,00	1,60	0,04	1,00	3,58
			MORTERO SELLO	56,00	1,60	0,04	1,00	3,58

27/12/13

WIT


OBSERVACIONES:		TOTAL				7,17

5/12/15

CAT

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 24 B ENTRE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO SELLO	72,00	3,20	0,02	1,00	4,61
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,61		
ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 27 ENTRE CLL 53-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	26,00	1,60	0,04	1,00	1,66
			MORTERO SELLO	26,00	1,60	0,02	1,00	0,83
OBSERVACIONES:			TOTAL			2,50		

王冲臣 王冲臣

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3			
			CRA 58 ENTRE 27D 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	52,00	1,60	0,04	1,00	3,33
			MORTERO SELLO	52,00	1,60	0,02	1,00	1,66
OBSERVACIONES:			TOTAL					
ACTIVIDAD			MORTERO 1:4			UNID.	M3	
			CALLE 43D CON CRA 27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			MORTERO PEGA	80,00	2,40	0,04	1,00	7,68
			MORTERO SELLO	80,00	2,40	0,02	1,00	3,84
OBSERVACIONES:			TOTAL					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
								



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	COCOSERINO SAS		NIT O.C.C.		900.104.779-0		CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA		NIT O.C.C.		901.587.366-8		CONTRATO N°

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN
-----------	--	------	--	-------	----


		CALLE 38A ESTE CON 59-61				
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	
			1,00			1,00
OBSERVACIONES:		TOTAL				1,00

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN
-----------	--	------	--	-------	----

 		CALLE 38 ESTE CON 59-61				
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	
						2,00
OBSERVACIONES:5		TOTAL				2,00


3/4/23


3/4/23

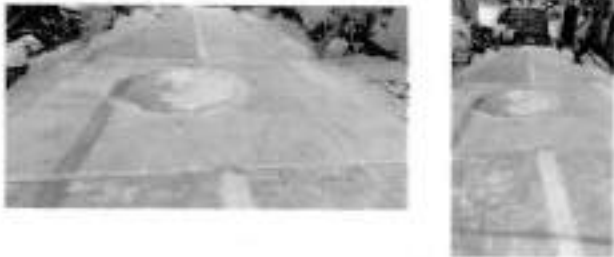ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN				
				CALLE 74B ESTE CON CALLE 58-57					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				POZOS					3,00
OBSERVACIONES:				TOTAL		3,00			
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN				
				CRA 26A ENTRE 58-59					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				POZOS					2,00
OBSERVACIONES:				TOTAL		2,00			
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN				
				CRA 26A ENTRE 58-59					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				POZOS					3,00
OBSERVACIONES:				TOTAL		3,00			

FPB

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN			
			CALLE 34B ENTRE 57-59 CALLE 59-57 ESCALERA					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			POZOS				1,00	
OBSERVACIONES:			TOTAL				1,00	
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN			
			CRA 35 B ENTRE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			POZOS				4,00	
OBSERVACIONES:			TOTAL				4,00	
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN			
			CRA 27 ENTRE CALLE 53-55					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			POZOS				2,00	
OBSERVACIONES:			TOTAL				2,00	



ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.75M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.75M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN					
			CALLE 430 CON CRA 37							
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
				POZOS						2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL							
			TOTAL							
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:							
										
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE							



MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA							
INTERVENIOR	COCODERING SAS				NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA				NIT O.C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
 			CALLE 26B ESTE CON CALLE 59-A-1					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			REPARACION ACOMETIDAS	-	-	-	2.00	2.00
OBSERVACIONES:			TOTAL			2.00		

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
			CALLE 2MA ESTE CON 39-61					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			4,00					

FLPBE 



CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO



ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN
 			CALLE 26 ESTE CDH 59-61		
			Dimensiones		
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)
			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-
OBSERVACIONES:			TOTAL		
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN
  			CRA 25 CALLE 59-61		
			Dimensiones		
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)
			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-
OBSERVACIONES:			TOTAL		

ELABORADO POR: [Signature]

 CONSORCIO GAMER SOACHA			MEMORIA DE CÁLCULO					
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
  			CRA 34 B CALLE 54-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	3,00	3,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			3,00		
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
 			CRA 25 BIS CALLE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	4,00	4,00
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,00		

ELABORADO



ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
			CRA 27 ENTRE CLL 53-51					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	1,00	1,00
				-	-	-		
OBSERVACIONES:			TOTAL			1,00		
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN			
   			CRA 51 ENTRE 270-27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	4,00	4,00
				-	-	-		
OBSERVACIONES:			TOTAL			4,00		

32/8 

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN	
	CALLE 430 CON CUA 27					
	OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
	ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	3,00	3,00
		-	-	-		
TOTAL					3,00	
TOTAL					26,00	
OBSERVACIONES:			Firma de Interventoria:			
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoria:			
Nombre: NILTON RIVERA			Nombre: EDGAR URIBE			

**CONSORCIO GAMER SOACHA****MEMORIA DE CÁLCULO**

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA											
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0			CONTRATO N°	025 DE 20222			
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8			CONTRATO N°	024 DE 2022			
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			UNID.	M3			
					CRA 26B ENTRE 5-61							
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
					VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	3,00	0,34		
OBSERVACIONES:					TOTAL 0,34							
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI			UNID.	M3			
					CRA 26A ENTRE 59-57							
					OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)				
					VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,25	8,00	0,96		
OBSERVACIONES:					TOTAL 0,96							

*F. P. B.**[Firma]*

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CRA 26 ENTRE 59-57					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA CONFINAMIENTO	3,20	0,15	0,25	8,00	0,96
OBSERVACIONES:				TOTAL		0,96			
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CRA 25 ENTRE 59-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA	3,00	0,15	0,25	7,00	0,79
OBSERVACIONES:				TOTAL		0,79			
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CRA 24 B CALLE 59-61					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA CONFINAMIENTO	3,25	0,15	0,25	11,00	1,34
OBSERVACIONES:				TOTAL		1,34			

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CALLE 34B ESTE CON CALLE 58-59					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA CONFINAMIENTO	3,00	0,15	0,25	2,00	0,23
OBSERVACIONES:				TOTAL			0,23		
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CRA 26A ENTRE CALLES 58-59					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA CONFINAMIENTO	2,70	0,15	0,25	11,00	1,11
OBSERVACIONES:				TOTAL			1,11		
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3				
				CRA 51 ENTRE 27D-27					
				OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
				VIGA CONFINAMIENTO	2,20	0,15	0,25	4,00	0,33
OBSERVACIONES:				TOTAL			0,33		


ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3			
			CRA 81 ENTRE 270-27					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	2,30	0,15	0,25	6,00	0,52
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			0,52					
ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000	UNID.	M3			
			calle 50 entre 17-21d					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
			VIGA CONFINAMIENTO	4,00	0,15	0,25	10,00	1,50
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			1,50					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
								
Nombre: MILTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					


MEMORIA DE CÁLCULO



FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	6	CONSORCIO GAMER SONCHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SONCHA									
INTERVENTOR	COCOSERING SAS				NIT O.C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SONCHA				NIT O.C.C.	901.587.365-B	CONTRATO N°	024 DE 2022		
ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC		MP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC		UNID.	M			
 		CALLE 36A ESTE CON CALLE 56-55								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			LONGITUDINAL	81,00				1,00	81,00	
			TRANS	2,75				24,00	66,00	
TOTAL								147,00		
ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC		MP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e= 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC		UNID.	M			
		CITA 24E ENTRE 56-57								
		OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)					
			LONGITUDINAL	72,00				1,00	72,00	
			TRANS	3,10				19,00	58,90	
TOTAL								130,90		

3216



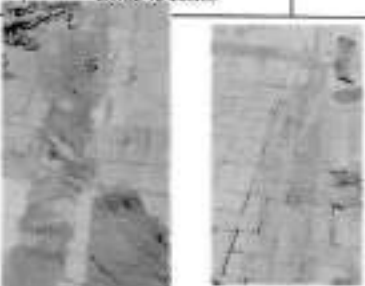ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	NP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	ML			
			CALLE 430 CON CRA 37					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTA LONGITUDINAL	80,00			1,00	80,00			
TRANSVERSALES	2,70			25,00	67,50			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			147,50					
ACTIVIDAD	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	NP16	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 OPSI e- 01,10cm ANCHO ENTRE 12-20CMC	UNID.	ML			
			CALLE 345 ENTRE 57-59					
			OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTA LONGITUDINAL	26,50			1,00	26,50			
TRANSVERSALES	7,00			5,00	35,00			
	4,00			5,00	20,00			
OBSERVACIONES:			TOTAL					
			81,50					
Firma: Director de obra:			Firma de Interventoría:					
								
Nombre: ALTON RIVERA			NOMBRE: EDGAR URIBE					



**“CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA
CUNDINAMARCA”**



CONSORCIO GAMER SOACHA

**INFORME TÉCNICO N° 05
5 MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2023**

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÁREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES	1
1. INTRODUCCION.....	3
2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA.....	4
1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022	4
2.2 GENERALIDADES	5
3. OBJETIVOS	6
4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	7
2.1 LOCALIZACIÓN	7
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	9
6. POLIZAS DEL CONTRATO	9
7. CAPITULO FINANCIERO	12
8. VIAS ASIGNADAS	13
9. ACTIVIDADES REALIZADAS	16
9. CORRESPONDENCIA ENVIADA	¡Error! Marcador no definido.
10. CONCLUSIONES	22
11. ANEXOS	22

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion	4
Ilustración 2.Localizacion general	6
Ilustración 3. Localización Cazuca.....	6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quienes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3443-2021
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ 79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	<u>04 DE MAYO DE 2022</u>
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica
MODIFICATORIO 1	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	11 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA	4 MESES 31 ENERO DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	31 MAYO DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

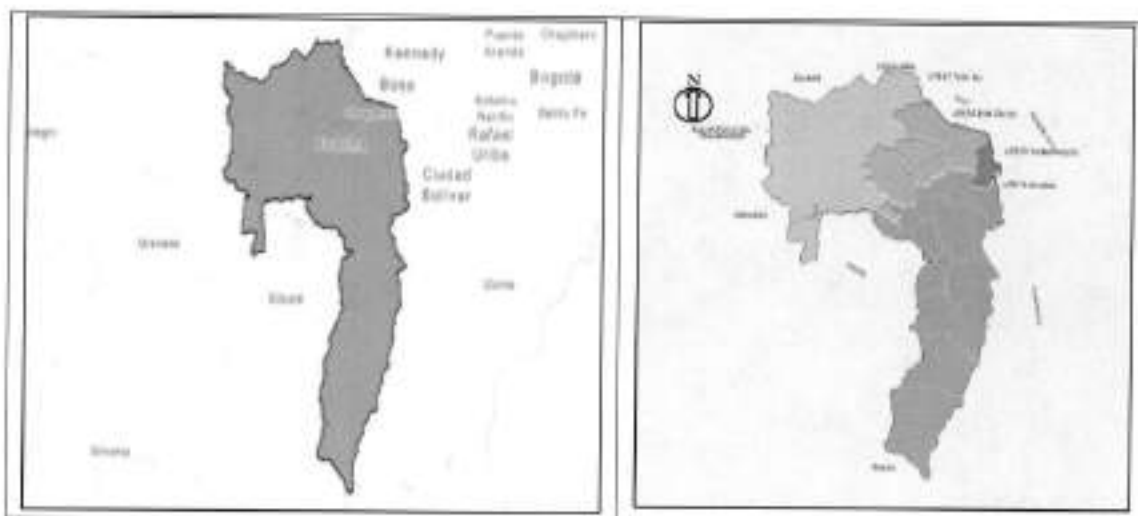


Ilustración 1. Localización

Fuente: <https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d8898bc263f>

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA**" donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 06, durante al periodo comprendido entre 5 Marzo del 2023 al 8 abril de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte del acta N° 6 del contrato de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO GAMER SOACHA**, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.


3. OBJETIVOS

Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el periodo de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".

4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto **"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"**. El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).² Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

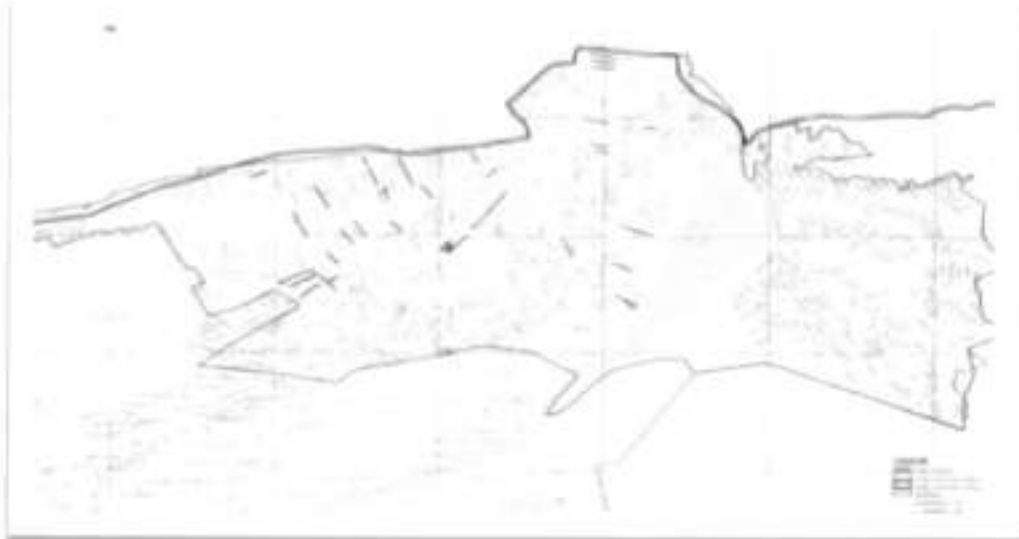

Lustración 2. Localización General



Lustración 3. Localización Cazuca
CAZUCA COMUNA 4.

BARRIO SANTO DOMINGO

Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 E 59-61
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 27 CON 39A -CURA
5	CALLE 27 E 43 D
6	CALLE 43D CON 27
7	CALLE 49 ENTRE 17C-19
8	CRA 19 ENTRE 59-51
9	CALLE 50 17C -21
10	CALLE 51 ENTRE 27-27D
11	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME
12	CRA 21 A ESTE 59-77 C -BOGOTA

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6. POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocoserling SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
Coberturas	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPANIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	\$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		\$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra,		\$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

7. CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO .

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	\$ 4.506.567.898,67
Acta por cobrar No. 1	\$ 649.376.068,00
Acta por cobrar No. 2	\$ 727.213.483,00
Acta por cobrar No. 3	\$ 1.003.532.431,00
Acta por cobrar No. 4	\$ 451.030.346
Acta por cobra No .5	\$ 666.543.025
Acta por cobra No .6	\$4864.672.910
Saldo Actual	\$ 524.199.595.67
Avance ejecutado financiero	88.37%

Fuente: Consorcio Garner Soacha

8. VIAS ASIGNADAS 7

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura;

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaria de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

A corte del acta N° 6 en reporte, se relaciona las vías en intervención e intervuidas a la fecha corte .

Tabla 4. Vías en intervención

NUM CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 59-58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CRA 21A ESTE 55-56 A	SIN INTERVENIR
4	CRA 23 ESTE ENTRE 50 Y 54	SIN INTERVENIR
5	CALLE 59D CON CRA 28 A - 21	SIN INTERVENIR
6	CALLE 49 CRA 19 E - 17	INTERVENIDA
7	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
9	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
10	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
11	CRA 24 ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	SIN INTERVENIR
12	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
13	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIR
14	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
15	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
16	CRA 41 C ESTE ENTRE CALLE 42- 41	SIN INTERVENIR
17	CRA 49 ESTE CALLE 41- 42	SIN INTERVENIR
18	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
19	CRA 26 ESTE ENTRE CAL 58-59	INTERVENIDA
20	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
21	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
22	CALLE58 ENTRE 26A-ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
24	CALLE 48 B ENTRE CR 19 -21	SIN INTERVENIR
25	CALLE 42 A ENTRE TV 28-28	SIN INTERVENIR
26	CRA 26 C ENTRE CALLE 59 CRA 77C	SIN INTERVENIR
27	CRA 19 ESTE CON 49-50	INTERVENIDA
28	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 39 A SUR (VIA CURA)	INTERVENIDA
30	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
31	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA
32	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
33	CRA 27D ESTE CON CALLE 46 -50	INTERVENIDA
34	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
35	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
36	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
37	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
38	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
39	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
40	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
41	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
42	CALLE 56 A CRA 26-27	INTERVENIDA
43	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA
44	CALLE 56B CRA 27 ESTE -CRA 27A/ESTE	INTERVENIDA
45	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
46	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
47	CALLE 43 BUS ETRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
48	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
49	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
50	CARRERA 32 A-CUL 44-59	FINALIZADA

51	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
52	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
53	CRA 37 ESTE DG 43I-DG 45	FINALIZADA
54	CALLE 50 CRA 32 A CRA 31	FINALIZADA
55	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
56	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43I	FINALIZADA
57	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
58	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA
59	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
60	CRA 28 ESTE CL 56A CL 59	FINALIZADA
61	CALLE 53 30-39	FINALIZADA
62	CRA 30 ESTE-CL 53 - CL 44	FINALIZADA
63	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
64	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
65	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
66	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
67	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 D Y 43F	FINALIZADA
68	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
69	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
70	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA
71	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
72	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
73	CRA 17 B ESTE ENTRE CALLE 60A-61	FINALIZADA
74	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A-61	FINALIZADA
75	CRA 17 A ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
77	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
78	CRA 26 C entre CL 59	ENTREGADA
79	CRA 25 B este desde CL 61 hasta CL 59	ENTREGADA
80	CRA 33 A este hasta CL 44	ENTREGADA
81	CRA 33 este hasta CL 44	ENTREGADA
82	CRA 27 B este CL 59	ENTREGADA
83	CRA 21A ESTE ENTRE CALLE 59-77C BDA	ENTREGADA
84	CRA 19 ENTRE CALLE 46-50	INTERVENIDA

Fuente: consorcio gomer Soacha

9. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas en los barrios Santo Domingo, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán I y Villas de Casa Loma, relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 B ENTRE 59-61
2	CRA 24B ENTRE 57-59
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 26 A ENTRE 59-61
5	CRA 26ª ENTRE 57-59
6	CRA 26 B ENTRE 57-61
7	CALLE 27 E 43 D
8	CALLE 43D CON 27
9	CALLE 49 ENTRE 17C-19
10	CRA 19 ENTRE 59-51
11	CALLE 50 17C -21
12	CALLE 51 ENTRE 27-27D
13	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME

ACTIVIDADES DE OBRA EN REPORTE DEL ACTA N° 6

- Excavaciones :



EXCAVACION CONGLOMERADO

- Fundida de las cunetas:



- Sub base granular





- Concretos clase D 3000 psi





- Acero de refuerzo.

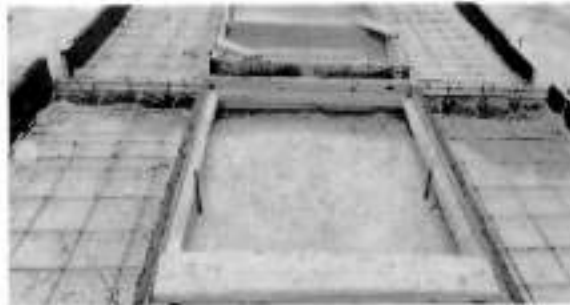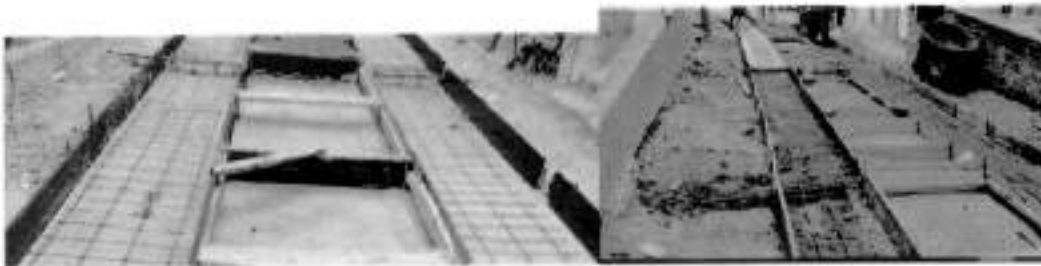


- Concreto ciclópeo 2500 psi



- Bordillo de confinamiento



- Malla electrosoldada de 5/16 e=15

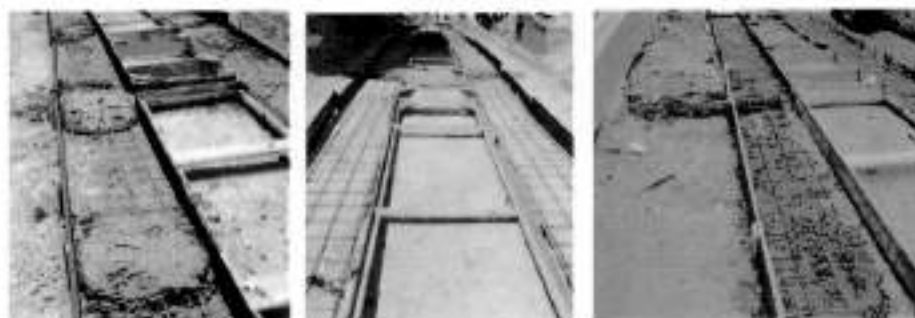

- Mortero 1:4



- Nivelación de pozos de inspección



- Viga de confinamiento de 15*25cm de 3000 psi



- Cintas de ajuste e concreto de 2500 psi



Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 7. Comités

COMITÉ N.	FECHA
24	13/03/2023
25	12/03/2023
26	30/03/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.
- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.
- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales
Reporte de afectaciones por lluvia
Relación de material para disposición final
RUT
RIT



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

LEYENDA

VÍAS_TOTALES_MARZO2023

EJECUCIÓN

- ENTREGADA
- REALIZADA
- INTERVENIDA
- EN INTERVENIR



ANEXOS
CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

**CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES**

Bogotá, abril 10 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8**; y yo **ADRIANA BONILLA** en mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **diez (10)** días del mes de **abril** de 2023.



MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal



ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora



CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
Certificación Decreto 1070 de 2013, Clasificación de Personas Naturales

Soacha, 10 de abril de 2023

Señores

Yo MILTON EDUARDO RIVERA RINCON, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 79.205.702, expedida en Soacha, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 1 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por dicho periodo fiscal: SI (x) NO ()

Mis ingresos en el año inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos en dicho periodo fiscal: SI () NO (x)

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior: SI (x) NO ()

Mi patrimonio bruto en el último día del año gravable 2021 excedía de 4.500 UVT (\$ 163.386.000). SI (x) NO ()

Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI () NO (x)

Mis consumos mediante tarjeta de crédito excedieron de 1.400 UVT (\$ 50.831.100). SI (x) NO ()

El valor total de mis compras y consumos supero las 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedió de 1.400 UVT (\$ 50.831.100) SI (x) NO ()

Que en la ejecución del presente contrato no he subcontratado 2 o más trabajadores. SI (x) NO ()

Nombre: MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
CC. 79.205.702 de Soacha

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: EPUXUA.	HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
FECHA: 03-03-2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión de obra para verificación de avances de obra y compromisos planteados.

AGENDA PROPUESTA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité verificando compromisos del acta anterior.
En la Cra 20 con Ell 43 se depende de una visita por parte de merjos para tener un concepto para continuar con la construcción de la vía que en la actualidad se encuentra en sublevar. En la vía se plantea canal a ambos costados. en conectar las aguas a la caja en la esquina de la Cra 27 n.
En la Cra 27 d este con Ell 51 se en paros de adelantos hasta el canal (adelantos pendiente) después del canal se instalará sistema en entos de concreto.
En la frase este Ell 51 entrega presupuesto con suministro de adelantos por parte del contratista.

En la Cmo 24 este con ell 59 definir terreno para dar acceso a los garages de la vivienda, pero estas obras salen del perimetro de la via por lo cual no se realizaran estas actividades.

En la Cmo 24 este ell 59 se realizará sistema en canales de concreto precastor, presupuesto con todas las actividades ejecutadas por el contratista.

Presentar presupuesto para la via de la Cmo 22c hasta la ell 59. bueñas de 40cm de ancho con espesor de 20 cm con doble malla #7, subbase de 25 cm.

En la Cmo 21a este entre ell 59 y Cmo 22c hacer presupuesto de via para protección en canchales de concreto.

En la Cmo 17a este con ell 60, se presenta un duno en tuberías de aguas negras, para este arreglo el contratista presentar presupuesto a la propiedad para el arreglo arreglo sin afectar la via.

Para la instalación de alcantarillas por parte de la comunidad, se dará un tiempo de 10 días para la instalación, si esta instalación no se cumple en el plazo, la comunidad asumirá la construcción de canchales y canales de confinamiento.

Barrío Santo Domingo, presentar presupuesto de Cmo 32a este y Cmo 33 este, en canales de 60 cm en concreto. Cmo 27b este ell 59 presupuesto en pases de alcantarillas.

Proyectar la ell 39a con Cmo 20a este, en canales de concreto de 60 cm. En la via ell 43d con Cmo 21 se ubica la instalación de bndillo para el confinamiento de la via. bndillo A-EC.

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
San Pablo Cuzi	EPUXUA	3124821154	
ARCO Puentes	EPUXUA	3166216313	
Alejandro Yule	DEV	313-8421556	
Guido Tulcan	Egoipamiento	318-2657489	
Milton Rivero	Contratista	315-3467636	
Sandra Inara Ojeda	Intendencia Cecosem	3105709036	
Leonardo Daza Vargas	Contratista	311-2259255	
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epxuca	HORA DE INICIO: 2:30 pm.
FECHA: 13 de Marzo 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoría.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación estado actual contrato de Obra ODS de 2021.

AGENDA PROPUESTA

1. Verificación Compromisos del acta anterior.
2. Estudio Actual Contratos Obra e Interventoría.
3. Estado Solicitud NPS.
- 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité de obra revisando los compromisos del acta anterior. Solicitando la entrega de topografía de la Era 27 D con Oll 43 F. la cual será enviada a la entidad a más tardar el día 14 de marzo.

Se revisa y se solicita a la Secretaría de Infraestructura la visita de Gestión de Riesgo a la vía Cra 27 B, ya que con las lluvias presentadas se está afectando la vía.

Se habla de la continuación de los gaviones en la Cra 50 entre Cra 32 A este y Cra 31, el contratista informa que se iniciarán actividades en este sector en cuanto seces las lluvias para no inestabilizar más la vía.

Se solicita un cronograma con la totalidad de las vías y las vías de la adición.

Se da claridad de que en la Cra 22 B este se va a realizar el arreglo de la vía en sistema de puros de adoquin.

Se solicita un balance con lo ejecutado, en ejecución y por ejecutar de las vías entregadas y las de proyección para adición. (Solicitud realizada por la entidad al contratista)

Se realiza una presentación donde se evidencian las afectaciones por lluvias del mes de marzo a la fecha.

La entidad informa que actualmente están realizando entregas de adoquin en las Carlos Galán 1.

La arquitecta informa que la comunidad no está realizando correctamente el mortero ya que no se está pizando antes de la instalación del adoquin.



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton E. Rivas R.	Contratista	315.346.70.36	
Laura Fuentes.	P. Inventario	3105700036	
Guido Tulcan	Dirrec. Equipam.	3112657489	
Juan Pablo Curi	EPUXUA	3124821154	
LUIS PUENTES	EPUXUA	3166216313	
Alcántara	Contratista	3102935197	
Alejandro Yate	D.E.V	313-8421556	



EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

2/2


	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

LUGAR DE REUNIÓN: <u>Francia.</u>	HORA DE INICIO: <u>2:45 pm.</u>
FECHA: <u>21 de Mayo 2023</u>	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: <u>Intenaterra.</u>	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	VERIFICACION. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	Validación del estado actual de las vías intercomunes.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>Se inicia el comité a las 2:45 pm, se inicia hablando de la ctra 9 donde se está instalando Sardinell por parte del contratista de obra, la inspectora de Obras solicita los diseños de las cunetas que se van a construir y se va a hacer una visita por parte de epuxua y la entidad para definir los diseños de las cunetas. Se retomaron actividades el día jueves por validaciones de topografía y desniveles.</p> <p>Se validan el estado actual de las vías intercomunes en las carter 9m I. en el barrio las carter galon II días D no se ha validado debido por parte de la comunidad.</p> <p>Se solicita el concepto de riesgo en la ctra 27 D.</p>	



ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Nubia Roca	Contratista	362935117	
Laura Ospina	Interventora	3105709086	
Guillermo Tulcán	Dir. Equipam.	3112657489	
Yusuf A. Rojas	EPUXUA	3166216313	
Alexandro yate	Dirección Ejecutiva	313-28121556	

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 8:20 AM.
FECHA: 30 de Marzo 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Epuxua (Interventoría).	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación del estado actual de la obra, contrato 025 y contrato 024 de 2022.

AGENDA PROPUESTA

1.	Verificación del Acta Anterior
2.	Estado actual del contrato de obra e Interventoría
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité a las 8:20 am, revisando los compromisos del acta anterior y se valida el estado de la obra, donde se define que a la fecha solo se realiza la instalación del barandal.

Se habla del estado actual de la Seguridad de los NPS, la secretaria informa que para esta semana dará respuesta.

Se revisará la vía cilíndrica desde la 24 hasta la 26 este, para validar su intervención.

Se realiza una presentación del estado actual de las vías y los frentes de trabajo con los que se están realizando las actividades por parte de la Interventoría.



Se informa que ya se reforman actividades en el barrio Loma Linda.

Se realizara la verificación de la topografía para realizar el
diseño de las escaleras de la Crea 27 D con cil 43 F
Segun las instrucciones dadas por la Secretaria de
Infraestructura y deportes.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
EDGAR E. HERRERA	INTERVENCIÓN COORDINADORA	3108032825	
Guido Tulcan	Dircc. Equip	3112657489	
Alejandro Yule	DEV	3138421556	
MARCO A. PUENTES	EPUXUA	3166216313	
Carlos Javier Cepeda	Residente Interventora	3105700036	
Juan Pablo Cárdenas	Epuxua	3124821154	

REPORTE LLUVIAS- RENIVELACION SUBBASE

Contrato 024 del 2022	marzo del 2023
-----------------------	----------------

Contrato 024 del 2022	marzo del 2023
-----------------------	----------------

Informe Técnico de Lluvia y su Impacto en el Material de Subbase

Introducción:

Las lluvias presentadas durante el mes de marzo y principios de abril del 2023 reflejaron un impacto significativo en el material de subbase en las vías del **barrio Luis Carlos Galán I y II al igual que en casa loma**. Los efectos de la lluvia incluyen socavación, erosión, arrastre de finos y pérdida de material por el agua, generando la necesidad de reacondicionar el material de subbase.

Analysis: _____

Debido a la acción de las corrientes de agua que fluyen a lo largo de las superficies de la vía, se genera **socavación** en la superficie de la subbase, esto evidenciado en la pérdida de material (en su mayoría material fino) generando zanjas y exponiendo el material grueso. Otro de los factores mas significativos en la subbase, fue la **erosión** generada por el impacto del agua lluvia de las casas hacia la superficie, debilitando la subbase hasta que el constante impacto rompe la estabilidad del material, generando así que la subbase pierda su densidad y empiece a **saturarse** por la filtración del agua. Se ha solicitado por parte del contratista la canalización de las aguas lluvias, en las vías afectadas se ha echo caso omiso a esta petición.

Las vías afectadas por estos fenómenos fueron:

cra 24 h entre 55-61.



ver memoria

* La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.

Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación.

CRA 24 II este CLI 59-360



ver memorias

- « Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la Cra 24b , el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas en la subbase.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación.

CRA 25 este CLL 59 61



ver memorias

- « Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la cra 25, el agua se acumula generando daños y afectaciones en la subrasante.
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que provocando saturación y fallos en el material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la excavación del material saturado y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación.

CRA 26 este CLL 61



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que ha generado saturación y fallos en el material.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la excavación del material saturado y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación en la subrasante.

225

CRA 26 A este desde CLL 59 hasta CLL 57



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que ha generado: saturación y fallos en el material
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado: la pérdida de material fino y grueso.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 26 A este CLL 61



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

calle 27 este con cra 43d



ver memorias

224

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
 « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
 « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 26 B este CLL 55-61



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
 « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
 « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
 « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CL 43 d Cra 27



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
 « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
 « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

28

cra 19 con calle 49-50



ver memoria

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación

cra 27 entre 50-51



ver memorias

- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha la pérdida de material fino y grueso.
- « La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.
- « Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genere saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.
- « Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nueva mente las actividades de nivelación y compactación

CLL 56 A con CRA 26 C este



ver memorias

226

« Debido a la elevada pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la **CRA 56 a este**, el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas en la subbase y revelando la subrasante.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación nuevamente por la demora en instalación de adoquín por parte de la comunidad, el cual a la fecha aun no ha sido terminada.

CLL 56 A con CRA 26 C este



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nuevamente las actividades de nivelación, compactación y estabilización por debajo de cintas con rajón.

cra 51 entre 27d 27



ver memorias

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado la pérdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genera saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adición de material nuevo y realizar nuevamente las actividades de nivelación y compactación.

227

Conclusión:

Ante los efectos negativos generados por la lluvia en el material de subbase, se llevó a cabo una solución eficaz para garantizar su estabilidad y durabilidad. Se realizó el levantamiento del material afectado en algunas vías, se eliminó el material que ya no tenía presencia de finos o se encontraba saturado, se llevó a cabo la nivelación de subbase, que se encontraba por debajo del nivel requerido, se agregó más material de subbase y finalmente se compactó. De esta manera, se logró resolver los problemas generados por la lluvia en el material y garantizar la estabilidad de la estructura.

leonardo devisa
reperte

228

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

CARGUES marzo 5 a abril 8

CONTRATO	UBICACIÓN OBRA	N°de RECIBO	METROS ³
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46180	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46201	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46179	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46196	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46197	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46176	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46177	15
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46195	7
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46194	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46178	15
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46193	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46192	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46175	15
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46174	15
Consortio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	46191	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46170	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46167	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46175	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46169	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46166	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46168	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46198	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46199	7

Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46202	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46203	15
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46200	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46221	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46223	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46222	7
Consortio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	46224	7
Consortio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	46225	7
	para comunidad via social blanca		45
			390
		M/K	15
			5850

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscritorio Municipal
El Alamo, Riosucio
Municipio Municipal de
Riosucio, Cundinamarca
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46180

ORDEN CLIENTE No.

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:


MAGIR SAS. ESP
RECEPCION**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscritorio Municipal
El Alamo, Riosucio
Municipio Municipal de
Riosucio, Cundinamarca
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46201

ORDEN CLIENTE No.

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:


MAGIR SAS. ESP
RECEPCION**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscritorio Municipal
El Alamo, Riosucio
Municipio Municipal de
Riosucio, Cundinamarca
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46179

ORDEN CLIENTE No.

--

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:


MAGIR SAS. ESP
RECEPCION



Servicio de Disposición
Final de Escombros

Resolución Municipal
Excmo. Alcalde Municipal de
Sagua la Grande del 2016

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46196

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:



M3

El servicio



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Resolución Municipal
Excmo. Alcalde Municipal de
Sagua la Grande del 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46197

ORDEN CLIENTE N°

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

M3

El servicio



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Resolución Municipal
Excmo. Alcalde Municipal de
Sagua la Grande del 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46176

ORDEN CLIENTE N°

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

M3

El servicio



CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPOCHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escritorio Municipal
El Alamo, Pinar del Rio
Avenida Municipal de
Sucesos 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46195

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPOCHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escritorio Municipal
El Alamo, Pinar del Rio
Avenida Municipal de
Sucesos 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46194

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosAvenida 32 No. 100
Edificio 1000
Alameda Municipal de
San José, Costa Rica
22 de Diciembre de 2015

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46178

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosAvenida 32 No. 100
Edificio 1000
Alameda Municipal de
San José, Costa Rica
22 de Diciembre de 2015

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46193

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosAvenida 32 No. 100
Edificio 1000
Alameda Municipal de
San José, Costa Rica
22 de Diciembre de 2015

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46192

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46175

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Municipal
11.30000. Resolución
Alcalde Municipal de
Sacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46174

CLIENTE

OBRA


DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Excmo. Municipal
11.30000. Resolución
Alcalde Municipal de
Sacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46191

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscuela Municipal
El Alamo, Escondido
Módulo Municipal de
Servicio 1205 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46170

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscuela Municipal
El Alamo, Escondido
Módulo Municipal de
Servicio 1205 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46167

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EscombrosEscuela Municipal
El Alamo, Escondido
Módulo Municipal de
Servicio 1205 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE N°

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

N° 46172

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Flota de VehículosExcmo. Alcalde Municipal
11 de Mayo, Medellín
Alcaldía Municipal de
Medellín 11002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46169

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPOCHADO POR:

RECIBIDO POR

MAGIR SAS. ESP
de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Flota de VehículosExcmo. Alcalde Municipal
11 de Mayo, Medellín
Alcaldía Municipal de
Medellín 11002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46166

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Flota de VehículosExcmo. Alcalde Municipal
11 de Mayo, Medellín
Alcaldía Municipal de
Medellín 11002 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

--	--	--

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46168

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EjecuciónExcmo. Sr. Alcalde Municipal
El Alamo, Residencia
Alcalde Municipal de
Sevilla 41013 del
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46198

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESTACHADO POR:

RECIBIDO POR:

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EjecuciónExcmo. Sr. Alcalde Municipal
El Alamo, Residencia
Alcalde Municipal de
Sevilla 41013 del
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46199

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP.****MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Final de EjecuciónExcmo. Sr. Alcalde Municipal
El Alamo, Residencia
Alcalde Municipal de
Sevilla 41013 del
21 de Diciembre de 2018

FECHA

--	--	--

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº

46202

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESTACHADO POR:

RECIBIDO POR:

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46203

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPECHADO POR:

REF. MAGIR SAS. ESP



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Distribución
Final de Escritorio

Escuela Municipal
El Alamo, Rosablanca
Alcalde Municipal de
Sacha 12/03 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46200

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPECHADO POR:

REF. MAGIR SAS. ESP



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Distribución
Final de Escritorio

Escuela Municipal
El Alamo, Rosablanca
Alcalde Municipal de
Sacha 12/03 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316 REMISIÓN

Nº 46221

ORDEN CLIENTE Nº

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
11 Adm. Rincón
Alcaldía Municipal de
Santander 1201 001
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46223

CLIENTE

Concejo Comunal

OBRA

Cable 024 2022

DIRECCION

Comuna 4

MATERIAL

Cable

PLACA VEHICULO

PAK 311

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBO

**MAGIR SAS. ESP.**
Servicio de Disposición**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
11 Adm. Rincón
Alcaldía Municipal de
Santander 1201 001
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46222

CLIENTE

Concejo Comunal

OBRA

Cable 024 2022

DIRECCION

Comuna 4

MATERIAL

Cable

PLACA VEHICULO

PAK 311

M3

CONDUCTOR

**MAGIR SAS. ESP**Servicio de Disposición
Fondo de ExplotaciónExplotación Municipal
11 Adm. Rincón
Alcaldía Municipal de
Santander 1201 001
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

No

46224

CLIENTE

Concejo Comunal

OBRA

Cable 024 2022

DIRECCION

Comuna 4

MATERIAL

Cable

PLACA VEHICULO

PAK 311

M3

CONDUCTOR



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

Tramite Municipal
Licencia Residencia
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Noviembre de 2016

FECHA

3/4/23

ORDEN CLIENTE No.

Cel. 320 830 6335

Cel. 312 447 3316

REMISIÓN

Nº 46225

CLIENTE

Carolina Gomez Sanchez

OBRA

Control CIA 2022

DIRECCION

Carretera a Soacha

MATERIAL

Escombros

PLACA VEHICULO

PAIS 219

MA

CONDUCTOR

12/11

DESPACHADO POR

12/11

Luzmila Daza

RECIBO



MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición
Final de Escombros

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14855262869



(315)7707212449984(8070) 000001485526286 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 8 7 3 6 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Insuata de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO GAMER SOACHA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601

42. Correo electrónico

gameviny.sas1@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 6 3 4 1 0 4 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 2 2 0 4 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

63. Código 7 9 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2022-08-25/09:21:28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1025 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RINCON ACOSTA DANIELA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855262869



141517707212489984180200000014855262869

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección nacional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 8 7 3 6 6 8

8

Impuestos de Renta

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2 0 4 0 5

74. Número de notario

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 2 0 4 2 2

77. No. Matrícula mercantil

0

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 0 %

84. Nacional privado

0 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 0 %

87. Extranjero privado

0 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 2 0 4 2 2

81. Hasta

2 0 2 4 1 0 2 2

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855262869



(415)7707212469984(8020) 000001485526286 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

18. Razón electrónica

9 0 1 5 8 7 3 6 6

8

Impuestos de Renta

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 2, 0 4, 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 7 9 2 0 5 7 0 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RIVERA	105. Segundo apellido RINCON	106. Primer nombre MILTON
107. Otros nombres EDUARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL.	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	2 0 2 2, 0 4, 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 0 3 0 5 4 3 6 0 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BELLO	105. Segundo apellido RIVERA	106. Primer nombre DEICY
107. Otros nombres LORENA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855262869



(415)770712485964(8020) 0000014855262869

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Sueldo electrónico

9 0 1 5 8 7 3 8 8 8

Impuestos de Renta

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 0 8 2 1 7 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido 1	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social GAMEVING CONSTRUCCION SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 4 2 2	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 7 9 2 0 5 7 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido 2	116. Segundo apellido RINCON	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 4 2 2	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido 3	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido 4	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Otros nombres
115. Primer apellido 5	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA



SOACHA
MUNICIPIO DE SOACHA

Secretaría de Hacienda

Dirección de Impuestos Municipales

01

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCIÓN DE USO		
1. Inscripción ☒	2. Reinscripción ☐	3. Cese de Actividades ☐
B. ES USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIAR, TÉCNICO, TECNOLÓGICO O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI ☐ NO ☒		
1.1 Sujeto Pasivo ICA ☐	1.2 Agente de retención ☒	1.3 Impuesto Población Exterior Visual ☐
1.4 Impuesto Delineación Urbana ☐	1.5 Otro ☐	Cual? _____
C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
2. Nombre de la Entidad		
3. Dirección de la entidad		
4. Número de contrato		
5. Fecha del Contrato		
D. DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
6. Tipo de Documento		
7. Nacionalidad Jurídica		
8. Régimen Tributario		
9. Nombre y apellidos o Razón Social		
10. Número de Registro Mercantil		
11. Fecha de inscripción		
12. Estado del registro mercantil		
13. Dirección de constitución judicial		
14. Dirección comercial		
15. Teléfono fijo o móvil		
16. Teléfono celular		
17. Correo electrónico		
E. ¿TIENE ESTABLECIMIENTO UNICADO EN SOACHA? SI ☐ NO ☒		
18. Dirección del Establecimiento Comercial		
19. Fecha de inscripción		
20. Estado del Registro Mercantil		
21. Tipo de actividad		
22. Fecha de inicio de Actividades en el Municipio de Soacha		
23. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RPT)		
24. Representante Legal, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO		
25. Tipo y número de identificación		
26. No. Tarjeta Profesional		
27. Acreditación (TRASPASO, CAMBIO RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DISEÑO COM, CAMBIO REGIMEN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS)		
28. Tipo de Documento		
29. Tipo de Documento		
30. Tipo de Documento		
31. Tipo de Documento		
32. Tipo de Documento		
33. Tipo de Documento		
34. Tipo de Documento		
35. Tipo de Documento		
36. Tipo de Documento		
37. Tipo de Documento		
38. Tipo de Documento		
39. Tipo de Documento		
40. Tipo de Documento		
41. Tipo de Documento		
42. Tipo de Documento		
43. Tipo de Documento		
44. Tipo de Documento		
45. Tipo de Documento		
46. Tipo de Documento		
47. Tipo de Documento		
48. Tipo de Documento		
49. Tipo de Documento		
50. Tipo de Documento		
51. Tipo de Documento		
52. Tipo de Documento		
53. Tipo de Documento		
54. Tipo de Documento		
55. Tipo de Documento		
56. Tipo de Documento		
57. Tipo de Documento		
58. Tipo de Documento		
59. Tipo de Documento		
60. Tipo de Documento		
61. Tipo de Documento		
62. Tipo de Documento		
63. Tipo de Documento		
64. Tipo de Documento		
65. Tipo de Documento		
66. Tipo de Documento		
67. Tipo de Documento		
68. Tipo de Documento		
69. Tipo de Documento		
70. Tipo de Documento		
71. Tipo de Documento		
72. Tipo de Documento		
73. Tipo de Documento		
74. Tipo de Documento		
75. Tipo de Documento		
76. Tipo de Documento		
77. Tipo de Documento		
78. Tipo de Documento		
79. Tipo de Documento		
80. Tipo de Documento		
81. Tipo de Documento		
82. Tipo de Documento		
83. Tipo de Documento		
84. Tipo de Documento		
85. Tipo de Documento		
86. Tipo de Documento		
87. Tipo de Documento		
88. Tipo de Documento		
89. Tipo de Documento		
90. Tipo de Documento		
91. Tipo de Documento		
92. Tipo de Documento		
93. Tipo de Documento		
94. Tipo de Documento		
95. Tipo de Documento		
96. Tipo de Documento		
97. Tipo de Documento		
98. Tipo de Documento		
99. Tipo de Documento		
100. Tipo de Documento		

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO AVANZA

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Codigo postal: 250051
Pbx: 7326960 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA

Suppose that the following is the case:

FORMULARIO No. 2210010566

DISTRIBUCIÓN GRATUITA[illegible]

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO
AVANZA ▶▶

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Codigo postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldesasoacha.gov.co

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCIÓN DE PAÍ		
1. Inscripción ☒	2. Revalidación ☐	3. Cese de Autorización ☐
5.1 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.2 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.3 Injeta Pasivo ICA ☐	5.4 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.5 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.6 Injeta Pasivo ICA ☐	5.7 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.8 Injeta Pasivo ICA ☐ 5.9 Injeta Pasivo ICA ☐
B. ¿ES UNO PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIAR, TÉCNICO, TECNOLÓGICO O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI ☐ NO ☒		
2. Nombre de la Entidad		
3. Dirección de la entidad		
4. Número de contacto		5. Fecha del Contrato
C. DATOS DEL CONTRATANTE		
6. Tipo de Documento		7. Razonamiento Jurídico
6.1 ☐ 6.2 ☒ 6.3 ☐ No. 001587366 Día 8		7.1 ☐ 7.2 ☒ 7.3 ☐ Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒
8. Razón Social		
9. Nombre de Registro Mercantil		
10. Fecha de Matrícula		
11. Estado del Registro Mercantil		
12. Dirección de identificación judicial		
13. Departamento		
14. Municipio		
15. Correo Electrónico		
16. Teléfono fijo o móvil		
17. Teléfono celular		
D. ¿TIENE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? SI ☐ NO ☒		
18. Nombre del establecimiento Comercial		
19. Dirección del Establecimiento Comercial		
20. Número de Registro Mercantil del Establecimiento		
21. Fecha de Matrícula del Establecimiento		
22. Estado del Registro Mercantil		
E. ACTIVIDAD ECONÓMICA		
23. Tipo de actividad		
24. Fecha de inicio de actividades en el Municipio de Soacha		
25. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RUT)		
26. Descripción de la Actividad Económica		
F. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO		
27. Nombre y Apellidos		
28. Tipo y Número de Identificación		
29. No. Tarjeta Profesional		
G. NOVEDADES (CAMBIO - CAMBIO RAZÓN SOCIAL - CAMBIO DIRECCIÓN - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACIÓN DE DATOS)		
30. Tipo de Documento		
31. Nombre y Apellidos del Nuevo Propietario		
32. Tipo de Documento		
33. Nombre Razón Social		
34. Fecha de Matrícula		
35. Cambio de Régimen		
36. Dirección		
37. Departamento		
38. Municipio		
39. Correo Electrónico		
40. Teléfono		
41. Si selecciona la casilla 38 diligencie este campo la información a actualizar		
H. CIERRE DE ACTIVIDADES		
42. Causa		
43. Fecha de Cierre del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha		
44. Número de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio		
45. Fecha de Cierre del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha		
I. FIRMAS		
46. Firma del Representante Legal		
47. Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Público		

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO
AVANZA ▶▶

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasocha.gov.co



SOACHA
MUNICIPIO MUNICIPAL
del METROPOLITANO

Secretaría
de Hacienda

Dirección de
Impuestos Municipales

01

**FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA**

Los datos suministrados en este formulario
constituirán información confidencial

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCIÓN DE USO		
1. Inscripción ☒	2. Recaudación ☐	3. Cese de Actividades ☐
B. EL USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIAR, TECNICO, TECNOLÓGICO O PROFESIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI ☐ NO ☒		
2. Nombre de la Entidad		
3. Dirección de la entidad		
4. Número de contrato		
5. Fecha del Contrato		
C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
6. Tipo de Documento		
7. Rutina de verificación		
8. Régimen Tributario		
9. Nombre y Apellido o Razón Social		
10. Número de Registro Mercantil		
11. Fecha de inscripción		
12. Estado del registro mercantil		
13. Dirección de constitución judicial		
14. Departamento		
15. Municipio		
16. Barrio		
17. Teléfono fijo o móvil		
18. Teléfono celular		
19. Correo Electrónico		
D. ¿USTED TIENE ESTABLECIMIENTO UNICADO EN SOACHA? SI ☐ NO ☒		
20. Nombre del Establecimiento Comercial		
21. Dirección del Establecimiento Comercial		
22. Número de Registro Mercantil del Establecimiento		
23. Fecha de inscripción del Establecimiento		
24. Estado del Registro Mercantil		
E. ACTIVIDAD ECONOMICA		
25. Tipo de actividad		
26. Fecha de inicio de actividades en el Municipio de Soacha		
27. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el MPT)		
28. Construcción de otras obras de ingeniería civil		
F. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y O CONTADOR PÚBLICO		
29. Nombre y Apellido		
30. Tipo o número de identificación		
31. C.R.		
32. M. M. Sucesor Profesional		
G. NOVEDADES (CAMBIO RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DIRECCIÓN, CAMBIO REGIMEN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS)		
33. Tipo de Documento		
34. Tipo de Documento		
35. Tipo de Documento		
36. Tipo de Documento		
37. Tipo de Documento		
38. Tipo de Documento		
39. Tipo de Documento		
40. Tipo de Documento		
41. Tipo de Documento		
42. Tipo de Documento		
43. Tipo de Documento		
44. Tipo de Documento		
45. Tipo de Documento		
46. Tipo de Documento		
47. Tipo de Documento		
48. Tipo de Documento		
49. Tipo de Documento		
50. Tipo de Documento		
51. Tipo de Documento		
52. Tipo de Documento		
53. Tipo de Documento		
54. Tipo de Documento		
55. Tipo de Documento		
56. Tipo de Documento		
57. Tipo de Documento		
58. Tipo de Documento		
59. Tipo de Documento		
60. Tipo de Documento		
61. Tipo de Documento		
62. Tipo de Documento		
63. Tipo de Documento		
64. Tipo de Documento		
65. Tipo de Documento		
66. Tipo de Documento		
67. Tipo de Documento		
68. Tipo de Documento		
69. Tipo de Documento		
70. Tipo de Documento		
71. Tipo de Documento		
72. Tipo de Documento		
73. Tipo de Documento		
74. Tipo de Documento		
75. Tipo de Documento		
76. Tipo de Documento		
77. Tipo de Documento		
78. Tipo de Documento		
79. Tipo de Documento		
80. Tipo de Documento		
81. Tipo de Documento		
82. Tipo de Documento		
83. Tipo de Documento		
84. Tipo de Documento		
85. Tipo de Documento		
86. Tipo de Documento		
87. Tipo de Documento		
88. Tipo de Documento		
89. Tipo de Documento		
90. Tipo de Documento		
91. Tipo de Documento		
92. Tipo de Documento		
93. Tipo de Documento		
94. Tipo de Documento		
95. Tipo de Documento		
96. Tipo de Documento		
97. Tipo de Documento		
98. Tipo de Documento		
99. Tipo de Documento		
100. Tipo de Documento		

**¡El pago oportuno de sus impuestos
genera Bienestar para todos!**

**EL CAMBIO
AVANZA**

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7326072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

[illegible]

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



 JUAN PABLO CARÓN Nombre y Firma Supervisor	10/04/2023 Fecha
--	---------------------



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO



EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 3443-2021

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato de obra No. 024 – 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA E suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 024-2022	CONSORCIO GAMER SOACHA	CONSTRUCCION REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No 6, Certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre 5 marzo de 2023 al 8 de abril de 2023, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
88.37%	07	\$ 484.672.910

fuelle, Contrato N. 3443 DE 2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria de Infraestructura – Obra, Interventoría

SUBTOTAL FACTURA	\$ 484.672.910
IVA	\$ 0
TOTAL, FACTURA	\$ 484.672.910

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.


JUAN PABLO CAÑON
Supervisor Contrato N° 024 DE 2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

	INFORME DE ACTIVIDADES	 

INFORMACION DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	024-2022	CDP RP	044-2022 2022-0077	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 4.506.57.898.67			
NOMBRE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO GAMER SOCHA				IDENTIFICACIÓN: 901.587.366.8					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				01	08	2022	31	MAYO	2023
SUBGERENCIA	Administrativa		Centro de Costo (área)			Administrativa			
VALOR ADICIONES			Nº CDP-FECHA						
PRORROGAS			FECHA						
MODIFICACIONES:			Agosto 12 de 2022						

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON
CARGO	SUPERVISOR	CARGO	SUPERVISOR
CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 484.672.910	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (5/3/2023)	CUENTA DE COBRO No.	CGS No 7
	HASTA (08/04/2023)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	10 abril 2023
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$3.982.368.303	SALDO POR EJECUTAR	\$ 524.199.597,57
Observaciones:			

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Se ejecutan según cronograma de obra
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTE DE OBRA	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Se realiza durante el inicio de obra
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSPORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMIENTAS, OBRA DE MANO, MANEJO, VIGILANCIA, Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDIENTE CUADRO DE CANTIDADES, ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Se verifica con interventoría, según acta 6
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS, RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Se verifica con interventoría, personal utilizado en cada uno de los frentes de vías ejecutadas según acta 6
SUMINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS, TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA, CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS, AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, POR LO TANTO ESTE DEBERA REPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUASAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Se verifica con interventoría, y se entregan certificados calidad, según acta 6

REALIZAR PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA. SI FUESE PRECISO, A JUICIO DE LA INTERVENTORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA. CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS

Se verifica con interventoría, y se entregan certificados calidad

SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUXUA AVANCE E.I.C.E. TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO, QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR

Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.

Se expide a los 10 días del mes de abril de 2023


 FIRMA CONTRATISTA
 CONSORCIO GAMIER SOACHA
 NIT 901587366-8


 FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
 JUAN PABLO CAÑON

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 SOACHA	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 024 DE 2021

Informe: Mensual Parcial x Final ____	
No. Del Informe: 06	
Periodo del Informe: 05 de marzo de 2023 al 08 de abril 2023	
Fecha de informe:	08 de abril de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO GAMER SOCHA
NIT / C.C.	901.587.366 8
Supervisor	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción de Contrato:	04/05/2022
Fecha de inicio del Contrato:	01/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal <small>Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones</small>	044-2022
Registro presupuestal <small>Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones</small>	2022-0077
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	\$ 4.506.567.898.67
Plazo de ejecución	DIEZ MESES
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha del corte de periodo	Ejecución de vías desde el 1 de febrero del 2023 hasta la fecha del periodo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS O MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTE DE OBRA	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Pólizas.	Garantías aprobadas y en firme contemplando la última actualización debido a la prórroga
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSPORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMIENTAS, OBRA DE MANO, MANEJO, VIGILANCIA, Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDIENTE CUADRO DE CANTIDADES, ADEMAS DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Ejecución de cantidades de acuerdo a los pactado contractualmente	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS, RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
SUMINISTRAR CON ANTICIPACION SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS, TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA, CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS, AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, POR LO TANTO ESTE DEBERA REPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
REALIZAR PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS, TODAS LAS PRUEBAS, LABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
CARGO DEL CONTRATISTA. SI FUESE PRECISO, A JUICIO DE LA INTERVENTORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA CUALQUIERA POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO BUENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DE DICHAS PRUEBAS		
SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUUA AVANZA E.I.C.E. TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO, QUE SE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 febrero hasta la fecha en corte del acta

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	88.37%
Financiero	88.37%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

5. ANEXOS

INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS, ENTREGABLES



JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ
Supervisor Cto 024-2022
