

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 
	FORMATO INFORME MENSUAL	

Objeto del contrato:	“Interventoría administrativa, técnica, jurídica, financiera y social y ambiental a: 1. diagnostico estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos, y análisis físico-químico de vertimientos identificados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y 2. estudios y diseños para vías en el municipio de Soacha – Cundinamarca”.		
Proyecto	INTERVENTORÍA INFORME PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 21 DE ENERO DE 2023	Código del Proyecto:	N/A
Cliente:	EPUXUA AVANZA EICE	Contrato:	016 DE 2022
Código del Documento:	SUBTEC_001_02	Fecha vigencia documento:	2022
Patrocinador:	MUNICIPIO DE SOACHA	Director Proyecto:	Secretaria
Fecha Inicial Proyecto:	14 DE FEBRERO DE 2022	Fecha Final Proyecto:	20 DE FEBRERO DE 2022

CONTROL DE VERSIÓN

VER	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	OBJETO DE LA REVISIÓN
0	Andres Peña	-----	Andres Peña	Formato versión inicial

CONTROL DE CONSECUTIVO

CON	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	OBJETO DE LA REVISIÓN
SUBTEC_001_02	Andres Peña	-----	Andres Peña	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVO	7
2.1 OBJETIVO GENERAL	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	7
3. ALCANCE	7
4. ACRÓNIMOS	7
5. CONDICIONES GENERALES	8
6. INTEGRACIÓN	11
6.1.Descripción de: proyecto, contrato y contratista	11
6.2.Solicitudes de cambio presentadas, analizadas, aprobadas, implementadas y rechazadas	14
6.3.Actualizaciones de versión a documentos Administrativos, Técnicos, Legales, SST o Social Ambientales	14
7. ALCANCE	15
7.1.Línea Base de Alcance vigente	15
7.2.Entregables iniciados, finalizados y retrasados según la Línea Base vigente	16
7.3.Curva de progreso físico “S” con porcentaje de avance alcanzado en los entregables (actualización al corte)	17
8. CRONOGRAMA	20
8.1.Línea Base de Cronograma vigente	20
8.2.Datos generales sobre plazos programados y estimados	20
8.3.Actividades iniciadas, finalizadas y retrasadas según Línea Base vigente	21
8.4.Análisis general de la situación actual en la ejecución de las actividades de la Ruta Crítica que se encuentran atrasadas y su plan de acción para recuperarlas (actualización al corte).	21
9. COSTOS	21

9.1. Línea Base de Costos vigente	21
10. CALIDAD	23
10.1. Pruebas técnicas programadas y completadas	23
10.2. Corrección de errores, Acciones preventivas y Acciones correctivas formuladas e implementadas	23
11. RECURSOS	23
11.1. Personal del contratista que inicia y finaliza labores en el proyecto durante el periodo	23
11.2. Personal del contratista retirado del proyecto durante la semana.....	24
11.3. Maquinaria, equipos y herramientas utilizados	24
11.4. Índices de accidentalidad detallando número de accidentes con pérdida de tiempo, número de accidentes sin pérdida de tiempo, índice de frecuencia e índice de severidad ((actualización al corte)	25
12. COMUNICACIONES	25
12.1. Reuniones administrativas, Técnicas, Legales, SST o Social Ambientales realizadas	25
12.2 Informes enviados	¡Error! Marcador no definido.
12.2. Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas¡Error! Marcador no definido.	
Para el presente periodo se envió la siguiente correspondencia:	¡Error! Marcador no definido.
13. RIESGOS	25
13.1. Riesgos identificados y analizados o reevaluados o cerrados	25
13.2. Riesgos materializados (incluye descripción de la aplicación de su respuesta y el impacto presentado en el proyecto).	25
14. ADQUISICIONES.....	25
14.1. Subcontratistas que inician y finalizan labores en el proyecto	25
14.2. Subcontratistas retirados del proyecto	25
14.3. Equipos de Sistemas técnicos programados para llegar e ingresados a bodega.....	26
14.4. Equipos de Sistemas técnicos retrasados para llegar a la bodega....	26

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Curva S proyecto 1764 18

Ilustración 2 Curva S proyecto 1733 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Información Contrato de Consultoría 1764, Fuente propia.	12
Tabla 2: Información Contrato de Consultoría 1733, Fuente propia.	12
Tabla 3: Información contrato de interventoría 016 de 2022, Fuente propia.	14
Tabla 4: Avance Proyecto 1764, Fuente propia.....	16
Tabla 5: Avance Proyecto 1733, Fuente propia.....	17
Tabla 6: Plazos programados, Fuente propia.....	19
Tabla 7: Cantidades Acta de Recibo Parcial No 1 proyecto 1764, Fuente propia.	214
Tabla 8: Cantidades Acta de Recibo Parcial No 1 proyecto 1733. Fuente propia.	21
Tabla 9: Relación de personal utilizado en el periodo.....	23
Tabla 10 Relación fechas de comite	24
Tabla 11 Correspondencia.....	25

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

1. INTRODUCCIÓN

La EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E, mediante ORDEN DE COMPRA OC 001-2022, abrió proceso para la ejecución de la **“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIAL Y AMBIENTAL A: 1. DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DISEÑO DE CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS URBANOS, Y ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS Y 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA”**. El 07 de febrero de 2022 se celebró el Contrato de Interventoría No. 016 de 2022.

El día 14 de febrero de 2022 se firma el acta de inicio del contrato de interventoría No 016 de 2022 y de la misma forma el día 22 de febrero de 2022 se suscribieron las Actas de Inicio de los contratos de consultoría No 1764 de 2021 y No 1733 de 2021.

El día 12 de agosto de 2022 se firma Prórroga No 1 por 30 días, el día 13 de septiembre se firma prórroga No 2 por un término de 11 días, el día 23 de septiembre se firma prórroga No 3 por un término de 26 días, el día 27 de octubre se firma prórroga No 4 por un término de 36 días y el 23 de noviembre se firma adición No 1 y prórroga No 5 por un tiempo de 86 días.

En el presente informe, se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo de los contratos en el ámbito administrativo, técnico, jurídico, financiero y social y ambiental, con el fin de garantizar la calidad de los productos entregados.

Así mismo contiene todas las actividades desarrolladas en el periodo citado, por los Consultores y la Interventoría, conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por La EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E, de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en el contrato y en una forma integral con los enfoques, metodología, organigramas, recurso humano y demás apoyo propuesto, dentro del plazo contractual.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe tiene como objeto describir las actividades realizadas por parte de la interventoría en referencia a las actividades de consultoría desarrolladas por los consultores: CONSORCIO EYD SOACHA y CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SOACHA, en el municipio de SOACHA, durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 y el 21 de enero de 2022, en sus diferentes áreas (administrativa, técnica, jurídica, financiera y social y ambiental), registrando las actividades propias desarrolladas por los Consultores y la Interventoría, junto con las observaciones, recomendaciones y gestiones adelantadas, con el fin de efectuar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Inspeccionar, asesorar, supervisar, comprobar y evaluar los productos entregados por los Consultores.
- Exigir a los contratistas el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales.
- Mantener informado a EPUXUA y la ALCALDÍA DE SOACHA, sobre el desarrollo de los proyectos.
- Velar por el cumplimiento de calidad de todos los productos entregados por los Consultores dentro de los tiempos establecidos.

3. ALCANCE

El contrato de interventoría 016 de 2022, se encuentra dentro del alcance de realizar la Interventoría administrativa, técnica, jurídica, financiera y social y ambiental a: 1. Diagnostico estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos, y análisis físico-químico de vertimientos identificados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y 2. Estudios y diseños para vías en el municipio de Soacha – Cundinamarca.

4. ACRÓNIMOS

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

ACCT:	Acta Comité Coordinación Técnica
ARE:	Acta Reunión Especial
ARS:	Acta de Reunión de Seguimiento
CDC:	Centro de Control.
CEC:	Correo Electrónico Contratista
CREG:	Comisión de Regulación de Energía y Gas.
DGP:	Director General del Proyecto
EDT:	Estructura de Desglose de Trabajo.
EDR:	Estructura de Desglose de Recursos.
EGP:	Equipo General del Proyecto
IEO:	Informe Especial de Obra
IFO:	Informe Final de Obra
IMO:	Informe Mensual de Obra
IRE:	Ingeniero Residente Electricista
IRO:	Ingeniero Residente de Obra
ISO:	Informe Semanal de Obra
MCC:	Matriz de Comunicaciones del Contrato
PGP:	Patrocinador General del Proyecto
PMBOK:	Project Management Body of Knowledge.
PMI:	Project Management Institute.
RACI:	Responsible – Accountable – Consulted – Informed
SCC:	Sitio Compartido Contrato
SCP:	Seguimiento de Compromisos Pendientes
SI:	Sistema Internacional de Unidades de Medida.
SPMI:	Sistema de Producción y Manejo de Informes
SST:	Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. CONDICIONES GENERALES

El alcance específico para el contrato de obra 016 de 2022 cuyo objeto es: “Interventoría administrativa, técnica, jurídica, financiera y social y ambiental a: 1. Diagnostico estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos, y análisis físico-químico de vertimientos identificados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y 2. Estudios y diseños para vías en el municipio de Soacha – Cundinamarca”.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

Así las cosas y como se estipula en el pliego de condiciones definitivo del concurso deméritos No CM-001-2021, en donde se menciona:

(...)

“Se desarrollan 3 proyectos encaminados a dar solución a problemáticas de saneamiento básico. El primero de ellos es el “DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA”, se pretende conocer el estado de las redes existentes, para lo cual se requiere conocer el estado de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, ya que constituye una herramienta para la planificación de obras en la zona urbana y así gestionar los planes de acción que se deberán adelantar para que la prestación de los servicios en el Municipio sea continua y de calidad, de acuerdo a los requerimientos de las normas vigentes.

El segundo de ellos es el “DISEÑO DE CONEXIONES DE VERTIMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”, por lo que se requiere un equipo experto e interdisciplinario de profesionales que estudien la problemática a fondo de dichos vertimientos, y a partir de análisis de laboratorio e ingeniería de detalle se determine la alternativa más viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental para eliminar los 66 puntos de vertimiento. Teniendo en cuenta las obras que se encuentran establecidas en el plan maestro de alcantarillado, las mestas del actual plan de desarrollo, proyectos de inversión de los prestadores de los servicios de alcantarillado en el municipio, proyectos en ejecución o gestión con recursos del municipio, así como lo establecido en el PSMV (resolución 2205 de 2016) y proyectos de construcción que se desarrollan en el municipio de Soacha y que involucran de manera directa o indirecta construcción de redes de alcantarillado. Y así mismo se dé solución a la problemática de las diversas fallas técnicas (daños, redes obsoletas, redes de forma combinada) que generan problemas sanitarios y ambientales a los habitantes de dichos sectores por tal motivo se pretende que mediante la ejecución de un contrato de consultoría en donde se ejecute el diagnóstico, estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para diversos sectores críticos del municipio de Soacha.

Y el tercero y último el “ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA”, en donde es importante aclarar que el Municipio de Soacha dispone de 3 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobados por la Corporación Autónoma Regional bajo las resoluciones 2205 de 2016, 2727 y 2728 de 2016, correspondientes a la zonas del casco urbano, Corregimiento 2 Sector El Charquito y Vereda Alto de la Cruz y Sector Chacua, respectivamente.

Es por ello que en el marco de la ejecución de estos planes es necesario llevar a cabo un análisis fisicoquímico de aguas vertidas en cuerpos hídricos en el municipio de Soacha, que permita comparar los resultados obtenidos con la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. De esta manera, se podrá evaluar el cumplimiento de cargas contaminantes establecidas a través de metas globales e individuales.

Para dar paso a lo comparación de resultados se debe tener en cuenta los establecido en el Artículo 8 de dicha resolución (Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, (ARD) y de las aguas residuales (ARD – ARND) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales), para una carga menor o igual a 625 Kg/día DBO5). Que nos permitirá definir si los parámetros sobrepasan el límite estipulado en la normatividad legal vigente.

Con lo anterior y a partir de lo dispuesto en el decreto 2667 de 2012 por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. Se podrá dar paso a identificar por parte de la Corporación Autónoma Regional –CAR la tasa retributiva correspondiente al Municipio.

Por otro lado, y en concordancia con lo descrito es importante llevara cabo proyectos que permitan mitigar la descarga de aguas residuales a cuerpos hídricos. En este caso en específico se daría inicio con el PSMV del casco urbano aprobado

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 
	FORMATO INFORME MENSUAL	

por la Corporación Autónoma Regional (CAR) por la resolución 2205 de 2016, en donde identifican sesenta y seis (66) vertimientos de aguas residuales. Estos puntos descargan en diversos cuerpos de agua superficial del Municipio (Rio Soacha, Rio Bogotá, Río Claro, Laguna Terreros, Humedal Puyana y Humedal Tierra Blanca) afectando la calidad de esta.”

En cuanto en el tema de vías, uno de los retos de la Administración Municipal es la planificación del desarrollo integral de la población, con la cobertura de las necesidades básicas.

Es por ello por lo que se hace necesario la contratación de la consultoría para el diseño de vías y puentes vehiculares, el cual tiene como objetivo alcanzar una mejor infraestructura en materia vial para el desarrollo social, económico y turístico del Municipio de Soacha y que en un futuro cercano a través de este programa, Soacha sea considerada como una ciudad Emergente de nuestro País.

Por lo anterior es imperativa la necesidad de contratar los estudios y diseños de esta serie de obras civiles con las adecuaciones necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos de cada una de ellas y así mismo dar cumplimiento a los programas y metas del Plan de Desarrollo Municipal EL CAMBIO AVANZA.

6. INTEGRACIÓN

6.1. Descripción de: proyecto, contrato y contratista

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SOACHA
PROCESO	CONCURSO DE MÉRITOS No CM-001-2021
NO. CONTRATO	1764 DE 2021
OBJETO:	Diagnóstico, estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos y análisis físico – químicos de vertimientos del municipio de Soacha
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.489.037-1

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 
	FORMATO INFORME MENSUAL	

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	81.715.692 DE BOGOTÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 de junio de 2021
FECHA DE INICIO	22 de febrero de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (06) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de agosto de 2022
PRÓRROGA No 1	Sesenta (60) días.
ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2	20/10/2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 de febrero de 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.804.236.650.00

Tabla 1: Información Contrato de 1764, Fuente propia.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO EYD SOACHA
PROCESO	CONCURSO DE MÉRITOS No CM-003-2021
NO. CONTRATO	1733-2021
OBJETO:	Consultoría estudios y diseños para vías en el Municipio de Soacha Cundinamarca
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT. 901.487.706-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI PINEDA CORTES
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.600.583 DE BOGOTÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de junio de 2021
FECHA DE INICIO	22 de febrero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (05) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	13 de julio de 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1	13 de agosto de 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.522.486.000.00

Tabla 2: Información Contrato de Obra 1733 de 2021, Fuente propia.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGEVIALES SAS
PROCESO	INVITACIÓN A COTIZAR OC-001-2022
NO. CONTRATO	016-2022
OBJETO:	Interventoría administrativa, técnica, jurídica, financiera y social y ambiental a: 1. Diagnostico estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos, y análisis físico – químico de vertimientos identificados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y 2. Estudios y diseños para vías en el municipio de Soacha – Cundinamarca
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT. 900.961.470-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ESPAÑOL ALBA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	74.333.217 DE TOCA (BOYACÁ)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	07 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO	14 de febrero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (06) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de agosto de 2022
PRÓRROGA No 1	Treinta (30) días.
PRÓRROGA No 2	Once (11) días
PRÓRROGA No 3	Veintiséis (26) días.
PRÓRROGA No 4	Treinta y seis (36) días.
PRÓRROGA No 5	Ochenta y seis (86) días.
ADICIÓN No 1	\$75.111.997.00
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 de febrero de 2023

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 
	FORMATO INFORME MENSUAL	

VALOR DEL CONTRATO	\$ 396.185.897.00
--------------------	-------------------

Tabla 3: Información contrato de interventoría 016 de 2022, Fuente propia.

6.2. Solicitudes de cambio presentadas, analizadas, aprobadas, implementadas y rechazadas

Para el presente periodo no se presentaron cambios en el personal.

6.3. Actualizaciones de versión a documentos Administrativos, Técnicos, Legales, SST o Social Ambientales

Para el corte del presente informe en el contrato 1764 de 2021, el consultor ha entregado el producto 1 del proyecto 1, DIAGNOSTICO, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, el cual fue revisado y recibido a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría, mediante comunicado C.I-016-017 del 24 de abril de 2022, el producto 1 del proyecto 2, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL CONTRATO DE LA REFERENCIA el cual fue revisado y recibido a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría, mediante comunicado C.I-016-016 del 21 de abril de 2022, el producto 2 del proyecto 1, ENTREGA FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, el cual fue revisado y recibido a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría, mediante comunicado C.I-016-027 del 27 de mayo de 2022 y el producto 3 del proyecto 1, INGENIERÍA DE DETALLE, el cual fue revisado y recibido a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría.

De igual forma para el presente periodo se han aprobado los diseños hidráulicos de los sectores 10, 11 y 12.

Para el contrato 1733 de 2021, mediante comunicación C.I-016-063 del 07 de octubre de 2022, la interventoría realiza entrega a la Alcaldía Municipal de Soacha de la siguiente documentación:

1. VOLUMEN VI. DISEÑO GEOMÉTRICO.
2. VOLUMEN VII. DISEÑO HIDRÁULICO.
3. VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL.
4. VOLUMEN IX. DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO.
5. VOLUMEN X. ESTUDIO ELÉCTRICO.
6. VOLUMEN XI. ESTUDIO AMBIENTAL.
7. VOLUMEN XII. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL.
8. VOLUMEN XIII. ESPECIFICACIONES, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
9. VOLUMEN XIV. RESUMEN EJECUTIVO.

10. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN I. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.
11. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRÁNSITO.
12. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN IV. INFORME FINAL DE GEOTECNIA.
13. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN V. DISEÑO DE PAVIMENTOS.
14. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VI. DISEÑO GEOMÉTRICO.
15. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VII. DISEÑO HIDRÁULICO.
16. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL.
17. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN IX. DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO.
18. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN XI. ESTUDIO AMBIENTAL.
19. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN XII. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL.

Así mismo se aclara que los volúmenes correspondientes al HITO 1 (VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, VOLUMEN II. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y SUELOS PARA FUNDACIONES, VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRÁNSITO, VOLUMEN IV. INFORME FINAL DE GEOTECNIA y VOLUMEN V. DISEÑO DE PAVIMENTOS), fueron radicados a la Empresa de Servicio Públicos EXPUXUA AVANZA E.I.C.E mediante comunicación C.I-016-022 del 20 de mayo de 2022.

Así las cosas, para este contrato ya se entregaron el 100% de los productos que se encuentran dentro del objeto del contrato.

7. ALCANCE

7.1. Línea Base de Alcance vigente

Durante el periodo cada uno de los contratistas entregaron sus respectivos cronogramas con el fin de establecer la línea base con la que se realizara el proyecto.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

7.2. Entregables iniciados, finalizados y retrasados según la Línea Base vigente

Teniendo en cuenta los cronogramas de obra, a continuación, se relaciona los productos entregados por cada consultor.

Contrato 1764 de 2021:

Para el corte del presente informe en el contrato 1764 de 2021, el consultor ha entregado el producto 1 del proyecto 1, DIAGNOSTICO, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, lo que corresponde al 20% de avance del contrato, el producto 2 del proyecto 1, ENTREGA FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, que corresponde al 20% de avance del contrato, cabe resaltar que estos documentos fueron revisados y recibidos a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría, el PROYECTO 3 Aprobación 100 % Informes de Laboratorio y el producto 3 del proyecto 1, INGENIERÍA DE DETALLE lo que corresponde al 40% de avance del contrato, el cual fue revisado y recibido a satisfacción por parte del Especialista Hidráulico de la Interventoría.

De igual forma se han aprobado los diseños hidráulicos de los sectores 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Contrato 1733 de 2021:

Para el contrato 1733 de 2021, se ha entregado a la Entidad el 100% de los productos contractuales los cuales se describen a continuación:

1. VOLUMEN VI. DISEÑO GEOMÉTRICO.
2. VOLUMEN VII. DISEÑO HIDRÁULICO.
3. VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL.
4. VOLUMEN IX. DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO.
5. VOLUMEN X. ESTUDIO ELÉCTRICO.
6. VOLUMEN XI. ESTUDIO AMBIENTAL.
7. VOLUMEN XII. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL.
8. VOLUMEN XIII. ESPECIFICACIONES, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
9. VOLUMEN XIV. RESUMEN EJECUTIVO.
10. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN I. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.
11. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRÁNSITO.
12. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN IV. INFORME FINAL DE GEOTECNIA.

13. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN V. DISEÑO DE PAVIMENTOS.
14. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VI. DISEÑO GEOMÉTRICO.
15. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VII. DISEÑO HIDRÁULICO.
16. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL.
17. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN IX. DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO.
18. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN XI. ESTUDIO AMBIENTAL.
19. Aprobación por parte de Especialista de Interventoría del VOLUMEN XII. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL.

7.3. Curva de progreso físico “S” con porcentaje de avance alcanzado en los entregables (actualización al corte)

Hasta la fecha el Consultor CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SOACHA ha venido ejecutando actividades, por cual cuenta con un 20% (Producto 1 proyecto 1), 20% (Producto 2 proyecto 1), un 15% (Producto 1 Proyecto 2), un 100% (Proyecto 3) y un 40 % (producto 3 Proyecto 1) de lo ejecutado sobre la facturación con los tiempos estipulados dentro del contrato.


Tabla 4 Avance proyecto 1764

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	FECHA DE CORTE	PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Proyecto 1: Diagnóstico, estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para diversos sectores del municipio de Soacha	23/02/2022	20/10/2022		75%	81%
Producto 1: Diagnóstico, análisis y recopilación de información	23/02/2022	9/05/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2: Formulación y selección de alternativas	11/04/2022	29/07/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3.1: Topografía	25/03/2022	12/08/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3.2: Diseños hidráulicos de detalle	27/05/2022	18/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3.3: estudios de geotecnia	1/04/2022	11/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3.4: diseños ingeniería de detalle	13/06/2022	19/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 4: Aprobación final	14/07/2022	20/10/2022	2/01/2023	0%	0%

Producto 5: Viabilización ventanilla única MVCT	11/08/2022	20/10/2022	2/01/2023	0%	50%
PROYECTO 2: Prestación de servicios para el diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos en el municipio de Soacha	23/02/2022	15/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 1: Recopilación, análisis de información, formulación y selección de alternativa	23/02/2022	20/04/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2.1 Topografía detallada	26/04/2022	1/09/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2.2: estudios de geotecnia	18/04/2022	20/09/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2.3: Diseños hidráulicos de detalle	26/05/2022	26/09/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2.4: diseños estructurales	17/06/2022	3/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3: Informe final	6/07/2022	15/10/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 4: Ajustes	12/07/2022	5/10/2022	2/01/2023	100%	100%
PROYECTO 3: Análisis fiscoquímico de vertimientos identificados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos del Municipio de soacha	31/03/2022	30/08/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 1: Info laboratorio primera mitad puntos de vertimiento	31/03/2022	23/08/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2: Info laboratorio segunda mitad puntos de vertimiento	24/05/2022	30/08/2022	2/01/2023	100%	100%
ADICION			2/01/2023	53%	61%
Producto 1: Diagnóstico, análisis y recopilación de información	20/10/2022	30/11/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 2: Formulación y selección de alternativas	1/12/2022	13/01/2022	2/01/2023	100%	100%
Producto 3.1: Topografía	8/11/2022	20/02/2022	2/01/2023	60%	80%
Producto 3.2: Diseños hidráulicos de detalle	15/10/2022	18/02/2022	2/01/2023	50%	80%
Producto 3.3: estudios de geotecnia	21/12/2022	9/02/2022	2/01/2023	60%	80%
Producto 3.4: diseños ingeniería de detalle	21/12/2022	9/02/2022	2/01/2023	50%	50%
Producto 4: Aprobación final	11/02/2023	16/02/2023	2/01/2023	0%	0%
Producto 5: Viabilización ventanilla única MVCT	20/02/2023	20/02/2023	2/01/2023	0%	0%

Fuente: Propia

Ilustración 1 Curva S proyecto 1764

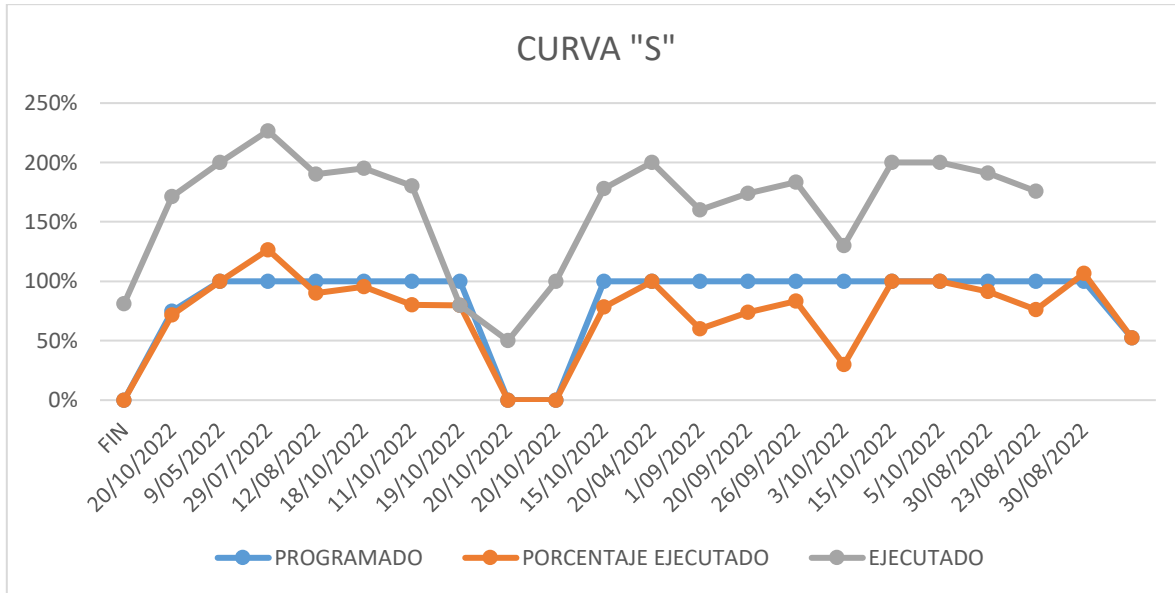

Fuente: Propia

Para el consultor CONSORCIO EYD SOACHA, presenta un porcentaje del 100%, de lo ejecutado sobre la facturación con los tiempos estipulados dentro del contrato, cabe resaltar que el contrato se suspendió el día 13 de julio de 2022 ya que no se contaba con la aprobación de estudios y diseños por parte de las Empresas de Servicios Públicos CIUDAD LUZ S.A (SOCILUZ y ENEL Colombia S.A), de igual forma y superado el inconveniente con esta empresa, se firma acta de reinicio el día 13 de septiembre y el día 21 de septiembre se firma acta de terminación del contrato.


Tabla 5 Avance proyecto 1733

CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA	22/02/2022	22/07/2022	20/07/2022	PROGRAMADO
HITO 1	22/02/2022	22/04/2022	20/07/2022	100%
Estudio de Topografía	22/02/2022	22/04/2022	20/07/2022	100%
Estudio de Tránsito	22/02/2022	22/04/2022	20/07/2022	100%
Estudio de suelos	22/02/2022	22/04/2022	20/07/2022	100%
Estudio Geotécnico y diseño de pavimentos	5/04/2022	22/04/2022	20/07/2022	100%
HITO 2	29/03/2022	1/06/2022	20/07/2022	100%
Estudio de suelos para fundaciones	5/04/2022	6/05/2022	20/07/2022	100%
Estudio de trazado y diseño geométrico	29/03/2022	6/05/2022	20/07/2022	100%
Estudio de hidrología, Hidráulica y socavación	29/03/2022	1/06/2022	20/07/2022	100%
Diseño Estructural	9/05/2022	17/06/2022	20/07/2022	100%
Diseño Urbanístico y Paisajismo	9/05/2022	1/07/2022	20/07/2022	100%
Estudio Eléctrico	29/03/2022	1/07/2022	20/07/2022	100%
Estudio Ambiental	29/03/2022	1/07/2022	20/07/2022	100%
HITO 3	29/03/2022	21/07/2022	20/07/2022	100%
Estudio de Gestión predial	29/03/2022	8/07/2022	20/07/2022	100%
Estudio de Especificaciones Técnicas	31/05/2022	18/07/2022	20/07/2022	100%

Estudio de cantidades de obra y presupuesto	21/06/2022	19/07/2022	20/07/2022	100%
Resumen ejecutivo	4/07/2022	21/07/2022	20/07/2022	100%
HITO FINAL	4/07/2022	21/07/2022	20/07/2022	100%

Fuente: Propia

Ilustración 2 Curva S proyecto 1733

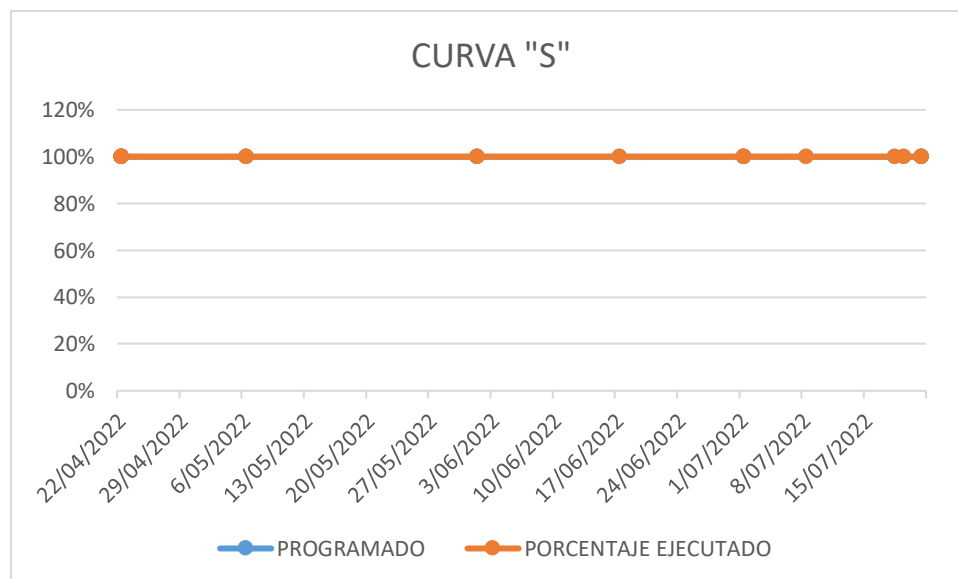

Fuente: Propia

8. CRONOGRAMA

8.1. Línea Base de Cronograma vigente

Durante el periodo cada uno de los contratistas entregaron sus respectivos cronogramas con el fin de establecer la línea base con la que se realizara el proyecto.

8.2. Datos generales sobre plazos programados y estimados

A la fecha los plazos generales de ejecución de cada obra son programados de la siguiente manera:

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 
	FORMATO INFORME MENSUAL	

Tabla 06 Plazos programados

CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	OBJETO	PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SOACHA	1764 de 2021	Diagnóstico, estudios y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, diseño de conexiones que permitan eliminar los vertimientos urbanos y análisis físico - químicos de vertimientos del municipio de Soacha.	Doce (12) meses	22 de febrero de 2022	20 de febrero de 2023
CONSORCIO EYD SOACHA	1733 de 2021	Consultoría estudios y diseños para vías en el Municipio de Soacha Cundinamarca	Siete (07) meses	22 de febrero de 2022	21 de septiembre de 2022

8.3. Actividades iniciadas, finalizadas y retrasadas según Línea Base vigente

Para el contrato 1764 de 2021 y una vez presentada la anterior información se evidencia que la ruta crítica del proyecto se presenta en la entrega y aprobación de los estudios hidráulicos y dicha actividad no presenta atraso para el contrato 1764 de 2021, se debe tener en cuenta que para el presente periodo se han realizado entregas de los productos por parte del consultor y se han realizado las respectivas revisiones por parte del especialista hidráulico de la interventoría.

Para el contrato 1733 de 2021, se radicaron a la Alcaldía Municipal de Soacha el 100 % de los productos objeto del contrato de consultoría.

8.4. Análisis general de la situación actual en la ejecución de las actividades de la Ruta Crítica que se encuentran atrasadas y su plan de acción para recuperarlas (actualización al corte).

Para el contrato 1764 de 2021, a la fecha no se presentan atrasos en ninguna actividad.

9. COSTOS

9.1. Línea Base de Costos vigente

A la fecha de corte del presenta informe el contrato 1764 de 2021, realiza la entrega del acta de cobro parcial No 3, ya que la interventoría aprobó el proyecto 3, como se muestra a continuación:

Tabla 07 Cantidades Acta Parcial No 1 contrato 1764 de 2021

ÍTEM	UNIDAD	VALOR ACTA PARCIAL No 3
------	--------	-------------------------

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		 
	FORMATO INFORME MENSUAL		

	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTO 1					
1	Entrega a Satisfacción de Diagnóstico, Análisis y Recopilación de Información	UNIDAD	1,00	231.844.290,00	231.844.290,00
2	Entrega Formulación y Selección de Alternativas	UNIDAD	1.00	231.844.290,00	231.844.290,00
3	Ingeniería de Detalle (Estudios Básicos y Diseños Definitivos)	UNIDAD		463.688.581,00	
4	Formulación del Proyecto ante MVCT	UNIDAD		115.922.145,00	
5	Acta de Liquidación	UNIDAD		115.922.145,00	
PROYECTO 2					
6	Recopilación de información para evaluación de alternativas	UNIDAD	1,00	42.276.750,00	42.276.750,00
7	Ingeniería de Detalle (Geotecnia, Topografía y Diseños)	UNIDAD		84.553.500,00	
8	Informe Final	UNIDAD		126.830.250,00	
9	Acta de Liquidación	UNIDAD		28.184.500,00	
PROYECTO 3					
10	Aprobación 50% Informes de Laboratorio	UNIDAD		30.039.520,00	30.039.520,00
11	Aprobación 50% Informes de Laboratorio y Producto Final	UNIDAD		45.059.280,00	45.059.280,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					581.064.131,00
	IVA 19%	19,00%			\$ 110.402.185,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$ 691.466.316,00

Para el contrato 1733 de 2021, realiza la entrega del acta de recibo final, lo anterior teniendo en cuenta que se aprobó por parte de la Interventoría el 100% de los productos contractuales como se muestra a continuación:

Tabla 07 Cantidades Acta Parcial No 1 contrato 1733 de 2021

DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ACTA PARCIAL No 1		
		CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Topografía	GLOBAL	1,00	\$ 511.760.000,00	\$ 511.760.000,00
Estudios de Geotécnico y de suelos				
Estudios de Tránsito				

Informe preliminar de Geotecnia y de pavimentos				
Diseño Geométrico	GLOBAL	1,00	\$ 383.820.000,00	\$ 383.820.000,00
Diseño Hidráulico				
Diseño Puente				
Diseño Urbanístico				
Diseño Eléctrico				
Levantamiento Predial	GLOBAL	1,00	\$ 255.880.000,00	\$ 255.880.000,00
Memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto, APU, listado de insumos, programación, proceso constructivo				
Planos definitivos	GLOBAL	1,00	\$ 127.940.000,00	\$ 127.940.000,00
Entrega final				
				\$ 1.279.400.000
IVA 19%	19,00%			\$ 243.086.000
				\$ 1.522.486.000

10. CALIDAD

10.1. Pruebas técnicas programadas y completadas

Durante el periodo no se realizaron pruebas de laboratorios

10.2. Corrección de errores, Acciones preventivas y Acciones correctivas formuladas e implementadas

No aplica

11. RECURSOS

11.1. Personal del contratista que inicia y finaliza labores en el proyecto durante el periodo

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SOACHA			
ÍTEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ	CC 2.940.717	DIRECTOR DE OBRA
2	GUSTAVO ADOLFO NIÑO GALLARDO	CC. 91.540.685	RESIDENTE DE OBRA
3	JHON GERARDO BAUTISTA HERNÁNDEZ	CC. 1.020.718.924	ESPECIALISTA HIDRÁULICO
4	GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA	CC. 81.715.692	COSTOS Y PRESUPUESTO
5	LEONARDO OLIVEROS BOLÍVAR	CC. 79.751.129	FORMULACIÓN DE PROYECTOS
6	CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO	CC. 1.013.581.606	TOPÓGRAFO
CONSORCIO EYD SOACHA			
ÍTEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	MANUEL JOSÉ MEZA SOTO	CC. 92.530.122	DIRECTOR DE OBRA
2	DAYANA ALEXANDRA BETANCOURT LEMUS	CC. 52.736.591	ESPECIALISTA TRANSITO
3	JOSÉ LUIS MERCADO PÉREZ	CC. 9.147.677	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
4	LUZ ENEIDA BOTINA MUÑOZ	CC. 25.288.304	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Tabla 3 Relación personal de cada consultoría, fuente propia

11.2. Personal del contratista retirado del proyecto durante la semana

En el presente periodo no se retiró el personal de ningún Consultor.

11.3. Maquinaria, equipos y herramientas utilizados

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

No aplica

11.4. Índices de accidentalidad detallando número de accidentes con pérdida de tiempo, número de accidentes sin pérdida de tiempo, índice de frecuencia e índice de severidad ((actualización al corte)

Durante el periodo no se registran accidentes de ningún tipo.

12. COMUNICACIONES

12.1. Reuniones administrativas, Técnicas, Legales, SST o Social Ambientales realizadas

Durante el periodo se realizaron reuniones y mesas de trabajo internas entre consultor e interventoría.

13. RIESGOS

13.1. Riesgos identificados y analizados o reevaluados o cerrados

Durante el periodo comprendido del presente informe no se presentaron riesgos asociados a las obras.

13.2. Riesgos materializados (incluye descripción de la aplicación de su respuesta y el impacto presentado en el proyecto).

Como se menciona anteriormente no se presentaron riesgos durante el periodo.

14. ADQUISICIONES

14.1. Subcontratistas que inician y finalizan labores en el proyecto

14.2. Subcontratistas retirados del proyecto

Durante el periodo no aplica el retiro de subcontratistas retirados.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	FORMATO INFORME MENSUAL	

14.3. Equipos de Sistemas técnicos programados para llegar e ingresados a bodega

No aplica

14.4. Equipos de Sistemas técnicos retrasados para llegar a la bodega

No aplica
