

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Tipo de Contrato:	
OBRA ☒	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número: <u> 3 </u>	Periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.405.2022	
Nombre Completo del Contratista: SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS	
Documento de identificación del contratista: 900.564.496-4	
Nombre (s) del interventor (es): CONSORCIO INTERVIAS CD	
Organismo: Secretaria de Movilidad de Cali	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 21.55%	Obra Física Ejecutada Acumulada 44.68%
Objeto del contrato: “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924”.	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
21 de octubre de 2022	31 de mayo de 2023
<p>Modificación del contrato:</p> <p>MODIFICACIÓN No. 1 Suscrita el 15 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda modificar la cláusula Octava, y el numeral 6) del Numeral 10.7 de la cláusula Decima del complemento del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 (ver anexo contrato SECOP II)</p> <p>MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)</p> <p>MODIFICACIÓN No. 3 Suscrita el 21 de febrero de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II) y se acuerda incorporar nueve (9) ítems no previstos.</p>	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
Acta de recibo final de obra: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
<p>Valor inicial del Contrato:</p> <p>Tres mil diecinueve millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte. (\$3.019.072.646).</p>	
Adición: N/A	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

Prórroga:

Mediante MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 3 Suscrita el 21 de febrero de 2023 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$3.019.072.646	\$ 650.476.226	\$698.343.514	\$ 1.670.252.906

PERSONA JURIDICA: SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.564.496-4

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de abril de 2023

Firmada por MONICA AVENDAÑO FRANCO identificada con CC. 67.004.218 y tarjeta profesional No 97195-T de la junta central de contadores, quien actúa como Revisor Fiscal de SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.564.496-4

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- El contratista cumplió con la presencia del equipo profesional de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico.
- El contratista presentó su plan de trabajo el cual ya se encuentra aprobado por interventoría.
- El contratista realizó las solicitudes de intervención ante las entidades correspondientes y las cuales ya se han recibido y esta pendiente el trámite ante el DAGMA.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

- El contratista presentó las pólizas actualizadas y estas se encuentran vigentes a la fecha.
- El contratista acató el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas.
- El contratista ejecutó las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.
- El contratista designó el personal competente para interacción con la interventoría y supervisión.
- El contratista levanto registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al interventor.
- Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo.
- El contratista cumplió con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.
- El contratista cumplió las normas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra.
- El contratista adoptó las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
- El contratista asistió a las reuniones programadas por la interventoría del contrato.
- El contratista levantó la bitácora de obra, de acuerdo con los términos requeridos.
- El contratista presentó la documentación correspondiente para manejo de RCDs y cumplió con los requerimientos del mismo.
- El contratista cumplió con normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.
- El contratista dotó a los trabajadores con el vestuario y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL requerido.
- El contratista presentó los informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotográfico.
- El contratista informó por escrito a la interventoría de los eventos y circunstancias presentadas.
- El contratista elaboró el acta de obra la cual fue verificada por interventoría

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

- El contratista cumplió de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo de 2019, donde se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia en el 1% del personal a vincular.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	
1	Localización y replanteo por intersección. Incluye visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante.	UN	0.0	13	
5	Inspección y sondeo de ductería para D<=4". Incluye hilado y plano de levantamiento de la canalización existente.	ml	0.0	1357.52	
9	Retiro de base semafórica en concreto, existente. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, izaje, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	1	8	
15	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	45.3	100.23	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

16	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	18.6	18.6	
17	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	0.0	182.5	
20	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material de sitio seleccionado compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	63.40	63.40	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

21	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	8.5	21.36	
28	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquín o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	747.50	1595.95	
32	Suministro e instalación tubo 2" galvanizado para paso en puentes vehiculares y peatonales. Incluye elementos de sujeción a la estructura.	ml	29	29	
37	Construcción de base (80cm x 80cm x 80cm) para poste semafórico. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	7	44	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

38	Construcción de base (70cm x 70cm x 153cm) para poste semafórico con ménsula de 8.5m. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	Ud	0	1
49	Suministro e instalación de tubería para acometida eléctrica o de telecomunicaciones. Incluye: curva de 2", Tubo conduit 2" hasta 1m, Tubo galvanizado 2" x 3ml, capacete galvanizado, sujeción a poste con zunchos metálicos de 5/8" (3 puntos mínimo), localización, replanteo, corte y demolición de acabado, excavación, conexión a caja hasta 1m, recuperación de andén f'c:3000 psi, trasiego y retiro de material sobrante en lugar autorizado.	Un	2	2
81	Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango de 300 metros en las intersecciones a intervenir.	Ud	0	12
82	Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de comunicación para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos. El punto de atención, así como el canal de comunicación deben estar disponibles durante la totalidad de ejecución del proyecto.	Ud	0.0	0.707
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	Ud	26	73
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	Ud	2	2
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	501.27	812.22
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR			
REGISTRO FOTOGRÁFICO:				

<div><p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p><p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p></div>	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002



Foto No. 1 Apiques de lanzamiento de topo



Foto No. 2 Descripción: Demolición de andén
Construcción Caja Sencilla.



Foto No. 3 Perforación neumática.



Foto No. 4 Descripción: Canalización con perforación

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002



Foto 5-

Construcción de Tapas



Foto 6

Construcción de anclajes



Foto 7

Canalización a cielo abierto zona dura



Foto 8

Perforación dirigida

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002



Foto 9

Halado de tubería PHD



Foto 10

Tubo Galvanizado

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Forman parte integral del presente informe de supervisión las actas parciales por intersección y la bitácora de obra.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA CONCENTRARSE EN ENTREGAR LAS INTERSECCIONES INTERVENIDAS.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Interventor
María Teresa Varona Arcila
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS CD

Fecha de suscripción del informe: 5 de mayo de 2023

CONTRATO No.4152.010.26.1.405.2022**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES****ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

MONICA AVENDAÑO FRANCO identificada con la cedula No.67.004.218 de Cali, y con tarjeta profesional No.97195-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. con NIT.900.564.496-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali - Valle, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados, por la compañía durante el término de la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los 12 días del mes de abril de 2023.



MONICA AVENDAÑO FRANCO
CC.67.004.218 de Cali
M.P. 97195-T
Revisora Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NÚMERO **67.004.218**
AVENDAÑO FRANCO

APELLIDOS
MONICA

NOMBRES


8714






FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1977**
CALI
(VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
09-DIC-1995 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NOCE DE FONDO

Director del Departamento de Identificación
 PROCTA ADONFACIAL
 OFICINA DEL MANEJO DE DATOS



A: 8790162-09537506 F: 0067064218-00-40120 003670-0984-4 8985734121

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

97195-T

MONICA
AVENDADO FRANCO
C.C. 87004238
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 258, FECHA 2003/11/15
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

103/84

[Firma]

PROFESOR TITULAR **016601**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO establecido por lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6061707591009582

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA AVENDAÑO FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 67004218 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 97195-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	6	\$ 2.231.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.231.300	\$ 0	\$ 2.231.300	
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 1.097.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.600	\$ 0	\$ 1.097.600	
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 632.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.800	\$ 0	\$ 632.800	
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 575.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.600	\$ 0	\$ 575.600	
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 2.988.700	\$ 0	\$ 0	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.053.700	\$ 0	\$ 3.053.700	
SUBTOTALES:										\$ 7.591.000	\$ 0	\$ 7.591.000	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 444.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 444.000	\$ 0	\$ 0	\$ 444.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 88.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.300	\$ 0	\$ 0	\$ 88.300
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 271.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.800	\$ 0	\$ 0	\$ 271.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 383.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.800	\$ 0	\$ 0	\$ 383.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 829.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 829.700	\$ 0	\$ 0	\$ 829.700
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 90.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.400	\$ 0	\$ 0	\$ 90.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 193.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.000	\$ 0	\$ 0	\$ 193.000
SUBTOTALES:													\$ 2.301.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.301.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	19		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.873.800	\$ 1.873.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.800
SUBTOTALES:								\$ 1.873.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.800	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	18	\$ 2.109.600	\$ 0	\$ 2.109.600
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400
SUBTOTALES:			\$ 2.156.000	\$ 0	\$ 2.156.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO VIGILANCIA				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTES	

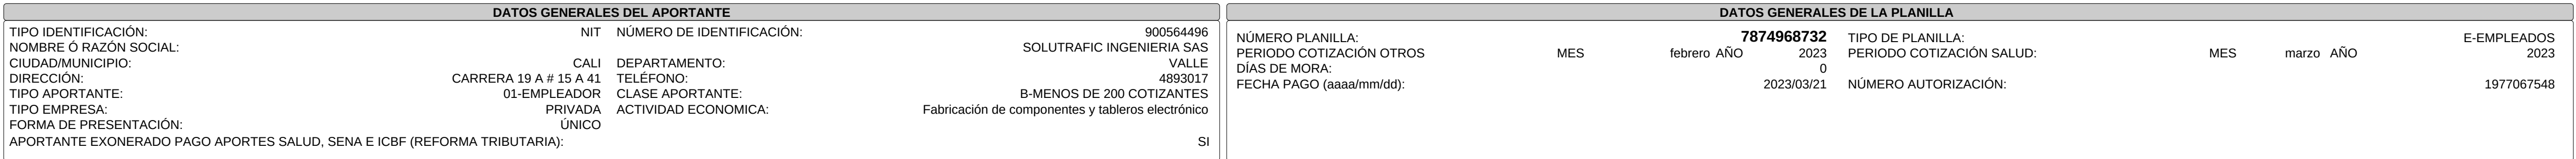[illegible]

TOTAL	\$ 13.921.800
--------------	----------------------



Fecha Validación Dian: diciembre 30, 1899
Fecha y Hora de Impresión: abril 26, 2023,04:30 pm

SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S

NIT. 900564496-4
CARRERA 19A No. 15A -41
Tel. 4893017
director@solutraffic.com

CALI - COLOMBIA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 2610 ICA 203 - 5 (7.7 x 1000)

- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

- NI RETENEDORES DE IVA AL RESPONSABLE IVA

- NO SOMOS AUTORREtenedores DE RENTA E ICA

O. Compra: 405-2022 ACTA No.3

Remision:

Señores: DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SEC.MOV

NIT. 890399011

Dirección: CL 56 3 46

Telefono: 4184215

Ciudad: CALI-COLOMBIA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE - 264
No.

FECHA FACTURA: abril 26, 2023

FECHA VENCIMIENTO: mayo 26, 2023

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
11.01.01.1182		CONTRATO 4152.01.26.1.405-2022 / ACTA 02 O.CIVIL IMPLEMENTA SISTE.SEMAFORIZACIÓ	1.00	484,345,663.00	0	484,345,663
16.01.01.0012		UTILIDAD 5%	1.00	24,217,283.00	0	24,217,283
16.01.01.0010		ADMINISTRACION 29.3%	1.00	141,913,280.00	0	141,913,280

CONTRATO No. 4152.010.26.1.405.2022 LOTE 1

'REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra decambio segun Art. 774 del
Codigo de Comercio y podra causar intereses de mora al maximo legal vigente, sin
perjuicio de la accion legal por incumplimiento.

VALOR BRUTO: 650,476,226
DESCUENTO: 0
SUBTOTAL: 650,476,226
I.V.A 19%: 0
RETE FUENTE DIAN: 0
RETEIVA: 0
RETEICA: 0
NETO A PAGAR: 650,476,226

Firma Autorizada

Recibido

RESOLUCION DIAN 18764019915606 HABILITA PREFIJO FE 151 A FE 2000 22/10/2021 VIGENCIA 12 MESES

Cufe:
