

Barranquilla, 14 de abril de 2023

CINP-522-189-1419

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo

Supervisor

luisfernandotobarmellizo@yahoo.com

Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21

Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes los informes semanales de interventoría relacionados a continuación, los cuales corresponden al contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

- ✓ Informe No 46 correspondiente al periodo 13 al 19 de marzo de 2023.
- ✓ Informe No 47 correspondiente al periodo 20 al 26 de marzo de 2023.
- ✓ Informe No 48 correspondiente al periodo 27 de marzo al 2 de abril de 2023

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S



ANSELMO MARTÍNEZ ARIZA
Director de Interventoría

Elaboró: PMZ

Aprobó: AMA

Barranquilla, 14 de abril de 2023

CINP-522-190-1429

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez

Secretaria de Infraestructura

secretariainfraestructura@popayan.gov.co

Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21

Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes los documentos relacionados a continuación:

- Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 85-44-101115315, Anexo 14 la cual se encuentra ajustada según Modificadorio No 4 del contrato de la referencia.
- Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 85-44-101115315, Anexo 15 la cual se encuentra ajustada según Modificadorio No 4 del contrato de la referencia.
- Recibo de pago No 10000046282409.
- Pantallazo cargue al Secop II

Atentamente.

INP SERVICIOS S.A.S.



ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría

C.C. Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: AOD

Aprobó: AMA



Barranquilla, 26 de abril de 2023

CINP-522-191-1591

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes le informe semanal de interventoría, el cual corresponde al contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

✓ Informe No 49 correspondiente al periodo del 03 al 09 de abril de 2023


Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S


ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

Elaboró: PMZ
Aprobo: AMA

Calle 77B No. 57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

		RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA ☒ ENVIADA ☐		FP-35-00 (10/05/2013)
TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA NÚMERO DE CONTRATO: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021". CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A. INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR				
CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	REFERENCIA /	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
28/02/2023	E-24217-106	ENTREGA REPROGRAMACION CORREGIDA FEBRERO 2023	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
8/02/2023	E-24217-109	ENSAYOS MDC FEBRERO	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
9/03/2023	E-24217-110	SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES PARA LA GESTION PIPMA	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
15/03/2023	E-24217-114	OFICIO REAJUSTE INCREMENTO ASFALTO MALLA VIAL POPAYAN 2023	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
15/03/2023	E-24217-115	SOLICITUD RECURSOS ADICIONALES PARGHEO MARZO 2023	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
17/03/2023	E-24217-116	RESPUESTA DERECHO DE PETICION HAROLD DAZA	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
25/03/2023	E-24217-118	OFICIO BARRIO EL GUAYABAL	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
28/03/2023	E-24217-119	CERTIFICADOS DE CALIDAD PINTURA	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
4/04/2023	E-24217-121	OFICIO EMPOZAMIENTO BARRIO SAN CAMILO	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
11/04/2023	E-24217-122	PREACTA 10	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
15/04/2023	E-24217-123	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y DENSIDADES ABRIL 2023	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
Firma:  Nombre: ANSELMO MARTINEZ A DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				

E-24217-106

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Respuesta comunicado CIMP-522-171-0679 Reprogramación de obra.

Respetado Ingeniero Martínez, mediante el presente documento nos permitimos enviar a ustedes la reprogramación de obra a partir de la fecha de reinicio No. 01, 16-02-2023 corregida, de acuerdo a las observaciones realizadas en el documento relacionado en el asunto.

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Archivo con reprogramación actualizada

Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2023.

Ingeniera:
KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Ciudad

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES.

Respetados ingenieros,

De manera atenta y respetuosa nos permitimos elevar ante la entidad contratante y la interventoría del proyecto, la presente petición de solicitud de recursos adicionales con base en los siguientes argumentos:

1.- Dentro de la estructura de la Administración Municipal de la Alcaldía de Popayán se encuentra la Secretaría de Infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad.

En aras de dar alcance a sus objetivos, la Administración Municipal y la Secretaría de infraestructura cuentan con un plan vial en el que se encuentra inmerso el proyecto **MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO**

DE POPAYAN 2021", Proyecto que ejecuta actualmente la empresa Edificaciones y Vías S.A. Mediante el contrato de la referencia.

Durante la ejecución del contrato se han intervenido varios sectores de la ciudad abarcando 8 comunas del Municipio de las 9 que lo componen, no obstante, el alto deterioro de la malla vial actual no han permitido llegar a la comuna número 9. Por lo anterior se hace necesario continuar con el mantenimiento de las vías mediante el programa de parcheo y garantizar a los usuarios mejores tiempos de desplazamiento, evitar accidentes y mitigar el deterioro actual de la estructura del pavimento de la zona urbana del Municipio de Popayán. A la fecha se evidencia que con el monto actual del contrato no es posible abarcar todas las comunas del Municipio y que con el objeto y alcance del contrato No. 20211800024217, es posible atender las necesidades prioritarias de la ciudad, para así incluir las arterias viales más importantes y mejorar sus condiciones de transitabilidad.

El día 31 DE ENERO DE 2022 se llevó a cabo una reunión en La Secretaría de Infraestructura del Municipio con los líderes comunales de los barrios que componen la comuna 9, en esta reunión se solicitó por parte de estos, la intervención de la malla vial de los barrios que la componen debido al deterioro que presenta, posterior a ello el día 02 de febrero de 2023 se realiza recorrido por parte de la entidad contratante, interventoría, contratista y líderes comunales en el cual se prioriza la intervención de las siguientes calles de los barrios que componen la comuna 9, las cuales se observan deterioradas y con una necesidad urgente de reparación:


No.	ZONA DE INTERVENCIÓN
1	Carrera 48A entre calles 1 y 2 Los Naranjos
2	Calle 2 entre carreras 48 y 48A
3	Calle 2 entre carreras 47A y 48
4	Calle 2 entre carreras 44 y 42
5	Calle 2 entre carreras 44 y 42
6	Calle 2A entre carrera 41 y 42 La María, frente al CAI
7	Carrera 41 entre calles 2 y 2A frente a Hospital La María
8	Carrera 37 entre calles 1 y 1A y
9	Calle 1A entre carreras 36 y 37 Carlos I
10	Carrera 48C entre calles 1 y 2 Villa Colombia
11	Calle 2 entre carreras 48A a 48D Los Naranjos Villa Colombia
12	Calle 2A entre carrera 42 y 44 La María
13	Calle 1A desde carrera 41 a 42B
14	Carrera 41 entre calles 1 y 2 frente a colegio La María
15	Carrera 42 calle 4, La María
16	Carrera 42 calle 4, La María
17	Calle 4 entre carreras 41 y 42 La María
18	Calle 4 entre carreras 39 y 40 La María
19	Calle 38 entre carreras 2, 3 y 4 La María
20	Calle 4D entre carreras 36 y 37 Carlos I
21	Carrera 36 entre calles 4A y 5 Carlos I

Con base en lo anterior, muy respetuosamente se eleva la siguiente:

SOLICITUD

1.- Con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, bajo el cual la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato, y las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente se solicita al Municipio de la ciudad de Popayán, y con el aval de la interventoría, proceda a aprobar la solicitud de **RECURSOS ADICIONALES** del contrato No. 20211800024217 DE 2021 "**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**", por un valor de **MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL M/CTE (\$1.085.760.000.00)** y un término adicional **HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual actual para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Anexo: Presupuesto para el valor de la adición solicitada.

E-24217-109

Bogotá, D.C., 08 de marzo de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ENTREGA ENSAYOS MDC-19 FEBRERO DE 2023.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los ensayos de mezcla asfáltica y agregados en frío correspondientes del mes de febrero de 2023.

Anexo ensayos de mezcla y agregados en frío

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Ensayos de laboratorio (1 archivo adjunto)

Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Solicitud de recursos adicionales para la gestión PIPMA

Por medio de la presente comunicación se solicita a la interventoría la aprobación de un presupuesto adicional para la gestión del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución de las actividades desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2023.

El contrato inicial, cuenta con un presupuesto PIPMA de 131.647.040,00, valor que se agota con la gestión del mes de diciembre del año 2022, a continuación, se relacionan los diferentes cobros realizados a la entidad de este recurso:

Acta Pipma No 1 del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2022 valor \$ 20.953.959,00
Acta PIPMA No 2 del 1 AL 31 de julio del 2022 Valor \$ 15.157.050,00
Acta PIPMA No 3 del 1 AL 31 de agosto del 2022 \$ 15.157.050,00
Acta PIPMA No 4 del 1 AL 30 septiembre del 2022 \$ 35.012.459,00
Acta Pipma No 5 del 1 al 31 de octubre del 2022 valor \$ 15.280.578,00
Acta Pipma No 6 del 1 al 30 de noviembre del 2022 valor \$ 15.280.578,00
Acta Pipma No 7 del 1 al 31 de diciembre del 2022 valor \$ 14.805.366,00

A continuación, se presenta el presupuesto requerido para la gestión PIPMA hasta el 15 de abril del 2023.

 EDIFICACIONES Y VIAS S.A 800.059.675-8						
PRESUPUESTO PGIO (PMA Y PMT) - PARCHEO POPAYÁN - 15 DE MARZO - 15 DE ABRIL DEL 2023						
SISTEMA DE GESTION Y SEGUIMIENTO						
PROGRAMA A1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)						
Num	ITEM	Cantidad	Tiempo Meses	Valor Unitario	Total	Registro de cumplimiento
NP1	Residente Social	1	1	3.885.000,00	3.885.000,00	Desprendible de nomina y pago de seguridad social
Subtotal					\$ 3.885.000,00	
COMPONENTE D: PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION						
D5.MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO						
ITEM	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Total	Registro de cumplimiento	
NP3	Brigada de ordeo, aseo y limpieza (El valor unitario corresponde a dos personas)	1,0	meses	3.757.350	3.757.350	Factura / Registro fotográfico /desprendibles de pago
Sub total					\$ 3.757.350,00	
PRESUPUESTO COMPONENTES A, B, C, D Y E					\$ 7.642.350	
SEÑALIZACION Y MANEJO DE ACCESOS VIALES PMT						
ITEM	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Total	Registro de cumplimiento	
NP9	Colombina	20,00	Und	36.134	722.680	Registro fotográfico/Factura
NP10	Cinta plástica con distintivo peligro demarcación tipo II (7.5 cm ancho) rollo de 500 m	6,00	Rollo	20.588	123.528	Registro fotográfico/Factura
NP11	4 reguladores de tránsito (el valor unitario corresponde al pago total mensual 4 reguador de trafico en un mes)	0,50	meses	7.514.700	3.757.350	Desprendible de nomina y pago de seguridad social
NP13	Señales móviles PMT	10,00	Und	195.000	1.950.000	Registro fotográfico/Factura
					\$ 6.553.558	
COSTO TOTAL AMBIENTAL SOCIAL Y PMT					\$ 14.195.908	

ITEM Profesional social: se requiere recurso para el pago del profesional residente social desde el 15 de marzo al15 de abril del 2023.

ITEM Brigada de Orden aseo y limpieza: se requiere recurso para el pago de la Brigada de Orden Aseo y limpieza desde el 15 de marzo al15 de abril del 2023.


ITEM Colombina: Se requieren 20 colombinas adicionales para reponer las colombinas deterioradas en la obra.

ITEM Cinta plástica con distintivo peligro demarcación tipo II (7.5 cm ancho) rollo de 500 m: Se requieren 6 rollos de cinta mensuales desde el 15 de marzo al15 de abril del 2023.

ITEM reguladores de tránsito (el valor unitario corresponde al pago total mensual 4 reguladores de tráfico en un mes): Se requieren 2 controladores de tráfico, para el cumplimiento del PMT, desde el 15 de marzo al15 de abril del 2023.

ITEM Señales móviles: Las señales dispuestas en el frente de obra han sufrido daños y robos por lo tanto se requiere reemplazar 10 unidades de señalización para el cumplimiento con lo exigido en el PMT.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: PRESUPUESTO ADICIONAL 2023

Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Solicitud de recursos adicionales para la gestión PIPMA

Por medio de la presente comunicación se solicita a la interventoría la aprobación de un presupuesto adicional para la gestión del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución de las actividades hasta el 15 de abril del 2023.

El contrato inicial, cuenta con un presupuesto PIPMA de 131.647.040,00, valor que se agota con la gestión del mes de diciembre del año 2022, a continuación, se relacionan los diferentes cobros realizados a la entidad de este recurso:

Acta Pipma No 1 del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2022 valor \$ 20.953.959,00
Acta PIPMA No 2 del 1 AL 31 de julio del 2022 Valor \$ 15.157.050,00
Acta PIPMA No 3 del 1 AL 31 de agosto del 2022 \$ 15.157.050,00
Acta PIPMA No 4 del 1 AL 30 septiembre del 2022 \$ 35.012.459,00
Acta Pipma No 5 del 1 al 31 de octubre del 2022 valor \$ 15.280.578,00
Acta Pipma No 6 del 1 al 30 de noviembre del 2022 valor \$ 15.280.578,00
Acta Pipma No 7 del 1 al 31 de diciembre del 2022 valor \$ 14.805.366,00

A continuación, se presenta el presupuesto requerido para la gestión PIPMA hasta el 15 de abril del 2023.

 EDIFICACIONES Y VIAS S.A 800.059.675-8						
PRESUPUESTO PGIO (PMA Y PMT) - PARCHEO POPAYÁN - ADICION PARA ENERRO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2023						
SISTEMA DE GESTION Y SEGUIMIENTO						
PROGRAMA A1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)						
Num	ITEM	Cantidad	Tiempo Meses	Valor Unitario	Total	Registro de cumplimiento
NP1	Residente Social	1	2,5	3.885.000,00	9.712.500,00	Desprendible de nomina y pago de seguridad social
Subtotal					\$ 9.712.500,00	
COMPONENTE D: PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION						
D5.MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO						
ITEM	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Total		
NP3	Brigada de ordeo, aseo y limpieza (El valor unitario corresponde a dos personas)	2,5	meses	3.757.350	9.393.375	Factura / Registro fotográfico /desprendibles de pago
Sub total					\$ 9.393.375,00	
PRESUPUESTO COMPONENTES A, B, C, D Y E					\$ 19.105.875	
SEÑALIZACION Y MANEJO DE ACCESOS VIALES PMT						
ITEM	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Total		
NP9	Colombina	20,00	Und	36.134	722.680	Registro fotográfico/Factura
NP10	Cinta plástica con distintivo peligro demarcación tipo II (7.5 cm ancho) rollo de 500 m	15,00	Rollo	20.588	308.820	Registro fotográfico/Factura
NP11	4 reguladores de tránsito (el valor unitario corresponde al pago total mensual 4 reguador de trafico en un mes)	2,50	meses	7.514.700	18.786.750	Desprendible de nomina y pago de seguridad social
NP13	Señales móviles PMT	10,00	Und	195.000	1.950.000	Registro fotográfico/Factura
					\$ 21.768.250	
COSTO TOTAL AMBIENTAL SOCIAL Y PMT					\$ 40.874.125	

ITEM Profesional social: se requiere recurso para el pago del profesional residente social de los periodos, para el mes de enero, febrero, marzo y los 15 días del mes de abril del 2023.

ITEM Brigada de Orden aseo y limpieza: se requiere recurso para el pago de la Brigada de Orden Aseo y limpieza de los periodos enero, febrero, marzo y abril los primeros 15 días del mes de abril del 2023.

ITEM Colombina: Se requieren 20 colombinas adicionales para reponer las colombinas deterioradas en la obra.

ITEM Cinta plástica con distintivo peligro demarcación tipo II (7.5 cm ancho) rollo de 500 m: Se requieren aproximadamente 6 rollos de cinta mensuales para culminar el periodo de construcción hasta el 15 de abril del 2023,

ITEM reguladores de tránsito (el valor unitario corresponde al pago total mensual 4 reguladores de tráfico en un mes): Se requiere mensualmente 4 controladores de tráfico mensualmente, para el cumplimiento del PMT, hasta el 15 de abril del 2023.



ITEM Señales móviles: Las señales dispuestas en el frente de obra han sufrido daños y robos por lo tanto se requiere reemplazar 10 unidades de señalización para el cumplimiento con lo exigido en el PMT.

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: PRESUPUESTO ADICIONAL 2023

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2023.

Ingeniera:

KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Ciudad

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 –
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL
PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

**ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION DEL CONTRATO – ACTUALIZACION DE PRECIO DEL ITEM
MEZCLA DENSA EN CALIENTE.**

Respetados ingenieros,

La empresa **EDIFICACIONES Y VIAS S.A.**, es una compañía con más de 30 años de actividad económica que dentro de su desarrollo comercial ha ejecutado proyectos en obras de infraestructura vial, acueductos, alcantarillados, Distritos de riego, obras de contención y espacio público entre otras, aportando de ésta manera al desarrollo de la infraestructura en Colombia.

En este sentido, con gran responsabilidad y compromiso se asumió la ejecución del contrato de obra pública No. 20211800024217 con el Municipio de Popayán, bajo la modalidad de precios unitarios, bajo el régimen de contratación estatal que otorga a los contratistas obligaciones frente a las entidades estatales pero también derechos los cuales permiten que la relación contractual con el estado, mantenga los criterios definidos en los principios de la contratación estatal.

El fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal como principio, se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato que deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse¹.

Es de conocimiento público que el precio del asfalto depende única y directamente de la sociedad de economía mixta ECOPETROL S.A., y que de acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), entre enero

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C. veintidós (22) de junio de dos mil once (2011). Radicación número: 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836). Actor: TOPCO S. A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.

de 2021 y mayo 2022, el acero subió un 65,7 por ciento, el asfalto, 25,7 % y el cemento, 9,8 por ciento².

Tenemos entonces que en ejecución del contrato No. 20211800024217 se ha presentado una **variación negativa de precios y la incidencia de esta variación en su ecuación de costos**; así lo podemos observar respecto al ítem de instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 del contrato que se paga hoy en día, y el precio que refleja el mercado, de conformidad con las circulares expedidas por ECOPETROL como política interna de fijación de precios para los productos petroquímicos e industriales, aumento en los materiales granulares disponibles en la zona y la actualización del valor del salario mínimo en cuanto a mano de obra se refiere:

Es claro que el incremento de los insumos para el suministro y la instalación de la Mezcla Asfáltica en Caliente, rompe el equilibrio contractual del contrato, situación que ha sido explorada con anterioridad respecto a otros insumos esenciales de las obras de infraestructura, como en el caso del acero; al respecto, en consultas llevadas a cabo por el Departamento del Cauca – Secretaría de Infraestructura mediante correo electrónico del 19 de abril de 2021, con radicado institucional No. 202101400028561 de 19 de abril de 2021, a la Contraloría General del Cauca, RAD No. 202101400038662 de fecha 2 de junio de 2021, se indicó que frente a los presupuestos antes expuestos, las entidades territoriales tendrían la potestad de determinar los ajustes necesarios para contrarrestar los impactos negativos del aumento de precios en los siguientes términos:

(...)

*En todo caso, y ante la ausencia de normatividad y jurisprudencia que regule el tema en comento, que permita generar una meridia certidumbre, no puede descartarse la eventual configuración de instituciones jurídicas como el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión en el contexto del Covid 19, pues claramente en estos tiempos de pandemia no es ilógico considerar un rompimiento del equilibrio económico del Contrato Estatal. Sobre el particular, el Consejo de Estado en providencia del 27 de marzo de 2014, ha manifestado [2]³: "El equilibrio económico del contrato corresponde a la ecuación contractual que surge una vez las partes celebran el negocio jurídico, de conformidad con la cual las prestaciones a cargo de cada una de las partes se miran como equivalentes a las de la otra. Así, el contratista cuya propuesta fue acogida por la administración, considera que las obligaciones que asume en virtud del contrato que suscribe, resultan proporcionales al pago que por las mismas pretende recibir, toda vez que al elaborar dicha oferta, ha efectuado un análisis costo-beneficio, fundado en los estudios y proyecciones que realizó en relación con los factores determinantes del costo de ejecución de las prestaciones a su cargo y la utilidad que pretende obtener a partir de la misma. (...) Una vez las partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna obligatorio su cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda (art. 1602, C.C.), lo que no descarta que situaciones extraordinarias, posteriores a la celebración del contrato, imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes (en el caso de la teoría de la imprevisión) o imputables a una actuación legal de la contratante (en el caso del hecho del príncipe), puedan alterar la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, de tal manera que sin imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más onerosa para la parte afectada, en lo que se conoce como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual, **en virtud del principio rebus sic stantibus, surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante una indemnización integral de perjuicios, en el caso del hecho del príncipe, en el cual la afectación de la ecuación contractual proviene de una medida de carácter general proferida por la misma persona de derecho público***

² <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/31/incremento-en-el-precio-de-los-materiales-amenaza-la-construccion-en-colombia/>

³ [2] Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-23-26-000-1998-03066-01 (20912).

contratante, o llevando al contratista a un punto de no pérdida (art. 5º, Ley 80/93), mediante el reconocimiento de los mayores costos en los que incurrió, por hechos imprevistos e irresistibles para las partes. (...)”

Así que, bajo esta premisa, las partes tendrán derecho a pedir la revisión del contrato, para efectos de que se “analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y más específicamente, la composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido presentar en los mismo entre la fecha de presentación de la oferta o de celebración de contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones” o si, en efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada”, [3]⁴ pues en todos los casos se debe perseverar por el equilibrio financiero, en razón al interés público y a los principios constitucionales que orientan la función administrativa y que se materializan en la génesis de cada contrato. Conforme a lo anterior, el discernimiento de cada una de las anteriores posturas, finalmente estará sometido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través del medio de control denominado Controversias Contractuales. (subrayas y negrillas fuera del texto original).

A LA LUZ DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, se trata de situaciones todas ajenas a las partes de los negocios contractuales, que exceden el álea normal de los riesgos que asumió la parte privada en el momento en que suscribió el contrato. En este sentido el Código de Comercio indica:

Artículo 868:

“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”.

La imprevisión hace referencia a la ocurrencia de hechos o circunstancias extraordinarias que exceden en mucho las previsiones que podían hacerse al momento de contratar y que, al ser de tal gravedad para la relación contractual, hacen intolerable la carga de la obligación para una de las partes. Hablamos de una imposibilidad relativa de cumplir, como aquella generada por una crisis económica.

Atendiendo los principios de la buena fe y de confianza legítima que deben primar en las relaciones contractuales, de mutuo acuerdo y conscientes del nuevo escenario que nos impone el incremento desmesurado del acero, es necesario se revisen los contratos y se ajusten considerando los efectos de los hechos imprevistos que afectan su ejecución.

Si bien es cierto que los contratos son para cumplirse, no menos cierto es que ello depende del mantenimiento de las condiciones y circunstancias normales al momento en que fueron pactados.

El principio “*Pacta sunt servanda rebus sic stantibus*”, expresa que los pactos deben cumplirse, mientras las cosas sigan así.

La «cláusula rebus» es una construcción doctrinal cuya posibilidad de utilización ha sido admitida por nuestra jurisprudencia sobre el fundamento de que exigir el mantenimiento de las condiciones de un contrato a pesar

⁴ [3] Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-23-26-000-1998-03066-01 (20912).

de una modificación extraordinaria de las circunstancias que lo motivaron podría resultar contrario a la equidad y a la buena fe.

La Jurisprudencia ha reconocido que ante factores exógenos, imprevistos e irresistibles, el más afectado resulta ser el contratista.

En este orden de ideas, se tendrá el derecho a pedir **la revisión del contrato**⁵, para efectos de que se *"analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y más específicamente, la composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido presentar en los mismo entre la fecha de presentación de la oferta o de celebración de contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones o si, en efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada"*.

En todos los casos se debe perseverar por el equilibrio financiero, en razón al interés público y a los principios constitucionales que orientan la función administrativa y que se materializan en la génesis de cada contrato.

En las condiciones anteriormente descritas, ¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico del contrato de obra celebrado bajo el sistema de precios unitarios?

Recordemos que el contrato estatal tiene el carácter de ser conmutativo y por regla general sinalagmático, lo que quiere decir que se debe propender por la equivalencia entre el trabajo ejecutado y la utilidad recibida.

Así lo manifiesta el Tratadista Jaime Orlando Santofimio Gamboa⁶:

"Ahora bien, de manera primordial y sobre todo especial, la aproximación a las bases del concepto material de contrato estatal implica forzosamente admitir, en cuanto es presupuesto legal fundamental para estos propósitos, como lo determinan los artículos 4.º (num. 3 y 8); 5.º (num. 3); 25 (num. 3 y 4); 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, su carácter de fenómeno económico. De aquí la necesidad de predicar para el mismo una regla básica e indispensable para garantizarla convivencia en la relación negocial, cual es la de la existencia de un equilibrio permanente entre las prestaciones y el derecho de las partes involucradas, lo que implica partir del expreso reconocimiento legal y admitir su carácter conmutativo y oneroso; por lo tanto, compartir la esencia de lo sinalagmático que la conmutatividad implica, por lo menos para los casos en que proceda, construyendo con esta caracterización una grande e importante regla general en cualquier intento de reconstrucción de un concepto de fondo de contrato estatal, esto en la medida en que quedado el carácter amplio del artículo 32 de nuestra ley de contratación pública, es posible encontrar contratos del Estado excepcionalmente de efectos unilaterales, donde resulta difícil sostener la operatividad de la conmutatividad"

Para el caso sub-examine, tenemos que el Contrato No. **20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021**, carece de fórmula de ajuste; situación que si bien era conocida por los proponentes desde los pliegos definitivos, iba flagrantemente en contravía de lo preceptuado en el artículo 4º, numeral 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, donde claramente se expresa:

⁵ Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-23-26-000-1998-03066-01 (20912).

⁶ <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/viewFile/2589/2228>. El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio económico. Bogotá, abril de 2008. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

"ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

(...)

8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

9°. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

Al respecto, el Consejo de Estado y diferentes Tribunales de Arbitramento, ha abordado el estudio respecto a la revisión de los Contratos estatales por la vía del medio de control de las controversias contractuales, con relación al desequilibrio económico cuando la cláusula de ajuste pactada, conduce al rompimiento del equilibrio económico del Contrato. Para el caso en concreto, tenemos la absoluta falta de esta posibilidad, sin que lo anterior signifique que se proscriba el derecho de los contratistas y los deberes de la administración por el mero negocio jurídico del Contrato.

En este sentido el Tribunal⁷ de Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre las partes ha expresado:

"Valor del Contrato. «(...)Con otras palabras, si bien un Contrato administrativo es ley para las partes en virtud de que las mismas manifiestan autónomamente su voluntad de comprometerse (...) corresponde al valor de la obra, de los servicios o del suministro, precio que no puede ser el que acuerden las partes conforme a apreciaciones subjetivas, sino que debe reflejar los costos reales de la prestación a cargo del contratista, más un margen razonable de utilidades garantizadas por el Estado (L. 80/93, art. 3.2). El valor del Contrato debe ser el justo precio de la obra, servicio, o del suministro. El ideal ético jurídico de justicia conmutativa es una regla básica para asegurar la selección objetiva de los contratistas, que se inspira en la necesidad de preservar la moralidad y transparencia del manejo de los recursos públicos, y los derechos e intereses de los particulares que colaboran en la realización de los fines del Estado. El artículo 28 de la Ley 80 de 1993 señala que el ofrecimiento más favorable lo realiza la entidad, atendiendo entre otros factores, la consulta de precios o condiciones del mercado. El precio del Contrato es justo no porque haya sido convenido entre las partes (tantum valet res quantum vendi potest), sino porque

⁷ Laudo Arbitral de fecha Julio 12 de 2000. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tribunal de Arbitramento. Caso: INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGÍA Y EQUIPO CONSTRUCTORA INECON-TE LTDA. Y CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO S.A. CONCA S.A. VS. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS.

concuera con unos parámetros objetivos de legitimidad. Esta regla se aplica tanto a los Contratos que la administración pública celebra por licitación pública o concurso de méritos, como también por contratación directa (art. 24, par. 2º *ibidem*)".(...)

Cláusula de revisión, reajuste y equilibrio económico del Contrato. «(...) De lo expresado puede concluirse que la cláusula de revisión y ajuste de precios hace parte de la ecuación contractual pactada y que, como cualquier otro elemento de dicha ecuación, es una ley del Contrato que debe ser observada por las partes en virtud de que a ello autónomamente se comprometieron en el momento de proponer o contratar, según el caso. No obstante cabe anotar que la propia Ley 80 de 1993 en su artículo 4.8 prevé que la cláusula de ajuste y revisión de precios es revisable "si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución?", tema que se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión lo cual significa, que si durante el desarrollo del plazo de un Contrato administrativo surgen circunstancias o hechos imprevisibles e imprevistos que hagan ineficaz la fórmula adoptada para mantener el equilibrio económico del precio pactado, esta debe revisarse a fin de restablecer la ecuación contractual vulnerada.(...)»

Cláusula de ajuste y revisión de precios. «(...) Dentro de los anteriores parámetros una cláusula de ajuste y revisión de precios que, vista al momento de proponer o contratar, conduzca a inflar sustancialmente el valor de los bienes o servicios contratados en desmedro de la entidad estatal o a rebajarlos en contra del particular contratista, no será idónea para cumplir con el propósito para el cual fue ideada por la ley y, por el contrario, conduciría a la violación de imperativas normas de orden público contempladas en la misma, como son las que obligan a la administración a seleccionar objetivamente a los contratistas y confieren a estos el derecho a recibir la remuneración pactada y a que esta mantenga su valor intrínseco a lo largo de la ejecución del Contrato. En esta hipótesis la cláusula de revisión de precios sería absolutamente nula por violar normas de orden público de obligatoria observancia en la contratación estatal.(...)»

Equilibrio económico del Contrato. «(...) "La noción de equilibrio financiero del Contrato, sin embargo, no comporta para el contratista una garantía de la utilidad esperada. Hay que distinguir lo que corresponde al riesgo normal del Contrato, que el contratista habría podido y debido normalmente prever al momento de contratar, y la pérdida que, en cambio, se produzca por circunstancias extraordinarias, no previsibles o imperiosas que hayan hecho más gravosa la prestación a su cargo".

"La teoría del equilibrio económico no se aplica para suplir las deficiencias económicas en que haya incurrido el contratista al momento de contratar o convenir los precios en relación con los costos vigentes y los probables. Tampoco para corregir los errores de cálculo de la fórmula de ajuste de precios del Contrato".

"Lo que sustenta el principio del equilibrio financiero del Contrato es que se preserve la equivalencia de las prestaciones en la forma pactada en el Contrato, porque es esa correspondencia la que determinó a las partes a contratar y, en condiciones normales, no debe ser alterada".(...)

El Consejo de Estado⁸ ha dictaminado que en los eventos en los que no se haya pactado fórmula de reajuste o que la pactada sea insuficiente, la parte afectada tendrá derecho a pedir la revisión del Contrato:

⁸ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA - SUBSECCION B. Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-26-000-1998-03066-01(20912). Actor: CONSORCIO FRANCISCO EDGAR LIZCANO PAEZ-HUGO SALAZAR ORTIZ. Demandado: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE. Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

"EL REAJUSTE Y REVISION DE PRECIOS - Medida preventiva frente a una situación previsible, que puede afectar el resultado económico final del Contrato en contra de cualquiera de las partes / RESULTADO ECONOMICO FINAL DEL CONTRATO - Inclusión la respectiva cláusula de reajuste, mediante una fórmula matemática / FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS - No se pactó. Derecho de la parte afectada a pedir la revisión del Contrato. El reajuste de precios, surgió como solución ante el hecho de que en aquellos Contratos de tracto sucesivo o ejecución diferida, el solo transcurso del tiempo puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los diversos ítems o rubros que conforman los precios unitarios, afectándolos de tal manera que el contratista va a incurrir en realidad en mayores costos de los presupuestados inicialmente, porque a la hora de ejecutar las obras o servicios, los materiales, equipos y mano de obra ya no valdrán lo mismo que valían en la fecha en la que se proyectó el presupuesto de la obra y se calcularon los costos de la misma. (...) Toda vez que se trata de una situación previsible para las partes, se ha considerado necesario que éstas incluyan en el Contrato fórmulas, que pueden ser matemáticas, mediante las cuales puedan reajustarse periódicamente esos precios unitarios obedeciendo a las variaciones de sus componentes en el mercado, de tal manera que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. (...) la figura del reajuste de precios es una medida preventiva frente a una situación previsible, que puede afectar el resultado económico final del Contrato en contra de cualquiera de las partes, y que se soluciona mediante la inclusión en el mismo de la respectiva cláusula de reajuste, normalmente mediante una fórmula matemática. (...) No obstante, puede suceder que no se haya pactado una fórmula de reajuste de precios, o que la incluida en el Contrato resulte insuficiente para absorber las variaciones que se hayan presentado en algunos de los elementos componentes de los precios unitarios, de tal manera que al aplicarla realmente no se produzca la actualización de los mismos; en tales condiciones, la parte afectada tendrá derecho a pedir la revisión del Contrato, es decir, que se analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y más específicamente, la composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido presentar en los mismos entre la fecha de presentación de la oferta o de celebración del Contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones o si, en efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada."

Estableciendo entonces el derecho del contratista de contar con la revisión del Contrato de obra pública, cuando las condiciones de los precios representan un desequilibrio contractual, es pertinente abordar el tema de las utilidades debidas al contratista, que con base en el Artículo 3° Inciso 2; Artículo 4° y Artículo 5 numeral 1° de Ley 80 de 1993 son propias del Contrato estatal.

Así lo ha expresado el Consejo de Estado⁹ en sentencia de veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ:

« (...) De lo dicho resulta que cuando la administración priva de la posibilidad de la ejecución del Contrato al contratista particular, éste tiene derecho al reconocimiento y pago de la utilidad esperada En esta dirección adicionalmente la Sala ha precisado:

"la indemnización debe equivaler al 100%, porque no es posible para el juez deducir que el contratista no habría obtenido la totalidad de la utilidad que esperaba, de haber podido ejecutar el

⁹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA - SUBSECCION A. Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 44001-23-31-000-2001-00779-01(25643). Actor: SOCIEDAD OJEDA BRITO LIMITADA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Contrato. Es decir, el hecho de que no haya tenido que hacer un esfuerzo, administrativo, financiero o técnico, no significa que necesariamente su utilidad hubiera sido inferior"

(...)

...el Tribunal a quo no condenó con un lucro cesante genérico o hipotético, como aduce el apoderado de la entidad apelante. Se tiene por probado que el Instituto Nacional de Vías adjudicó un Contrato de obra que no pudo iniciarse por causas ajenas al contratista y que la imposibilidad de ejecutarlo causó un daño específico y concreto al contratista, consistente en la pérdida de la utilidad predeterminada entre las partes. Ahora bien, como la entidad demandada no discute la base del cálculo de la utilidad y ésta hace parte del Contrato, la Sala considera que debe condenar a la indemnización calculada sobre dicha utilidad pactada en el Contrato, sin exigir o pretender otra prueba de la misma.

En ese sentido lo ha definido la Sala para este tipo de circunstancias, así:

"Estima también que es procedente reconocer al proponente la totalidad de la utilidad que esperaba, de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, si se tiene en cuenta que este estatuto prevé el derecho del contratista a percibir las utilidades proyectadas..."

(...)

Por tal motivo, se proferirá condena en concreto en cuya virtud la entidad estatal demandada deberá a pagar la suma que corresponde al 5% del valor del Contrato, que correspondiente a la utilidad proyectada de acuerdo con el pacto contractual. La condena incluirá el respectivo ajuste de valor con el índice de precios al consumidor. (...)"

Al respecto, el Consejo de Estado¹⁰, ha manifestado que:

"(...)

El fenómeno inflacionario puede tener la virtualidad de impactar la economía del contrato, cuando afecta los costos del mismo; así, cuando la fórmula de reajuste pactada está concebida en función de la variación de los factores que inciden en la determinación de los costos del contrato, la inflación puede aumentar dichos costos, pero la fórmula corregirá los precios exactamente en la misma proporción (incluyendo la utilidad, puesto que dentro de la estructura de los precios unitarios ella hace parte integrante de los mismos), de modo que el valor de la remuneración intrínseca del contratista se mantendrá incólume. **También puede suceder que, como consecuencia de un hecho económico imprevisible, se altere el valor de la remuneración pactada, porque se afecten factores que inciden en la determinación de los costos del contrato que no fueron incluidos como variables de la fórmula de reajuste, de manera que el deflactor de precios utilizado no permita mitigar el efecto negativo que se produce en la economía del negocio; cuando esto sucede, debe analizarse en cada caso particular si se presenta ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato y si resulta procedente arbitrar mecanismos de revisión de precios.**" (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

Respecto al **INCREMENTO DEL PRECIO DEL ASFALTO**, en demanda de controversias contractuales en la que el contratista alegó el desequilibrio económico del contrato de obra por el incremento desmesurado del

¹⁰ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA - SUBSECCION A. Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Radicación número: 85001-23-31-000-1998-00168-01(17660). Actor: GISAICO LTDA. Vs. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS.

precio del asfalto, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la **fluctuación de precios es una circunstancia imprevisible** que puede generar el rompimiento de la ecuación financiera del contrato estatal¹¹.

En la jurisprudencia se cita que en los contratos de obra en los que se pacta el pago por precios fijos sin fórmula de reajuste es más probable que se presente una ruptura en la equivalencia de las obligaciones.

Así también lo ha expresado el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 20524 manifestó que la modalidad de pago a precio o precios fijos sin fórmula de reajuste es poco plausible, ya que pone en riesgo el mantenimiento de la ecuación financiera del contrato estatal; en efecto, en esa providencia se dijo que:

"tal proceder es completamente equivocado, pues, por una parte, la simple prohibición o la renuncia al cobro de los reajustes de precios no impide que éstos varíen durante la ejecución del contrato y, por otra parte, la prohibición en tal sentido sólo conduce a imposibilitar que se conserve o se restablezca la ecuación económica del contrato, en detrimento del patrimonio de una de las partes intervinientes y con el correlativo incremento injusto del patrimonio de la parte contraria, lo cual pugna con el principio general del derecho según el cual nadie puede enriquecerse, sin justa causa, a expensas del patrimonio de otro, en la medida en que el comitente puede recibir una construcción cuyo costo puede ser superior al que ha pagado por ella al constructor".

Con base en lo anterior, de manera respetuosa, se eleva ante la entidad contratante la siguiente:

PETICION

1.- Con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, bajo el cual la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato y el artículo 4° numeral 3° bajo el cual se podrá solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra del contratista el equilibrio económico o financiero del contrato, adicional a las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente se solicita al municipio de Popayán, proceda a **LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL ITEM DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE** del presente contrato de la siguiente manera:

¹¹ Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 73001233100020110006001 (44715), Sept. 19/19

Edivial S.A.		EDIFICACIONES Y VIAS S.A 800.059.675-8	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA		FECHA	15 / 3 / 2023 (Día) (Mes) (Año)
CONTRATO No. 20211800024217 DE 2021			
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.			
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VIAS S.A.			
INTERVENTOR:		CTO No.	DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: (Día) (Mes) (Año)			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 incluye Transporte	M3	7610,80
I. EQUIPO			
DESCRIPCION	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compactador neumático	\$ 100.000,00	43,18	\$ 2.315,78
Compactador vibratorio, 10 TN, 153 Hp	\$ 100.000,00	43,18	\$ 2.315,78
Terminadora de asfalto	\$ 180.000,00	43,18	\$ 4.168,40
Herramienta menor		5,00	\$ 1.015,47
SUBTOTAL			\$ 9.815,43
II. MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.
Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	1,25	\$ 687.000,00
SUBTOTAL			\$ 858.750,00
III. TRANSPORTES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA
Transporte de Mezcla densa en caliente MDC-19	m3Km	1,25	10,00
SUBTOTAL			\$ 14.185,50
IV. MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL
Obrero (8)	\$ 309.333,33	1,85	\$ 572.266,67
Oficial (1)	\$ 65.733,33	1,85	\$ 121.606,67
Rastrillero (2)	\$ 98.986,67	1,85	\$ 183.125,33
SUBTOTAL			\$ 20.309,36
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 903.060,29			
V. COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25,00%	225.765,07	
IMPREVISTOS (2% sobre costo directo contractual de \$633.248,79)	2,00%	12.664,97	
UTILIDAD (5% sobre costo directo contractual de \$633.248,79)	5,00%	31.662,43	
SUBTOTAL		\$ 270.092,48	
PRECIO UNITARIO TOTAL (Redondeado al peso) \$ 1.173.153			
Firma Nombre: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. 54202-68954 NTS			

Se anexa al presente escrito, análisis de precio unitario, la circular expedida por ECOPETROL donde se refleja el incremento del precio del asfalto y cotización de la Mezcla Asfáltica en Caliente MDC 19 actualizada.

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
EDIFICACIONES Y VIAS S.A.
GERENTE
C.C. Interventoría

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731678942DAD47D

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
<p>DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> E68C1ACFF5D04B0</p> <p>Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos</p>	<p>DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> A6D9C613D53C9428</p> <p>Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales</p>



Popayán, 14 de marzo de 2023

**SEÑORES
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S**

REFERENCIA: CONTRATO No 20211800024217 DEL 2021
Suministro de insumos para la obra en referencia

Cordial saludo:

Mediante la presente doy conocimiento de los insumos y materiales solicitados a cotizar

No.	Materiales	Unidad	Cotización
1	Mezcla densa en caliente	M3	\$ 700.000

DANIEL SANTIAGO CAICEDO CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL
DASAK INGENIERIA S.A.S

CALLE 27 NORTE # 4 – 54 TEL 3212130602
EMAIL: DASAK INGENIERIA@GMAIL.COM
POPAYAN - CAUCA



ORLANDO EDMUNDO REVELO
INGENIERO CIVIL CONTRATSTA NIT. 12.976.085-8
CALLE 18 N No. 16-15 TEL 8366180 Popayán

Popayán, marzo de 2023

Señores:
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
Popayán-Cauca

Referencia: Cotización

Cordial saludo

Por la presente me permito dar conocimiento de los costos de los equipos solicitados, los cuales son de mi propiedad.

No.	Materiales	Unidad	Cotización
1	Mezcla densa en caliente	M3	\$ 710.000

De manera atenta

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C No. 12.976.085
PROPIETARIO



Calle 36 No. 17 A - 39 Piso 2
Teléfono: 285 7731 Fax: 288 0275
Bogotá, D.C.
agregadostetuansa@hotmail.com
NIT. 801.004.314-1

Popayán, 15 de marzo de 2023

AT-POP-0060

COTIZACIÓN

PARA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

DE: HASMER A JAVELA Q.
Administrador de Obra

ASUNTO: Cotización materiales de obra

Cordial saludo

Atendiendo a su solicitud, de manera atenta nos permitimos presentar cotización, según los siguientes ítems:

Material	Unidad	VALOR
Mezcla densa en caliente MDC-19	M3	\$687.000,00

Atentamente

HASMER A JAVELA Q.
Administrador de Obra

cc. Archivo
Elaboro: prg

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2023.

Ingeniera:
KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Ciudad

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 –
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO
DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE
POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES.

Respetados ingenieros,

De manera atenta y respetuosa nos permitimos elevar ante la entidad contratante y la interventoría del proyecto, la presente petición de solicitud de recursos adicionales con base en los siguientes argumentos:

1.- Dentro de la estructura de la Administración Municipal de la Alcaldía de Popayán se encuentra la Secretaría de Infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad.

En aras de dar alcance a sus objetivos, la Administración Municipal y la Secretaría de Infraestructura cuentan con un plan vial en el que se encuentra inmerso el proyecto **MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"**, Proyecto que ejecuta actualmente la empresa Edificaciones y Vías S.A. Mediante el contrato de la referencia.

Durante la ejecución del contrato se han intervenido varios sectores de la ciudad abarcando la mayoría de las comunas del Municipio de las 9 que lo componen, no obstante, el alto deterioro de la malla vial actual no han permitido llegar todas ellas. Por lo anterior se hace necesario continuar con el mantenimiento de las vías mediante el programa de parcheo y garantizar a los usuarios mejores tiempos de desplazamiento, evitar accidentes y mitigar el deterioro actual de la estructura del pavimento de la zona urbana del Municipio de Popayán. A la fecha se evidencia que con el monto actual del contrato no es posible abarcar todas las

comunales del Municipio y que con el objeto y alcance del contrato No. 20211800024217, es posible atender las necesidades prioritarias de la ciudad, para así incluir las arterias viales más importantes y mejorar sus condiciones de transitabilidad.

El día 31 DE ENERO DE 2022 se llevó a cabo una reunión en La Secretaria de Infraestructura del Municipio con los líderes comunales, en esta reunión se solicitó por parte de estos, la intervención de la malla vial de los barrios que aún falta intervenir debido al deterioro que presenta; posterior a ello el día 02 de febrero de 2023 se realiza recorrido por parte de la entidad contratante, interventoría, contratista y líderes comunales en el cual se prioriza la intervención de las siguientes comunas, las cuales se observan con vías deterioradas y con una necesidad urgente de reparación:

No.	ZONA DE INTERVENCIÓN
1	COMUNA 1
2	COMUNA 4
3	COMUNA 9

Con base en lo anterior, muy respetuosamente se eleva la siguiente:

SOLICITUD

1.- Con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, bajo el cual la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato, y las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente se solicita al Municipio de la ciudad de Popayán, y con el aval de la interventoría, proceda a aprobar la solicitud de **RECURSOS ADICIONALES** del contrato No. 20211800024217 DE 2021 "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".", por un valor de **MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL M/CTE (\$1.085.760.000.00)** y un término adicional **HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2023**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual actual para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A
Copia a la Alcaldía

Anexo: Presupuesto, flujo de caja y programación de obra para el valor de la adición solicitada.

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
– OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL
MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL
MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: RESPUESTA ANTE DERECHO DE PETICIÓN

Cordial saludo:

Atendiendo al asunto del presente oficio, referente al caso del sr. Harold Daza Garcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.817 de la ciudad de Popayán y residente en la Carrera 9 # 8-81 del Barrio San Camilo, quien presento un derecho de petición, manifestando que por obras desarrolladas en la Calle 9 entre Carreras 8 y 9, sector donde se realizaron obras del contrato de la referencia, se dejaron presuntas fallas en andenes y calles, hueco de aproximadamente 5m x 0.50m, y empozamiento de agua durante la ocurrencia de lluvias, que podría estar generando inundación de la vía y salpicaduras de barro sobre las viviendas. Adicionalmente, añade, que, presuntamente por esta causa, su vivienda de habitación antes mencionada, se está llenando de grietas sobre las paredes y cielo raso, además, de fuertes cimbrones que ocasiona en su residencia, el paso de camiones debido al hueco o zanja citado con anterioridad.

Entre las peticiones del Sr. Harold Daza está, una visita técnica y que se realicen los arreglos de infraestructura a que haya lugar, además, de hacer una valoración sobre los daños causados a su vivienda y que se lleven a cabo los arreglos necesarios.

En atención a la petición del señor **HAROLD DAZA**, el contratista **EDIVIAL S.A.**, adelantó visita técnica en la calle 9 con carrera 9 el día 17 de febrero de 2023, donde se observa un corte a la estructura de pavimento previamente instalada en los trabajos desarrollados en el reparcheo de la ciudad de Popayán.

Es pertinente aclarar que este corte en la estructura, no obedece a una condición de calidad o de servicio bajo la ejecución del contrato de la referencia, pero si de trabajos llevados a cabo por EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN, en sus labores de traslado de redes de este servicio.

Se observa en la visita llevada a cabo por nuestro personal técnico, que posterior al corte llevado a cabo por la empresa de acueducto, se adelanta un recubrimiento en concreto pobre, el cual presenta evidente deterioro.

Como quiera que lo anteriormente evidenciado no guarda relación alguna con las labores desarrolladas por la empresa **EDIVIAL S.A.**, muy respetuosamente se sugiere **TRASLADAR LA PETICION** del señor **HAROLD DAZA** a la Empresa de Acueducto de Popayán, para que brinde solución respecto al deterioro de la reparación del corte para traslado de redes.

Por otra parte, se manifiesta en el derecho de petición que se presenta en la carrera 9 con calle 9 un empozamiento para lo cual es pertinente indicar que este comportamiento de las aguas, era preexistente a las actividades desarrolladas por **EDIVIAL S.A.**, razón por la cual el contratista de obra tuvo en cuenta la margen derecha e izquierda de la vía para conservar el mismo nivel que se tenía con anterioridad.

Se informa que al momento de desarrollar las obras se determinó que de levantar los niveles de la estructura de pavimento, estos elevarían los niveles de agua sobre la margen izquierda y derecha, lo que podría encausar las aguas hacia una vivienda que esta ubicada en el costado izquierdo # 8- 84 del mismo sector, generando posibles inundaciones en la misma.

Respecto a los presuntos daños a la vivienda del señor **HAROLD DAZA**, es pertinente manifestar que se desconoce el estado estructural previo de techos, paredes y demás razón por la cual no es dado para el contratista atender dicha petición.

Importante indicar que el derecho de petición del señor **HAROLD DAZA** fue atendido dentro de los términos legales establecidos para tal fin, teniendo en cuenta la visita técnica de fecha 17 de febrero de 2023.

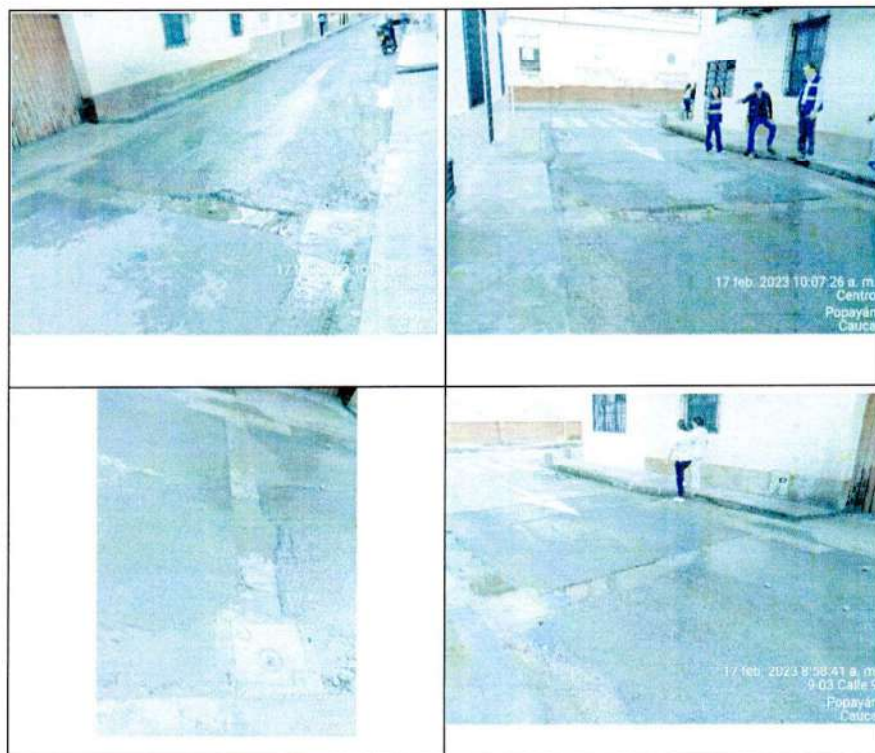
De esta manera se confiere respuesta de manera **oportuna, clara, completa y de fondo** al asunto solicitado. Se anexa a la presente, registro fotográfico.

Sin otro en particular, agradecemos su atención,

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
EDIVIAL S.A.
GERENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Entrega Certificados De Calidad - Insumos Para Demarcación Horizontal.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los certificados de calidad de los insumos (Pintura y micro esferas) a utilizar para realizar la actividad de demarcación horizontal en el proyecto.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Certificados de Calidad (3 archivos adjuntos)

Bogotá, D.C., 4 de abril de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: EMPOZAMIENTO - BARRIO SAN CAMILO.


Cordial saludo:

Atendiendo al asunto referente al caso del sr. Harold Daza García, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.817 de la ciudad de Popayán y residente en la Carrera 9 # 8-81 del Barrio San Camilo; Sobre un empozamiento que se presenta en la carrera 9 con calle 9.

Se reitera que este comportamiento de las aguas, era preexistente a las actividades desarrolladas por EDIVIAL S.A., razón por la cual y bajo el criterio del ingeniero residente de obra, se tuvo en cuenta la margen derecha e izquierda de la vía para conservar el mismo nivel que se tenía con anterioridad. Se informa que al momento de desarrollar las obras se determinó que, de levantar los niveles de la estructura de pavimento, estos elevarían los niveles de agua sobre la margen izquierda y derecha, lo que podría encausar las aguas hacia una vivienda que está ubicada en el costado izquierdo # 8- 84 del mismo sector, generando posibles inundaciones en la misma.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

E-24217-122

Bogotá, D.C., 11 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Entrega Preacta 10.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de la preacta parcial de obra No. 10 correspondiente al mes de marzo de 2023, lo anterior para su revisión y trámite.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Archivo en Excel con lo enunciado

Bogotá, D.C., 15 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: Entrega de caracterización de materiales granulares y densidades en campo.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los ensayos y caracterización de los materiales granulares utilizados en la rehabilitación de la carrera 6 entre calles 69N y 70N del barrio La Paz (subbase granular y base granular). Así como los resultados de los ensayos de densidades realizadas en campo al material instalado.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Ensayos de laboratorio, caracterización y densidades en campo
(6 Archivos en pdf)

E-24217-124

Bogotá, D.C., 18 de abril de 2023.


Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ENTREGA DE CANTIDADES DE OBRA REHABILITACIÓN LA PAZ.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de las cantidades de obra cuantificadas en la rehabilitación de la carrera 6 entre calles 69N y 70N del barrio La Paz para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Documentos anexos: Archivo con cantidades (1 carpeta)

Bogotá, D.C., 19 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"

ASUNTO: ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 5

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de copia de las siguientes pólizas:

- Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101372699, Anexos 11 y 12, expedidos por Seguros del Estado S.A.
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101179920, Anexos 8 y 9, expedida por Seguros del Estado S.A.

Las pólizas originales fueron radicadas el 13 de abril de 2023 en el portal SECOP II, quedando pendiente la aprobación de la entidad, como se observa en la imagen:

Fecha límite para entrega de garantías: 30-12-2021 5:00:00 PM. Fecha de entrega de garantías: 23/02/2023 2:41:38 PM.

Garantías del proveedor									
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emissor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	
GGT-WRE-11357292	Cumplimiento - Buen manejo y correcta ejecución vial anteriores	Contrato de seguro	\$ 254.674.112.55 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/04/2025	Pendiente	Detalle		
GGT-WRE-11357593	Cumplimiento - Buen manejo y correcta ejecución vial anteriores	Contrato de seguro	\$ 254.674.112.55 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/03/2025	Pendiente	Detalle		
GGT-WRE-11357493	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	\$99.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5 días para terminar	Pendiente	Detalle		
GGT-WRE-11357490	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	\$99.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5 días para terminar	Pendiente	Detalle		

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Anexos de las pólizas en cuatro (4) documentos.

Bogotá, D.C., 21 de abril de 2023

Ingeniero:

ANSELMO MARTINEZ ARIZA

Director de interventoría

INP SERVICIOS SAS

Calle 77B No 57 -103 Of. 905

Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 - OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE.

Por medio del presente el contratista de obra el consorcio Edivial S.A, se procede a remitir actas de vecindad de cierre levantadas en la ejecución del contrato en referencia, con el objetivo de que se realice su respectiva revisión, relacionados a continuación.

N°	RESPONSABLE	DIRECCIÓN	N. FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	Juan Camilo Lara	Calle 70 -carrera 6 esquina	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
2	Leonardo Leitón	Calle 70AN # 6-02	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
3	Luis cerón	Calle 70AN # 6-02	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
5	Esmeralda Cortez	Calle 70 N # 6-02	9	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.

*Recibo -
Rogelio de Q. Lind
21-ABR-2023*

6	Oscar Hernán Collo	Calle 70 N # 6-03	10	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
7	Víctor Eugenio Arango	Calle 70 N # 6-04	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
8	Néstor Hurtado	Calle 69 AN # 6-03	7	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
9	Katherine Rengifo	Calle 69 N # 5A-60	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
10	Martha Rojas	Calle 69 N # 5A-58	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
12	Manuel Eduardo Ramírez	Calle 69 N # 5A-59	6	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
13	Alejandra Bravo Delgado	Calle 69 AN # 5A-58	7	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
14	María Nidia D.	Calle 70 N # 5A-59	7	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
15	Andrea Jativa	Calle 70 N # 5A-58	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o

				responsable de la unidad social.
19	Marisol Castillo	Calle 70 AN # 5A-58	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
20	Sully Alexandra Ortega S.	Calle 70 AN # 5A-58 Local 2	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
23	Carolina Sánchez	Carrera 6 # 70-69	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.
24	Jorge Luis Gonzales	Calle 70bn # 5A-59	5	Acta de vecindad de cierre firmada a satisfacción por el propietario y/o responsable de la unidad social.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
 Gerente
 EDIVIAL S.A.

Bogotá, D.C., 21 de abril de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ACTAS DE RESPONSABILIDAD

Por medio del presente el contratista de obra el consorcio Edivial S.A, se procede a remitir actas de fachada levantadas en la ejecución del contrato en referencia, con el objetivo de dar a conocer casos particulares en los cuales luego de tres (3) visitas no se encontró al propietario y/o responsable del predio; a raíz de lo cual se procedió a levantar acta de fachada describiendo la parte exterior de las viviendas, en tal sentido en caso de presentarse algún reclamo posterior o durante la obra, el contratista se exime de responsabilidad cada vez que no fue posible el ingreso a dichos predios, relacionados a continuación.

N°	RESPONSABLE	FECHA DE LEV	DIRECCIÓN	BARRIO	N. FOLIOS	OBSERVACIÓN
4		03-12-2022	Calle 70 AN- carrera 6 esquina	La Paz	5	La vivienda se encuentra deshabitada, se realiza acta de fachada.
14	Hernán Legarda	27-12-2022	Carrera 6 # 69N-10	La Paz	5	Se realiza visita y el responsable del predio manifiesta estar ocupado y no atiende el acta.
16		03-12-2022	Calle 70 N # 5A-59 Local 1er piso	La Paz	5	Se realiza visita sin atención-local cerrado.
17		03-12-2022	Calle 70 N # 5A-59 Apto 2do piso	La Paz	5	Se realiza visita sin atención.

18		03-12-2022	Calle 70 N # 5A-59 Apto 3er piso	La Paz	5	Se realiza visita sin atención- deshabitado.
21		03-12-2022	Carrera 6 # 70N-69 Local 1- cafeteria	La Paz	4	Se realiza visita sin atención-local cerrado.
22		03-12-2022	Carrera 6 # 70N-69 Local 2 Bodega	La Paz	5	Se realiza visita sin atención-local cerrado.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,


ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

E-24217-129

Bogotá, D.C., 22 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL MALLA VIAL.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de las cantidades de demarcación horizontal realizadas en las vías de la malla vial de la ciudad de Popayan, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Documentos anexos: Archivo con cantidades (1 archivo)

Bogotá, D.C., 22 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ENTREGA ENSAYOS MDC-19 MARZO Y ABRIL DE 2023.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los ensayos de mezcla asfáltica y agregados en frío correspondientes de los meses de marzo y abril de 2023.

Anexo ensayos de mezcla y agregados en frío

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Ensayos de laboratorio (1 archivo adjunto)

Bogotá, D.C., 27 de abril de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: CORRECCIÓN EMPOZAMIENTO - BARRIO SAN CAMILO.


Cordial saludo:

Atendiendo al Derecho de Petición interpuesto por el sr. Harold Daza García, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.817 de la ciudad de Popayán y residente en la Carrera 9 # 8-81 del Barrio San Camilo; en donde hacía referencia a una solicitud de corrección de empozamiento que se presenta en la carrera 9 con calle 9 del mismo barrio.

El día 25 de abril del año en curso, una cuadrilla del contratista de obra en cabeza de su director, realizó una renivelación con mezcla asfáltica para corregir el hundimiento de la vía y de esta manera corregir el empozamiento; subsanado así la queja del peticionario.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Se anexa registro fotográfico

Registro fotográfico



E-24217-132

Bogotá, D.C., 27 de abril de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: ENTREGA PREACTA 11.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de la preacta final de obra No. 11 correspondiente al mes de abril de 2023, lo anterior para su revisión y trámite.

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Archivo en Excel con lo enunciado

Bogotá, D.C., 04 de mayo de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: CIERRE PQR BARRIO SAN CAMILO.

Cordial saludo:

Por medio de la presente comunicación me permito remitir el cierre de la PQR del Sr. Harold Daza García, identificado con cedula de ciudadanía No. 76.314.817 de la ciudad de Popayán y residente en la carrera 9 # 8-81 del barrio San Camilo. Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Comunicado de interventoría al contratista de obra sobre el Derecho de Petición.
2. Copia del Derecho de Petición.
3. Respuesta al Derecho de Petición por parte del contratista de obra.
4. Oficio de corrección de empozamiento.
5. Cierre de PQR.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,



ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

Código: ADTI-FO-106

Versión: 1

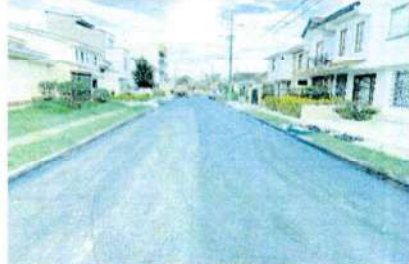
Fecha de aprobación:

03- Julio 2018

**ANEXO 9
INFORMES SEMANALES**

ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		44	
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 6 3 2023	
Semana Número: 44	Del: 27 de febrero de 2023	Al: 5 de marzo de 2023	
Suspensión No. 1: 306/10023	Reinicio No. 1: 1602/2023		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 316 DIAS			
Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLADO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"			
SEMANAL		ACUMULADO	
Obras programadas (%)	3.238%	Obras Físicas Ejecutadas (%)	1.500%
Valor de la obra programada	\$ 306.718.538,25	Valor de la obra Ejecutada	\$ 234.637.615,00
SEMANAL		ACUMULADO	
Obras programadas (%)	3.238%	Obras Físicas Ejecutadas (%)	1.500%
Valor de la obra programada	\$ 306.718.538,25	Valor de la obra Ejecutada	\$ 234.637.615,00
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No: 2021/0000242/17 DE DICIEMBRE DEL 2021 Valor Inicial: \$ 6.486.786.110,00 Valor Final: \$ 12.220.657.873,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Plazo Final: Quince (15) días Adición y Prórroga No. 1: Uta (15) días Adición y Prórroga No. 2: Adición \$ 1.869.989.812 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 3: Adición \$ 1.834.089.031 y Prórroga 29-02-2023 Adición y Prórroga No. 4: Adición \$ 1.834.089.031 y Prórroga 29-02-2023 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 17 de marzo de 2023		Interventor: INP SERVICIOS S.A.S. Contrato No: 2022/00001169/7 DE MARZO DEL 2022 Valor Inicial: \$ 4.496.991.830,00 Valor Final: \$ 7.098.134.665,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Plazo Final: Quince (15) días Adición y Prórroga No. 1: Uta (15) días Adición y Prórroga No. 2: Adición \$ 1.111.242.835 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 3: Adición \$ 1.100.800.000 y Prórroga 29-02-2023 Adición y Prórroga No. 4: Adición \$ 1.100.800.000 y Prórroga 29-02-2023 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 17 de marzo de 2023	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
ASPECTOS TÉCNICOS: Continúan las actividades de obra en las prioridades por la Entidad en el Barrio Campamento, realizando el frezado de carpeta asfáltica deteriorada, imprimación e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Carrera 17 entre Calles 18N y 19N, en la Carrera 17 entre Calles 19N y 18N, Carrera 17 entre Calles 18N y 19N, Carrera 17 entre Calles 18N y 19N, actividades de frezado e imprimación con emulsión asfáltica en la Carrera 17 entre Calles 18N y 19N, en la instalación de carpeta asfáltica en este sector. Se da inicio a las actividades de obra en la vía de acceso al Barrio La Playa, realizando el frezado, imprimación e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en media calzada de la Carrera 16A entre Calles 18N y 17N.			
ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 27 de febrero, el contratista por medio de correo electrónico, envió las subobservaciones a las observaciones del informe N°10 (enero 2023). El día martes 28 de febrero, se realizó visita en conjunto con el profesional ambiental del contratista, donde se realizaron varias observaciones como la falta de recolección de escombros en el sector de la Cra. 17 Barrio Campamento, organización y aseo del punto de acopio y señalizaciones de obra. Se evidencia manchado de emulsión en varias zonas verdes en todo el Barrio Campamento, ya que se está continuando con emulsión en estos sectores, de igual forma, se evidencia que algunos trabajadores impriman sus botas en estos lugares, se requiere la limpieza del anterior punto de acopio ubicado en el paraseñalero de visitantes de la jornada campamento, debido a que se evidencia derrame de aceite en el suelo y en la zona verde, y contaminación de algunos andenes, bocanetas, puentes y baldosas de viviendas del sector al realizar la imprimación con emulsión asfáltica. El contratista, el día miércoles 01 de marzo, realizó jornada de orden, limpieza y aseo, donde se corrigieron varias de las observaciones, realizó barrido de vías, levantamiento de escombros, organización del punto de acopio, levantamiento de ramas. El día viernes 03 de marzo, finalizó con la limpieza del antiguo punto de acopio y andenes manchados con emulsión, subsanando las observaciones dadas por la interventoría. La interventoría realiza la revisión y aprobación del informe N°10 enero 2023, el día viernes. Los días 01 y 03 de marzo de 2023, se realizaron jornadas de capacitación a los trabajadores con temas del componente PFMA. El día viernes 03 de marzo, el contratista envió el acta de modificación N°12 y el acta PFMA N°17 (DICIEMBRE 2022).			
ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 44 del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: La Residente Social del contratista, realiza actividades de socialización de obras en el sector de Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa, el día 1 de marzo de 2023, previo a las actividades en el sector. Se realiza entrega de volantes casa a casa, portafolio de conjunto comunitario y administración, se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: La Residente Social del Contratista realiza levantamiento de registro fotográfico de fachadas, andenes, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector de Campamento y entrada al Barrio La Playa, previo al inicio de la intervención en el sitio. El día jueves 2 de marzo, con el acompañamiento del Profesional SST de la interventoría, se realiza recorrido por el sector de Campamento a fin de verificar la reparación en andenes del sector de campamento, verificando que se realizó reparación por parte del contratista. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. En el sector del Barrio La Playa, aun se encuentra pendiente el inicio de labores, al respecto la interventoría en Comité de Obra del 28 de febrero, solicitó el inicio de actividades basando en cuenta la problemática social generada en el sector. El contratista realizó reubicación de señalizaciones y adecos los pasos peatonales, de igual forma, reubicó la pedertera. El contratista realiza reparación de andén en la Calle 20N con Carrera 17 Esquina sector campamento, se cuenta con registro fotográfico. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente Social del Contratista e Interventoría, realizan acompañamiento en jornadas de parqueo en el sector de Campamento y entrada al Barrio La Playa. Se realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. Se solicita la revisión continua del correo electrónico edivulgacion@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitudes de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo. Durante la semana no se presentaron PQRS. En Comité del 28 de febrero de 2023, se solicitó al contratista informar respecto del proceso de respuesta a derecho de petición interpuesto por el señor Haroldo Díaz con fecha de 16 de febrero de 2023, vivienda ubicada en la Carrera 6 N° 8 - 81, a la fecha, no encuentra procedimiento de respuesta, se solicita dar cumplimiento a los tiempos establecidos por ley para la emisión de la respuesta. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana el contratista no reporta ingreso de personal.			
ASPECTOS SST: Durante las actividades de obra realizadas en el sector de Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa, se inspecciona la señalización en las vías intervenidas por el contratista, solicitando la colocación de más señalizaciones móviles requeridas en el desarrollo de la obra.			
REQUERIMIENTO A CUENTAS DE OBRA:			
Comité de obra 21-02-2023: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. A continuación, se presenta una descripción de los temas tratados: La Entidad manifiesta la voluntad de adicionar nuevos recursos al contrato, para continuar con la atención de vías que presentan un elevado deterioro, razón por la cual, el contratista presentará la respectiva solicitud de adición. La Entidad autoriza la intervención en la vía de acceso al Barrio La Playa Carrera 16A entre Calles 18N y 17N y la intervención en la Carrera 16 entre Calles 18N y 20N del Barrio Campamento. La Interventoría solicita al contratista, el reinicio inmediato de las actividades de obra en la vía del Barrio La Playa, Carrera 6 entre Calles 69N y 708N, y dar respuesta por escrito a las solicitudes que al respecto se han realizado. Se solicita al contratista mejorar el control en el desarrollo de las obras y responder a los representantes de la maquinaria e instalaciones para garantizar una adecuada ejecución de las mismas se solicita disponer de obra de un terminado para control de temperatura de la mezcla asfáltica. La Entidad solicita la intervención en la Calle 19B desde Carrera 17 hasta donde hay reposición de rodos de alcantarilla. Se solicita al contratista la revisión y conexión de un bache ubicado en la Carrera 17 No. 19N-238. Se le recuerda al contratista dar atención a la solicitud de la señora María Lige Pineda del Barrio Guayabal. El contratista informa que se tomará la medida correctiva dentro de las posibilidades que de él lugar. De igual forma, se solicita dar respuesta al derecho de petición del señor Haroldo Díaz del Barrio San Camilo. Se solicita terminar las obras en la esquina de la Calle 17N con Carrera 11 y conexión de un bache en la Calle 17N entre Carreras 5 y 6A del Barrio Antonio Nariño. Se informa a la Entidad Contratista para su conocimiento y fines pertinentes, que en la Carrera 11 entre Calles 11N y 14N, terceros ajenos a la obra, realizaron obras de instalación de rodos de alcantarilla que afectaron la carpeta asfáltica instalada mediante el contrato. Se recomienda por parte de la Interventoría a la Entidad Contratista, que una vez se terminen las obras en el Barrio Campamento y se realicen obras en la vía del Hospital Santa Concepción, se realicen obras en vías de la Comuna 8, para garantizar la inversión de recursos en este sector. Se leen las actas del área social, ambiental y SST, se anexan las actas correspondientes. Cierre de obra con fecha 26-02-2023, % ejecutado: 87,73 (8.719.003.107), no programado: 01,31 (\$ 1.148.764.708), anexo: 1,40% (8.077.161.612).			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
El contrato de obra No. 2021/0000242/17 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 2022/00001169/7 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Finado de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Reinicio No. 1: 16 de febrero de 2023. Fecha de terminación actualizada incluye la suspensión No. 1: 17-03-2023. Estado del contrato: EN EJECUCIÓN. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 4,81%.			
4,81% ATRASO		equivalente a \$ 588.242.535	
OBSERVACIONES		INTERVENTORIA	
El área de Inspección Intermedia autorizada a la fecha, corresponde a 108.467 m2. Se concorda con las actividades de obra en las vías del Barrio Campamento, y se da inicio a las obras en la vía de acceso al Barrio La Playa, vías prioritizadas por la Entidad Contratista. En comité de obra del día 28-02-2023, la Interventoría solicita al contratista el reinicio inmediato de las actividades de obra en la vía del Barrio La Playa, Carrera 6 entre Calles 69N y 708N. En este último sector, se realizaron actividades de mantenimiento del cerramiento perimetral, de la señalización, barridos y pasos peatonales, para evitar que se presente algún tipo de accidente.		Firma:  NO. ANSELMO MARTINEZ A. Director de Interventoría	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	44
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	6/03/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	2 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO	
	
Comité de obra 28-02-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 17 entre Calles 20N y 19BN. Barrio Campamento
	
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 17 entre Calles 19BN y 19AN. Barrio Campamento	Carpeta asfáltica instalada en la Carrera 17 entre Calles 19AN y 19N. Barrio Campamento
	
Instalación de carpeta asfáltica en la Carrera 17 entre Calles 19N y 18CN. Barrio Campamento	Instalación de carpeta asfáltica en la Carrera 17 entre Calles 18CN y 18BN. Barrio Campamento

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	44
		FECHA	6/03/2023
		PAGINA	3 de 4
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Instalación de carpeta asfáltica en la Carrera 17 entre Calles 18CN y 18BN. Barrio Campamento		Fresado e imprimación con emulsión asfáltica en la Carrera 17 entre Calles 18BN - 18AN y 18N. Campamento	
			
Fresado e imprimación con emulsión asfáltica. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa		Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 media calzada. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa	
			
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en media calzada. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	44
		FECHA	6/03/2023
		PAGINA	4 de 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL			
			
<p>Actividades de atención a la comunidad Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa. Acompañamiento Actividades de Parcheo. Recorrido de obra con el Ingeniero Supervisor del contrato por parte de la Alcaldía</p>			
			
<p>Personal con la debida dotación de EPPs. Señalización de obras para evitar el paso de vehículos. Actividades de mantenimiento de cerramiento perimetral y barricadas, y adecuación de pasos peatonales en vía del Barrio La Paz</p>			
			
<p>Capacitación a personal temas PIPMA. Solicitud orden, limpieza y aseo. Verificación subsanaciones de aseo y limpieza solicitadas por la Interventoría.</p>			

ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 13	3
Semana Número: 45 Del: 6 de marzo de 2023 Al: 12 de marzo de 2023		FECHA: 13	3
Suspensión No. 1: 30/01/2023 Retorno No. 1: 16/02/2023			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 323 DIAS			
Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"			
SEMANAL Obra programada (%) Valor de la Obra programada: \$ 395.718.538,24		ACUMULADO 97,687% Valor de la Obra Ejecutada (%) Valor de la Obra Ejecutada: \$ 209.660.000,00	
SEMANAL Obra Falsa Ejecutada (%) Valor de la Obra Falsa Ejecutada: \$ 209.660.000,00		ACUMULADO 91,351% Valor de la Obra Falsa Ejecutada: \$ 11.183.900.811,00	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 2021180002427 DE DICIEMBRE DEL 2021 Valor Inicial: \$ 8.486.780.110,00 Valor Final: \$ 12.220.857.973,00 Plazo Inicial: Sete (7) meses Plazo Final: Cuince (15) días Adición y Prórroga No. 1: Un (1) Mes Adición y Prórroga No. 2: Adición \$ 1.869.999.812 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 3: Adición \$ 1.851.080.081 y Prórroga 28-03-2023 Adición y Prórroga No. 4: Adición \$ 1.851.080.081 y Prórroga 28-03-2023 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 17 de marzo de 2023		Interventor: INP SERVICIOS S.A.S. Contrato No.: 20221800011897 DE MARZO DEL 2022 Valor Inicial: \$ 498.961.830,00 Valor Final: \$ 708.134.655,00 Plazo Inicial: Sete (7) meses Plazo Final: Cuince (15) días Adición y Prórroga No. 1: Adición \$ 1.111.242.835 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 2: Adición \$ 1.100.000.000 y Prórroga 28-03-2023 Adición y Prórroga No. 3: Adición \$ 1.100.000.000 y Prórroga 28-03-2023 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 17 de marzo de 2023	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
ASPECTOS TÉCNICOS: Durante el periodo de la presente semana, se realizaron actividades de obra correspondientes a frizado de carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado, imprimación con emulsión asfáltica e instalación de mezcla MDC-19, en la Carrera 17 entre Calles 18N y 18N, Carrera 17 entre Calles 18N y 18N, Calle 18N entre Carrera 17 y No. 17-37 del Barrio Campeamento y continúan las actividades de obra en la vía de acceso al Barrio La Playa, realizando el frizado, imprimación e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la media calzada restante de la Carrera 18A entre Calles 18N y 17N, continuando las obras en el sector. Posteriormente, se da inicio a las obras en la Carrera 16 entre Calles 20N y 19N del Barrio Campeamento, realizando el frizado de la carpeta asfáltica, imprimación e inicio de instalación de la carpeta asfáltica en un ancho total de la calzada. Las actividades de obra se ejecutan teniendo en cuenta el orden de priorización de las vías, de acuerdo con indicaciones de la Entidad Contratante.			
ASPECTOS AMBIENTALES: El día 08 de marzo de 2023, por medio de correo electrónico, el contratista envía a la interventoría el informe N°111 correspondiente a febrero 2023. El día 08 de marzo de 2023, la interventoría realizó la revisión del Acta de modificación PFMAN°2, y por medio de correo electrónico dio su aprobación. El día 09 de marzo de 2023, por medio de correo electrónico, la interventoría realizó la revisión y envío de observaciones al Acta PFMAN°107, correspondiente al mes de diciembre 2022, donde se corroboró la ejecución del presupuesto PFMAN en un 100% por parte del contratista, para cada una de las actividades estipuladas como obligación. El día sábado 11 de marzo, el contratista envía la subsección de las observaciones del acta PFMAN°107, correspondiente al mes de diciembre 2022. El día jueves, se realizó visita donde se informaron varias observaciones como la recolección de escombros en el sector de entrada barrio La Playa, organización y aseo de punto de accepi y señalamiento de obra. El contratista, los días jueves y viernes, realizó jornada de orden, limpieza y aseo donde se corrigieron las observaciones dadas el día anterior, realizó el barrido de vías, levantamiento de escombros en la vía de acceso al Barrio La Playa y traslado del punto de accepi, debido a que la obra dio inicio en otro sector.			
ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 45 del 6 al 12 de marzo de 2023, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad. Los días 8 y 9 de marzo de 2023, la residente social del contratista realizó socialización casa a casa, previo a las intervenciones en el sector de Campeamento y vía de acceso al Barrio La Playa, con el fin de informar a los residentes sobre los trabajos, sobre la instalación de mezcla asfáltica y las medidas que se tomarán cubriendo los andenes, para evitar que se marchen con la aplicación de la imprimación con emulsión asfáltica. El 9 de Marzo de 2023 la Residente Social del contratista reportó socialización casa a casa en la Carrera 16 entre Calles 18N y 20N, a fin de informar respecto del cierre de la vía debido a las actividades de obra en el sector. Se realizó entrega de volantes casa a casa sector Campeamento, se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados. El 9 de Marzo de 2023, la Residente Social del Contratista realizó el levantamiento de registro fotográfico de fachadas, andenes, tapas de alcantarillas y sanitarios, en el sector de Campeamento, previo al inicio de la intervención en el sitio. Se realizó recorrido por el sector de Campeamento por parte del Profesional SST, Profesional Ambiental y Profesional Social de Interventoría, a fin de verificar condiciones de andenes y fachadas. Se solicitó a la profesional SST del contratista presente en el sector, el arreglo de andenes vía de ingreso a Sector La Playa y limpieza de andenes. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. El día 7 de Marzo en Comité de obra, se solicitó al contratista realizar actividades de obra en la vía del barrio La Playa, Carrera 6 entre Calles 6N y 70N, teniendo en cuenta la problemática social generada en el sector. El contratista refiere que el fin de semana entre 11 y 12 de Marzo llegará la maquinaria al sitio y se tiene programado el inicio para el día 13 de Marzo de 2023. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana. El componente Social del Contratista e Interventoría realizan acompañamiento en jornadas de parqueo en el sector de Campeamento. Las Profesionales Ambiental y Social de Interventoría realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. Se solicita la revisión continua del correo electrónico edv@inp.com.co, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en su caso tiempo a las inquietudes que pueden presentarse. Durante la semana no se presentaron PQRs. En Comité del 7 de Marzo de 2023, se reitera solicitud al contratista de informar respecto del proceso de respuesta a derecho de petición interpuesto por el señor Harold Daza con fecha de Febrero 15 de 2023, vivienda ubicada en la Carrera 9 No. 8-81, ante lo cual la Residente Social del Contratista refiere que está pendiente de respuesta por parte del área jurídica de la empresa, se solicita del cumplimiento a los tiempos establecidos por ley para la emisión de la respuesta. 4. Programa B4 Mano de Obra. Durante la presente semana el contratista no reportó ingreso de personal.			
ASPECTOS SST: - Se inspecciona elementos de primeros auxilios ubicados en obra, como camilla, extintor y botiquín. - Se dan orientaciones por parte de la interventoría al personal, del uso adecuado de los EPPs entregados por parte del contratista. - Se verifica señalización tomando como referencia el documento PMT y de esta manera determinar la señalizaciones y poderles reportar. - Se verifica al momento en las horas presentando actividades laborales.			
REQUERIMIENTO A COMITES DE OBRA			
Comité de obra 07-03-2023. Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. A continuación, se presenta una descripción de los temas tratados: La Interventoría revisó y aprobó la solicitud de adición y prórroga presentada por el contratista y se remitió a la Entidad para su estudio y trámite. La Interventoría informa que los días 01, 04, 05, 06 y 07 de marzo, el contratista no realizó actividades de obra, razón por la cual se solicita el renuncio inmediato de las actividades. El contratista informa que a partir del 08-03-2023 renuncia actividades. Con relación a las obras del Barrio La Playa, Carrera 6 entre Calles 6N y 70N, el contratista se compromete al renuncio de obras el próximo lunes 13-03-2023. Este fin de semana se trasladará la maquinaria al sector de las obras. La Supervisión solicita a la interventoría, que si el próximo lunes el contratista no cumple con el renuncio de obras en la vía del Barrio La Playa, se proceda con la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. La Interventoría reitera la solicitud al contratista, de iniciar con las actividades del capítulo 7 (calificación y seguridad), que incluye líneas de demarcación y marca vial. Se solicita al contratista el arreglo de los siguientes fallos observados en la Carrera 17 entre Calles 20N y 19N, en las siguientes direcciones: No. 19N-20N, No. 19N-195 y en la intersección de la Carrera 17 con Calle 18N del Barrio Campeamento y que fueron indicados en obra al Ingeniero Residente por parte del contratista. El contratista presentará la programación de obras de la solicitud de adición 09-03-2023. Se leen los temas del área social, ambiental y SST, se revisan los actos correspondientes. Del área social está pendiente el arreglo sector Guayalí, pendiente respuesta derecho de petición Cra. 9 No. 8-81, se solicita agilizar su respuesta. Se programa reunión para el próximo 09-03-2023 en oficinas de Infraestructura con representantes de la Oficina de Tránsito, para revisar temas de señalización y PMT, hora 10:00 AM. Avance de obra con corte a 05-03-2023, % programado 94,45 (\$ 11.542.483.337), % ejecutado 86,84 (\$ 10.564.240.802).			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
El contrato de obra No. 2021180002427 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011897 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Finiendo de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Renuncio No. 1: 18 de febrero de 2023. Fecha de terminación actualizada incluye la suspensión No. 1: 17-03-2023. Estado del contrato: EN EJECUCIÓN. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 6,34%.			
6,34%	ATRASO	equivalente a \$ 774.301.064	INTERVENTORIA
El área de localización interviene acumulada a la fecha, corresponde a 110.433 m2. Continúan obras en el Barrio Campeamento y se realizan intervenciones de instalación de carpeta asfáltica en la vía de acceso al Barrio La Playa, que corresponden a vías priorizadas por la Entidad Contratante. El contratista presenta una solicitud de adición y prórroga al contrato de obra, la cual fue revisada por la interventoría y remitida a la Entidad, para su estudio y trámite.		Firma:  N. A. SELMO VALTRÉVEZ Líder de Interventoría	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	45
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	13/03/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	2 de 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Comité de obra 07-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría		Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 17 entre Calles 18BN y 18AN. Campamento	
			
Carpeta asfáltica instalada en la Carrera 17 entre Calles 18BN y 18AN. Barrio Campamento		Instalación y compactación de mezcla asfáltica. Carrera 17 entre Calles 18AN y 18N. Barrio Campamento	
			
Instalación y compactación de mezcla asfáltica. Carrera 17 entre Calles 18AN y 18N. Barrio Campamento		Instalación de carpeta asfáltica en la Calle 19BN entre Carrera 17 y No. 17-37 Barrio Campamento	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	45
		FECHA	13/03/2023
		PAGINA	3 de 4
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Fresado e imprimación con emulsión asfáltica. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía Acceso a Barrio La Playa		Instalación de mezcla asfáltica. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía de Acceso a Barrio La Playa	
			
Instalación de mezcla asfáltica. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía de Acceso a Barrio La Playa		Instalación de carpeta asfáltica. Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía de Acceso a Barrio La Playa	
			
Fresado, imprimación e instalación de carpeta asfáltica. Carrera 16 entre Calles 20N y 19N		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 20N y 19N	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	45
		FECHA	13/03/2023
		PAGINA	4 de 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL			
			
<p>Acompañamiento a comité de obra por parte del área social. Atención a la comunidad por parte de las profesionales social y ambiental. Recorrido y acompañamiento en actividades de parcheo en el barrio Campamento y vía de acceso al barrio La Playa. Atención a la comunidad en los sectores intervenidos.</p>			
			
<p>Inspección elementos de primeros auxilios. Charla por parte interventoria - Importancia uso de tapabocas Señalización móvil y personal en actividades de pare y siga.</p>			
			
<p>Solicitud orden, limpieza y aseo punto de acopio. Solicitud recolección de escombros y verificación orden, limpieza y aseo en vías intervenidas del barrio Campamento y vía de acceso al barrio La Playa</p>			


ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME		46	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		FECHA		20/03/2023	
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PAGINA		1 de 4	
FECHA		20		3	
Semana Número: 46		Del:		13 de marzo de 2023	
Suspensión No. 1:		30/01/2023		Reinicio No. 1:	
14/02/2023					
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		330		DIAS	
Nombre del Supervisor:		JOSÉ LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"					
SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	
Obra programada (%)		1.280%		Obra Ejecutada (%)	
Valor de la Obra programada		\$ 170.206.918,82		Valor de la Obra Ejecutada	
		\$ 12.106.468.793,87		\$ 2.228%	
				\$ 296.430.487,00	
				11.480.331.273,00	
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"			OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"		
Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A. Contrato No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Valor Inicial \$ 4.496.780.110,00 Valor Final \$ 13.306.617.973,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Plazo Final: Quince (15) días Adición y Prórroga No. 1: Un (1) Mes Adición y Prórroga No. 2: 7/03/2023 \$ 1.086.980.812 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 3: 7/03/2023 \$ 1.086.980.812 y Prórroga 28-02-2023 Adición y Prórroga No. 4: 7/03/2023 \$ 1.086.980.812 y Prórroga 15-04-2023 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023			Interventor: INP SERVICIOS S.A.S. Contrato No. 20221800011697 DE MARZO DEL 2022 Valor Inicial \$ 496.891.830,00 Valor Final \$ 771.704.695,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Plazo Final: Quince (15) días Adición y Prórroga No. 1: 11/11/2022 \$ 111.242.838 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 2: 11/11/2022 \$ 111.242.838 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 3: 11/11/2022 \$ 111.242.838 y Prórroga 31-12-2022 Adición y Prórroga No. 4: 11/11/2022 \$ 111.242.838 y Prórroga 31-12-2022 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ASPECTOS TÉCNICOS: Continúa el desarrollo de las obras en la Carrera 16 entre Calles 204, 194 y 184 del Barrio Campamento, realizando el friso de la carpeta asfáltica que se encuentra deteriorada, imprimación e instalación de carpeta en mezcla asfáltica MDC-19 en un espesor de 0,10 m. Se dejó dos sectores puntuales sin intervenir, en donde se requiere la intervención de la Empresa de Asfalto y Alcantarilla (AAPS) para realizar arreglos en una cámara antigua y un arreglo de tubo de alcantarillado. Posteriormente, se dio inicio a las obras en la Calle 184 entre Camarones 17 y 18 del Barrio Campamento, realizando el friso de la carpeta deteriorada, imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en un ancho de media calzada. En la presente semana, se realizó reunión en oficinas de la Empresa AAPS, para revisión del estado de redes en otros sectores de posible intervención en el Barrio Campamento, e incluir los conceptos que fueron dados previamente a la intervención de las obras en los demás viles de este barrio, indicando que no tienen proyecto de intervención de redes por parte de esta empresa. De igual forma, se realizó revisión de las vías que fueron visitadas en la Comuna 9 para posible intervención. Las actividades de obra se ejecutaron teniendo en cuenta el orden de priorización de las vías, de acuerdo con indicaciones de la Entidad Contratista.					
ASPECTOS AMBIENTALES: Por medio de correo electrónico del día 13 de marzo de 2023, la interventoría realiza la aprobación del acta PIMA N°7 (diciembre 2022). El contratista envió subsecciones del informe N°11 (16 al 28 de febrero 2023), por medio de correo electrónico. El día 14 de marzo, se realizó recorrido donde se solicitó la limpieza del antejardín de la casa con dirección Carrera 17 y 40. El contratista informó que el día 17 de marzo, se realizó jornada de orden, limpieza y aseo, pero desafortunadamente por orden de gerencia del contratista, no se realizaron actividades de obra, por lo tanto, no se ejecutó la limpieza del antejardín, pero si barrido y señalización del proyecto por parte del personal que quedó. El día 15 de marzo de 2023, por medio de correo electrónico, el contratista envió nuevamente el oficio de solicitud de adición del presupuesto PIMA, de acuerdo a requerimiento en comité de obra del día 14 de marzo, en el cual se informó que la obra tendrá fecha final 15 de abril 2023. El día 16 de marzo, se realizó recorrido con personal del contratista, verificando la limpieza de vías, señalización y sumideros. El día 18 de marzo, se realizó limpieza y señalización de la vía en intervención del barrio La Paz, por parte del personal de obra.					
ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 46 correspondiente al periodo del 13 al 19 de marzo de 2023, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad. El día 15 de marzo, se realizó acompañamiento en actividades de socialización por parte de la Residente Social del contratista, previo a la intervención en nuevas vías del sector de Campamento. La socialización se realizó en una casa, también en el sector del Complejo Deportivo Comfocauca, a fin de informar respecto de inicio de actividades de parqueo en el sector. Se realizó entrega de volantes, se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Programa B2 Restricción de Bienes Afectados: El 16 de marzo de 2023, la Residente Social del Contratista realiza levantamiento de registro fotográfico de fachadas, andenes, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector de Campamento/ Complejo Deportivo Comfocauca, previo al inicio de la intervención en el sitio. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. El día 14 de marzo en Comité de obra, el contratista informa que el próximo 17 de marzo iniciará el trabajo de maquinaria hacia la vía del Barrio La Paz, para reanudar actividades a partir del 18 de marzo. El día 17 de marzo, se evidencia presencia de personal de topografía en este sector, se realiza acompañamiento por parte de la Profesional Social de Interventoría. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente Social del Contratista e Interventoría, realizan acompañamiento en jornadas de intervención. Se realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. Se solicita la revisión continua del correo electrónico adveps@popayan.gov.co, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitar información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo a las inquietudes que puedan presentarse. Durante la presente semana, no se presentaron PQRS. El 17 de marzo de 2023, el contratista realiza entrega de respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor Harold Daza, vivienda ubicada en la Carrera 9 N° 8-81, para revisión de Interventoría. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana el contratista no reportó ingreso de personal.					
ASPECTOS SST: Se verifica la señalización instalada de acuerdo al PMT en el sector de campamento. El contratista informa que está en trámite la reposición de nuevos señales. El contratista hace la reposición de extintores vencidos en los diferentes equipos, atendiendo las observaciones de la Interventoría. Se realiza a los integrantes al con accidente de los EPPs, como lo es, al supervisor para evitar la instalación de los diferentes equipos generados durante el proceso de instalación de mezcla asfáltica. Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.					
SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA					
Comité de obra 14-03-2023: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad Contratista, Secretaria de Tránsito e Interventoría. A continuación, se presenta un resumen de los temas tratados. En la revisión de compromisos: remoción de obras via del barrio La Paz 13-03-2023, no cumplido. El contratista informa que mañana (15-03-2023) remite actividades de topografía y revisión de la capa de mequetripado, traslado de equipos viernes 17-03-2023, para realizar actividades desde el 18-03-2023. Se informa que el día de hoy, se realizó reunión en oficinas de la Empresa de Asfalto y Alcantarilla, para revisar estado de redes y/o posibles intervenciones futuras, en otros viles del Barrio Campamento, además de las que fueron visitadas previo a las intervenciones. Hospital Santa Gracia y viles de Comuna 9 priorizadas para posible intervención. Teniendo en cuenta que queda aproximadamente un mes del contrato, se solicita al contratista que todos los viles que se deben quedar terminados dentro del plazo contractual, incluidas las conexiones solicitadas y obras del Barrio La Paz. Atendiendo observaciones de la interventoría, el contratista realizó arreglos de fallas puntuales en la Carrera 17 entre Calles 204 y 194. La semana pasada, se terminaron las intervenciones en la Cra 17 entre Calles 204 y 194, Cra 16A entre Calles 184 y 174, Calle 160A entre Cra 17 y fin de barrio norte, y se realizaron obras en la Cra 16 entre Calles 204 y 194. La Entidad solicita realizar intervenciones en la Comuna 4 Sector Centro, posterior a las obras de Campamento y Santa Gracia, y luego realizar intervenciones en Comuna 9. Compromiso 17-03-2023 debe estar atendida solicitud del Barrio Guayabal, atención derecho de petición Cra 9 N° 8-81 SF. San Camilo, y arreglo de andenes via al Barrio La Playa para el próximo comité. Tema señalización, se recomienda intervenir vías principales en recorridos del 10-03-2023, equipando Barrio Pandiguando y Glorieta de la Aldea, priorizar La Villa, Yambobá y Maria Occidente. Se leen los temas del área social, ambiental y SST, se anotan las actas correspondientes. Revisión recarga extintores 16-03-2023. Comité de obra con fecha a 12-03-2023. % programado 87,69 (\$ 11.908.201.875), % ejecutado 91,36 (\$ 11.163.900.811).					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Periodo de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Reinicio No. 1, 16 de febrero de 2023. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato al 4,87%. Mediante el Modificatorio No. 5, el contrato de obra tuvo una adición de recursos por \$ 1.086.780.000 y prórroga hasta el 15-04-2023. Mediante el Modificatorio No. 4, el contrato de la Interventoría tuvo una adición de \$ 63.570.000 y prórroga hasta el 15-04-2023. Estado del contrato EN EJECUCIÓN.					
4,87%		ATRASO		equivalente a \$ 648.167.522	
OBSERVACIONES		INTERVENTORIA			
El área de localización interviene acumulada a la fecha, corresponde a 113.262 m2. Continúa el desarrollo de las obras en el barrio Campamento en vías que presentan un elevado deterioro de la capa de rodadura. La intervención de las obras, se realiza en vías priorizadas por la Entidad Contratista. La prima solicitada por adición al contrato de obra por un valor de \$1.086.780.000 y prórroga hasta el día 15 de abril de 2023, fue aprobada por la Entidad. Los porcentajes de obra programada y ejecutada, están calculados de acuerdo a la programación de obras, que incluye el valor acumulado del contrato y nueva fecha de terminación de las mismas, razón por la cual, se observa una disminución respecto a los porcentajes reportados en el informe de la semana inmediatamente anterior.		Ing. ANSELMO MARTINEZ A. Director de Interventoría			

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	46
		FECHA	20/03/2023
		PAGINA	2 de 4
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Comité de obra 14-03-2023. Asiste Contratista, Entidad, Secretaría de Tránsito e Interventoría		Reunión en empresa AAPSA 14-03-2023: revisión tema de redes de acueducto y alcantarillado	
			
Revisión niveles de topografía sector Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 20N y 19N. Barrio Campamento	
			
Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento		Instalación de carpeta asfáltica. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	

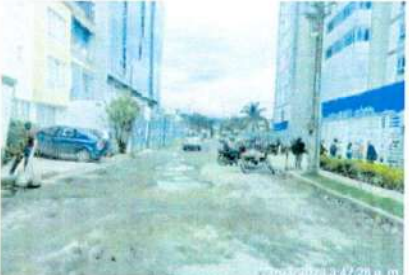
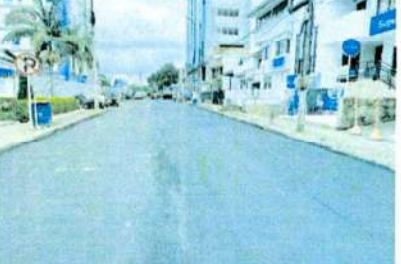
	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	46
		FECHA	20/03/2023
		PAGINA	3 de 4
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	
			
Fresado de carpeta asfáltica deteriorada. Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.		Fresado e imprimación con emulsión asfáltica. Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.	
			
Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	46
		FECHA	20/03/2023
		PAGINA	4 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL
   
Asistencia a Comité de Obra. Atención a la comunidad para aclarar dudas e inquietudes. Acompañamiento en actividades de parcheo sector Campamento
   
Inspección elementos de protección personal. Reposición de extintores vencidos. Verificación de la señalización móvil instalada en el desarrollo de las actividades de la obra
       
Solicitud orden, limpieza y aseo del punto de acopio. Solicitud recolección de material vegetal. Solicitud limpieza de antejardines y zonas verdes

ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME	47
		FECHA	27/03/2023
		PAGINA	1 de 4
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	27 3 2023
Semana Numero	47	Del	20 de marzo de 2023
Suspensión No. 1	305/10/2023	Al	26 de marzo de 2023
Revisión No. 1	337	Revisión No. 1	16/02/2023
Tempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	337	DIAS	
Nombre del Supervisor	ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"			
SEMANAL		ACUMULADO	
Otra programada (%)	2.35%	Otra Ejecutada (%)	2.35%
Valor de la Obra programada:	\$ 318.474.734,33	Valor de la Obra Ejecutada:	\$ 350.534.595,00
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"	
Contratista:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A	Interventor:	NP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Contrato No.	20221800011897 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial	\$ 8.486.780.110,00	Valor Inicial	\$ 496.691.830,00
Valor Final	\$ 13.306.617.973,00	Valor Final	\$ 771.704.655,00
Plazo Inicial	Seis (6) meses	Plazo Inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días	Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2	Un (1) Mes	Prórroga No. 2	Adición \$ 111.342.835 y Prórroga 31-12-2022
Adición y Prórroga No. 3	Adición \$ 1.869.999.812 y Prórroga 31-12-2022	Adición y Prórroga No. 3	Adición \$ 100.000.000 y Prórroga 28-02-2023
Adición y Prórroga No. 4	Adición \$ 1.634.969.951 y Prórroga 28-02-2023	Adición y Prórroga No. 4	Adición \$ 63.570.900 y Prórroga 15-04-2023
Adición y Prórroga No. 5	Adición \$ 1.585.780.000 y Prórroga 15-04-2023	Adición y Prórroga No. 5	Adición \$ 63.570.900 y Prórroga 15-04-2023
Fecha de Inicio:	7 de abril de 2022	Fecha de Inicio:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	15 de abril de 2023	Fecha de Vencimiento:	15 de abril de 2023
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
<p>ASPECTOS TÉCNICOS: En la presente semana, se terminan las obras de instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Carrera 16 entre Calles 18N y 18N del Barrio Campamento, y continúan las actividades de frenado, imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Calle 18N entre Camerías 17, 16 y 15 del Barrio Campamento frente a la Villa Olímpica, terminando las actividades en el sector. Hasta el presente con la Carrera 15. Posteriormente, los obreros se dirigen hacia la Calle 18N entre Camerías 15 y acceso posterior de la Clínica Santa Gracia, realizando igualmente el frenado de la carpeta asfáltica que presentará un elevado camión; instalación de la imprimación e instalación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19. Las obras en el sector de la Clínica Santa Gracia, fueron terminadas el día domingo 26 de marzo, logrando disminuir al máximo los tiempos de intervención en el sector.</p> <p>ASPECTOS AMBIENTALES: El día 22 de marzo de 2023, se realizó solicitud de licencia de sonido frente a la vivienda Carrera 16 # 18N/23. El contratista para el día 23 de marzo con el personal BOAL, realizó la licencia de dicho sonido.</p> <p>De igual forma, el día jueves 23 de marzo, se realizó aseo y limpieza en las vías habilitadas por el proyecto, en el sector de Campamento.</p> <p>Teniendo en cuenta la solicitud del día 14 de marzo, donde se requirió la licencia del anteproyecto de la casa con dirección Carrera 16 # 17N 40, el contratista realiza la subsección de dicha solicitud, dejando tiempo lo requerido.</p> <p>En recordo del día 23 de marzo, se informó sobre la necesidad de licencia de los sumideros ubicados en la Carrera 17 # 18N 44 y Carrera 16 con calle 17 esquina del barrio Campamento.</p> <p>El día sábado 25 de marzo, se realizó capacitación al personal de obra temas PPM, de igual forma se realizó visita de vías habilitadas sector Santa Gracia donde se evidenció la necesidad de licencia de sumideros Edificio Cívico, frente a entrada de Urgencias Hospital y sumidero barrio campamento Carrera 16 # 18N - 111, licencia de frenado y mezcla en zona verde contigua a la Villa Olímpica Carrera 16, de igual forma recolección de resquepente con aseo, recolección de botes de basura ubicados en el punto de amparo del sector, parqueadero Villa Olímpica y zona controlada por parte del contratista para realizar frenado, recolección de frenado, mezcla asfáltica, material de aniego de falo, cinta y resquepente de aseo ubicado en el parqueadero de la Villa Olímpica. Es importante mencionar, que estas solicitudes no se realizaron el día sábado, si no el día lunes 27 de marzo por medio de correo electrónico por parte de la interventoría.</p> <p>ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 47 del periodo 20 a 26 de marzo de 2023, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Los días 20, 21 y 22 de marzo de 2023, se continúa con las actividades de socialización en el sector de Campamento, y los días 23 y 24, se llevaron a cabo socializaciones en el sector de la Clínica Santa Gracia, las socializaciones se llevan a cabo casa a casa, en la administración de Clínica Santa Gracia - Barrio Machangara, oficinas y locales comerciales de Comercio, a fin de informar respecto de inicio de actividades de parqueo en el sector. Se realizó entrega de volantes, se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Programa B2 Resolución de Bienestar Afectado: El día 23 de marzo de 2023, la Residente Social del Contratista realizó levantamiento de registro fotográfico de fachadas, andenes, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector de la Clínica Santa Gracia - Barrio Machangara, previo al inicio de la intervención en el sitio. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Pendiente remisión de actividades sector La Paz. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente Social del Contratista e Interventoría realizan acompañamiento en jornadas de parqueo en el sector de la Clínica Santa Gracia - Barrio Machangara, actividades que concluyen el día domingo 26 de marzo. Se realizaron actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. Se solicita la revisión continua del correo electrónico edivas@np.com.co, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo. Durante la semana no se presentaron PQRS. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana el contratista no reporta ingresos de personal.</p> <p>ASPECTOS SST: Se verifica la señalización móvil instalada de acuerdo al PMT aprobado en el sector de Campamento y Clínica Santa Gracia, para evitar riesgos de ocurrencia de accidentes, e informar a los usuarios de las vías sobre las obras que se están ejecutando en la zona de influencia de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El día miércoles 22 de marzo, el contratista hace reposición de elementos de protección personal (dipabones y guantes). - El día jueves 23 de marzo, ingresa el profesional de apoyo SST William Morales. - El día sábado 25 de marzo, el contratista realiza charlas sobre temas del área ambiental y SST, a todo el personal colaborador en la obra. <p>Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.</p>			
REQUERIMIENTO A COMITÉS DE OBRA			
<p>Comité de obra 22-03-2023: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. A continuación, se presenta una descripción de los temas tratados. Respecto al adicional, está pendiente la revisión final jurídica, dado la solicitud de incremento de precios de la mezcla asfáltica realizada por el contratista. El contratista no cumplió con el remcio de actividades en la vía del Barrio La Paz el 13-03-2023, en la Carrera 6 entre Calles 69N y 708N. La Interventoría remitió el comunicado CNP-522-186-1096, que corresponde a un apremio por incumplimiento en la ejecución de obras de esta vía. Se solicitó al contratista tomar los correctivos para que el personal no sea llevado a otras obras que no pertenecen al contrato e incrementar el rendimiento en la instalación de la mezcla asfáltica. El contratista se comprometió a dar inicio a las conexiones solicitadas por la interventoría el día 01 de abril de 2023. Se recuerda que las obras deben estar terminadas dentro del plazo contractual. El contratista se comprometió a dar inicio a las actividades de demarcación y señalización vial en la primera semana de abril de 2023. Se tiene los temas del área social, ambiental y SST, se anexan los actos correspondientes. El contratista manifiesta que en la intervención realizada en la Calle 9 entre Cra. 8 y B, el empujamiento es preventivo, que en la zona del sector No. 8-54 el agua ingresa al garaje, por lo tanto si se suben los niveles el agua va a ingresar más. La Interventoría envió el comunicado No. CNP-522-185-1095 dirigido al contratista, donde solicita sustentar su respuesta con soportes técnicos de topografía para su verificación. Se informa a la Entidad Contratista, que en revisión de la solicitud del Sr. Harold Daza García se evidenció un cruce de redes de la Empresa de Acueducto sobre la Calle 9 cuyo concreto de reparación está en mal estado y está generando un hueco, se recomendó a la Entidad, trasladar la solicitud del peticionario a la Empresa AAPS. Se informa a la Entidad Contratista, que el derecho de petición del Sr. Harold Daza García, manifiesta adiferencia entre los andenes, en visita realizada el día 17-03-2023, se evidenció daño en andén sobre la Calle 9 extremo hacia la Carrera 9, control norte, sin embargo, estas obras no fueron ejecutadas mediante el contrato, razón por la cual, se recomendó a la Entidad verificar cuál fue el contratista que ejecutó estas obras y la Entidad que lo contrató, para que lo informe y se proceda con el requerimiento que corresponde. Corte de obra con fecha a 19-03-2023, % programado 90,966 (\$ 12.108.498.794), % ejecutado 86,125 (\$11.460.351.772), atraso 4,87%, (\$648.147.522).</p>			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
<p>El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoría No. 20221800011897 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Periodo de la Suspensión No. 1, entre el 30 de agosto y 15 de febrero de 2023. Fecha de Plazo No. 1: 15 de febrero de 2023. Se presentó un atraso en la ejecución del contrato del 4,63%. Se encuentra vigente el Modificatorio No. 5 para el contrato de obra y el Modificatorio No. 4 para el contrato de interventoría, según los cuales, la fecha de terminación de los contratos es 15-04-2023. Estado del contrato: EN EJECUCIÓN.</p>			
4,63%	ATRASO	equivalente a	\$ 616.167.141
OBRAS EJECUTADAS		INTERVENTORIA	
<p>El área de localización intervenciones acumulada a la fecha, corresponde a 118.434 m2. En la semana del presente informe, se culminan las obras de intervención en las vías del Barrio Campamento, al igual, que las obras en el sector de la Clínica Santa Gracia, en donde se observaba un elevado deficiente del pavimento. Las obras mejoraron las condiciones de movilidad y seguridad para los usuarios de las vías, especialmente, para las personas que requieren ingresar a la Clínica Santa Gracia. La intervención de las obras, se realiza en vías priorizadas por la Entidad Contratista.</p>		<p>Por:  ING. ANSELMO MARTÍNEZ A. Director de Interventoría</p>	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	47
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	27/03/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	2 de 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Comité de obra 22-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría		Instalación de carpeta asfáltica. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	
			
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	
			
Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.		Instalación de carpeta asfáltica. Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Barrio Campamento.	

	<p>ALCALDÍA DE POPAYÁN</p> <p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>INFORME</p> <p>FECHA</p> <p>PAGINA</p>	<p>47</p> <p>27/03/2023</p> <p>3 de 4</p>
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
		<p>Instalación de carpeta asfáltica. Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Sector Villa Olímpica</p>	<p>Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Sector Villa Olímpica</p>
		<p>Estado inicial pavimento deteriorado Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia</p>	<p>Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia</p>
		<p>Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia</p>	<p>Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia</p>



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME	47
FECHA	27/03/2023
PAGINA	4 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Actividades de socialización y entrega de folantes sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara. Verificación sector de encharcamiento Calle 9 Barrio San Camilo



Reposición EPPs a todo el personal
Charlas Ambientales y SST
Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra



Subsanación limpieza de sumidero y antejardín. Capacitación PIPMA. Puntos de acopio sector campanario y Santa Gracia, solicitud de orden, aseo y limpieza

ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		48	
UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3 4 2023	
Semana Número 48 Del 27 de marzo de 2023 Al 2 de abril de 2023		FECHA	
Suspensión No. 1 306/10223		Ratificación No. 1 1602/2023	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 344 DIAS			
Nombre del Supervisor ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"			
SEMANAL Obra programada (%) 2.314% Valor de la obra programada \$ 307,875,789.30		ACUMULADO 96.703% 12,734,945,097.30	
SEMANAL Obra Ejecutada (%) 3.481% Valor de la obra Ejecutada \$ 463,471,878		ACUMULADO 92.220% 12,271,377,688.48	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A		Interventor: INP SERVICIOS S.A.S	
Contrato No: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		Contrato No: 20221800011697 DE MARZO DEL 2022	
Valor Inicial \$ 8,486,786,110.00		Valor Inicial \$ 4,496,861,830.00	
Valor Final \$ 13,306,617,973.00		Valor Final \$ 7,771,704,665.00	
Plazo Inicial: Seis (6) meses		Plazo Inicial: Siete (7) meses	
Plazo Final: Once (15) días		Plazo Final: Once (15) días	
Adición y Prórroga No. 2 Un (1) Mes		Adición y Prórroga No. 2 Adición \$ 111,242,835 y Prórroga 31-12-2022	
Adición y Prórroga No. 3 Adición \$ 1,869,966,812 y Prórroga 31-12-2022		Adición y Prórroga No. 3 Adición \$ 100,000,000 y Prórroga 28-02-2023	
Adición y Prórroga No. 4 Adición \$ 1,834,088,051 y Prórroga 28-02-2023		Adición y Prórroga No. 4 Adición \$ 83,576,000 y Prórroga 15-04-2023	
Adición y Prórroga No. 5 Adición \$ 1,065,760,000 y Prórroga 15-04-2023		Adición y Prórroga No. 5 Adición \$ 1,065,760,000 y Prórroga 15-04-2023	
Fecha de Iniciación: 7 de abril de 2022		Fecha de Iniciación: 7 de abril de 2022	
Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023		Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
<p>ASPECTOS TÉCNICOS: En el transcurso de la presente semana, se llevó a cabo actividades de obra en el sector Centro de la ciudad de Popayán, realizando el frezado de carpeta asfáltica que presenta deterioro, instalación de la imprimación con emulsión asfáltica e instalación de carpeta de rodadura en macizo asfáltico MOC-16, en los siguientes tramos viales: Carrera 5 entre Calles 4 y 5, Carrera 5 entre Calles 3 y 4, Calle 3 entre Carreras 7 y 6, Calle 3 entre Carreras 6 y 5, Calle 3 entre Carreras 5 y 4, Calle 3 entre Carreras 4 y 3, y en la Calle 3 entre Carreras 3 y 2, logrando la culminación de las obras en los tramos intervenidos. Posteriormente, las obras se direccionan hacia el barrio La Paz, específicamente en la Carrera 6 entre Calles 69N y 708N, tramo donde se realizan actividades de rehabilitación de pavimentos. En este sector, se continúa con la conformación y compactación de la capa de material de mejoramiento, y su control de calidad por medio de la toma de densidades. Posteriormente, se realiza la instalación de la Geomalla Basal en toda el área de intervención, y se da inicio a la instalación, conformación y compactación de la capa de Subbase Granular. Por otra parte, se da inicio a las actividades de pintura de líneas de demarcación y marca vial en vías intervenidas mediante el contrato en el barrio Villa Docente y Santa Clara. Las actividades de demarcación vial, se realizan en coordinación con la Secretaría de Tránsito.</p> <p>ASPECTOS AMBIENTALES: El día 28 de marzo, se realizó recorrido sector centro (Calle 3), donde se verificó manejo de Impacts, protección de sumideros y replicación de arriales, para evitar marchado de pavidos. Se realizó recomendación a los Integridores, los cuales informaron que se estaba realizando las actividades con precaución y tomando las medidas pertinentes. El día 30 de marzo, se realizó recorrido verificando la señalización, orden y aseo de la obra, esto debido a la ubicación de la obra, lo cual hace más difícil el manejo de los cierras y señalización, debido a que personas ajenas a la obra no acatan dichas señales de prevención. En el recorrido se informó al personal BOAL sobre la necesidad de organizar el punto de acopio situado frente al acueducto, recolección de material frezado orden, señalización y demarcación del punto de acopio. Para el presente día, la obra se situó en otro sector del centro contiguo al Palacio de Justicia, por lo tanto, se realizó levantamiento de lo requerido. El día 01 de abril, se realizó recorrido en la vía de intervención del barrio La Paz, donde se evidenció el aporreamiento de los sumideros presentes en la obra, esto debido al exceso del material que quedó expuesto por varios días y la basura. De igual forma, no se evidenció el punto ecológico, falta complementar la señalización y cerramiento en toda la obra. Se hicieron las observaciones pertinentes al contratista, para que tome los correctivos a la mayor brevedad.</p> <p>ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 48 del 27 de Marzo al 2 de Abril de 2023 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se desarrollan actividades de Socialización en el sector Centro Calle 3 entre Carreras 7 y 3 Banco de la República y sector Acueducto, se llevan a cabo casa a casa, en locales comerciales, talleres y parquederos, a fin de informar respecto de inicio de actividades de parqueo en el sector. Se realiza entrega de volantes, se cuenta con registro fotográfico como evidencia. Programa B2 Reafirmación de Bienes Afectados: El componente social de Interventoría realiza acompañamiento en el levantamiento de registro fotográfico de fachadas, arriales, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector Centro, previo al inicio de la intervención en el sitio. Se realizan actividades en el sector del Barrio La Paz, se toma registro fotográfico de sumideros y tapas de alcantarillas. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente Social del Contrato e Interventoría, realizan acompañamiento en jornadas de puertas en el sector del Centro y actividades de obra en la vía del barrio La Paz. Se realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. En el correo electrónico advocapipa@gmail.com, no se reciben manifestaciones, inquietudes o solicitud de información por parte de la comunidad. Durante la semana no se presentan PQRS. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana el contratista no reporta ingreso de personal.</p> <p>ASPECTOS SST: Se verifica la señalización móvil y fija instalada de acuerdo al PMT aprobado en el sector del Centro y vía de intervención en el Barrio La Paz. Se inspecciona el uso adecuado de los EPP, debido a que el contratista hace su respectiva entrega y los Integridores no hacen el uso adecuado de estos elementos. Diariamente se cuenta con hidratación para el personal en el sitio de obra. Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.</p>			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Período de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Ratificación No. 1: 16 de febrero de 2023. Se presenta un adelanto en la ejecución del contrato del 3.48%, se encuentra vigente el Modificatorio No. 5 para el contrato de obra y el Modificatorio No. 4 para el contrato de Interventoría, según los cuales, la fecha de terminación de los contratos es 15-04-2023. Estado del contrato: EN EJECUCIÓN.			
3.48%	ATRASO	equivalente a \$	463,471,878
El área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 120,965 m ² . En la semana del presente informe, se ejecutaron obras en vías del sector Centro de la ciudad y continuaron las actividades de rehabilitación de pavimentos en la vía Carrera 6 entre Calles 69N y 708N del Barrio La Paz. Se dio inicio a las actividades de demarcación vial con pintura en frío en varias vías intervenidas mediante el contrato, en los barrios Villa Docente y Santa Clara. La intervención de vías en el sector Centro de la ciudad, mejoraron considerablemente las condiciones de movilidad y seguridad para los usuarios de las vías. La intervención de las obras, se realiza de acuerdo con el orden de priorización de las vías, dado por la Entidad Contratista.		INTERVENTORIA	
		Firma:  ING. ABELARDO MARTÍNEZ A. Director de Interventoría	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		INFORME	48
			FECHA	3/04/2023
			PAGINA	2 de 5
	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO				
				
Comité de obra 28-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoria		Reunión 29-03-2023 en Secretaría de Tránsito. Tema revisión de vías para señalización y demarcación vial		
				
Terminación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 3 y 4. Barrio Centro		
				
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 7 y 6. Barrio Centro		Instalación de carpeta asfáltica. Calle 3 entre Carreras 6 y 5. Barrio Centro		

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	48
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	3/04/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	3 de 5
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Instalación de carpeta asfáltica. Calle 3 entre Carreras 5 y 4. Barrio Centro		Actividades de instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 4 y 3. Barrio Centro	
			
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 3 y 2. Barrio Centro		Conformación capa de material de mejoramiento en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
			
Control de densidades sobre capa de mejoramiento en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz		Instalación de Geomalla Biaxial sobre capa de mejoramiento. Cra. 6 entre Calles 69N y 70BN B/. La Paz	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	48
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	3/04/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	4 de 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO	
	
Se inicia instalación de capa de Subbase Granular en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	Instalación y conformación de capa de Subbase Granular en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
	
Actividades de demarcación vial con pintura en frio en el Barrio Villa Docente	Actividades de demarcación vial con pintura en frio en el Barrio Villa Docente
	
Demarcación vial en la Calle 11N con Carrera 9, Barrio Santa Clara	Línea de demarcación con pintura en frio en el Barrio Villa Docente



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME	48
FECHA	3/04/2023
PAGINA	5 de 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Acompañamiento en actividades de parcheo sector Centro Calle 3 entre Cra. 7 y 5 Banco de la República, Calle 3 entre carrera 5 y 4 sector Acueducto, Calle 3 entre Cra. 4 y 3, y vía del sector Barrio La Paz . Actividad de revision de documentación y PQRS pendientes Componentes Social y Ambiental Interventoría y Contratista. Actividades de socialización sector Centro y verificación atención de solicitud sector barrio Guayabal



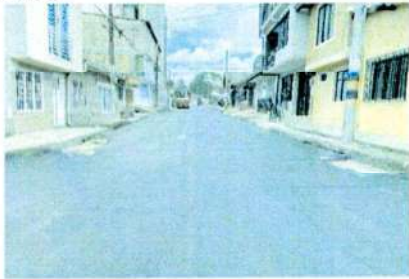
Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra
Uso adecuado de EPPs por parte de los trabajadores de la obra



Verificación limpieza de sumideros zona centro, cerramiento y señalización obras sector La Paz. Puntos de acopio sector centro, solicitud de orden, aseo y limpieza. Recorrido solicitud limpieza de sumideros barrio La Paz

	ALCALDIA DE POPIAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		INFORME 49
			FECHA 10/04/2023
			PAGINA 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPIAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			FECHA: 10 4 2023
Semana Número: 49 Del: 3 de abril de 2023 Al: 9 de abril de 2023 Suspensión No. 1: 30/01/2023 Retorno No. 1: 16/02/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 351 DIAS Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLADO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO NO CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPIAYAN 2021"			
Obra programada (%) SEMANAL: 2,314% ACUMULADO: 98,017% Valor de la Obra programada: \$ 307.875.789,38 \$ 13.042.754.456,58		Obra Falsa Ejecutada (%) SEMANAL: 3,653% ACUMULADO: 95,873% Valor de la Obra Falsa Ejecutada: \$ 286.137.900,45 \$ 12.757.500.918,85	
CONTRATO DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO NO CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPIAYAN 2021"		CONTRATO DE INTERVENTORIA OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO NO CONSERVACIÓN VAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPIAYAN 2021"	
Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Valor Inicial: \$ 8.498.180.110,00 Valor Final: \$ 13.308.617.973,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Promesa No. 1: Quince (15) días Promesa No. 2: Un (1) Mes Adición y Promesa No. 3: Adición \$ 1.860.000.000 y Promesa 31-12-2021 Adición y Promesa No. 4: Adición \$ 1.834.000.000 y Promesa 28-02-2022 Adición y Promesa No. 5: Adición \$ 1.085.780.000 y Promesa 15-04-2022 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023		Interventor: RUP SERVICIOS S.A.S. Contrato No.: 20221800011697 DE MARZO DEL 2022 Valor Inicial: \$ 498.661.830,00 Valor Final: \$ 771.794.695,00 Plazo Inicial: Seis (6) meses Promesa No. 1: Quince (15) días Adición y Promesa No. 2: Adición \$ 111.343.936 y Promesa 31-12-2021 Adición y Promesa No. 3: Adición \$ 100.000.000 y Promesa 28-02-2022 Adición y Promesa No. 4: Adición \$ 63.970.000 y Promesa 15-04-2022 Fecha de Inicio: 7 de abril de 2022 Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2023	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS: Continúan las actividades construcción de pavimento en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, terminando la instalación de la capa de subbase granular en un espesor de 0,15 m, y la instalación y compactación de la capa de base granular con espesor de 0,15 m. Se realiza la imprimación de toda el área de intervención, y se suspenden las actividades durante los días festivos de Semana Santa. En la presente semana, se da inicio a las obras en la Comuna 8, realizando el frasco de la carpeta asfáltica existente que presenta un elevado deterioro, imprimación con emulsión asfáltica e instalación de carpeta asfáltica MDC-18 en un espesor de 0,10 m, en las siguientes vías del Barrio Carlos Primero: Carrera 36 entre Calles 5 y 44, Calle 40 entre Carreras 36 y 37, en la curva de la Calle 4A entre Carreras 36A y 37, y Carrera 37 entre Calles 2 y 4A (empalme con el Barrio María Occidente). En sectores del Barrio La María Occidente, se intervienen de igual forma las siguientes vías: Carrera 43 entre Calles 1A y 2, Carrera 41 con Calle 1, Calle 1A entre Carreras 41 y 428 que presentaba un pavimento con un elevado deterioro, y en la Carrera 41 entre Calles 1A y 2, donde se intervienen dos tramos, uno de ellos frente al Hospital de La María Occidente. Se realiza recordo con el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La María Occidente, en las vías que fueron sugeridas por el representante de la comunidad y que fueron priorizadas por la Entidad para ser intervenidas. Por otra parte, se continúan con las actividades de pintura de líneas de demarcación y marca via, logrando su culminación. Las actividades de demarcación vial, se realizan en coordinación con la Secretaría de Tránsito en vías ubicadas en los barrios Villa Occidente, Yambitara, Santa Clara, Antonio Nariño, Campesinato, vía de acceso al barrio La Paz, Barrio Sotará, José María Obando y barrio La Esmeralda. ASPECTOS AMBIENTALES: El día 03 de abril, se requiere la limpieza de sumideros en el barrio Carlos Primero, los cuales se encuentran con material de frasco y asfalto. El contratista dispuso la cuadrilla BOAL, para dar atención a dicho solicitud. El día 04 de abril, se realiza recordo en la vía de intervención del barrio La Paz, donde se evidencia el taponamiento de los sumideros presentes en el sector de la obra, esto debido al lavado del material que quedó expuesto por varios días y a la basura. La Interventoría solicitó al contratista proceder de manera inmediata con la limpieza de los sumideros. Es importante mencionar, que el punto de acopio, punto ecológico y señalización móvil, solo se encuentra en el sector del barrio Carlos primero, en la vía del barrio La Paz, no se dispone de ningún elemento antes mencionado. Finalmente, se acordó con la Ingenua Sirena, entregar el informe del mes marzo con adición de quince días de abril, quedando del 01 de marzo al 15 de abril de 2023, esto para no presentar un informe de solo 15 días. ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 49 del 3 al 9 de Abril de 2023, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se desarrollan actividades de socialización en los barrios Carlos Primero y María Occidente, se llevan a cabo casa a casa, en locales comerciales, talleres y parrandas, a fin de informar respecto de inicio de actividades de parques en el sector. Se realiza entrega de volantes. De igual forma, teniendo en cuenta el riesgo de actividades en el sector del Barrio La Paz, se informa a los habitantes del sector respecto del inicio de las actividades de obra. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: El componente social de Interventoría realiza acompañamiento en el levantamiento de registro fotográfico de techados, andenes, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector Carlos Primero y La María, previo al inicio de la intervención en el sitio. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente Social del Contratista e Interventoría realizan acompañamiento en jornadas de parqueo en el sector del Barrio La Paz, Carlos Primero y María Occidente. Se realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. En el correo electrónico edivulgacion@gmail.com, no se reciben manifestaciones, inquietudes o solicitud de información. Durante la semana no se presentan PQRS. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana, el contratista no reportó ingreso de personal. ASPECTOS SST: Se verifica la señalización tipo instalada de acuerdo al PMT actualizado mediante resolución No. 20231500025254 del 30 de marzo hasta el 30 de abril de 2023 - Se inspecciona elementos de primeros auxilios en obra - Se verifica el uso adecuado de los EPPs - Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.			
SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS DE OBRA Comité de obra: En la presente semana, no se realizó comité de obra.			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Periodo de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Retorno No. 1: 16 de febrero de 2023. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato de 2,14%. Se encuentra vigente el Modificador No. 5 para el contrato de obra y el Modificador No. 4 para el contrato de Interventoría, según los cuales, la fecha de terminación de los contratos es 15-04-2023. Estado del contrato: EN EJECUCIÓN.			
2,14% ATRASO equivalente a \$ 203.214.336		INTERVENTORIA  ING. ALJAIRO MARTÍNEZ Director de Interventoría	
El área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 125.368,90 m2. Durante la semana del presente informe, continuaron las obras de construcción de pavimentos en la vía Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, por medio de la instalación de las capas granulares. De igual forma, se realizaron actividades de pintura de líneas de demarcación y marca via, los cuales fueron terminados en su totalidad. De acuerdo con priorización de vías por parte de la Entidad Contratista, en donde se tuvo en cuenta las solicitudes de representantes de la Comuna 8, se realizan intervenciones en diferentes vías de este sector ubicado en el occidente de la ciudad de Popayán.			

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	49
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	10/04/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	2 de 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Recorrido en vías priorizadas Comuna 9 con el Presidente de la JAC La Maria. Calle 1A entre Cra. 41 y 42B		Recorrido en vías priorizadas Comuna 9 con el Presidente de la JAC La Maria. Calle 2A entre Cra. 44 y 42	
			
Instalación y compactación capa de subbase granular. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz		Control densidades de Interventoría capa de subbase. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
			
Instalación y compactación capa de base granular. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz		Imprimación para protección de capa de base granular en periodo de Semana Santa. Barrio La Paz	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	49
		FECHA	10/04/2023
		PAGINA	3 de 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 36 entre Calles 5 y 4A. Barrio Carlos Primero (Comuna 9)		Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 36 entre Calles 5 y 4A. Barrio Carlos Primero (Comuna 9)	
			
Instalación mezcla asfáltica MDC-19. Calle 4D entre Carreras 36 y 37. Barrio Carlos Primero		Instalación mezcla asfáltica MDC-19. Calle 4D entre Carreras 36 y 37. Barrio Carlos Primero	
			
Estado inicial vía con pavimento deteriorado. Calle 4A entre Carreras 36A y 37. Barrio Carlos Primero		Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica. Calle 4A entre Carreras 36A y 37. Barrio Carlos Primero	



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME	49
FECHA	10/04/2023
PAGINA	4 de 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado inicial vía con presencia de baches. Carrera 37 entre Calles 2 y 4A. Barrio Carlos Primero



Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica. Carrera 37 entre Calles 2 y 4A. Carlos Primero



Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 43 entre Calles 1A y 2. Barrio La María Occidente (Comuna 9)



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Sector curva Carrera 41 con Calle 1. La María Occidente (Comuna 9)



Estado inicial vía con pavimento deteriorado. Calle 1A entre Carreras 41 y 42B. Barrio La María Occidente



Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica. Calle 1A entre Carreras 41 y 42B. Barrio La María Occidente



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME	49
FECHA	10/04/2023
PAGINA	5 de 6

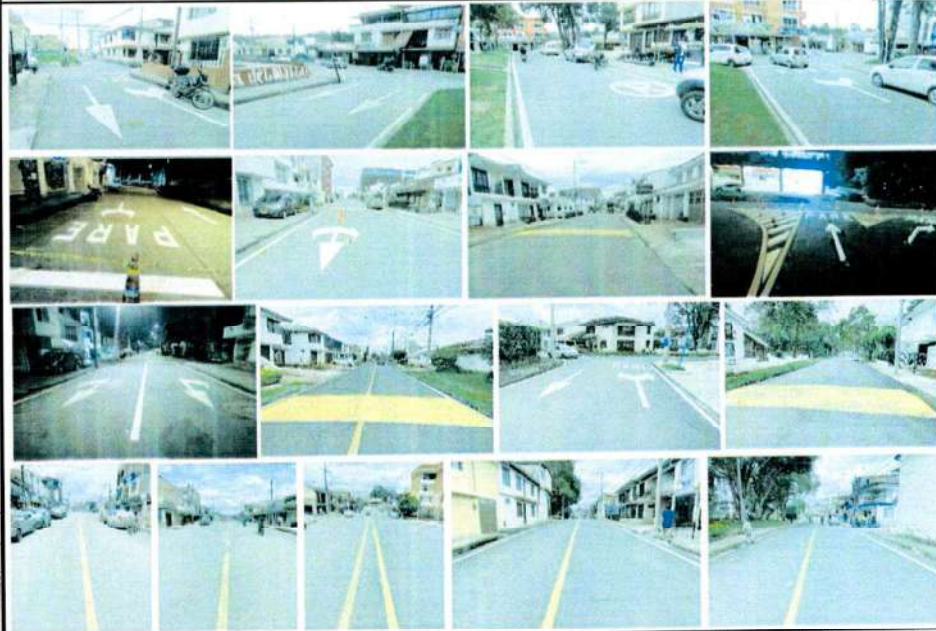
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 41 entre Calles 1A y 2. Sector Hospital La María Occidente

Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 41 entre Calles 1A y 2. Barrio La María Occidente



Actividades de pintura de línea de demarcación y marca vial, las cuales se realizan en coordinación con la Secretaría de Tránsito en vías ubicadas en los barrios Villa Docente, Yambitará, Santa Clara, Antonio Nariño, Campamento, vía de acceso al barrio La Playa, barrio Sotará, José María Obando y barrio La Esmeralda.



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME	49
FECHA	10/04/2023
PAGINA	6 de 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Actividades de socialización sector Carlos Primero, Maria Occidente y La Paz, y acompañamiento en actividades de parcheo en estos sectores. Verificación reubicación de tubo de desagüe de aguas lluvias sector Barrio La Paz

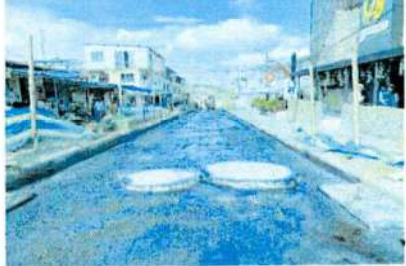


Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra
Personal PARE y SIGA. Uso adecuado de elementos EPPs de los colaboradores en obra



Limpieza de sumideros Barrio Carlos I. Puntos de acopio sector centro, solicitud de orden. Verificación cerramiento y señalización en vía de intervención barrio La Paz. Recorrido solicitud limpieza de sumideros en vía de intervención barrio La Paz

 ALCALDIA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		INFORME		50	
		FECHA		17/04/2023	
		PAGINA		1 de 6	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
UNIDAD EJECUTORA		MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA	
		17		4	
		2023			
Semana Número		50		Del 10 de abril de 2023	
Suspensión No. 1		30/01/2023		Retorno No. 1: 16/02/2023	
Tiempo transcurrido desde la ejecución del contrato		357		DÍAS	
Nombre del Supervisor		ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.					
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"					
Otra programada (%)		SEMANAL		ACUMULADO	
Valor de la Obra programada		\$ 263.863.516.42		\$ 13.306.877.973.00	
Otra Ejecutada (%)		SEMANAL		ACUMULADO	
Valor de la Obra Ejecutada		\$ 532.937.736.15		\$ 13.290.447.655.00	
CONTRATO DE OBRA:					
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"					
Contratista		EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.			
Contrato No.		2021180024217 DE DICIEMBRE DEL 2021			
Valor Inicial		\$ 8.486.789.110.00			
Valor Final		\$ 13.306.817.873.00			
Plazo Inicial		Seis (6) meses			
Plazo Final		Quince (15) días			
Prórroga No. 1		Un (1) Mes			
Adición y Prórroga No. 2		Adición \$ 1.869.999.813 y Prórroga 31-12-2022			
Adición y Prórroga No. 3		Adición \$ 1.854.989.051 y Prórroga 28-03-2023			
Adición y Prórroga No. 4		Adición \$ 1.065.780.000 y Prórroga 15-04-2023			
Fecha de Inicio		7 de abril de 2022			
Fecha de Vencimiento		15 de abril de 2023			
Interventor		INP SERVICIOS S.A.S.			
Contrato No.		2022180011897 DE MARZO DEL 2022			
Valor Inicial		\$ 496.891.830.00			
Valor Final		\$ 771.734.655.00			
Plazo Inicial		Seis (6) meses			
Plazo Final		Quince (15) días			
Prórroga No. 1		Adición \$ 111.242.835 y Prórroga 31-12-2022			
Adición y Prórroga No. 2		Adición \$ 189.589.600 y Prórroga 28-03-2023			
Adición y Prórroga No. 3		Adición \$ 63.570.000 y Prórroga 15-04-2023			
Adición y Prórroga No. 4		Adición \$ 63.570.000 y Prórroga 15-04-2023			
Fecha de Inicio		7 de abril de 2022			
Fecha de Vencimiento		15 de abril de 2023			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
<p>ASPECTOS TÉCNICOS: En la semana correspondiente al presente informe, se realizó recomposición y compactación de la capa de base granular en la vía Camera 6 entre Calles 69N y 70N del Barrio La Paz, en los sectores que se venían afectados por las lluvias durante los días festivos de la Semana Santa. Posteriormente, se procede nuevamente con la imprimación, instalación y compactación de la capa de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19 en un espesor de 10 cm, dando por terminadas las actividades de rehabilitación de pavimentos en este sector del norte de la ciudad. Continúan las actividades de obra en la Camera 9, en los barrios Villa Colombia, Los Nanqueros y Barrio La María Occidente, realizando el frizado de carpeta asfáltica que presenta deterioro, imprimación con emulsión asfáltica e instalación de carpeta de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19 en las siguientes vías: Calle 2A entre Cameras 42 y 44, Intersección Calle 2A con Camera 42, Camera 48D entre Calles 1 y 2 (extensión hacia calle 2), Calle 2 entre Camera 48A y 48B, Calle 4 entre Cameras 42 y 41, Intersección Calle 4 con Camera 42, Calle 2 entre Cameras 43A y 44 e Intersección Calle 2 con Camera 44. De igual forma, se realizó intervenciones en el sector de Entrénquios en la Intersección Variante Norte Popayán y Camera 17, e intervención en parches puntuales en la Camera 17 entre Variante Norte y sector de Morinda.</p> <p>ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 10 de abril de 2023, se realizó recorrido de verificación PIPMA en la vía de intervención del barrio La Paz, donde se evidenciaron materiales granulados y medos de mezcla asfáltica sobre los sumideros y restos de escombros en toda la cuadrilla. Se evidencia de igual forma, que se debe realizar la reparación del andén que se vio afectado por las obras y por la instalación de las guardas del cerramiento, razón por la cual, se solicitó al contratista proceder a la mayor brevedad con la limpieza y arreglo respectivos. En atención a esta solicitud, al finalizar las actividades de la obra, el contratista por medio de su personal BOA, procedió a realizar la limpieza de sumideros, retiro de escombros, arreglo sobre el andén y tapado de huecos con mezcla de concreto, donde se instalaron las guardas de la polimérica. Una vez culminadas las obras, se procede de igual forma a realizar jornadas de limpieza, recolección y retiro de escombros en los tramos intervenidos en el barrio La María Occidente, Villa Colombia, Los Nanqueros y en el sector de Entrénquios. Se realiza capacitación a los trabajadores de obra, por parte de los profesionales del área PIPMA. La limpieza de material vegetal por parte de ramos para el manejo de la fricción, fue realizada por el contratista. Terminados los días, el contratista elabora y presenta el informe PIPMA No. 12 correspondiente al periodo del 1 de marzo al 15 de abril del 2023, el cual fue revisado por la Interventoría enviando las observaciones correspondientes. El informe fue presentado nuevamente por el contratista por medio de correo electrónico, atendiendo las observaciones realizadas por la Interventoría. Finalmente, la Interventoría equipo PIPMA, realiza la aprobación del informe mensual PIPMA N° 12 V2 (1 de marzo al 15 de abril del 2023) enviando la aprobación por medio de correo electrónico.</p> <p>ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 50, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se desarrollan actividades de socialización en el sector La María Occidente, Villa Colombia y Barrio Los Nanqueros, se llevan a cabo casa a casa a fin de informar respecto de inicio de actividades de parqueo en el sector. Se realiza de igual forma, la entrega de volantes en los sectores visitados. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: El componente social realiza acompañamiento en el levantamiento de registro fotográfico de techados, andenes, tapas de alcantarillas y sumideros en el sector La María Occidente, Villa Colombia, Los Nanqueros y Entrénquios, previo al inicio de la intervención en el sitio. Dando atención a la solicitud de la Interventoría, el contratista procedió a realizar la reparación de andenes que fueron afectados durante la ejecución de las obras en el sector de la Camera 18A entre Calles 18N y 17N vía de acceso al barrio La Paz, en la Camera 17 del barrio Campanero, en andenes de ramos intervenidos en el barrio La María Occidente, y en el andén de la Camera 9 entre Calles 69N y 70N del barrio La Paz. De igual forma, procedió a realizar la renovación de la carpeta asfáltica en la Calle 9 con Camera 9, para eliminar problemas de aparcamiento de agua que se presentaban en el sector. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El componente social del Contratista y la Interventoría, realizan acompañamiento en jornadas de parqueo en el sector del Barrio La Paz, La María Occidente, Villa Colombia, Los Nanqueros y Entrénquios. Se realizan actividades de atención a la comunidad y se resuelven dudas e inquietudes. En el correo electrónico edivulgacion@gmail.com, no se reciben preguntas, inquietudes o solicitud de información por parte de la comunidad. Durante la semana no se presentan PQRS. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana, el contratista no reportó ingreso de personal.</p> <p>ASPECTOS SST: Se verifica la señalización instalada de acuerdo al PMT actualizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dan charlas de SST al personal en obra. - Se verifica el transporte de maquinaria pesada, que se realice con todas las medidas de seguridad. - Se inspeccionan elementos de protección personal en obra. - Durante la ejecución del contrato, no se presentaron accidentes laborales. 					
SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:					
<p>Comité de obra 11-04-2023: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. A continuación, se presenta una descripción de los temas tratados: La Entidad, desde la solicitud realizada en comités anteriores, referente a la intervención de la vía peatonal en el Barrio Matamoros. Lo anterior, debido a los cambios de programación solicitados por la misma Entidad. En el sector de la María Occidente, se incluye para intervención un tramo de la vía Camera 43 entre Calles 1B y 1A. Se informa en el presente comité, sobre una solicitud de intervención de área en el Barrio Villa Colombia, específicamente de la Señora Magaly. Se informa que las actividades de señalización y demarcación vial, ya fueron ejecutadas y terminadas. Los trabajos se realizaron en coordinación con la Oficina de Tránsito. Se programa visita para el día 12-04-2023 al sector Camera 17 con la Vía Variante (Entrénquios), para revisar el área que se va a intervenir por solicitud de la Entidad para 10 años. Se solicita al contratista revisar y corregir un fallo que se observó en la vía asfáltica a la Facultad de Educación. La Entidad revisará, sobre la documentación requerida para el proceso de liquidación de los años. Se le recuerda al contratista, que todos los observaciones y PQRS pendientes, deben estar subsanados para poder culminar el proceso de liquidación del contrato de obra. Se leen los temas del área social, ambiental y SST. Se anexas las actas correspondientes. Ambiental: Se solicita al contratista realizar la revisión y limpieza de las vías adyacentes a las obras de la vía del barrio La Paz, Calle 69N y Calle 70N. Se informa que las obras de rehabilitación de la vía Camera 6 entre Calles 69N y 70N del Barrio La Paz, se encuentran culminadas.</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
<p>El contrato de obra No. 2021180024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 2022180011897 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Periodo de la Suspensión No. 1, entre el 30 de enero y 15 de febrero de 2023. Fecha de Plazo No. 1: 16 de febrero de 2023. La fecha de terminación de los contratos de obra y de interventoría en 15-04-2023, de acuerdo con el Modificador No. 5 y Modificador No. 4, respectivamente. El Valor total ejecutado acumulado corresponde al 99.98% del valor del contrato, quedando un saldo por valor de \$16.170.318. Estado del contrato: TERMINADO.</p>					
0,12%		SALDO		equivalente a \$ 16.170.318	
El área de localización intervenida acumulada, corresponde a 130.247,90 m2. Las obras de rehabilitación de pavimentos en la Camera 6 entre Calles 69N y 70N del Barrio La Paz fueron terminadas en su totalidad, logrando restablecer el tránsito vehicular en este tramo vial, toda vez que se encontraba en condiciones que no permitían el paso de vehículos por el sector. Por medio del contrato, se realizaron actividades de pintura de líneas de demarcación en el marco vial en diferentes barrios de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Tránsito y de acuerdo con las cantidades de obra consideradas en el contrato. Las actividades de obra se desarrollaron de acuerdo con el orden de priorización de vías dado por la Entidad Contratista. Se presenta un saldo en el contrato por valor de \$16.170.318, el cual debe quedar a cargo de la Entidad Contratista.		OBSERVACIONES		INTERVENTORIA	
				Firmado:  ING. ANSELMO MARTÍNEZ Director de Interventoría	

	<p align="center">ALCALDÍA DE POPAYÁN</p> <p align="center">SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p align="center">INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>INFORME</p> <p>FECHA</p> <p>PAGINA</p>	<p>50</p> <p>17/04/2023</p> <p>2 de 6</p>
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
		<p>Comité de obra 11-04-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría</p>	<p>Reconformación y compactación de capa de base granular. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz</p>
		<p>Control densidades Interventoría capa de base granular. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz</p>	<p>Nuevamente se realiza aplicación de la imprimación. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz</p>
		<p>Estado inicial vía con pavimento totalmente deteriorado. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz</p>	<p>Vía terminada con instalación de pavimento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz</p>

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	50
		FECHA	17/04/2023
		PAGINA	3 de 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ASPECTO TÉCNICO			
			
Estado inicial vía con pavimento totalmente deteriorado. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz		Vía terminada con instalación de pavimento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
			
Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 2A entre Carreras 42 y 44. Barrio Maria Occidente		Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 2A entre Carreras 42 y 44. Barrio Maria Occidente	
			
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 2A entre Carreras 42 y 44. Barrio Maria Occidente		Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Intersección Calle 2A con Carrera 42. Barrio Maria Occidente	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	50
		FECHA	17/04/2023
		PAGINA	4 de 6
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 48D entre Calles 1 y 2 (extremo hacia calle 2). Villa Colombia		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 2 entre Carrera 48A y 48B. Barrio Los Naranjos	
			
Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Calle 4 entre Carreras 42 y 41. Barrio La María Occidente		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Intersección Calle 4 con Carrera 42 . La María Occidente	
			
Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 2 entre Carreras 43A y 44. Barrio Maria Occidente		Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Intersección Calle 2 con Carrera 44. Barrio Maria Occidente	

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME	50
		FECHA	17/04/2023
		PAGINA	5 de 6
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ASPECTO TÉCNICO			
			
Fresado e instalación de imprimación. Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos		Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos	
			
Instalación carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 17 Sector Entrepinos		Instalación carpeta asfáltica MDC-19 parches puntuales. Carrera 17 entre Variante Norte y Calle 55N	
			
Instalación carpeta asfáltica MDC-19 parches puntuales. Carrera 17 entre Calle 55N y Sector Morinda		Instalación carpeta asfáltica MDC-19 parches puntuales. Carrera 17 entre Calle 55N y Sector Morinda	



ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INFORME	50
FECHA	17/04/2023
PAGINA	6 de 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Acompañamiento en actividades de socialización sector La Maria Occidente, Villa Colombia, Los Naranjos y Entrepinos, y atención de inquietudes de la comunidad. Capacitación personal de obra. Visita del Sr. Alcalde en vías intervenidas del barrio Maria Occidente. Reparaciones en andenes que fueron afectados durante la intervención de las obras.



Uso adecuado de EPPs por parte de los colaboradores en obra. Carro escolta para transporte y traslado de maquinaria pesada. Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra. Durante la ejecución de las obras del contrato, no se presentaron accidentes laborales.



Retiro de escombros de obra. Actividades de limpieza de andenes, sumideros y vías que fueron intervenidas mediante el contrato.



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

Código: ADTI-FO-106

Versión: 1

Fecha de aprobación:

03- Julio 2018

**ANEXO 10
INFORMES PIPMA**

 <p>Creo en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 1 DE 34</p>

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No. 12

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO No. 20221800011697 de marzo del 2022



POPAYÁN, ABRIL DE 2023

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 INP SERVICIOS SAS
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 2 DE 34

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. OBJETIVOS	4
1.1 OBJETIVO GENERAL	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS	5
3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	5
3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS	5
3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, D, E Y F	6
3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental	6
Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental	6
Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	7
3.2.2 COMPONENTE B – GESTIÓN SOCIAL	7
Programa B1: Divulgación e información a la comunidad.	7
Programa B2: Restitución de bienes afectados.	9
Programa B3: Atención y participación ciudadana	11
Programa B4: Vinculación de mano de obra.	12
Programa B5: Capacitación del personal de obra.	19
Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas	20
3.2.4. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción	20
Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción	21
Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte	21
Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas	22
Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra	22
Programa D6: Manejo de aguas superficiales	24
Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos	24
Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido	25
Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos	25
3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	25
Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo	25
Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción	31
3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico	32
RESUMEN DE LA INVERSIÓN PIPMA Y PMT	34

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 3 DE 34

INTRODUCCIÓN

El alcalde Juan Carlos López Castrillón como representante legal del Municipio de Popayán, mediante contrato N° 202218000242 del 2021 adjudico el proyecto MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021.

De acuerdo a lo anterior se realizó el proceso de licitación Pública para la ejecución de la interventoría cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021", el cual se adjudicó al contratista de Interventoría **INP SERVICIOS S.A.S.** el cual fue adjudicado al por medio del Contrato No. 20221800011697 de marzo del 2022 ,con un plazo de ejecución inicial meses (06) meses.

Mediante modificatorio No 1 la Alcaldía de Popayán otorga una PRORROGA al contrato de obra No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021, de 15 días contados a partir del 7 de octubre del 2022 y hasta el 22 de octubre del 2022.

Mediante el modificatorio No 2 al contrato de obra pública No 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021, se otorga una prórroga de un mes, del 23 de octubre al 23 de noviembre del 2022.

Mediante modificatorio No 3 al contrato de obra pública No 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021, se otorga una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022.

Mediante modificatorio No 4 al contrato de obra pública No 20211800024217 se otorga una prórroga hasta el 16 de marzo del 2023.

Mediante modificatorio No 5 al contrato de obra pública No 20211800024217 se otorga una prórroga hasta el 15 de abril del 2023

La contratación de la interventoría se realizó con el objeto de ejecutar la supervisión y seguimiento externo al contrato de obra, así como también para propender por un cumplimiento adecuado y oportuno de su respectivo objeto.

Para dar cumplimiento a los requisitos contractuales INP SERVICIOS SAS elaboro el presente informe de seguimiento y evaluación de la Gestión Socio-Ambiental desarrollada por el Contratista de Obra EDIFICACIONES Y VÍAS S.A durante el periodo comprendido entre marzo al 15 abril de 2023, verificando el cumplimiento de las obligaciones socio-ambientales durante el periodo mencionado anteriormente.

A continuación, se presenta toda la información sobre el seguimiento de la implementación del plan de manejo ambiental presentado por el contratista de obra en sus componentes ambiental, social, SST y manejo de tráfico.

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 4 DE 34

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar a la Alcaldía del Municipio de Popayán, el informe número 12 del seguimiento a la gestión socio ambiental desarrollada por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo y 01 al 15 de abril de 2023.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los resultados del seguimiento a las actividades socios ambientales desarrollados para minimizar, prevenir y compensar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras en los lugares intervenidos.
- Demostrar el seguimiento a las actividades de carácter ambiental, social y SST, implementadas para el cumplimiento del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental- PIPMA de este proyecto.
- Verificar el cumplimiento a los requisitos legales establecidos por la Autoridad Ambiental competente, para el trámite y obtención de los permisos necesarios requeridos para el desarrollo de las actividades constructivas.

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 5 DE 34</p>

2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

En la Tabla No. 1 se presenta la información básica de los contratos de interventoría y de obra.

Tabla 1 Datos básicos de los contratos de interventoría y de obra.

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de la Ciudad de Popayán.		
ENTIDADES	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No:	20221800011697 de marzo del 2022	20211800024217 de diciembre de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"
CONTRATISTA:	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S.

3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Contratista entregó la versión No. 1 del informe de gestión socio ambiental correspondiente al periodo comprendido entre marzo al 15 abril de 2023, por medio de correo electrónico el día 24 de abril 2023, se envían observaciones a dicho informe. El contratista envía subsanaciones del informe versión 2 el día 26 de abril del 2023.

En los siguientes ítems se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el marco de seguimiento de los componentes socio ambientales durante el periodo en cuestión.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS

A continuación, se relacionan las actividades generales ejecutadas en los Componentes Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y de Señalización como parte del seguimiento al PIPMA.

- Durante el periodo el realizó visitas diarias a los frentes de obra habilitados, donde se realizó el seguimiento e inspección al cumplimiento de las actividades socio ambientales desarrolladas por el contratista de obra.
- Se realizó recorridos diarios en conjunto con el personal del contratista en las áreas correspondientes al plan de manejo ambiental establecido para la ejecución de las actividades. Lo anterior con el objetivo de la verificación del cumplimiento de lo establecido en los temas ambientales, sociales y SST.
- Visitas de seguimiento e inspección semanal en conjunto con personal del contratista.
- Seguimiento al personal dispuesto en obra y su afiliación al sistema integral en salud.
- Revisión y seguimiento de PQRS que se generaron durante el periodo correspondiente al presente informe.
- Inspección de retiro de señalización.
- Revisión semanal de formatos implementados por el contratista de obra para el cumplimiento socio ambiental.
- Diligenciamiento de formatos de interventoría.
- Seguimiento a disposición de escombros, orden, aseo y limpieza de la obra.

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 6 DE 34

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, D, E Y F

3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental

Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental

Para este periodo INP SERVICIOS SAS realizó el seguimiento, inspección, control y acompañamiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra dando cumplimiento a los programas que conforman el PIPMA.

Se verificó la vinculación de los profesionales del contratista encargados de ejecutar las actividades socio-ambientales de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones, para este periodo el contratista no cumplió con la contratación total del personal según lo establecido contractualmente, esto refiriéndose a la auxiliar SST, la cual debe estar presente en la obra en un 100%.

Durante la etapa de mantiene la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza – BOAL, diariamente al inicio de la jornada el equipo ambiental del Contrato, dio instrucción a esta brigada acerca de las actividades a desarrollar, dando prioridad antes de la jornada de aseo a aquellas situaciones a ser atendidas de manera inmediata. De igual forma hubo plena participación en comités de obra (7 de marzo, 14 de marzo, 22 de marzo, 28 de marzo, 4 de abril y 11 de abril del 2023) mesas de trabajo y recorridos programados por parte de la Alcaldía de Popayán y contratista en los cuales se evaluó el avance de la gestión ambiental del proyecto, se expusieron observaciones, compromisos y recomendaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el PIPMA.



Tabla 2. Profesionales implementación de PIPMA
INTEGRANTES EQUIPO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SST

NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD
Anderson Viveros	Director de obra.	Aprobación de recursos, coordinación, seguimiento y control a la ejecución del PIPMA.
Sirlena Medina Plaza	Residente Ambiental de Obra.	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental.

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 7 DE 34

Dayan Narvaez	Liceth	Residente Social de Obra	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión social.
Claudet Pacheco	Guerrero	Residente S.S. T	Apoio en la ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental, ejecución de PSO y cumplimiento de la normatividad SST aplicable al proyecto.

Fuente: Edificaciones y Vías SA

Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA)

Para este periodo se realizó por parte del contratista capacitaciones y charlas a los trabajadores, con temas ambientales, sociales y SST.

Tabla 3. Capacitaciones PIPMA

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	AREA
15/04/23	Pensamiento de líder	SOCIAL
15/04/23	Ciclo de vida de los materiales más representativos en obra	AMBIENTAL
15/04/23	Estilo de vida saludable – Semana de la salud	SST
25/03/2023	Fenómenos naturales	AMBIENTAL
25/03/2023	Manejo de Hallazgos Arqueológicos	SOCIAL



3.2.2 Componente B – Gestión Social

Programa B1: Divulgación e información a la comunidad.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se llevan a cabo socializaciones de cierres viales y de inicio de labores operativas en cada uno de los sectores donde se desarrollan las intervenciones por obras de parcheo; de la siguiente manera:

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	

PÁG 8 DE 34

Tabla 4. Socializaciones.

Socializaciones con la comunidad del AID				
No.	Fecha	Lugar	Descripción	Piezas entregadas
1	01/03/2023 15/03/2023	Barrio Campamento	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
2	23/03/2023	Barrio Machangara	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
3	27/03/2023 30/03/2023	Barrio Centro	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
4	03/04/2023	Carlos Primero	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
5	10/04/2023 12/04/2023	María Occidente	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes

Fuente: EDIFICACIONES Y VIAS SAS

Reuniones con Interventoría y Alcaldía:

No. 1. El día 07 de marzo del 2023. Asistencia a comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. Por parte de la interventoría, se solicita al contratista de obra dar respuesta al Derecho de Petición interpuesto por el señor Harold Daza García, en la carrera 9 # 8-81 barrio San Camilo.

No. 2. El día 14 de marzo del 2023. Asistencia a comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. Por parte de la interventoría, se solicita al contratista de obra realizar arreglos a los andenes que se vieron afectados durante las labores de mantenimiento a malla vial en el Barrio Campamento. Los cuales a la fecha continúan sin reparación.

Además, en el mismo comité queda como compromiso por parte del contratista de obra dar respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor Harold Daza García, máximo hasta el 17 de marzo, se solicita anexar el concepto técnico de topografía por parte del contratista.

No. 3. El día 17 de marzo del 2023. Se da cumplimiento al compromiso de entregar por escrito la respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor Harold Daza García, donde se explica que el corte en la estructura, no obedece a una condición de calidad o de servicio bajo la ejecución del contrato de la referencia, pero sí de trabajos llevados a cabo por EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN, en sus labores de traslado de redes de este servicio.

Por otra, con respecto al empozamiento se explica los motivos por los cuales no es posible corregir dicha falla.

Respecto a los presuntos daños a la vivienda del señor Harold Daza, es pertinente manifestar que se desconoce el estado estructural previo de techos, paredes y demás razón por la cual no es dado para el contratista atender dicha petición, el contratista realiza entrega de oficio con respuesta, no obstante se encuentra pendiente el concepto técnico de topografía.

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 9 DE 34

No. 4. El día 22 de marzo del 2023. Asistencia a comité en secretaria de infraestructura. Por parte de la interventoría se solicita a la entidad contratante trasladar la petición a la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, sobre el corte realizado en la vía en la Carrera 9 # 8-81 del Barrio San Camilo, derecho de petición interpuesto por el señor Harold Daza García; ya que dicha empresa es la responsable de la reparación de los daños ocasionados en la vía.

Con respecto al empozamiento de la misma zona, se solicita por parte de la interventoría al contratista de obra enviar soporte técnico de topografía para su verificación.

En este mismo comité se solicita a el contratista de obra hacer la reparación de los andenes que se vieron afectados durante las jornadas de parcheo en el barrio Campamento Sector La Playa y realizar el arreglo pendiente en el barrio el Guayabal.

No. 5. El día 22 de marzo del 2023. En atención a la solicitud realizada por la interventoría sobre el caso de la Señora María Ligia Pisso Valencia, del Barrio El Guayabal Calle 8B # 20-23, sobre la corrección de empozamiento frente a la casa de residencia. Por parte del contratista de obra se corrigió el empozamiento mediante la canalización del agua esorrentía, subsanando así la queja de la peticionaria (se anexa oficio).

No. 6. El día 28 de marzo del 2023. Se realiza comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. En este se solicita al área social dar respuesta por escrito sobre la solicitud del señor Harold Daza García, en lo que concierne al Empozamiento de la cra 9 con calle 9 del barrio San Camilo.

No. 7. El día 11 de abril del 2023. Asistencia a comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. En este se solicita al área social que se realicen los arreglos pendientes de los andenes del barrio Campamento (Sector La Playa) y La paz, de igual manera se pide que desde la parte técnica se le dé solución al empozamiento del barrio San Camilo y dar por cerrada esa PQR para la liquidación del contrato.

Indicador de Cumplimiento

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	% Volantes entregados
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de volantes entregados}}{N^{\circ} \text{ de volantes programados al mes 200}} \times 100 = 100\%$

Programa B2: Restitución de bienes afectados.

Para el momento, el único tramo intervenido por rehabilitación vial completa, ha sido el barrio la Paz, al norte de la ciudad, sector que requirió el levantamiento de acta de vecindad de inicio.

Por su parte el acta de vecindad de entorno se realizará con el registro fotográfico de las fachadas y andenes de las viviendas colindantes, directamente con el área de intervención, es una herramienta interna que proporcionará una evidencia previa del espacio externo y como soporte ante alguna posible reclamación, por alguno de los moradores del sector.

Actividades

- ✓ El proceso de registro fotográfico para actas de entorno empezó ejecutarse el día 20 del mes de mayo del 2022.

Tabla 5. Relación actas de vecindad y de entorno.

N	DIRECCIÓN	Nº FOLIOS	OBSERVACIONES
46	Barrio Pandiguando		Se realizo levantamiento de registro fotográfico,

 <p>Creo en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 10 DE 34</p>

47	Barrio Antonio Nariño	Se realizo levantamiento de registro fotográfico
48	Barrio Campamento	Se realizo levantamiento de registro fotográfico.
49	Barrio Machangara	Se realizo levantamiento de registro fotográfico.
50	Barrio Centro	Se realizo levantamiento de registro fotográfico.
51	Barrio Carlos Primero	Se realizo levantamiento de registro fotográfico.
52	Barrio María Occidente	Se realizo levantamiento de registro fotográfico.

- ✓ A la fecha se han realizado 24 actas de vecindad de inicio del sector del barrio La Paz firmadas y aprobadas por parte del Ingeniero Residente de Interventoría. Las cuales se relacionan a continuación.

N°	RESPONSABLE	DIRECCIÓN	N. FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	Juan Camilo Lara	Calle 70 -carrera 6 esquina	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
2	Leonardo Leitón	Calle 70AN # 6-02	5	Firmadas y aprobadas por interventoría
3	Luis cerón	Calle 70AN # 6-02	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
4		Calle 70 AN- carrera 6 esquina		La vivienda se encuentra deshabitada, se realiza acta de fachada - será remitida a Personería Municipal - Firmadas y aprobadas por interventoría
5	Esmeralda Cortez	Calle 70 N # 6-02	9	Firmadas y aprobadas por interventoría
6	Oscar Hernán Collo	Calle 70 N # 6-03	10	Firmadas y aprobadas por interventoría
7	Víctor Eugenio Arango	Calle 70 N # 6-04	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
8	Néstor Hurtado	Calle 69 AN # 6-03	7	Firmadas y aprobadas por interventoría
9	Katherine Rengifo	Calle 69 N # 5A-60	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
10	Martha Rojas	Calle 69 N # 5A-58	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
11	Hernán Legarda	Calle 69 N # 5A-58	5	Firmadas y aprobadas por interventoría
12	Manuel Eduardo Ramírez	Calle 69 N # 5A-59	6	Firmadas y aprobadas por interventoría
13	Alejandra Bravo Delgado	Calle 69 AN # 5A-58	7	Firmadas y aprobadas por interventoría
14	María Nidia D.	Calle 70 N # 5A-59	7	Firmadas y aprobadas por interventoría
15	Andrea Jativa	Calle 70 N # 5A-58	5	Firmadas y aprobadas por interventoría

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 11 DE 34

16		Calle 70 N # 5A-59 Local 1er piso	5	Se realiza visita sin atención-local cerrado - será remitida a Personería Municipal - Firmadas y aprobadas por interventoría
17		Calle 70 N # 5A-59 Apto 2do piso	5	Se realiza visita sin atención - será remitida a Personería Municipal- Firmadas y aprobadas por interventoría
18		Calle 70 N # 5A-59 Apto 3er piso	5	Se realiza visita sin atención-deshabitado - será remitida a Personería Municipal- Firmadas y aprobadas por interventoría
19	Marisol Castillo	Calle 70 AN # 5A-58	5	Firmadas y aprobadas por interventoría
20	Sully Alexandra Ortega S.	Calle 70 AN # 5A-58 Local 2	5	Firmadas y aprobadas por interventoría
21		Carrera 6 # 70N-69 Local 1-cafeteria	4	Se realiza visita sin atención-local cerrado - será remitida a Personería Municipal- Firmadas y aprobadas por interventoría
22		Carrera 6 # 70N-69 Local 2 Bodega	5	Se realiza visita sin atención-local cerrado - será remitida a Personería Municipal- Firmadas y aprobadas por interventoría
23	Carolina Sánchez	Carrera 6 # 70-69	5	Firmadas y aprobadas por interventoría
24	Jorge Luis Gonzales	Calle 70bn # 5A-59	5	Firmadas y aprobadas por interventoría

Programa B3: Atención y participación ciudadana

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo y del 1 al 15 de abril de 2023, la Interventoría realizo acompañamiento en actividades de atención a la comunidad durante los acompañamientos a las jornadas de parcheo, contando evidenciando la atención personalizada por parte del componente social del proyecto.

Durante este periodo el contratista no reporta PQRS.

INDICADOR		% PQR:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de pqr cerradas}}{N^{\circ} \text{ de pqr total}} \times 100 = 0\%$	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUEJAS	
INDICADOR	% QUEJAS:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de quejas atendidas}}{N^{\circ} \text{ de quejas interpuestas}} \times 100 = 0\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO RECLAMOS	
INDICADOR	% RECLAMOS:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de reclamos atendidos}}{N^{\circ} \text{ de reclamos interpuestos}} \times 100 = 0\%$

 <p>Crea en POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 12 DE 34

Nota aclaratoria: en el periodo del mes de marzo durante las labores constructivas en el barrio campamento se presentaron algunos daños a los andenes en el sector de la Playa; a la fecha se encuentran pendiente la reparación por parte del contratista.

Dirección	Afectación	Estado
Barrio campamento <ul style="list-style-type: none"> • Cra 18A N 42 • Cra 18N 10 • cra 16 # 6N30 	Fractura en la estructura de tres andenes.	Pendiente de reparación

Programa B4. Vinculación de mano de obra.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo del 2023, el contratista reporta personal vinculado a obra de la siguiente forma, 29 hacen parte de la nómina del contratista y 7 a las empresas subcontratistas, se relacionan en la tabla N° 5, 6 y 6.1

Tabla 6. Personal Edificaciones y Vías SAS

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR JAVIER CAICEDO	76314250	PROFESIONAL DE APOYO	POPAYAN	
2	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON	15816639	DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN	3158940704
3	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME OSWALDO PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN	3162546425
4	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SIRLENA MEDINA PLAZA	1061713662	PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	POPAYAN	3164983492
5	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DAYAN LIZETH NARVAEZ ARCILA	1085295298	RESIDENTE SOCIAL	POPAYAN	3106981114
6	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE WILLIAM MORALES	83166318	REIDENTE SST	POPAYAN	3167576565
7	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ELDER LENIN CUENE ALCALO	1064431522	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3157677724
8	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS HERNANDEZ OREJUELA	1061742623	CONTROLADOR DE TRAFICO	ROSAS	
9	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EMILIO CHILITO MACIAS	1061797781	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223
10	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	1002954050	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3188330947
11	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1061701342	OFICIOS VARIOS	TIMBIO	
12	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIR TALAGA ZEMATATE	76150449	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3145377367
13	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1079409048	BOAL	POPAYAN	
14	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OMAR ALEJANDRO AGREDO HURTADO	1061598911	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	3206298224
15	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1061780010	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	3117751203
16	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	1058788777	OFICIOS VARIOS	LA VEGA	
17	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO SECUE BOYOCUE	1067521620	OFICIAL	POPAYAN	3162536954

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 13 DE 34

18	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN PABLO QUIÑONEZ ESPINOSA	1004709684	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	
19	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BREYNER ANDRES AGUILERA	1065915543	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
20	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALVEAR ANACONA AURELIO	94072283	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
21	EDIFICACIONES Y VIAS SA	MACA MOMPOTES EDWIN ANDRES	1061735767	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
22	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME VARGAS	94429732	OPERADOR FRESADORA	POPAYAN	
23	EDIFICACIONES Y VIAS SA	YANGANA RIVERA EDWAR SANTIAGO	1002776741	BOAL	POPAYAN	
24	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALEXANDER DIAZ GAVIRIA	1061599743	OPERADOR TURNO MARMITA	TOTORO	
25	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN CARLOS RIVERA	4752358	OPERADOR DE FRESADORA	TOTORO	
26	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ARLES NARVAEZ	1007700113	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	POPAYAN	3224436304
27	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CRISTIAN JAVIER BARRETO	1106774843	OPERADOR FINISHER	SANTANDER	3203748012
28	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALIRIO TORRES MOLINA	1117532391	TOPOGRAFO	POPAYAN	3147592411
29	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BRAYAN ESTIVEN DIAZ LAZO	1061821026	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	

Tabla 7. Sub – Contratistas

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	VOLVOS DEL SUR	MARIO MUÑOZ	1061748828	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3217074667
2	VOLVOS DEL SUR	JOSE ALEXANDER SEGURA	1061732967	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3207197920
3	VOLVOS DEL SUR	LUIS EDUARDO AGUDELO PEREZ	1061770928	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3153600349

Tabla 7.1 Sub – Contratistas

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU	JHAMER SINSAJOA	1.085.276.691	OPERARIO TECNICO Y CONDUCTOR	PASTO	3117277314
2	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU	WILLIAN ERAZO	98.396.829	OFICIOS VARIOS	PASTO	3186975254
3	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU	CARLOS ALFREDO DIAZ PORTILLA	1.085.272.458	OPERADOR EQUIPO DE PINTUTA	PASTO	3145379121

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 14 DE 34

4	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU	DIAZ ROSETO IVAN JAVIER	1085344052	OFICIOS VARIOS	PASTO	
---	--	----------------------------------	------------	-------------------	-------	--

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril del 2023, el contratista reporta, 28 personas vinculadas las cuales hacen parte de la nómina del contratista y 3 a la empresa subcontratista, se relacionan en la tabla N° 5.1 y 6.2 (Ver Anexo B4- 1. Formato ISI 10 abril).

Tabla 8. Personal Edificaciones y Vías SAS

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR JAVIER CAICEDO	76314250	PROFESIONAL DE APOYO	POPAYAN	
2	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON	15816639	DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN	3158940704
3	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME OSWALDO PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN	3162546425
4	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SIRLENA MEDINA PLAZA	1061713662	PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	POPAYAN	3164983492
5	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DAYAN LIZETH NARVAEZ ARCILA	1085295298	RESIDENTE SOCIAL	POPAYAN	3106981114
6	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE WILLIAM MORALES	83166318	REIDENTE SST	POPAYAN	3167576565
7	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ELDER LENIN CUENE ALCALO	1064431522	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3157677724
8	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS HERNANDEZ OREJUELA	1061742623	CONTROLADOR DE TRAFICO	ROSAS	
9	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EMILIO CHILITO MACIAS	1061797781	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223
10	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	1002954050	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3188330947
11	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1061701342	OFICIOS VARIOS	TIMBIO	
12	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIRO TALAGA ZEMATATE	76150449	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3145377367
13	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1079409048	BOAL	POPAYAN	
14	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OMAR ALEJANDRO AGREDO HURTADO	1061598911	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	3206298224
15	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1061780010	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	3117751203

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 INP SERVICIOS SAS
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 15 DE 34

16	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	1058788777	OFICIOS VARIOS	LA VEGA	
17	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO SECUE BOYOCUE	1067521620	OFICIAL	POPAYAN	3162536954
18	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN PABLO QUIÑONEZ ESPINOSA	1004709684	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	
19	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BREYNER ANDRES AGUILERA	1065915543	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
20	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALVEAR ANACONA AURELIO	94072283	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
21	EDIFICACIONES Y VIAS SA	MACA MOMPOTES EDWIN ANDRES	1061735767	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
22	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME VARGAS	94429732	OPERADOR FRESADORA	POPAYAN	
23	EDIFICACIONES Y VIAS SA	YANGANA RIVERA EDWAR SANTIAGO	1002776741	BOAL	POPAYAN	
24	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALEXANDER DIAZ GAVIRIA	1061599743	OPERADOR TURNO MARMITA	TOTORO	
25	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN CARLOS RIVERA	4752358	OPERADOR DE FRESADORA	TOTORO	
26	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ARLES NARVAEZ	1007700113	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	POPAYAN	3224436304
27	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CRISTIAN JAVIER BARRETO	1106774843	OPERADOR FINISHER	SANTANDER	3203748012
28	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALIRIO TORRES MOLINA	1117532391	TOPOGRAFO	POPAYAN	3147592411

Tabla 8.1 Sub – Contratistas

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	VOLVOS DEL SUR	MARIO MUÑOZ	1061748828	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3217074667
2	VOLVOS DEL SUR	JOSE ALEXANDER SEGURA	1061732967	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3207197920
3	VOLVOS DEL SUR	LUIS EDUARDO AGUDELO PEREZ	1061770928	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3153600349

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021					
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023					
						PÁG 16 DE 34

Tabla 9. Porcentaje de contratación

PERSONAL CONTRATADO MARZO 2023							
CARGO	Categoría		Procedencia		Genero		Cantidad Total
	MOC	MONC	De la Región	Externo	FEM	MASC	
Director de obra	1	0	1	0	0	1	1
Profesional de apoyo	1	0	1	0	0	1	1
Residente de obra	1	0	1	0	0	1	1
Residente Social	1	0	1	0	1	0	1
Profesional de apoyo ambiental	1	0	1	0	1	0	1
Residente SST	1	0	1	0	0	1	1
Oficios Varios		11	9	2	0	11	11
Oficial		1	1	0	0	1	1
Conductores		3	3	0	0	3	3
Controladores de trafico		3	3	0	0	3	3
Boal		2	2	0	0	2	2
Operadores	9	0	6	3	0	9	9
Topógrafo	1	0	1	0	0	1	1
TOTALES	16	20	31	5	2	34	36
PORCENTAJE %	44%	55%	86%	15%	5%	94%	100%

El Contratista reporta un total de 37 trabajadores activos discriminados de la siguiente manera:

Personal calificado: 16 personas
Personal no calificado: 20 personas
Personal del área de influencia directa: 31 personas
Personal foráneo: 5 personas
Personal femenino: 2 personas
Personal masculino: 34 personas

Tabla 10. Porcentaje de contratación

PERSONAL CONTRATADO ABRIL 2023							
CARGO	Categoría		Procedencia		Genero		Cantidad Total
	MOC	MONC	De la Región	Externo	FEM	MASC	
Director de obra	1	0	1	0	0	1	1

 <p>Crecer en POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 17 DE 34

Profesional de apoyo	1	0	1	0	0	1	1
Residente de obra	1	0	1	0	0	1	1
Residente Social	1	0	1	0	1	0	1
Profesional de apoyo ambiental	1	0	1	0	1	0	1
Residente SST	1	0	1	0	0	1	1
Oficios Varios		9	9	0	0	9	9
Oficial		1	1	0	0	1	1
Conductores		3	3	0	0	3	3
Controladores de trafico		3	3	0	0	3	3
Boal		2	2	0	0	2	2
Operadores	6	0	5	1	0	6	6
Topógrafo	1	0	1	0	0	1	1
TOTALES	13	18	30	1	2	29	31
PORCENTAJE %	41%	58%	96%	3%	6%	93%	100%

El Contratista reporta un total de 31 trabajadores activos discriminados de la siguiente manera:

Personal calificado: 13 personas

Personal no calificado: 18 personas

Personal del área de influencia directa: 30 personas

Personal foráneo: 1 personas

Personal femenino: 2 personas

Personal masculino: 29 personas

Tabla 11. Relaciones planillas de pago de seguridad social mes de marzo

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	1052907382	Edificaciones y Vías SAS	23	\$ 19.174.200
2	1052863785	Edificaciones y Vías SAS	1	\$ 432.300
3	1052863839	Edificaciones y Vías SAS	4	\$2.965.000
TOTAL				\$22.571.500

(se anexa la afiliación de un trabajador de que ingreso a finales de marzo)

Tabla 12. Relación de planilla de pago de seguridad social mes de marzo (subcontratista)

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	9448084353	Volcos del Sur	3	\$751.800
TOTAL				\$751.800

Tabla 13. Relación de planilla de pago de seguridad social mes de marzo (subcontratista)

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	66737833	Servicios técnicos en ingeniería y señalización EU	4	\$2.001.500
TOTAL				\$2.001.500

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	

PÁG 18 DE 34

Tabla 14. Relaciones planillas de pago de seguridad social mes de abril

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	1053688338	Edificaciones y Vías SAS	23	\$ 20.751.800
2	1053674876	Edificaciones y Vías SAS	4	\$ 3.065.400
3	1053662987	Edificaciones y Vías SAS	1	\$423.000
TOTAL				\$24.240.200

Tabla 15. Relación de planilla de pago de seguridad social mes de abril (subcontratista)

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	9448084353	Volcos del Sur	3	\$1.166.500
TOTAL				\$1.166.500

Indicadores de Cumplimiento Marzo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra marzo
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculados con cumplimiento de requerimientos de ley } 36}{N^{\circ} \text{ de trabajadores requeridos}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de mujeres contratadas}}{N^{\circ} \text{ total de trabajadores contratados}} \times 100 = 5\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Generación de empleo marzo
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos generados en la zona de influencia directa}}{N^{\circ} \text{ de empleos generados por el proyecto}} \times 100 = 86\%$
INDICADOR	% Generación de empleo marzo
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos mano de obra no calificada}}{N^{\circ} \text{ total de empleados requeridos}} \times 100 = 55\%$
INDICADOR	% Generación de empleo marzo
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos mano de obra calificada}}{N^{\circ} \text{ total de empleados requeridos}} \times 100 = 44\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
CONTRATISTA	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social marzo:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$

Indicadores de Cumplimiento Abril

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra abril
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculados con cumplimiento de requerimientos de ley } 31}{N^{\circ} \text{ de trabajadores requeridos}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 19 DE 34

FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de mujeres contratadas}}{N^{\circ} \text{ total de trabajadores contratados}} \frac{2}{31} \times 100 = 6\%$
---------	--

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Generación de empleo abril
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos generados en la zona de influencia directa}}{N^{\circ} \text{ de empleos generados por el proyecto}} \frac{30}{31} \times 100 = 96\%$
INDICADOR	% Generación de empleo abril
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos mano de obra no calificada}}{N^{\circ} \text{ total de empleados requeridos}} \frac{18}{31} \times 100 = 58\%$
INDICADOR	% Generación de empleo abril
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de empleos mano de obra calificada}}{N^{\circ} \text{ total de empleados requeridos}} \frac{13}{31} \times 100 = 41\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
CONTRATISTA	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social abril:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados}} \frac{28}{28} \times 100 = 100\%$

Programa B5: Capacitación del personal de obra.

Durante este período se la Interventoría realizó acompañamiento y verifico actividad de capacitación por parte del área social, de acuerdo al plan de capacitaciones mensual.

Tabla 16. Plan de capacitación mensual

Fecha	Tema	Metodología	Asistentes
25/03/2023	Hallazgos arqueológicos	Capacitación	25
15/04/2023	Liderazgo	Capacitación	23

Con referencia a los componentes ambiental y SST en cada componente correspondiente se anexa el plan de capacitación desarrollado. Es de resaltar que cada área dio cumplimiento al cronograma inicial pactado de una capacitación mensual.

Indicadores de Cumplimiento

Capacitación mes de marzo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores capacitados}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados}} \frac{25}{36} \times 100 = 69\%$

Capacitación mes de abril

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores capacitados}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados}} \frac{23}{31} \times 100 = 74\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 20 DE 34</p>

FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de capacitaciones realizados}}{N^{\circ} \text{ de capacitaciones programados}} \times 100 = 100\%$
---------	---

Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas

3.2.4. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción

En los lugares de obra se adelantaron actividades de demolición de carpeta existente y posterior recolección de escombros, los frentes de obra intervenidos en este periodo son Barrio Campamento, Machangara (hospital Santa Gracia), Carlos primero, centro, barrio la Paz y la María Occidente.

El manejo de escombros se realizó, reciclando directamente el material fresado (RAP) con el equipo a la volqueta e inmediatamente es trasladado a los talleres del municipio de Popayán un total de 622 m³ del 1 al 31 de marzo del 2023 y 445 m³ del 1 al 15 de abril del 2023

Tabla 17. Materiales y escombros generados

PERIODO	RCD LA LAJITA(m³)	RAP TALLERES MUNICIPALES (m³)	RAP REUTILIZADO EN OBRA (m³)	CASA DE LA MONEDA (m³)	TOTAL (m³)
7 de abril al 6 de mayo del 2022	0	0	0		0
7 de mayo al 6 de junio del 2022	0	780	0		780
7 de junio al 6 de julio del 2022	0	1.255	0		1.255
7 de julio al 31 de julio del 2022	30	946			976
1 al 31 de agosto del 2022	0	955	0	188	1.143
1 al 30 de septiembre del 2022	0	2.136	0	0	2.136
1 al 31 de octubre del 2022	0	1.828	0	0	1828
1 al 30 de noviembre del 2022	0	760	0	0	760
1 al 31 de diciembre del 2022	784	776	0	0	1560
1 al 30 de enero del 2023	0	434	0	0	434
16 al 28 de febrero del 2023		577			577
1 de marzo al 15 de abril del 2023		1762			1762
TOTAL	814	11209	0	188	13211

Indicadores de cumplimiento.

A continuación, se muestra el indicador de seguimiento y monitoreo de periodo del presente informe:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Volumen de disposición
FORMULA	$\frac{\text{Vol. de escombros entregados al SIT adecuadamente (m3)}}{\text{Vol. de escombros totales generados (m3)}} \times 100 = 100\%$

 <p>Crecer en POPAYÁN</p>	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 <p>INP SERVICIOS SAS</p>
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 21 DE 34

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción

Los materiales de construcción utilizados en el periodo del informe fueron: mezcla Asfáltica y emulsión Asfáltica. Materiales que no se almacenaron en obra, sino que diariamente son trasladadas la planta Popayán.

La Mezcla asfáltica es trasladada en volquetas sencillas o dobles troques y se instala directamente sobre la vía y la emulsión de igual forma se traslada a diario.

Las plantas de producción de mezcla asfáltica Galíndez y Popayán.

Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte

En el periodo del informe no se realizaron mantenimiento a la maquinaria o vehículos en obra.

Se conto con tres (3) volquetas para el transporte de fresado y de mezcla asfáltica con todos los documentos vigentes y UNA Turbo Marmita.

Tabla 18 Listado de Maquinaria de obra.

No.	EQUIPO	REFERENCIA/ PLACA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	P-11-F2500CS-015-01 - PAVIMENTADORA DYNAPAC(	P-11-F2500CS-015-01	1	
2	P-10-HP280-019-02 - COMPACTADOR NEUMATICO HAMM(WGH0H249 CHAA00270	HAMM	1	
3	Vibro compactador de Rodillo Cilindro	HAMM 137HD190	1	
4	Fresadora	Writgen P-12-W130F-003-01	1	
5	Volqueta doble troque	UZN 181	1	
6	Turbo Marmita	VEP 983	1	
7	Volqueta doble troque	WCV223	1	
8	Volqueta doble troque	ETT575	1	

Fuente. EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de mantenimiento
FORMULA	$\frac{\text{No de mantenimientos: No de mantenimientos realizados}}{\text{Número de mantenimientos programados}} \times \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% de Certificación Técnico mecánica y de gases vigente
FORMULA	$\frac{\text{No de certific Tecnomecánica y de gases vigente: No de vehoculos con certifi Tecnic}}{\text{Numero total de vehículos}} \times \frac{4}{4} \times 100 = 100\%$

 <p>Creo en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 22 DE 34</p>

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas

En la obra no se manejan aguas residuales ya que el servicio de baño se alquila con viviendas cercanas al sector, cuyas sanitarias están conectadas a la red de alcantarillado de la ciudad.

Durante el periodo del presente informe, No se generaron residuos peligrosos.

En obra solo se almacenan sustancias químicas correspondientes a las usadas en la herramienta menor (Gasolina). Ver Formato F-11-GA-1, lista de chequeo productos químicos

Indicador de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Residuos peligrosos
FORMULA	$\frac{\text{Cantidad de residuos peligrosos generados}}{\text{Cantidad de residuos dispuestos en empresa autorizada}} \times \frac{N/A}{N/A} \times 100\% = N/A$

Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra

Se realiza recorridos con el contratista en las vías habilitadas de la obra, revisando cada sector para verificar la limpieza de estos y/o realizar observación si se requiere. En el mes de octubre, se verifico los barrios Ciudad Jardín y el recuerdo.

El contratista cuenta con una (1) BOAL -Brigada de Orden Limpieza y Aseo, una persona para cada obra, los cuales tienen las siguientes funciones y está conformado de la siguiente manera:

- Instalación, verificación y reposición del cerramiento del proyecto.
- Limpieza de los frentes de trabajo habilitados.
- Instalación, verificación y reposición de los senderos de los frentes de obra del proyecto.
- Adecuación y limpieza del campamento de la obra.
- Limpieza de sumideros.
- Instalación y verificación de la señalización vertical del PMT.
- Mantenimiento de la señalización en obra (Arreglo de colombinas, cintas, maletines y señales móviles).

Nombre	Identificación
JAIRO TALAGA	76150299
YANGARA RIVERA EDWAR SANTIAGO	1002776741

La brigada BOAL, al igual que el personal de obra realiza el ingreso a obra a partir de las 6:00 A.M, se revisan los elementos de protección personal y de ser necesario se realiza el cambio (monogafas, guantes, tapa oídos, tapa bocas), se dan instrucciones acerca de las actividades de tipo urgente, se realiza la retroalimentación acerca de algún suceso en la obra o de relaciones interpersonales, de igual forma diariamente los residentes encargados ambiental y SST comparten temas del documento PIPMA para las charlas de cinco minutos y a las 6.30 p.m. se disponen a dar inicio a las actividades regulares en la obra. Al finalizar la jornada 4:00 p.m., la brigada organiza las herramientas utilizadas en el día y manifiestan las diligencias que por la dinámica de la obra requieren algún tipo de tratamiento especial para dar prioridad al día siguiente.

Para la disposición de residuos, se instalaron un punto ecológico, el cual constan de tres (3) canecas plásticas, rotuladas y debidamente protegidas contra la acción del agua.

Se realiza verificación del punto ecológico, siempre que se realiza recorrido y muchas ocasiones se verifico la incorrecta clasificación de los desechos, informando al contratista, sin presentar mejoría en el tema.

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	

PÁG 23 DE 34

Los residuos sólidos son recopilados diariamente y con apoyo de las rutas que transitan por el sector para la recolección y disposición final de residuos ordinarios, se hace la entrega a la empresa URBASER esta empresa no entrega un soporte de evacuación de los residuos, los datos calculados hacen referencia al volumen aproximado generado por una bolsa de 65 cm de ancho x 90 cm de largo. Por lo general durante el periodo, la empresa URBASER se encontró realizando la recolección los días lunes, miércoles y viernes.

Tabla 19. Volumen de residuos sólidos

SEMANA	DÍAS HÁBILES DE RECOLECCIÓN	N° BOLSAS ENTREGADAS POR DÍA DE RECOL.	N° BOLSAS TOTAL	PESO APROX C/U KG	PESO TOTAL KG
1	1 al 8 de marzo del 2023	1	3	1	3
2	9 al 15 de marzo del 2023	1	3	1	3
3	16 al 22 de marzo del 2023	2	3	1	3
4	Del 17 al 31 de marzo del 2023	1	3	1	3
5	1 al 8 de abril del 2023	1	3	1	3
6	8 al 15 de abril del 2023	3	3	1	3
TOTAL, PESO DE BASURA SUELTA (Kg)					18
TOTAL, VOLUMEN DE BASURA SUELTA (m³)					0,27

Indicadores de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Generación de residuos peligrosos
FORMULA	$\frac{\text{Volumen residuos peligrosos dispuestos}}{\text{Volumen residuos peligrosos generados}} \times 100 = \%$
INDICADOR	% de Generación de residuos ordinarios
FORMULA	$\frac{\text{Volumen residuos ordinarios dispuestos } 18\text{kg}}{\text{Volumen residuos ordinarios generados } 18\text{ kg}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% de Generación de residuos de papel, cartón y plástico
FORMULA	$\frac{\text{Volumen de residuos ordinarios dispuestos } 0}{\text{Volumen de residuos ordinarios generados } 0} \times 100 = NA\%$
INDICADOR	% Brigadas realizadas
FORMULA	$\frac{\text{Volumen residuos de papel y carton dispuestos } 0\text{Kg}}{\text{Volumen residuos de papel y carton generados } 0\text{ Kg}} \times 100 = 100\%$



 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 24 DE 34



Fuente Edificaciones y Vías SA

Programa D6: Manejo de aguas superficiales

En el periodo del informe se pagaron el servicio de agua cruda para abastecimiento de la maquinaria y equipo.

El material de construcción no se cubrió en obra, ya que se utilizan inmediatamente.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Sumideros protegidos
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de facturas pagadas}}{N^{\circ} \text{ de facturas emitidas}} \times 100 = 100\%$

Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos

Se verifico el material producto de excavaciones y demoliciones RAP (Reciclado Asfáltico de Pavimento) el cual se transportó en las volquetas del contratista; que cuentan con sus respectivas carpas para evitar la dispersión de materiales cuando se encuentran en movimiento; las cueles están aprobadas para su labor y tienen el análisis pre-operacional al inicio de cada jornada laboral.

Cerca de la finalización de cada jornada de trabajo se inspeccionan áreas donde se requiere señalización de excavaciones y/o zonas de riesgo, esta actividad es implementada en compañía del residente SST, ambiental y con apoyo del personal de la BOAL, del contratista.

Durante la jornada laboral se verifico las áreas aisladas de trabajo (Excavaciones) con las señales del PMT, maletines, colombinas, cinta de señalización y conos viales. En general las áreas de excavación en el frente habilitado se encontraron acondicionadas para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra como la instalación de señalización preventiva para evitar accidentes.

Al finalizar las jornadas laborales, las áreas y frentes de trabajo se dejan debidamente, transitables y se retira la señalización preventiva y la BOAL se encarga diariamente de dejar las zonas de trabajo acondicionadas y seguras para el personal que transita por las zonas aledañas.

Se verifico que no hubo la necesidad de realizar ningún acopio de material, el RAP, ya que se evacua inmediatamente de obra.

No se realizó ningún acopio de material, el RAP se evacua inmediatamente de obra.

 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 25 DE 34</p>

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de excavaciones señalizadas
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de excavaciones señalizadas}}{N^{\circ} \text{ de excavaciones existentes}} \times 100 = 100\%$

Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido

En el periodo del informe no se realizó el monitoreo de ruido.

En el periodo del informe se continúa verificando que los vehículos utilizados en la obra cuenten con la revisión tecno mecánica.

Indicador de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Revisiones tecno mecánicas
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de revisiones tecnomecánicas}}{N^{\circ} \text{ de Vehículos}} \times 100 = 100\%$

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos

En el periodo del informe no se presentaron daños.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Suspensiones
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ suspensiones servicios públicos presentados}}{N^{\circ} \text{ suspensiones de servicios públicos programadas}} \times 100 = NA$
INDICADOR	% de Suspensiones de servicio de acueducto
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ suspensiones de servicio acueducto presentados}}{N^{\circ} \text{ suspensiones de servicio acueducto programadas}} \times 100 = NA$

3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Por parte de la interventoría para este componente se realiza el seguimiento en los temas de seguridad y salud en el trabajo que corresponde con la normativa a aplicar por parte del contratista, además de verificar los lineamientos planteados en el PIPMA para garantizar las salud y seguridad de los colaboradores que desempeñan labores propias del contrato de obra.

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo

En el periodo evaluado ingresaron 7 trabajadores (1 ingreso nuevo y 5 traslados), se verifica que todo el personal relacionado cuente con sus exámenes de ingreso, inducciones y afiliaciones a la seguridad social. Ver Anexo componente E.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	OBSERVACIÓN
1	ARLES NARVAEZ	1007700113	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	TRASLADO
2	CRISTIAN JAVIER BARRETO	1106774843	OPERADOR FINISHER	TRASLADO

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	

PÁG 26 DE 34

3	ALIRIO TORRES MOLINA	1117532391	TOPOGRAFO	TRASLADO
4	JOSÉ WILLIAM MORALES	83166318	RESIDENTE SST	INGRESO NUEVO
5	BRAYAN ESTIVEN DIAZ LAZO	1061821026	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	TRASLADO
6	OSCAR EDGARDO BURBANO	12978274	OPERADOR MOTONIVELADORA	TRASLADO

En el periodo del informe hay siete (7) trabajadores retirados del proyecto - periodo del 01 de marzo y 1 abril de 2023.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	1061601364	OFICIOS VARIOS
2	JESUS ANDRES LLANTEN	10291656	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
3	NELSON AGUILERA	77081823	OPERADOR FINISHER
4	BAIRON CONEJOS	1062775054	OFICIOS VARIOS
5	LUIS CARLOS BEDOYA	1061599632	OFICIOS VARIOS
6	BRAYAN ESTIVEN DIAZ LAZO	1061821026	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
7	OSCAR EDGARDO BURBANO	12978274	OPERADOR MOTONIVELADORA

Registro de accidentes morbilidad y ausentismo: Para este periodo el contratista, no reporto accidentes laborales ni ausentismo laboral.

Señalización previa 	Entrega de EPPS y dotación. 
Talento Humano	Señalización

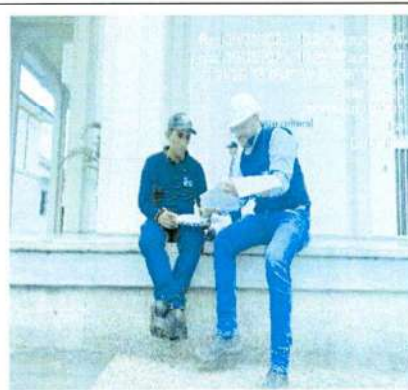
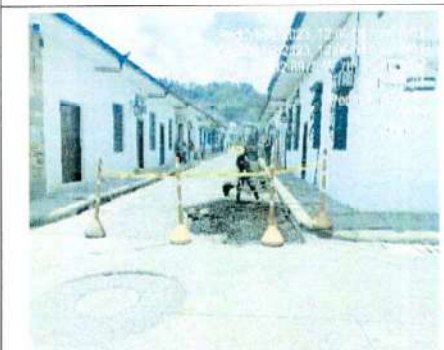
 <p><i>Creo en</i> POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 27 DE 34</p>



Fotografia 1 Reinducción



Fotografia 2 Reinducción



DEMARCAACION DE TRAMOS A INTERVENIR.

 	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 28 DE 34

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

- Personal que ingresa: 6
- Personal retirado: 7
- Personal activo: 28 colaboradores.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de frecuencia: I.F
FORMULA	$\frac{\text{Número de casos reportados} \times 240.000}{\text{Número de horas hombre trabajados}} = \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Severidad:
FORMULA	$\frac{\text{Nº días perdidos o cargados por AT en el período} \times 240.000}{\text{Número de horas hombre trabajados}} = \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas-hombre trabajadas durante el mismo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice Medio de Días Perdidos por Lesiones:
FORMULA	$\frac{\text{No de días perdidos o cargados por causa de lesiones en un período}}{\text{Total de casos con tiempo perdido}} = 0$
DEFINICIÓN	El índice medio de días perdidos por lesiones se define como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos puede ser aplicado para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad profesional

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Lesión Incapacitante (ILI):
FORMULA	$\frac{\text{Índice de frecuencia} \times \text{Severidad}}{1000} = \frac{0}{1000} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades profesionales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia (IT):
FORMULA	$\frac{(\text{No de accidentes} + \text{No de incidentes}) \times K}{\text{No Total de trabajadores expuestos}} = \frac{0}{52} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (AT) – Accidente de Trabajo:
FORMULA	$\frac{\text{No de horas perdidas por AT} \times K}{\text{No de horas trabajadas}} = \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre

 <p>Crecer en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 29 DE 34</p>

	<p>trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por accidente de trabajo.</p>
--	---

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia Específica (EP):
FORMULA	$\frac{\text{Casos nuevos que presentan patologia por exposicion } X K}{\text{No de horas trabajadas total expuestas al riesgo}} = \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	<p>La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas</p>

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (EP) – Enfermedad Profesional:
FORMULA	$\frac{\text{Número de horas perdidas por enfermedad profesional } X K}{\text{No de horas trabajadas}} = \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	<p>La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por enfermedad profesional.</p>

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (EC) – Enfermedad Común:
FORMULA	$\frac{\text{Nº de horas perdidas por enfermedad comun } X K}{\text{No de horas trabajadas}} \times 100 = \frac{0}{13280} \times 100 = 0$
DEFINICIÓN	<p>La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad común</p>

Reunión del COPASST: Ingeniería **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015 donde se realizan las reuniones correspondientes a cada mes durante la ejecución del proyecto, en la cual se presenta la gestión del área SST, socialización de la accidentalidad y ausentismo, indicadores, inspecciones y capacitaciones.

El contratista para el mes de octubre adjunta acta de reunión del COPASST realizada en el 29 de marzo de 2023. Donde se dan a conocer los indicadores SST, seguimiento a actividades desarrolladas durante el periodo, y socialización actividades programadas basadas en el plan de trabajo.

Afiliaciones al sistema de seguridad social Durante el periodo y como parte del seguimiento de interventoría se realizó la verificación de las afiliaciones del personal que ejecuta labores, comprobando que el contratista tuvo para este periodo a **28** colaboradores que (finalizaron hasta el 15 de abril) afiliados al sistema de seguridad social.

Exámenes médicos para este periodo el contratista reporta un examen ocupacional de ingreso correspondiente al aux SST.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:

 <p>Creo en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 30 DE 34</p>

FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social } 28}{No \text{ de trabajadores contratados } 28} \times 100 = 100\%$
---------	--

Inducción y Capacitación: Durante este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** realizó 1 inducción.

Las inducciones tienen una duración de 1 hora donde se explican los siguientes temas: Política SISOMA, COPASST, Plan de Emergencia y Brigadistas, Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo, examen de ingreso, notificación del riesgo, inducción al cargo, uso de EPP.

el objeto de garantizar el cumplimiento del plan de capacitaciones y dar las instrucciones conforme a la normativa colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo se dan las capacitaciones en los temas establecidos y se brindan las charlas de seguridad. A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en el área de SST durante el periodo.

Tabla 19. Inducciones y capacitaciones

No.	Fecha	Tema
1	25/03/2023	Presentación Residente SST y Autocuidado
2	13/04/2023	Divulgación Cartelera SST
3	15/04/2023	Estilos de vida saludables

FUENTE: EDIFICACIONES Y VIAS S.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitaciones SST
FORMULA	$\frac{No \text{ de eventos de capacitacion realizados } 3}{Numero \text{ de eventos programados } 3} \times 100 = 100\%$
% Trabajadores presentes en capacitaciones	
FORMULA	$\frac{Promedio \text{ de trabajadores presentes en capacitaciones } 28}{Numero \text{ total de trabajadores en obra } 28} \times 100 = 100\%$

Elementos de protección personal y dotación: Durante el periodo el contratista hace entrega y reposición de elementos de protección personal a todos sus colaboradores.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% EPP
FORMULA	$\frac{Numero \text{ de trabajadores dotados con EPP } 28}{Numero \text{ de trabajadores contratados } 28} \times 100 = 100\%$

Notificación de riesgos: Para este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** realizó la notificación de riesgos a 1 colaborador que ingresó a realizar labores propias del contrato de obra.

Actividades de alto riesgo: Durante este periodo no se desarrollaron actividades de alto riesgo.

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista realiza diferentes inspecciones en el lugar de trabajo ya que se considera una actividad preventiva que se incluye las técnicas generales de seguridad previas al accidente analíticas debido a que su objetivo es el de detectar las conductas y las acciones que pueden resultar peligrosas.

Indicadores de Cumplimiento:

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	 INP SERVICIOS SAS
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 31 DE 34

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% EPP
FORMULA	$\frac{\text{Numero de inspecciones planeadas}}{\text{Numero de inspecciones ejecutadas}} \times 100 = 100\%$

Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción

Plan de emergencias y contingencias.

Para el periodo evaluado el contratista instala el botiquín, camilla de emergencias y extintor en el frente de obra. A continuación, se presenta la información correspondiente a los elementos con los que cuenta el contratista para la atención de emergencias.

Tabla 20. Elementos plan de emergencia

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	1	PAC
Camilla rígida	1	PAC
Extintores Multipropósito	1	FRESADORA FINISHER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO y LLANTAS
Kits anti derrames	0	

Brigada de emergencias: El contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A.**, durante este periodo tiene vigente la brigada unificada de emergencias. la cual está conformada de la siguiente manera:

RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA			
NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	TELEFONO
SIRLENA MEDINA	1061713662	RESIDENTE AMBIENTAL	3164983492
DAYAN LICETH NARVAEZ	1061747020	RESIDENTE SOCIAL	3146427734
JAIME PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	3162546425
OSCAR EDUARDO SECUE	1067521620	OFICIOS VARIOS	3162536954
JUAN PABLO QUIÑOÑEZ	1004709684	OFICIOS VARIOS	3144476194
CARLOS ANDRES VELASCO	1079409048	OFICIOS VARIOS	3113785280
OSCAR EDUARDO MENESES	1061601364	OFICIOS VARIOS	3017896533
JAIME PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	3162546425
OSCAR EDUARDO SECUE	1067521620	OFICIOS VARIOS	3162536954
JUAN PABLO QUIÑOÑEZ	1004709684	OFICIOS VARIOS	3144476194
CARLOS ANDRES VELASCO	1079409048	OFICIOS VARIOS	3113785280
OSCAR EDUARDO MENESES	1061601364	OFICIOS VARIOS	3017896533

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacidad de respuesta
FORMULA	$\frac{\text{Numero de emergencias atendidas oportunamente}}{\text{Numero de emergencias presentadas}} \times 100 = N.A.$
INDICADOR	% de simulacros realizados
FORMULA	$\frac{\text{Numero de simulacros efectuados}}{\text{Numero de simulacros programados}} \times 100 = N.A$

 <p>Creo en POPAYÁN</p>	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 32 DE 34</p>

3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico

Para este periodo el contratista cuenta con el plan de manejo de tráfico aprobado por la secretaria de tránsito mediante Resolución No 202215000337084 del 12 de abril del 2022.

Con Resolución No 20221500096904 del 24 de noviembre del 2022, se aprueba ampliación del plazo del Plan de Manejo de Trafico del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2022.

Con Resolución No 20231500096904 del 15 de febrero del 2023, se aprueba ampliación del plazo del Plan de Manejo de Trafico del contrato, hasta el 29 de marzo del 2023.

Mediante resol. 20231500025254 se aprueba ampliación del plazo del Plan de Manejo de Trafico del contrato, hasta el 30 de abril del 2023.

Señalización

Para el periodo del presente informe el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con dos (2) personas para regulación de tráfico y manejo de movilidad en obra, estas personas están ubicadas en las diferentes intersecciones intervenidas con sus respectivas elementos preventivos e informativos.

Señales instaladas en obra: Para el periodo el contratista continuó con las señales requeridas preventivas de obra., maletines plásticos de acuerdo a la norma de manual de señalización vial del instituto nacional de vías – INVIAS, para la canalización de tráfico en los sectores donde se requirió de esta actividad. Para este periodo se instalaron 18 señales verticales requeridas para intervenir los diferentes sectores de la ciudad.

<p>Fotografía 3</p> 	<p>Fotografía 4</p> 	<p>Fotografía 5</p> 
<p>Fotografía 6</p> 	<p>Fotografía 7</p> 	<p>Fotografía 8</p> 
<p>Fotografía 9</p> 	<p>Fotografía 10</p> 	<p>Fotografía 11</p> 

 Creo en POPAYÁN	CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021	
	INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023	PÁG 33 DE 34



SEÑALIZACION

DESCRIPCION	UNIDAD
Barreras plásticas	22
Señalización kit de aproximación	18
Demarcación de áreas con cinta de señalización	8
Conos	7
Colombinas	20

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de N° de señales utilizadas fase I etapa I
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de señales preventivas puestas en obra } 20}{N^{\circ} \text{ de señales exigidas en el Plan de Manejo de Tráfico } 80} \times 100 = 25\%$

SEGUIMIENTO COVID-19

Durante el periodo del 01 de marzo al 15 de abril NO se presentaron caso relacionados con COVID- 19.

	<p>CONTRATO No 202218000242 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021</p>	
	<p>INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORIA 01 al 31 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL DE 2023</p>	<p>PÁG 34 DE 34</p>

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PIPMA Y PMT

A continuación, se presenta una tabla resumen de la inversión PMA Y PMT:

Valor inicial del presupuesto PMA y PMT: \$ 131.647.040,00.

Valor final del presupuesto PMA y PMT: \$ 143.892.948,00.

No acta	Inversión PMA	Inversión PMT	TOTAL
1	\$ 13.435.259,00	\$ 7.514.700,00	\$ 20.953.959,00
2	\$ 7.642.350,00	\$ 7.514.700,00	\$ 15.157.050,00
3	\$ 7.642.350,00	\$ 7.514.700,00	\$ 15.157.050,00
4	\$ 7.738.409,00	\$ 27.273.050,00	\$ 35.012.459,00
5	\$ 7.642.350,00	\$ 7.638.228,00	\$ 15.280.578,00
6	\$ 7.642.350,00	\$ 7.638.228,00	\$ 15.280.578,00
7	\$ 7.642.350,00	\$ 7.163.016,00	\$ 14.805.366,00
8	\$ 7.642.350,00	\$ 4.603.558,00	\$ 12.245.908,00
TOTAL	\$ 49.390.418,00	\$ 72.256.622,00	\$ 143.892.948,00



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

Código: ADTI-FO-106
Versión: 1
Fecha de aprobación:
03- Julio 2018

ANEXO11
BITÁCORA DE OBRA

Martes 20 de febrero de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Equipos: 1 finisher, 1 Fresadora, 3 compactadores, 1 Marmita, 2 Turbos, 5 volquetes. ?

Personal: 1 Residente obra, 1 Director, 1 Aux. Siso, 1 Residente ambiente, 1 Residente Social, 5 operarios,

17 oficios Varios, 2 Vigilantes, 8 Conductores

Actividades: Fresado Cra 17 entre calles 19, 18N, 18CN y 18BN, mezcla Asfáltica Carretera 17 entre Calles 19N, 18CN, 18BN

Nota: reparación finlos Carretera 17 entre Calles 20N y 18BN

Jim Duvaldo Ol
Residente de obra

Rogberto Quintanilla C
Res. Interventoría

Nota: se realiza comité de obra en las oficinas de Ingeniería, se le da un plazo de 3 días al Contratista para responder el oficio en el que se le solicita al Contratista reiniciar actividades en el barrio La Paz.

Miércoles 1 de marzo de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Nota: El director de obra informa que no hay Mezele por suministro de Agregado desde Galindez

Nota 2: Contratista e interventoría realizan Socialización de Intervención en la vía entrada al barrio La Playa Cra 16A entre Calles 17N y 18N

Jim Duvaldo Ol
Residente de obra

Rogberto Quintanilla C

Jueves 2 de marzo de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias intensas
Lluvias moderadas de 1:00pm - 2:00pm.

Equipos: 3 compactadores, 1 finisher, 1 fresadora, 1 marmita, 2 Turbos, 5 volquetes.

Personal: 1 Residente, 16 oficios Varios, 5 operarios

8 Conductores

Actividades: Instalación mezcla Asfáltica Cra 17 entre Calles 18AN, 18BN y 18CN; Cra 16A entre Calles 17N y 18N Carril Izquierdo entrada a la Playa

Nota: El Contratista revisa y renueva la Señalización en el Sector barrio La Paz, carrera 6 entre Calles 67N y 709N.

José Daroldo Al
Presidente de M.A.

Gustavo Quintana
RES. INTERO.

Viernes 3 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias Intensas de 7pm-8pm en el Sector Sur de la Ciudad.

Equipos: 2 Compactadores, 1 finisher, 1 fresadora, 1 maquina, 2 volquetas

Personal: 1 Resid. Obra, 1 Residente Ambiente, 1 Res. Social, 1 Aux. Siso, 2 vigilantes

Actividades: Se realiza instalación mezcla MOC-15 en Carril Izq. vía a La Playa Cra 16A entre Calles 17AN y 18AN.

Nota: No llega sino una sola volqueta dobletrque de Asfalto.

• El Contratista solicitará adición de recursos para alcanzar el 50% de adiciones.

José Daroldo Al
Presidente de M.A.

Gustavo Quintana
Res. Inter.

Sábado 4 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Sin lluvias durante el día, lluvias moderadas 7:00pm-8:00pm

No se realizan Actividades en obra

Nota: El Equipo está atendiendo la emergencia en Rosas.

Domingo 5 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas 11:30-12:30.

No se realizan Actividades en obra

José Daroldo Al
Presidente de M.A.

Gustavo Quintana
Resid. Interventoria.

Lunes 06 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas 2pm - 3pm

Actividades: No se realizan Actividades, el director de obra informa que las maquinarias fueron requeridas por el INVIAS para la atención de la Emergencia en Rosas - Cauca.

Jaime Ovallo OJ
Presidente de Obra

Rogberto Quintanilla
Res. Intervent.

Martes 07 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas 5:00am - 1:00pm

No se realizan actividades en obra.

Comité Técnico: El contratista informa que el día de mañana 08 de marzo reiniciarán actividades de reparate en el barrio Campamento.

y que el día lunes 13 de marzo se reiniciarán actividades en el barrio La Paz Era 6 entre calles 69N y 70BN.

Nota: La maquinaria del contratista ha estado siendo utilizada para atender la emergencia en el municipio de Rosas Cauca; Posiblemente en ese sector el día Viernes 10 de marzo de 2023

Se de vía y después de 2 mes de la emergencia que ocasiona cierre total de la vía Panamericana

Jaime Ovallo OJ
Presidente de Obra

Rogberto Quintanilla

Miércoles 08 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 3:00pm - 4:00pm de 6pm - 8pm.

Maquinaria y Equipo: 1 grader, 1 picadora, 1 Turbo marmitta, 2 Turbos, 4 Volquetes, 2 Bombas de agua

Personal: 1 Residente obra, 1 Director, 1 Res ambiental, 1 Res Social, 1 Aux Siso, 4 operadores, 12 Oficio Varios, 2 vigilantes, 7 Conductores

Actividades:

- fresado e instalación de mezcla en Cra 17 entre Calles 18N y 18BN

Ficorato Correo 17 entre Calles 18N y 18BN Campamento

Asfalto: Carrera 16AN entre Calles 17AN y 18N Carril

Tray. B1 Campamento en tramo a la Playa

Jaimé Bernaldo Oll

Rogberto Quintana C.

Jueves 09 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias desde 0:00 - 8:00 am moderadas y de 4 pm - 8 pm

Maquinaria y Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 4 Volquetas, 1 marmita, 2 Turbos.

Personal: 1 Residente obra, 1 Aux Siso, 12 oficios Varios, 4 operadores, 7 Volquetas (Conductores).

Actividades: instalación Asfalto en Cra 16A entre Calles 17AN y 18N Salidas a la Playa: queda terminando esta vía por ambos carriles.

Se instala Asfalto en Cra 17 entre Calles 18N y 18AN.

Fresado en Cra 16 entre Calles 20N y 19N - Campamento Se instala Asfalto margen Tray. (Carril.)

Jaimé Bernaldo Oll

Rogberto Quintana C.

Residente de Obra

Res. Intervent.

Viernes 10 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 3 am - 6 am y de 8 pm - 10 pm

Equipos: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores, 1 marmita, 4 Volquetas, 2 Turbos.

Personal: 1 Residente, 1 Auxilio SS7, 1 Aux Social, 12 oficios Varios, 4 operadores, 2 Conductores, 2 Vigilantes

Actividades: Se fresca e instala mezcla MOC-19 en Calle 19BN entre Carreras 17 y 18 Campamento.

Se continúa con fresado e instalación de Mezcla en Cra 16 entre Calles 19N y 20N Campamento

Jaimé Bernaldo Oll

Residente de Obra

Rogberto Quintana C.
Res. Intervent.

Sábado 11 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas desde las 00:00 horas hasta las 12:00. y en horas de la tarde lloviznas toda la tarde.

No hay actividades de obra; por que la empresa contratista estará apoyando los trabajos en la Emergencia del municipio de Rosas.

Gerardo Quintanilla

Reginaldo Quintanilla

Domingo 12 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 5:00am - 8:00am
Intensas de 4:00 - 5:00 pm

No se realiza actividad en obra

Gerardo Quintanilla

Reginaldo Quintanilla

Lunes 13 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 6:00am - 12:00 am
y prolongadas de 3:00pm - 6:00pm.

Equipos: 1 finisher, 1 fresadora, 3 compactadores, 4 Volquetas, 1 marmita, 2 Turbos.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Res. Social, 1 Aux. SISO
1 Res. ambiental, 12 Oficiales Varios, 4 Operadores,
7 Condutores, 2 Vigilantes.

Actividades: Instalación mezcla Asfáltica entre
cillos 19N y 20N de la Carretera 16 B/ Campamento.

Nota: Supervisión solicita de intervenga la Carretera 25N
entre cillos 20N y 21N Campamento y Carretera 15 entre cillos
18N y 20N (Doble Calzada de Campamento).

Nota: Interventoría Revisa que todos los equipos
dispongan de Extintores de Incendios, Solo el Extintor
de la finisher no cumple, el Contratista toma las
medidas para cargar nuevamente el Extintor.

Gerardo Quintanilla

Reginaldo Quintanilla

Martes 14 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 6:30 - 7:30 pm

Maquinarias: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores

2 Turbos, 6 Volquetas

Personal: 1 Res., 1 aux. SSO, 14 Oficios Varios, 4 operarios, 3 Conductores, 2 vigilantes.

Actividad: Fresado, se terminó de fresar la Ara 16 entre calles 19N y 20N, se inició fresado en Ara 16 desde la calle 19N hacia 19N. B/Campamento

Asfalto, se instala Asfalto en Ara 16 entre calles 19N y 20N

Nota: Se realiza reparación de fallas en Ara 17 en Glorieta Puerta de Hierro, Calle 17 #

Juan David Pelt
Presidente de PPA

Engelberto Quintana
Res. Interventor

Miércoles 15 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 6:00 am. 8:00 am
Lluvias moderadas y lluvias aisladas de 6pm - 12pm.

Equipo: Una finisher. Bomber-Greene BG 240, 1 fresadora
3 compactadores, 2 NPR, 1 marmita, 5 Volquetas.

Mano de Obra: 1 Residente, 12 Oficios Varios, 1 Aux SSI,
Un Residente Social, 4 operarios, 3 Conductores.

Actividades: Se fresa e instala Mezcla en Carrera 16 entre Calles 18N y 19N B/Campamento.

Nota: Se presenta dos hundimientos el primero en Ara 17 A18N-211 y el otro en Calle 17 A18N-31 posiblemente por fallas en el Alcantarillado.

Nota: Se cambia la finisher.

Nota: Sobre los dos daños en la estructura se informa a la Empresa AAPSA, para que tomen los correctivos necesarios, El Contratista dejó dos sectores sin intervención hasta que estos sean reparados por la Empresa AAPSA.

Juan David Pelt

Engelberto Quintana

Jueves 16 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias Intensas de 5:30 - 6:30 pm

Equipo: 2 finisher, 3 compactadores, 7 Volquetas, 1 marmita, 2 NPR, 1 fresadora

Personal: 1 Directo obra, 1 Residente obra, 1 Res. Social, 1 Res. ambiental, 1 Aux Siso, 12 Oficiales Varios, 2 Vigilantes, 4 Operarios, 10 Conductores.

Actividades: Termina presado en Car 16 entre calles 18N y 19N; se extiende mezcla en este sector.

Fresado Calle 18N entre av 17, 16 y 15

Nota: hay disponibles 2 finisher y 3 compactadores. Uno de los compactadores, trabajó compactando las Areas recién fresadas.

* Uno de los finisher instala mezclas en Calle 17N entre Car 16A y 17 B/ Maria Alejandra.

Nota: Interventoria y un funcionario de la Secretaria de transito realizan recorridos por diversas Areas de Intervención con Señalización.

- Se recomienda intervenir B/ Campamento, B/ Los Navajos y B/ Yambitara.

- Se excluyen Areas intervenidas en el B/ El Centro, Tulcan, Ciudad Jardin, El recuerdo, Pandiguando.

algunas porque ya se intervinieron y otras porque van a ser intervenidas por -Vías 1- Contratos de Movilidad futura.

Y Nota: El Contrato sera adicionado en Valor y prorrateo hasta 15 de abril segun la Supervision. Se esta a la espera de la legalización del mismo.

Guillermo Ovalle
Presidente de Obra

Rogberto Quintanilla
Res. Inter.

Viernes 17 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvia moderada y prolongada desde las 5:00 am - 2:00 pm, lluvia intensa a las 7-8 pm.

Actividades: En el frente de obra de Pariche no hay actividad, El Directo de obra ingresa via Whats App que las cuadrillas apoyaran la emergencia en el municipio de Rosas.

Se observan la Comisión de Topografía en el sector de la Paz Currier 6 entre Calles 69N y 70BN, realizan

Leantización de Eje.

Gerardo Ovalle Ol

Diego Roberto Quintana C.

Rebado 18 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas de 11-12 pm.

Equipos: 1 finisher, 1 presadora, 3 Compactadores, 2 Volquetas
1 marmitta, 2 Turbos

Mano de Obra: 1 Residente, 12 oficios varios, 2 vigilantes,
4 operadores, 5 Conductores

Actividades: No se realiza presado.

Asfalto: se instala asfalto en Calle 18N
entre Ocas 17 y 16; en uno de los sectores se instala capa
de 5cm con el fin de proteger la rasante.

Notas: El Contratista en horas de la mañana trabaja en un
parche particular, a la obra Negon Aprom. 27m³
de Asfalto.

Gerardo Ovalle Ol

Diego Roberto Quintana C.

Domingo 19 de marzo de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

No hay actividad en obra.

Lunes 20 de marzo de 2023 (Festivo)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 4:00 - 5:00 pm

No hay actividad en obra.

Gerardo Ovalle Ol

Diego Roberto Quintana C.

Residente de Obra

Res. Interventoria

Martes 21 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas de 3:00 - 4:00 pm

Alerta amarilla por Creciente del río Molino

Actividades: El director de Obra informa que no hay
Mezcla para el sector de Campamento.

En el barrio la paz: Dos trabajadores reparan
una tubería de Sumidero dañada por las maquinarias
días anteriores (Dic 2022)

Gerardo Ovalle Ol

Diego Roberto Quintana C.

Residente de Obra

Res. Interventoria

Miércoles 22 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas entre 8:00 pm y 12:00 pm,

Equipo: 1 finisher, 2 Compactadores, 1 marmita, 1 fresadora, 1 volquete, 1 Turbo

Personal: 1 Ing. Residente, 14 oficios varios, 4 operadores, 1 Ing. ambiental, 1 Residente SISO, 3 conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Se fresa en Calle 18N entre Carreras 15 y 16. Frente a la Entrada a Comacauer - La Villa.

Se instala mezcla asfáltica Calle 18N entre Carreras 16 y 15.

Nota: Personal del Acueducto golpea un poste ubicado ante Carrera 16 entre calles 18^a y 19^a N;

Nota: La alcaldía informa que está revisando una solicitud del Contratista en cuanto a nuevo ajuste a precio del asfalto; los abogados la consideran no procedente.

Nota: Se informa que se renovaron los Extintores que se encontraban vencidos, el personal SISO de la interventoría realiza la respectiva revisión.

Nota: El Contratista informa que el día de mañana llega el nuevo SISO.

Gim Divaldo Ol

Presidente de obra

Rugoberto Quintana

Jueves 23 de marzo de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 6:00 - 12:00 y

lluvias intensas de 5:00 pm a 6:00 pm

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 Compactadores, 1 marmita, 1 Turbo, 6 volquetes.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topógrafo-Inpector, 1 Aux. Social, 1 Ing. ambiental, 1 SISO, 4 operadores, 14 oficios varios, 2 vigilantes,

Actividades: Se fresa Calle 18N entre Carreras 15 y 16

Se instala mezcla Calle 18N entre Carrera 15 y 16 llegando a la glorieta.

Nota: Acueducto termina el llenado del huecoper dario en la carrera 16 entre calles 18N y 19N y el Contratista Instala Mezcla Asfáltica en el sitio.

Jaime Ovalle Oñ
Presidente de Obra

Rogberto Quintanilla C.
Res. Interventor

Viernes 24 de marzo /2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 5am - 9:00am y de 4pm a 6pm.

Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 marmita, 6 volquetas, 2 Turbos

Personal: 4 operadores, 9 Conductores, 1 Res. Obra, 1 Siso, 1 Topografo, 14 Oficiales Varios, 2 Vigilantes

Actividades: Se fresa en calle 18N entre Carreñ 15 y 16 cerca a la Glorieta de la Villa y en el Sector Santa Gracia Calle 15N entre Caras 15 y 16.

Asfalta: Se termina de pavimentar la calle 18N entre Caras 15, 16 y 17 (La Villa) y se instala asfalto en Calle 15N entre Caras 15 y 16 frente a la Obra Santa Gracia. El Carril Izquierdo y una parte del Carril derecho.

Jaime Ovalle Oñ
Presidente de Obra

Rogberto Quintanilla C.
Res. Interventor

Sábado 25 de marzo /2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias en la mañana y lluvia intensa de 5-6 pm

Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 marmita, 2 Turbos, 6 volquetas.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Res. Social, 1 Res. Siso, 15 Oficiales Varios, 1 Topografo, 4 operadores, 9 Conductores, 2 Vigilantes.

Actividades: Se fresa en la Calle 15N iniciando en la Carrera 15 hasta mitad de cuadra hacia Carrera 16. (Obra Santa Gracia) Carril Izquierdo.

y se instala mezcla asfáltica, terminando todo el carril Izquierdo de la calle 15N entre Caras 15 y 16

Jaime Ovalle Oñ

Rogberto Quintanilla C.

Domingo 26 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 10am-11am

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 Turbo, 1 marmita, 4 volquetas.

Personal: 1 Resid. obra, 1 Residente SISO, 1 Topógrafo, 4 operadores, 15 oficio Varios, 6 Conductores, 2 Vigilantes.

Actividad: Se termina la instalación de Mezcla asfáltica en Calle 15N entre Aven 15 y 16 (San Jacinto).

Nota: La maquinaria es trasladada al Sector del Centro Calle 3 entre Carre 4 y 5.

Gerardo Ovallo

Rogoberto Quintana C.

Jueves 27 de marzo de 2023

Estado del tiempo: lluvias moderadas de 4pm-5pm

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 Turbo, 6 volquetas, 1 marmita.

Personal: 1 Res. obra, 1 Resid. SISO, 1 Res. Social, 4 operadores, 1 Inspector, 1 Res. Ambiental, 12 oficio Varios.

Actividades: Fresado e imprimación Cra 5 entre Calles 3, 4 y 5. Sector Centro.

Gerardo Ovallo

Rogoberto Quintana C.

Residente de Obra

Res. Interventor

Martes 28 de marzo de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 1 Turbo, 2 compactadores, 3 volquetas, 1 marmita.

Personal: 1 Ing. Residente obra, 1 Res. SISO, 1 Res. Ambiental, 1 Topógrafo-Inspector, 4 Operadores, 14 oficio Varios, 2 vigilantes.

Actividades: Se instala mezcla Asfáltica en Carre 5 entre Calles 3, 4 y 5 Bx (Centro).

Nota: pendiente un paredón en Cra 5 entre Calles 3 y 4 (mitad de Cuadra).

Nota: Se realiza Comité de obra en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Popayán, se informa que ya se terminaron las obras en el B1 campamento y que se continúan en el Barrio el Centro, se priorizan las Calle 3 entre Aros 2 a 7 y Cía 5 entre calles 3, 4 y 5, se aclara que después del barrio el Centro se continuará en el Sector Ara 36 y 37 del Barrio (Los Huanjos) Carlos I en la calle 40 y Ara 37 entre Calles 4 y 2.

El día de mañana a las 9am se programa visita para priorizar Demarcación.

Nota: Las obras del barrio el Centro se realizarán hasta que lo permitan las fechas de Semana Santa.

Juan Quintero Cll
Presidente de Bta

Rogberto Quintanilla C.

Miércoles 29 de marzo 12023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 9:30 am - 10:30 am,
Lluvias Intensas de 11:00 pm - 12 pm.

Equipo: Vehículo para demarcación

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Ing. Directa, 4 personas en Señalización.

Actividades: No hay actividad de fresado y Asfalto
* se realiza demarcación en barrio Yambitará, Sotará y Villa Dolente. (Jornada Noturna)

Nota: En el día Contratista e Interventoría asistían a reunión con la Secretaría de tránsito para programar la Señalización, adicionalmente se va a campo para ubicar la Cuadrillas.

Juan Quintero Cll
Presidente de Bta

Rogberto Quintanilla C.
Res. Interventoría

Jueves 30 de marzo 12023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 2 Turbos
1 marmita, 8 volquetas.

Personal: 1 Res. de obra, 1 Res. social, 1 Res. SISO, 1 Res. ambiental, 4 operadores, 12 oficios Varios, 11 Conductores.

Actividades: Fresado: Calle 3 entre Carreras 5, 6 y 7 B/E El Centro:

Asfalto: Se termina de instalar asfalto en Carrera 5 entre calles 3 y 4.

Se instala Mezcla en Calle 3 entre Carreras 5, 6 y 7

Señalización: se trabaja en marcas viales en el sector de Yambitara y Villahozcente.

Jaime David Ochoa

Rogberto Quintana

Viernes 31 de marzo de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias

Equipos: Carro de Demarcación; 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 Carro compactador (maquina), 2 Turbos, 7 volquetas.

Personal: 4 trabajadores (auto) en demarcación (marcas viales); 1 Ing. Residente, 1 Resid. social, 1 Res. SST, 1 Resid. Ambiental, 1 Director, 10 oficios Varios 4 operadores, 10 Conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Fresado Calle 3 entre Carreras 4, 3 y 2

Asfalto: se instala mezcla en Calle 3 entre Carreras 3, 4 y 5 B/E El Centro

Nota: Acueducto y Alcantarillado atienden daño en Calle 3 con Carrera 3.

Señalización: En la madrugada de este día se continúo Señalización en Carrera 11 entre Calles BN y HN y Sector Cra 10 entre Calle HN y 16N. En la noche de este día se inició la pintura con línea Blanca en el Sector de Yambitara y se continúa en la madrugada del 01 de Abril Pintando con línea Blanca en el Sector de Campamento. en total se hacen 5 km de línea Blanca

Jaime David Ochoa
Residente de Obra

Rogberto Quintana
Res. Interventor

Sábado 01 de Abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias moderadas en Horas de la noche

8pm - 10pm (No se puede continuar con la Señalización en el barrio Antonio Nariño.

Actividades: Se instala Mezcla Asfáltica en Calle 3 entre Carreras 4, 3 y 2

Nota: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado reparan 2 (dos) daños que se presentaron en la Calle 3 entre Carreras 2 y 3.

Equipo: Carro de demarcación, 1 fresadora, 1 finisher, 2 Compactadores, 4 Volquetas, 1 maquina, 2 Turbos.

Personal: 4 profesionales pintura, 1 Res. Obra, 1 Res. Social, 1 Ing. Director, 1 Inspector, 10 Oficiales Varios, 1 Res. SISO, 4 operadores, 7 conductores, 2 vigilantes

Nota: Se instala Geomalla en Barrio La Paz

José Guillo B. L.
Presidente de BPA

Augusto Quintana C.
Res. Interventor.

Domingo 02 de Abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas de 2:00 - 3:00 pm

Equipo: Carro de Demarcación (Señalización)

Barrio La paz (1 Compactador, 1 motoniveladora, 4 volquetas)

Personal: 4 personas demarcación; Barrio La Paz 10 Oficiales Varios, 2 operadores, 7 conductores, y vigilantes.

Actividades: Señalización: se realiza demarcación pintura de marcas viales barrio Antonio Nariño. Se suspende a las 1:30 pm por lluvias y se reinicia en horas de la noche, se trabaja hasta la madrugada del 03 de abril de 2023 B/Antonio Nariño.

Rehabilitación vial: En el Barrio La paz el día anterior se instalo geomalla y en este día se instala Subbase granular Carrera 6 entre calles 69N y 70BN

José Guillo B. L.
Presidente de BPA

Augusto Quintana C.

JuNES 3 de Abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas de 1pm - 2pm y de 4pm - 5pm

Equipo: Carro de Demarcación, 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 7 Volquetas, 1 marmita, 1 moto-niveladora, 1 Compactador Rodillo, 2 Turbos.

Personal: 4 personas en demarcación, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Director, 1 Res. Social, 1 Res. SISO, 1 Res. Ambiental, 10 Oficios Varios, 6 operadores, 10 conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Se inició Fresado en el barrio Carlos I Cra 36 entre Calles 4, 40 y 5, en este mismo sector se instala Mezcla Asfáltica.

Nota: En la madrugada y noche anterior se realizó Señalización vial, En la noche de este día.

JuNES 3 se realiza pintura con líneas blancas y amarilla en el Barrio José María Obando.

Línea total entre blanca y amarilla 11.622,90 ml de ancho 0.12

y Marca Vial 755.17 M2.

Se trabaja en Terminación Caps de Subbase en el Barrio La Paz Carrera 6 entre Calle 69N y 70BN, Se toman densidades por parte de Contratista e Interventor.

Martes 4 de Abril de 2023 *Rubén Roberto Quintana*

Estado del tiempo: No se presentaron lluvias.

Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 1 compactador granulados, 2 compactadores Mezcla Asfáltica, Una marmita, 2 Turbos, Una moto-niveladora, Un Bocat (mini cargador).

Personal: 1 Ing. Residente obra, 1 Director obra, 1 Res. SISO, 1 Res. Social, 1 Res. Ambiental, 10 Oficios Varios, 6 operadores de maquinaria, (9 Volquetas, 1 marmita, 2 Turbos, Total: 12 conductores y 4 vigilantes.

Actividades: Se termina de instalar mezcla en Carrera 36 entre Calles 4A y 5 B1 Carlos I,

Se instala Mezcla en Calle 40 entre Carreras 36 y 37 - Se continúa Fresado en Calle 40 entre Carreras 36 y 37

En el barrio la paz se continúa organizando pista para instalación de base, se organizan los puntos donde hay recamaras y sumideros, donde se requieren de Equipo especial, una retroexcavadora de llantas o un minicargador (Bocat)

Juan Manuel M

Rogberto Quintana C

Miércoles 5 de abril de 2023

Estado del tiempo: El día martes no hubo procesiones de Semana Santa por lluvias, 8 a 9 pm (Intensas) y el día de hoy miércoles no se presentan lluvias.

Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores, 1 maquina, Un bocat, Una motoniveladora, un compactador, 2 Turbos, 9 Volquetas

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Director, 1 Res. Social, 1 Res. SISO, 1 Res. Ambiental, 14 Oficios Varios, 4 Operadores 12 Conductores, 4 Vigilantes.

Actividades: Fresado: Calle 4A entre Carreras 36A y 37 y Carrera 37 entre Calles 4 y 2; Se realiza instalación de Mezcla en estas mismas calles y se terminan asfalto en Calle 4D entre Carreras 36 y 37.

Barrio la Paz Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN de instala base granular, se toman densidades y se aplica imprimante para proteger la base.

Nota: Interventoria atiende a la comunidad del barrio La María, los Navajos y Villa Colombina y se le informa que las calles que ellos solicitan que se les pavimenten ya están priorizadas por la alcaldía y que el presupuesto es muy limitado y se trabajará hasta agotarlo.

Juan Manuel M
Presidente de BPA

Rogberto Quintana C
Res. Interventoria

Jueves 6 de abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas en horas de la tarde, El día de ayer miércoles se suspendió

Las procesiones por lluvias entre las 9pm y 10pm.
 * El día de hoy si se realizan Procesiones.
 No hay actividades en obra.

Alfonso Ovalle O.
 Presidente de Obra

Rugobero Quintana C.

Viernes 7 de Abril de 2023

Estado del tiempo: se presentan lluvias que no permiten realizar las procesiones (lluvia durante todo el día y noche)

Nota: Las cosas en la ciudad de Popayan fueron difíciles en cuanto a la Economía de la Ciudad

1. Lluvias
2. Amenaza de Paro al inicio de la Semana Santa

3. Emergencia en Posas (Pase restringido de vehículos)

4. Problemas en los vuelos hacia la ciudad por inconvenientes con las aerolíneas.

Nota: No hay actividades en obra.

Alfonso Ovalle O.
 Presidente de Obra

Rugobero Quintana C.

Sábado 8 de Abril de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Domingo 9 de Abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias Intensas 3-4 pm.

No hay actividades en obra.

Alfonso Ovalle O.
 Presidente de Obra

Rugobero Quintana C.

Lunes 10 de Abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas 4pm - 5pm

Equipo: 1 finisher, 1 presuradora, 2 compactadores (mezcla)
 1 motor vibrador, 1 vibrador compactador (granular), 2 Trucos
 1 marmita, 6 volquetas

Personal: 1 ing. Residente, 1 Res. Social, 1 Res. SISO,
 1 Res. ambiental, 1 Director, 14 Oficiales Varios.

6 Operadores de maquinaria, 9 Condutores y

4 vigilantes.

Actividades: Se instala Mezcla en tramo faltante de la Calle 40 entre Carreras 36 y 37 B/Carlos I Fresado e Instalación de Mezcla Cra 43 entre Calles 1A y 1B y 2 B/La María Occidente.

Se renueva la Base, la cual fue socavada por las lluvias del día jueves 6 de abril en el Barrio La Paz. Se toman nuevamente densidades y la interventoría avala la instalación de Carpetas asfálticas, se recibe por niveles y por densidades.

Jaime Gualdo OJ
Presidente de Obra

Rugoberto Quiñero c.
Res. Interventoría.

Martes 11 de abril de 2023.

Estado del tiempo: No se presentan lluvias

Equipo: 1 finisher, 2 compactadores, 2 Turbos, 1 Carro de Imprimador (Turbomarmita), 8 volquetas

Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Res. Social, 1 Res. Ambiental, 1 Res. SISO, 15 Oficios Varios, 1 Topog. 4 operadores, 11 Conductores, 4 vigilantes.

* Mezcla Asfáltica en B/La Paz Cra 6 entre Calles 69N y 70BN.

Fresado y Mezcla Cra 41 entre Calles 1A y 2 Frente a Hospital María Occidente, Intersección Cra 41 con Calle 1A, Calle 1 con Carrera 41 (Curva), Calle 1A entre Carreras 41 y 42B. (Barrio La María).

Jaime Gualdo OJ
Presidente de Obra

Rugoberto Quiñero c.

Miércoles 12 de abril de 2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas de 2pm-3pm

Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores, 2 Turbos, 1 marmita, 7 volquetas

Personal: 1 Res. Obra, 1 Res. Social, 1 Res. SISO, 1 Res. Ambiental, 1 Topógrafo, 14 Oficios Varios. 4 operadores, 2 vigilantes, 10 Conductores.

Actividades: Fresado e Instalación de Mezcla asfáltica, Calle 4 con Carrera 42 B/ La Maria se termina Instalación de Mezcla en Calle 14 entre Carreras 41 y 42B, se fresco Calle 2A entre Carreras 42 y 44 y se instala Mezcla Asfáltica.

José Rivaldo Oll
Presidente de obra

Rugoberto Quintán C.
Res. Interventor.

Jueves 13 de Abril de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 2 Turbos, 7 volquetas, 1 marmita.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Director, 1 Res. Socio, 1 Residente SISO, 1 Topógrafo, 14 oficio Varios, 4 operadores, 10 Conductores.

Actividades: Se Inicia Fresado e Instalación de Mezcla en la Carrera 4B entre Calles 1 y 2 Barrio Villa Colombia, Se termina de Instalar Mezcla en la Calle 2A entre Carreras 42 y 44, Fresado Calle 2 entre Carreras 4B y 47 Los Naranjos

José Rivaldo Oll
Presidente de obra

Rugoberto Quintán C.
Res. Interventor.

Viernes 14 de abril de 2023

Estado del tiempo: No se presentan lluvias.

Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 1 marmita, 2 Turbos, 5 volquetas.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Director, 1 SST, 1 Res. Socio, 1 Topógrafo, 14 oficio Varios, 4 operadores, 8 Conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Se realiza Fresado, e instalación de Mezcla Asfáltica, Calle 2 entre Carreras 43A y 44, Mezcla asfáltica Calle 2 entre Carreras 4B y 4B3 Villa Colombia.

A solicitud de la Supervisión la maquinaria es trasladada al Sector de Entrepinos Carrera 17 con Variante Norte.

Jaime Emilio Villalón
Presidente de BPA

Rugoberto Quintana c.

Sábado 15 de Abril de 2023

Estado del tiempo: lluvias intensas de 4pm-5pm

Equipos: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores,
2 Turbas, 5 volquetas, 1 marmita.

Personal: 1 Residente, 1 Director, 1 Res. Social, 1
Topógrafo-Inspector, 1 Res. ambiental, 14 oficiales
Varios, 4 Operadores, 8 conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Fresado e Instalación de Mezcla
asfáltica en Carrera 17 entre Calles 55N y 56N
(Vía entrepinos) Variante Norte.

Jaime Emilio Villalón
Presidente de BPA

Rugoberto Quintana c.
Res. Interventor.

FIN DE OBRA
15 de Abril / 2023

Jaime Emilio Villalón



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA**

Código: ADTI-FO-106
Versión: 1
Fecha de aprobación:
03- Julio 2018

**ANEXO 12
REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A.
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 1



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Oficina de Infraestructura
COMENTARIOS: Comité de obra 28-02-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoria

FOTO No. 2



FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 17 entre Calles 20N y 19BN Barrio Campamento
COMENTARIOS: Acompañamiento Actividades de Parcheo

FOTO No. 3



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Actividades de atención a la comunidad

FOTO No. 4



FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Actividades de atención a la comunidad

FOTO No. 5



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Recorrido de obra con el Ingeniero Supervisor del contrato por parte de la Alcaldia

FOTO No. 6



FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Actividades de atención a la comunidad



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A.
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

ÁREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 7



FOTO No. 8



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Información a la comunidad, socialización

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Información a la comunidad, socialización

FOTO No. 9



FOTO No. 10



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Personal con la debida dotación de EPPs

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS: Señalización de obras para evitar el paso de vehículos

FOTO No. 11



FOTO No. 12



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69 y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS: Actividades de mantenimiento de cerramiento perimetral y barricadas, y adecuación de pasos peatonales

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69 y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS: Actividades de mantenimiento de cerramiento perimetral y barricadas, y adecuación de pasos peatonales

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
<p align="center">AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL</p>			
<p align="center">FOTO No. 13</p>		<p align="center">FOTO No. 14</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calles 18N con carrera 16A, Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 16A entre calles 17N y 18N, La Playa
COMENTARIOS:	Capacitación a personal temas PIPMA	COMENTARIOS:	Capacitación a personal temas PIPMA
<p align="center">FOTO No. 15</p>		<p align="center">FOTO No. 16</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa	UBICACIÓN:	Setor Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa
COMENTARIOS:	Aseo y limpieza solicitadas por la Interventoria.	COMENTARIOS:	Aseo y limpieza solicitadas por la Interventoria.
<p align="center">FOTO No. 17</p>		<p align="center">FOTO No. 18</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Oficina de Infraestructura	UBICACIÓN:	Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Comité de obra 07-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoria	COMENTARIOS:	Atención a la comunidad por parte de las profesionales social y ambiental



ALCALDIA DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

ÁREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 19



FOTO No. 20



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Carrera 16A, entre calles 17N y 18N, La Playa

COMENTARIOS: Atención a la comunidad por parte de los profesionales social y ambiental

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Carrera 16A, entre calles 17N y 18N, La Playa

COMENTARIOS: Charla por parte interventoria - Importancia uso de tapabocas

FOTO No. 21



FOTO No. 22



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Carrera 16 entre Calles 20N y 19N

COMENTARIOS: Señalización móvil y personal en actividades de pare y siga.

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Sector Campamento y vía de acceso al Barrio La Playa

COMENTARIOS: Solicitud orden, limpieza y aseo punto de acopio

FOTO No. 23



FOTO No. 24



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Barrio Campamento y vía de acceso al barrio La Playa

COMENTARIOS: Solicitud recolección de escombros y verificación orden, limpieza y aseo en vías intervenidas

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN: Barrio Campamento y vía de acceso al barrio La Playa

COMENTARIOS: Solicitud recolección de escombros y verificación orden, limpieza y aseo en vías intervenidas

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO		
			FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021". EDIFICACIONES Y VÍAS S.A. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL			
FOTO No. 25		FOTO No. 26	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Secretaria de Vivienda - Alcaldía de Popayán	UBICACIÓN:	Oficinas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán
COMENTARIOS:	Comité de obra 14-03-2023. Asiste Contratista, Entidad, Secretaría de Tránsito e Interventoria	COMENTARIOS:	Reunión en empresa AAPSA 14-03-2023: revisión tema de redes de acueducto y alcantarillado
FOTO No. 27		FOTO No. 28	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Sector Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Sector Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Atención a la comunidad para aclarar dudas e inquietudes	COMENTARIOS:	Acompañamiento en actividades de parcheo sector Campamento
FOTO No. 29		FOTO No. 30	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Sector Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Sector Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Verificación de la señalización móvil instalada en el desarrollo de las actividades de la obra	COMENTARIOS:	Reposición de extintores vencidos

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
ÁREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL		
FOTO No. 31		FOTO No. 32
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16 entre calles 18N y 19N	UBICACIÓN: Carrera 16 entre calles 18N y 19N
COMENTARIOS:	Solicitud orden, limpieza y aseo del punto de acopio	COMENTARIOS: Solicitud recolección de material vegetal. Solicitud limpieza de antejardines y zonas verdes
FOTO No. 33		FOTO No. 34
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Secretaría de Infraestructura	UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS:	Comité de obra 22-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoria	COMENTARIOS: Actividades de socialización y entrega de volantes
FOTO No. 35		FOTO No. 36
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara	UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS:	Actividades de socialización y entrega de volantes	COMENTARIOS: Actividades de socialización y entrega de volantes



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A.
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 37



FOTO No. 38



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS: Reposición EPPs a todo el personal

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS: Charlas Ambientales y SST

FOTO No. 39



FOTO No. 40



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16 entre calles 18N y 19N Barrio Campamento
COMENTARIOS: Subsanación limpieza de sumidero y ante jardín

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16 entre calles 18N y 19N Barrio Campamento
COMENTARIOS: Subsanación limpieza de sumidero y ante jardín

FOTO No. 41



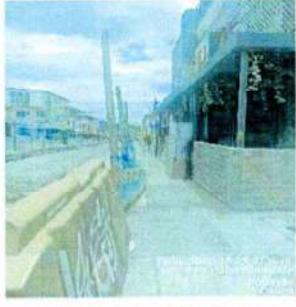
FOTO No. 42



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS: Puntos de acopio sector campanario y Santa Gracia, solicitud de orden, aseo y limpieza

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Sector Clínica Santa Gracia y Barrio Machángara
COMENTARIOS: Puntos de acopio sector campanario y Santa Gracia, solicitud de orden, aseo y limpieza

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p align="right"> FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023</p>	
<p>Contratista: <u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> Contrato No.: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> Interventor: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u></p>	<p>Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".</p>		
<p align="center">AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL</p>			
<p align="center">FOTO No. 43</p>		<p align="center">FOTO No. 44</p>	
			
<p>FECHA DE FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>	<p>FECHA FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>
<p>UBICACIÓN:</p>	<p>Secretaría de Infraestructura</p>	<p>UBICACIÓN:</p>	<p>Secretaría de Tránsito</p>
<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Comité de obra 28-03-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría</p>	<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Reunión 29-03-2023, Tema revisión de vías para señalización y demarcación vial</p>
<p align="center">FOTO No. 45</p>		<p align="center">FOTO No. 46</p>	
			
<p>FECHA DE FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>	<p>FECHA FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>
<p>UBICACIÓN:</p>	<p>sector Centro Calle 3 entre Cra. 7 y 5 Banco de la República</p>	<p>UBICACIÓN:</p>	<p>sector Centro Calle 3 entre Cra. 7 y 5 Banco de la República</p>
<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Acompañamiento en actividades de parcheo</p>	<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Acompañamiento en actividades de parcheo</p>
<p align="center">FOTO No. 47</p>		<p align="center">FOTO No. 48</p>	
			
<p>FECHA DE FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>	<p>FECHA FOTOGRAFÍA:</p>	<p>SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023</p>
<p>UBICACIÓN:</p>	<p>Calle 3 entre carrera 5 y 4 sector Acueducto</p>	<p>UBICACIÓN:</p>	<p>Calle 3 entre carrera 5 y 4 sector Acueducto</p>
<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Revisión de documentación y PQRS pendientes Componentes Social y Ambiental</p>	<p>COMENTARIOS:</p>	<p>Revisión de documentación y PQRS pendientes Componentes Social y Ambiental</p>

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL			
FOTO No. 49		FOTO No. 50	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre carreras 5, 6 y 7 Barrio El centro	UBICACIÓN:	Calle 3 entre carreras 5, 6 y 7 Barrio El centro
COMENTARIOS:	Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra	COMENTARIOS:	Uso adecuado de EPPs por parte de los trabajadores de la obra
FOTO No. 51		FOTO No. 52	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre carreras 5, 6 y 7 Barrio El centro	UBICACIÓN:	Calle 3 entre carreras 5, 6 y 7 Barrio El centro
COMENTARIOS:	Verificación limpieza de sumideros zona centro	COMENTARIOS:	Puntos de acopio sector centro, solicitud de orden, aseo y limpieza
FOTO No. 53		FOTO No. 54	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	cerramiento y señalización	COMENTARIOS:	cerramiento y señalización

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL		
FOTO No. 55	FOTO No. 56	
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Sector Carlos Primero, Maria Occidente	UBICACIÓN: Sector Carlos Primero, Maria Occidente	
COMENTARIOS: Actividades de socialización	COMENTARIOS: Actividades de socialización	
FOTO No. 57	FOTO No. 58	
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
COMENTARIOS: Reubicación de tubo de desagüe de aguas lluvias	COMENTARIOS: Acompañamiento en actividades de parcheo en estos sectores	
FOTO No. 59	FOTO No. 60	
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Calle 5 con carrera 36 Barrio Carlos I	UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
COMENTARIOS: Señalización móvil instalada en el desarrollo de la obra	COMENTARIOS: Uso adecuado de elementos EPPs de los colaboradores en obra	

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: Contrato No.: Interventor:	<u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL			
FOTO No. 61		FOTO No. 62	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 36 entre calles 1A y 4D Barrio carlos I	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Limpieza de sumideros	COMENTARIOS:	Limpieza de sumideros
FOTO No. 63		FOTO No. 64	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Barrio Maria Occidente
COMENTARIOS:	Verificación cerramiento y señalización en vía de intervención	COMENTARIOS:	Puntos de acopio sector centro, solicitud de orden
FOTO No. 65		FOTO No. 66	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Secretaria de Infraestructura	UBICACIÓN:	Barrio Maria Occidente
COMENTARIOS:	Comité de obra 11-04-2023. Asiste Contratista, Entidad e Interventoría	COMENTARIOS:	Visita del Sr. Alcalde en vías intervenidas del barrio Maria Occidente

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: <u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> Contrato No.: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> Interventor: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>		Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
<p align="center">AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL</p>			
<p align="center">FOTO No. 67</p>		<p align="center">FOTO No. 68</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023		FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Carrera 16A entre calles 17N y 18N Barrio La Playa		UBICACIÓN: Barrio campamento	
COMENTARIOS: Reparaciones en andenes que fueron afectados durante la intervención de las obras		COMENTARIOS: Reparaciones en andenes que fueron afectados durante la intervención de las obras	
<p align="center">FOTO No. 69</p>		<p align="center">FOTO No. 70</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023		FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Barrio Los Naranjos		UBICACIÓN: Carrera 6 entre calles 69N y 70BN Barrio La Paz	
COMENTARIOS: Retiro de escombros de obra		COMENTARIOS: Actividades de limpieza de andenes, sumideros	
<p align="center">FOTO No. 71</p>		<p align="center">FOTO No. 72</p>	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023		FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Calle 2 con carrera 44 Barrio Maria Occidente		UBICACIÓN: Carrera 17 con variante Norte, sector Entrepinos	
COMENTARIOS: Uso adecuado de EPPs por parte de los colaboradores en obra		COMENTARIOS: Localizacion areas de intervención	

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO		
			FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 1		FOTO No. 2	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 19BN y 19AN. Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 19AN y 19N. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 3		FOTO No. 4	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 19N y 18CN. Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 18CN y 18BN. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica
FOTO No. 5		FOTO No. 6	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 18CN y 18BN. Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 18BN - 18AN y 18N. Campamento
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica	COMENTARIOS:	Fresado e imprimación con emulsión asfáltica



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A.
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 7



FOTO No. 8



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa
COMENTARIOS: Fresado e imprimación con emulsión asfáltica

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa
COMENTARIOS: Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 media calzada

FOTO No. 9



FOTO No. 10



FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa
COMENTARIOS: Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Barrio La Playa
COMENTARIOS: Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

FOTO No. 11

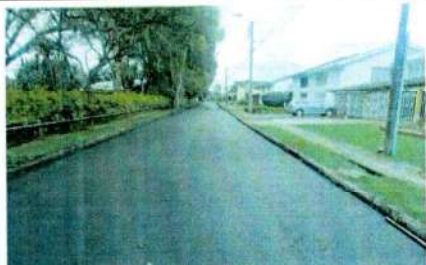


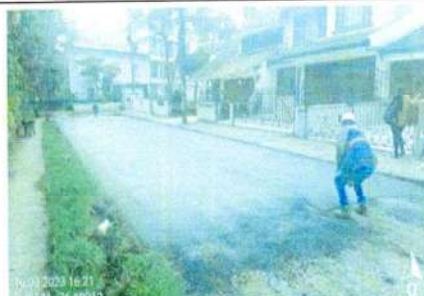
FOTO No. 12



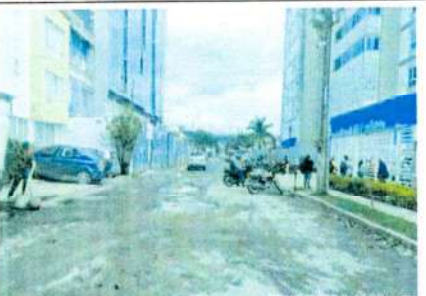
FECHA DE FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 17 entre Calles 18BN y 18AN. Barrio Campamento
COMENTARIOS: Carpeta asfáltica instalada

FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN: Carrera 17 entre Calles 18AN y 18N. Barrio Campamento
COMENTARIOS: Instalación y compactación de mezcla asfáltica

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021". EDIFICACIONES Y VIAS S.A 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
AREA TECNICA			
FOTO No. 13		FOTO No. 14	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 17 entre Calles 18AN y 18N. Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Calle 19BN entre Carrera 17 y No. 17-37 Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica	COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica
FOTO No. 15		FOTO No. 16	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía de Acceso a Barrio La Playa	UBICACIÓN:	Carrera 16A entre Calles 18N y 17N. Vía de Acceso a Barrio La Playa
COMENTARIOS:	Fresado e imprimación con emulsión asfáltica	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 17		FOTO No. 18	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 20N y 19N	UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 20N y 19N
COMENTARIOS:	Fresado e imprimación con emulsión asfáltica	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
ÁREA TÉCNICA		
FOTO No. 19		FOTO No. 20
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 16 entre Calles 20N y 19N. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Revisión niveles de topografía	COMENTARIOS: Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 21		FOTO No. 22
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	UBICACIÓN: Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS: Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 23		FOTO No. 24
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	UBICACIÓN: Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS: Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19

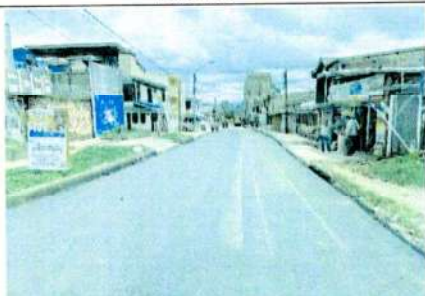
	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 25		FOTO No. 26	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.	UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.
COMENTARIOS:	Fresado de carpeta asfáltica deteriorada	COMENTARIOS:	Fresado e imprimación con emulsión asfáltica
FOTO No. 27		FOTO No. 28	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.	UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.
COMENTARIOS:	Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 29		FOTO No. 30	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 16 entre Calles 19N y 18N. Barrio Campamento
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

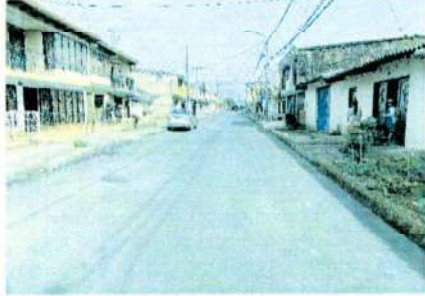
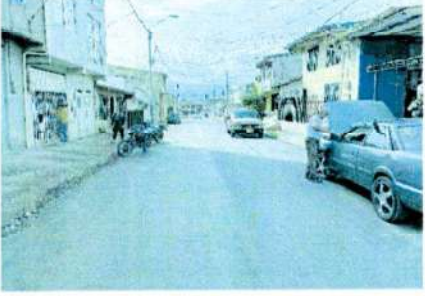
	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 31		FOTO No. 32	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 17 y 16. Barrio Campamento.	UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Barrio Campamento.
COMENTARIOS:	Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 33		FOTO No. 34	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Sector Villa Olimpica	UBICACIÓN:	Calle 18N entre Carreras 16 y 15. Sector Villa Olimpica
COMENTARIOS:	Inicio instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 35		FOTO No. 36	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia	UBICACIÓN:	Calle 15N entre Carrera 15 y acceso posterior Hospital Santa Gracia
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 37		FOTO No. 38	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro	UBICACIÓN:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
COMENTARIOS:	Terminación carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Carrera 5 entre Calles 3 y 4. Barrio Centro
FOTO No. 39		FOTO No. 40	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 7 y 6. Barrio Centro	UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 6 y 5. Barrio Centro
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 41		FOTO No. 42	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 5 y 4. Barrio Centro	UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 4 y 3. Barrio Centro
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica	COMENTARIOS:	Actividades de instalación de mezcla asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA TECNICA		
FOTO No. 43		FOTO No. 44
		
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 3 y 2. Barrio Centro	UBICACIÓN: Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS: Conformación capa de material de mejoramiento
FOTO No. 45		FOTO No. 46
		
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Control de densidades sobre capa de mejoramiento	COMENTARIOS: Instalación de Geomalla Biaxial sobre capa de mejoramiento
FOTO No. 47		FOTO No. 48
		
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Se inicia instalación de capa de Subbase Granular	COMENTARIOS: Instalación y conformación de capa de Subbase Granular

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A. Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021".	
AREA TECNICA		
FOTO No. 49		FOTO No. 50
		
FECHA DE FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Barrio Villa Docente	UBICACIÓN: Barrio Villa Docente	
COMENTARIOS: Actividades de demarcación vial con pintura en frio	COMENTARIOS: Actividades de demarcación vial con pintura en frio	
FOTO No. 51		FOTO No. 52
		
FECHA DE FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Calle 11N con Carrera 9. Barrio Santa Clara	UBICACIÓN: Barrio Villa Docente	
COMENTARIOS: Demarcación vial	COMENTARIOS: Línea de demarcación con pintura en frio	
FOTO No. 53		FOTO No. 54
		
FECHA DE FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	
UBICACIÓN: Calle 1A entre Cra. 41 y 42B	UBICACIÓN: Calle 2A entre Cra. 44 y 42	
COMENTARIOS: Recorrido en vías priorizadas Comuna 9 con el Presidente de la JAC La Maria	COMENTARIOS: Recorrido en vías priorizadas Comuna 9 con el Presidente de la JAC La Maria	

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: Contrato No.: Interventor:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A 20211600024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 20211600024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA TECNICA			
FOTO No. 55		FOTO No. 56	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación y compactación capa de subbase granular	COMENTARIOS:	Control densidades de Interventoria capa de subbase
FOTO No. 57		FOTO No. 58	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación y compactación capa de base granular	COMENTARIOS:	Imprimación para protección de capa de base granular en periodo de Semana Santa
FOTO No. 59		FOTO No. 60	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 36 entre Calles 5 y 4A, Barrio Carlos Primero (Comuna 9)	UBICACIÓN:	Carrera 36 entre Calles 5 y 4A, Barrio Carlos Primero (Comuna 9)
COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO		
			FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: <u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> Contrato No.: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> Interventor: <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 61		FOTO No. 62	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 4D entre Carreras 36 y 37. Barrio Carlos Primero	UBICACIÓN:	Calle 4D entre Carreras 36 y 37. Barrio Carlos Primero
COMENTARIOS:	Instalación mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 63		FOTO No. 64	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 4A entre Carreras 36A y 37. Barrio Carlos Primero	UBICACIÓN:	Calle 4A entre Carreras 36A y 37. Barrio Carlos Primero
COMENTARIOS:	Estado inicial vía con pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica
FOTO No. 65		FOTO No. 66	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 37 entre Calles 2 y 4A. Barrio Carlos Primero	UBICACIÓN:	Carrera 37 entre Calles 2 y 4A. Barrio Carlos Primero
COMENTARIOS:	Estado inicial vía con presencia de baches	COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRÁFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: Contrato No.: Interventor:	<u>EDIFICACIONES Y VÍAS S.A</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA TECNICA			
FOTO No. 67		FOTO No. 68	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 43 entre Calles 1A y 2. Barrio La María Occidente (Comuna 9)	UBICACIÓN:	Sector curva Carrera 41 con Calle 1. La María Occidente (Comuna 9)
COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19
FOTO No. 69		FOTO No. 70	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 1A entre Carreras 41 y 42B. Barrio La María Occidente	UBICACIÓN:	Calle 1A entre Carreras 41 y 42B. Barrio La María Occidente
COMENTARIOS:	Estado inicial vía con pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de carpeta asfáltica
FOTO No. 71		FOTO No. 72	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 41 entre Calles 1A y 2. Sector Hospital La María Occidente	UBICACIÓN:	Carrera 41 entre Calles 1A y 2. Sector Hospital La María Occidente
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

	<p align="center">ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		
Contratista: Contrato No.: Interventor:	<u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA TECNICA			
FOTO No. 73		FOTO No. 74	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 32N entre carreras 5 y 6 Barrio Yambitara	UBICACIÓN:	Calle 32N entre carreras 5 y 6 Barrio Yambitara
COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial	COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial
FOTO No. 75		FOTO No. 76	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 20N con carrera 15 Barrio Campamento	UBICACIÓN:	Carrera 16A con calle 18N Barrio La Playa
COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial	COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial
FOTO No. 77		FOTO No. 78	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 17N entre carreras 10 y 11 Barrio Antonio Nariño	UBICACIÓN:	Carrera 23 entre calles 7 y 5 Barrio Jose maria Obando
COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial	COMENTARIOS:	Pintura de línea de demarcación y marca vial

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	<u>EDIFICACIONES Y VÍAS S.A</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
ÁREA TÉCNICA		
FOTO No. 79		FOTO No. 80
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Control densidades Interventoría capa de base granular	COMENTARIOS: Aplicación de la imprimación
FOTO No. 81		FOTO No. 82
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN: Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Estado inicial vía con pavimento totalmente deteriorado	COMENTARIOS: Vía terminada con instalación de pavimento
FOTO No. 83		FOTO No. 84
		
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFÍA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 2A entre Carreras 42 y 44. Barrio Maria Occidente	UBICACIÓN: Calle 2A entre Carreras 42 y 44. Barrio Maria Occidente
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS: Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO		
			FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023
Contratista: Contrato No.: Interventor:	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		
AREA TECNICA			
FOTO No. 85		FOTO No. 86	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 48D entre Calles 1 y 2 (extremo hacia calle 2). Villa Colombia	UBICACIÓN:	Calle 2 entre Carrera 48A y 48B. Barrio Los Naranjos
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19
FOTO No. 87		FOTO No. 88	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 4 entre Carreras 42 y 41. Barrio La María Occidente	UBICACIÓN:	Intersección Calle 4 con Carrera 42. La María Occidente
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19
FOTO No. 89		FOTO No. 90	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 2 entre Carreras 43A y 44. Barrio María Occidente	UBICACIÓN:	Intersección Calle 2 con Carrera 44. Barrio María Occidente
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 REGISTRO FOTOGRAFICO	 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023	
Contratista: Contrato No.: Interventor:	<u>EDIFICACIONES Y VIAS S.A</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> <u>20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>	Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".	
AREA TECNICA			
FOTO No. 91		FOTO No. 92	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos	UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos
COMENTARIOS:	Fresado e instalación de imprimación	COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19
FOTO No. 93		FOTO No. 94	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos	UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos
COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19 parches puntuales
FOTO No. 95		FOTO No. 96	
			
FECHA DE FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023	FECHA FOTOGRAFIA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos	UBICACIÓN:	Intersección Variante Norte Popayán y Carrera 17 Sector Entrepinos
COMENTARIOS:	fresado e imprimación	COMENTARIOS:	Instalación carpeta asfáltica MDC-19
