

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPE MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UPI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE DICIEMBRE DE 2021
PRIORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRIORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRIORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRIORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.284.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,33%
% DE AVANCE ACUMULADO	59,91%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
01	OBRAS PRELIMINARES				\$ 214.839.820,00								
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER 7192501)	MES	7,00	\$4.872.830	\$ 34.109.810,00	16,00	\$77.965.280,00	15,00	\$ 73.092.450,00	1,00	\$ 4.872.830,00	16,00	\$ 77.965.280,00
CM-01	COMISION TOPOGRAFICA GENERAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LAYOHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL	MES	7,00	\$8.848.570	\$ 61.939.990,00	32,00	\$283.154.240,00	23,50	\$ 207.941.395,00	1,00	\$ 8.848.570,00	24,50	\$ 216.789.965,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POUSOMBRA) CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACIONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACIONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTI LLABA Y AMARRADA A LOS POSTES	ML	1.724,00	\$21.990	\$ 37.910.760,00	1.724,00	\$37.910.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECANICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	9.380,00	\$8.280	\$ 77.666.400,00	9380,00	\$77.666.400,00	975,84	\$ 8.079.980,04		\$ -	975,84	\$ 8.079.980,04
3819	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA	UND	1,00	\$3.212.960,00	\$ 3.212.960,00	1,00	\$3.212.960,00	1,00	\$ 3.212.960,00		\$ -	1,00	\$ 3.212.960,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	3.694,63	\$23.460	\$ 86.616.813,59	3694,63	\$86.616.813,59		\$ -		\$ -		\$ -
3918	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3.590,25	\$86.420	\$ 309.109.405,00	3590,25	\$483.109.405,00		\$ -		\$ -		\$ -
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	918,41	\$112.560	\$ 103.627.429,60	938,41	\$105.627.429,60		\$ -		\$ -		\$ -
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	902,68	\$137.040	\$ 123.676.186,80	902,68	\$123.676.186,80		\$ -		\$ -		\$ -
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	617,32	\$1.133.970	\$ 699.991.494,40	617,32	\$699.991.494,40		\$ -		\$ -		\$ -
03	PILOTAJE EN MADERA				\$ 28.957.756.216,70								
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACION PILOTE DIAMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	9.971,27	\$817.300	\$ 8.149.518.971,00	7911,17	\$6.466.454.211,45	6739,04	\$ 5.507.817.382,00	84,00	\$ 68.653.200,00	6823,04	\$ 5.576.470.592,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACION PILOTE DIAMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	3.765,05	\$961.780	\$ 3.621.149.789,00	10397,51	\$10.000.501.879,80	9574,63	\$ 9.208.687.641,40	95,30	\$ 91.657.634,00	9669,93	\$ 9.300.345.275,40
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACION AFROSTRAMIENTOS D15	ML	12.731,74	\$313.180	\$ 3.986.435.111,40	6338,17	\$1.984.541.408,70	3469,60	\$ 1.148.988.456,00	475,20	\$ 148.789.872,00	4344,80	\$ 1.297.778.328,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACION AFROSTRAMIENTOS D17	ML	23.232,58	\$357.285	\$ 8.300.652.345,30	6132,69	\$2.390.903.775,65	4335,40	\$ 1.548.973.389,00	646,60	\$ 231.020.481,00	49812,00	\$ 1.779.993.870,00
06	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA				\$ 13.527.797.851,80								
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA LAMINADA CCA DEC30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	8.120,59	\$478.270	\$ 3.883.834.579,30	6151,54	\$2.942.288.343,80	4639,63	\$ 2.218.995.840,10	330,11	\$ 157.881.708,70	4969,74	\$ 2.376.877.549,80
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA LAMINADA CCA DEC36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	2.871,06	\$560.600	\$ 1.609.516.236,00	4123,44	\$2.311.600.464,00	3483,63	\$ 1.952.922.978,00		\$ -	3483,63	\$ 1.952.922.978,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPISO - SECCION CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTON DE DECK	M2	2.255,45	\$971.650	\$ 2.191.507.992,50	1737,43	\$1.688.173.859,50	224,63	\$ 218.261.789,50	46,95	\$ 45.618.967,50	271,58	\$ 263.880.707,00
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPISO - SECCION RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTON DE DECK	M2	6.952,90	\$840.360	\$ 5.842.939.044,00	8678,17	\$7.292.788.941,20	6038,79	\$ 5.074.757.564,40	484,99	\$ 575.638.196,40	6723,78	\$ 5.650.395.760,80
05	BARRANDAS EN MADERA				\$ 2.845.609.316,80								
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACION BARRANDA - SECCION CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	308,20	\$845.480	\$ 260.576.936,00	754,38	\$637.813.202,40	113,82	\$ 96.232.533,60	15,88	\$ 13.426.222,40	129,70	\$ 109.658.756,00
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACION BARRANDA - SECCION RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	3.159,80	\$818.100	\$ 2.585.032.380,00	3589,85	\$2.936.856.285,00	2170,58	\$ 1.857.561.488,00	260,42	\$ 213.049.602,00	2513,00	\$ 2.070.611.100,00
05	EDIFICACIONES EN MADERA				\$ 6.382.825.990,80								
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACION MUÑO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	936,00	\$1.582.470	\$ 1.481.191.920,00	606,39	\$959.599.983,30	476,34	\$ 753.799.759,80		\$ -	476,34	\$ 753.799.759,80
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEL MUÑO EXTERIOR	M1	70,00	\$244.270	\$ 17.098.900,00	29,19	\$7.830.241,30	15,60	\$ 3.810.612,00		\$ -	15,60	\$ 3.810.612,00
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACION VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	111,00	\$674.540	\$ 74.873.940,80	376,61	\$254.038.509,40	248,76	\$ 167.796.570,40		\$ -	248,76	\$ 167.796.570,40
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ESTRUCTURAL MUÑO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	87,00	\$241.180	\$ 20.982.660,00	545,49	\$131.561.278,20	263,34	\$ 63.512.341,20		\$ -	263,34	\$ 63.512.341,20

Dici

Des

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	27,00	\$175.730	\$ 4.744.710,00	22,30	\$3.918.779,00	18,62	\$ 3.272.091,60		\$ -	18,62	\$ 3.272.091,60
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	629,00	\$86.570	\$ 54.452.530,00	545,18	\$47.196.232,60		\$ -		\$ -		\$ -
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	629,00	\$112.810	\$ 70.957.490,00	545,18	\$61.501.755,80		\$ -		\$ -		\$ -
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	335,50	\$2.011.190	\$ 674.754.245,00	305,28	\$613.976.083,20	235,28	\$ 473.192.783,20		\$ -	235,28	\$ 473.192.783,20
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	710,00	\$1.208.560	\$ 858.077.600,00	542,87	\$656.090.967,20	337,00	\$ 407.284.720,00	34,19	\$ 41.320.666,40	371,19	\$ 448.605.386,40
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	3.309,00	\$759.880	\$ 2.514.442.920,00	2736,45	\$2.079.373.626,00	1111,06	\$ 844.272.272,80	707,62	\$ 537.706.285,60	1818,68	\$ 1.381.978.558,40
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	1.697,50	\$359.970	\$ 611.049.075,00	1697,50	\$611.049.075,00		\$ -		\$ -		\$ -
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 736.059.539,40								
7.1	CEMENTACIONES												
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA	M3	28,35	\$34.750	\$ 985.162,50	28,35	\$985.162,50		\$ -		\$ -		\$ -
398	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,70	\$86.420	\$ 924.694,00	10,70	\$924.694,00		\$ -		\$ -		\$ -
3201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	28,95	\$481.690	\$ 13.944.925,50	28,95	\$13.944.925,50		\$ -		\$ -		\$ -
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	41,05	\$475.260	\$ 19.509.423,00	41,05	\$19.509.423,00		\$ -		\$ -		\$ -
7652	VIGA DE CEMENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	70,70	\$617.220	\$ 43.637.454,00	70,70	\$43.637.454,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	9,10	\$467.470	\$ 4.253.977,00	9,10	\$4.253.977,00		\$ -		\$ -		\$ -
2677	CEMENTO EN CONCRETO CICLOPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLOPEA	M3	61,55	\$229.160	\$ 14.104.798,00	61,55	\$14.104.798,00		\$ -		\$ -		\$ -
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	51,48	\$675.770	\$ 34.788.639,60	51,48	\$34.788.639,60		\$ -		\$ -		\$ -
7.2	ESTRUCTURA												
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	28,00	\$ 829.330,00	\$ 23.221.240,00	28,00	\$23.221.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,05	\$ 790.210,00	\$ 2.410.140,50	3,05	\$2.410.140,50		\$ -		\$ -		\$ -
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	38,00	\$127.830	\$ 4.857.540,00	38,00	\$4.857.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	80,35	\$30.050	\$ 2.414.517,50	80,35	\$2.414.517,50		\$ -		\$ -		\$ -
7.3	TANQUE												
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F'C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	216,50	\$1.016.570	\$ 220.087.405,00	216,50	\$220.087.405,00		\$ -		\$ -		\$ -
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL O SIMILAR.	M2	568,76	\$31.480	\$ 17.904.564,80	568,76	\$17.904.564,80		\$ -		\$ -		\$ -
7.4	ACERO DE REFUERZO												
7610	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	49.703,74	\$6.700	\$ 333.015.058,00	49703,74	\$333.015.058,00		\$ -		\$ -		\$ -
08	MAMPONERÍA Y ACABADOS				\$ 160.884.529,20								
8.1	LISTONES EN MADERA												
8.2	MESONES												
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	4,00	\$8.960.100	\$ 35.840.400,00	4,00	\$35.840.400,00		\$ -		\$ -		\$ -

D-24
Jus

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3.3M X 0.65 M X 0.012 M.	UND	1,00	\$8.259.560	\$ 8.259.560,00	1,00	\$8.259.560,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0.56 M X 0.60 M X 0.012 M.	UND	3,00	\$2.587.220	\$ 7.761.660,00	3,00	\$7.761.660,00		\$ -		\$ -		\$ -
8.3	MUROS MAMPOSTERÍA												
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	240,00	\$42.440	\$ 10.185.600,00	240,00	\$10.185.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
8.4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS												
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	237,60	\$66.100	\$ 15.705.360,00	237,60	\$15.705.360,00		\$ -		\$ -		\$ -
8.5	ACABADOS SOBRE MUROS												
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	480,00	\$18.390	\$ 8.827.200,00	480,00	\$8.827.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	58,76	\$21.170	\$ 1.243.949,20	58,76	\$1.243.949,20		\$ -		\$ -		\$ -
432	ESTUCCO PLÁSTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	480,00	\$9.770	\$ 4.689.600,00	480,00	\$4.689.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	480,00	\$12.400	\$ 5.952.000,00	480,00	\$5.952.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	240,00	\$260.080	\$ 62.419.200,00	240,00	\$62.419.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
09	PISOS Y ENCHAPES				\$ 299.968.031,40								
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	293,76	\$590.490	\$ 173.462.342,40	293,76	\$173.462.342,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM. JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	75,00	\$86.820	\$ 6.511.500,00	75,00	\$6.511.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	87,00	\$25.110	\$ 2.184.570,00	87,00	\$2.184.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	76,74	\$362.830	\$ 27.843.574,20	76,74	\$27.843.574,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	116,61	\$375.020	\$ 43.731.082,20	116,61	\$43.731.082,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	205,86	\$206.050	\$ 42.417.453,00	205,86	\$42.417.453,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KUPEN O SIMILAR	M2	12,36	\$308.860	\$ 3.817.509,60	12,36	\$3.817.509,60		\$ -		\$ -		\$ -
10	CIELOS RASOS				\$ 8.537.550,60								
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	76,74	\$33.700	\$ 2.586.138,00	76,74	\$2.586.138,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	205,86	\$28.910	\$ 5.951.412,60	205,86	\$5.951.412,60		\$ -		\$ -		\$ -
11	PAVIMENTOS Y ANDENES				\$ 685.398.692,00								
5759	EDU. TRITURADO [VER DISEÑO]	M3	235,30	\$97.590	\$ 22.962.927,00	235,30	\$22.962.927,00		\$ -		\$ -		\$ -
8095	PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC - 25	M3	295,26	\$772.540	\$ 228.100.160,40	295,26	\$228.100.160,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-38	CONCRETO ASFÁLTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	129,15	\$749.740	\$ 96.828.921,00	129,15	\$96.828.921,00		\$ -		\$ -		\$ -
4742	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN LOSETAS PREPULIDA USA, TÁCTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS. INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI [VER DISEÑO]	M2	1.610,18	\$130.020	\$ 209.355.603,60	1610,18	\$209.355.603,60		\$ -		\$ -		\$ -

DMZ
JCO

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-S41-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUIA TIPO A S8. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 200X200X60MS.	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 200X200X60MS.	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
3872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS	UND	24,00	\$85.900	\$ 2.061.600,00	24,00	\$2.061.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
1752	DEMARCAÇÃO CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	1.857,90	\$2.880	\$ 5.350.752,00	1857,90	\$5.350.752,00		\$ -		\$ -		\$ -
125	BORDELLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.30 MTS	ML	1.857,90	\$51.840	\$ 96.313.536,00	1857,90	\$96.313.536,00		\$ -		\$ -		\$ -
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 76.091.823,20								
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	7,00	\$179.650	\$ 1.257.550,00	7,00	\$1.257.550,00		\$ -		\$ -		\$ -
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	13,00	\$141.450	\$ 1.838.850,00	13,00	\$1.838.850,00		\$ -		\$ -		\$ -
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	19,00	\$166.550	\$ 3.164.450,00	19,00	\$3.164.450,00		\$ -		\$ -		\$ -
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO S1A TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	6,00	\$831.580	\$ 4.989.480,00	6,00	\$4.989.480,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	\$430.480	\$ 860.960,00	2,00	\$860.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	2,00	\$141.480	\$ 282.960,00	2,00	\$282.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,00	\$1.603.060	\$ 6.412.240,00	4,00	\$6.412.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	6,00	\$352.680	\$ 2.116.080,00	6,00	\$2.116.080,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA, COLOR BLANCO	UND	11,00	\$1.041.250	\$ 11.453.750,00	11,00	\$11.453.750,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	2,00	\$1.047.250	\$ 2.094.500,00	2,00	\$2.094.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LINEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	19,00	\$239.090	\$ 4.541.570,00	19,00	\$4.541.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VIAL 558 O SIMILAR	UND	9,00	\$420.100	\$ 3.780.900,00	9,00	\$3.780.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	5,76	\$98.040	\$ 564.710,40	5,76	\$564.710,40		\$ -		\$ -		\$ -

OAS
 Juan

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	29,72	\$634.260	\$ 18.850.207,20		29,72	\$18.850.207,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	2,16	\$612.910	\$ 1.323.885,60		2,16	\$1.323.885,60		\$ -		\$ -		\$ -
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPE. TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA.	UND	4,00	\$2.753.660	\$ 11.014.640,00		4,00	\$11.014.640,00		\$ -		\$ -		\$ -
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	2,00	\$192.420	\$ 384.840,00		2,00	\$384.840,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAIDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	13,00	\$89.250	\$ 1.160.250,00		13,00	\$1.160.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
13	URBANISMO Y EXTERIORES				\$ 25.666.630,00									
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES, FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	15,00	\$1.536.260	\$ 23.043.900,00		15,00	\$23.043.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPADO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	11,00	\$238.430	\$ 2.622.730,00		11,00	\$2.622.730,00		\$ -		\$ -		\$ -
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BCI				\$ 1.700.000.000,00									
14.00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	\$1.700.000.000	\$ 1.700.000.000,00		1,00	\$1.700.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1	3300000000	\$ 3.300.000.000,00									
15.1	SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL													
15.1.1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en cielo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -		159,00	\$44.995.092,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -		38,00	\$10.753.544,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.3	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en pisos de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -		78,00	\$22.073.064,00		\$ -		\$ -		\$ -

Des
fuer

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTE	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$492.196	\$ -	-	794,00	\$390.803.624,00		\$ -	57,40	\$ 28.252.050,40	57,40	\$ 28.252.050,40
15.1.5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$72.690	\$ -	-	2260,00	\$164.279.400,00		\$ -	484,11	\$ 35.189.955,90	484,11	\$ 35.189.955,90
15.1.6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$137.058	\$ -	-	1655,00	\$226.830.990,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHPCL de 3M	UND	0,00	\$1.111.743	\$ -	-	11,00	\$12.229.173,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	0,00	\$54.106	\$ -	-	230,00	\$12.444.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.9	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$169.870	\$ -	-	29,00	\$4.926.230,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.10	Suministro e instalacion de salida para interruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$194.917	\$ -	-	1,00	\$194.917,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$258.231	\$ -	-	14,00	\$3.615.234,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UNG	0,00	\$675.253	\$ -	-	6,00	\$4.051.518,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N. 10(T) IN UPS	UND	0,00	\$530.543	\$ -	-	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N. 10(T) OUT UPS	UND	0,00	\$530.543	\$ -	-	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -

DNA

Busca

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.15	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$111.231	\$ -		47,00	\$5.227.857,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.16	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), IN UPS.	UND	0,00	\$350.909	\$ -		2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.17	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), OUT UPS.	UND	0,00	\$350.909	\$ -		2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.18	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$54.559	\$ -		20,00	\$1.091.180,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.19	Suministro e instalación de salida para extractor en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$374.266	\$ -		7,00	\$2.619.862,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.20	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de extractores en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$55.097	\$ -		73,00	\$4.022.081,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.21	Suministro e instalación de salida para evaporador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$379.618	\$ -		6,00	\$2.277.708,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.22	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$399.576	\$ -		2,00	\$799.152,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.23	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$431.223	\$ -		3,00	\$1.293.669,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.24	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$63.698	\$ -		50,00	\$3.184.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.25	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), soportera por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$64.672	\$ -		75,00	\$4.850.400,00		\$ -		\$ -		\$ -

DMG
Barr

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA. (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTE	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$205.664	\$ -	5,00	\$1.028.320,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$56.071	\$ -	85,00	\$4.766.035,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$215.948	\$ -	59,00	\$12.740.932,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$322.907	\$ -	12,00	\$3.874.884,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$246.170	\$ -	28,00	\$6.892.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES												
15.2.1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$678.689	\$ -	6,00	\$4.072.134,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2.2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$1.339.110	\$ -	3,00	\$4.017.330,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2.3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$292.204	\$ -	2,00	\$584.408,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2.4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$536.546	\$ -	2,00	\$1.073.092,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2.5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagnéticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$34.197	\$ -	60,00	\$2.051.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2.6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagnéticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	0,00	\$34.197	\$ -	5,00	\$170.985,00		\$ -		\$ -		\$ -

DM
Bor

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.2,7	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 666.656	\$ -	12,00	\$ 799.872,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,8	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 666.656	\$ -	5,00	\$ 333.280,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,9	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 666.656	\$ -	2,00	\$ 133.312,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,10	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 141.815	\$ -	5,00	\$ 709.075,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,11	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 141.815	\$ -	15,00	\$ 2.127.225,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,12	Suministro e instalación de UPS trifásica 3KVA - 220VAC	UND	0,00	\$ 7.364.041	\$ -	2,00	\$ 14.728.082,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,13	Suministro e instalación de UPS trifásica 10KVA - 220VAC	UND	0,00	\$ 42.117.991	\$ -	2,00	\$ 84.235.982,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3	LUMINARIAS Y POSTES												
15.3,1	Suministro e instalación de luminaria LED de sobrepasar circular. Grado de protección IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminaria 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. Coral Line 400x120mm o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 926.575,00	\$ -	113,00	\$ 104.702.975,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,2	Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de sobrepasar. Grado Protección IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminaria 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplástico inyectado. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. ALHABOOL o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 281.439,00	\$ -	20,00	\$ 5.628.780,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,3	Suministro e instalación de luminaria LED hermética de sobrepasar. Grado Protección IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminaria 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 689.318,00	\$ -	26,00	\$ 17.922.268,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,4	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 65. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminaria 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. Sculpture o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 8.631.747,00	\$ -	38,00	\$ 328.006.386,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,5	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 65. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminaria 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. InclLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 1.720.345,00	\$ -	794,00	\$ 1.365.953.930,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,6	Suministro e instalación de luminaria LED de alumbrado público. Grado Protección IP65. Potencia Nominal 108W. Eficiencia luminaria 14805lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schneider Ref. Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.022.718,00	\$ -	22,00	\$ 66.499.796,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,7	Suministro e instalación de poste de polestar reforzado en fibra de vidrio. Referencia Simetra -510KG. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial liso uniforme. Incluye brazo sencillo de 1m5 para montaje de luminaria. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.177.507,00	\$ -	11,00	\$ 34.952.577,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3,8	Suministro e instalación de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de protección IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminaria 500lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. Balcón139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.542.806,00	\$ -	78,00	\$ 276.338.868,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION												
15.4,1	Suministro e instalación de alimentador en 3N 250F+N 250N+N 2:OT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribución CDD-1 hasta transformador seco 150KVA - Tablero de Distribución CDD-1 hasta motogenerador 150 KVA	ML	0,00	\$ 810.324,00	\$ -	25,00	\$ 20.258.100,00		\$ -		\$ -		\$ -

DM
Jaco

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTE	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE NOVIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,32%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	LIN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.4.2	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribución CGD-2 - Transformador 30 KVA (B4460VAC).	ML	0,00	\$ 93.781,00	\$ -		10,00	\$937.810,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.3	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 8T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (B4460VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-3.	ML	0,00	\$ 418.076,00	\$ -		5,00	\$2.090.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.4	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 8N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-2 hasta PP-SUB.	ML	0,00	\$ 83.354,00	\$ -		10,00	\$833.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.5	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-2 hasta PP-EST-8.	ML	0,00	\$ 103.782,00	\$ -		70,00	\$7.264.740,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.6	Suministro e instalación de alimentador en 3N 40F+N 40N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-2 hasta PP-PP-PARQ.	ML	0,00	\$ 128.455,00	\$ -		170,00	\$21.837.350,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.7	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE.	ML	0,00	\$ 92.978,00	\$ -		80,00	\$7.438.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.8	Suministro e instalación de alimentador en 2x(3N 500F+2N 500N+N 8T). Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribución CGD-3 - Transformador 30 KVA (B4460VAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -		670,00	\$370.350.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.9	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (B4460VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-3.	ML	0,00	\$ 95.164,00	\$ -		5,00	\$475.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.10	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 8T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (B4460VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-3.	ML	0,00	\$ 417.849,00	\$ -		5,00	\$2.089.245,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.11	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 8N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-LOCAL-1.	ML	0,00	\$ 84.141,00	\$ -		10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.12	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 8N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-LOCAL-2.	ML	0,00	\$ 83.801,00	\$ -		15,00	\$1.257.015,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.13	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 8N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-GR-P.	ML	0,00	\$ 84.141,00	\$ -		10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.4.14	Suministro e instalación de alimentador en 2x(3N 500F+2N 500N+N 8T). Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribución CGD-4 - Transformador 45 KVA (B4460VAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -		450,00	\$248.742.900,00		\$ -		\$ -		\$ -

DDA
JCO

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-543-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UPI DISTRITO FAMILIA EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE ENERO DE 2022
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 62.464.254.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	9,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,81%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.A.15	Transformador de 150 KVA (OUT), CSD-4. Suministro e instalación de transformador en 3x 100F+4 100+4 100F. Incluye terminales de compresión NOTA: Construcción de cable con aislamiento Therm-Therm-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CSD-4 - Transformador de 150 KVA (OUT) (BARRIO).	ML	0,00	\$ 417.849,00	\$ -	5,00	\$ 2.089.245,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.16	Suministro e instalación de alimentador en 3x 50F+4 50+4 100F. Incluye terminales de compresión NOTA: Construcción de cable con aislamiento Therm-Therm-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CSD-4 hasta PP-ALCAL-3.	ML	0,00	\$ 116.505,00	\$ -	20,00	\$ 2.330.100,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.17	Suministro e instalación de alimentador en 3x 50F+4 50+4 100F. Incluye terminales de compresión NOTA: Construcción de cable con aislamiento Therm-Therm-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CSD-4 hasta PP-ALCAL-4.	ML	0,00	\$ 117.458,00	\$ -	25,00	\$ 2.936.475,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.18	Suministro e instalación de alimentador en 3x 50F+4 50+4 100F. Incluye terminales de compresión NOTA: Construcción de cable con aislamiento Therm-Therm-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CSD-4 hasta PP-BIG-0.	ML	0,00	\$ 117.247,00	\$ -	10,00	\$ 1.172.470,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.19	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1" incluye excavación, tubería y empalmes.	ML	0,00	\$ 42.995,00	\$ -	140,00	\$ 6.019.300,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.20	Suministro e instalación de tubería PVC A de 2" incluye excavación, tubería y empalmes.	ML	0,00	\$ 124.140,00	\$ -	150,00	\$ 18.621.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.21	Suministro e instalación de tubería PVC A de 3" incluye excavación, tubería y empalmes.	ML	0,00	\$ 86.276,00	\$ -	195,00	\$ 16.823.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.22	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40. Incluye tubería de 1" incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varilla rosca galvanizada en caliente.	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	90,00	\$ 3.506.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.23	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40. Incluye tubería de 2" incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varilla rosca galvanizada en caliente.	ML	0,00	\$ 232.830,00	\$ -	2360,00	\$ 549.478.800,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.24	Suministro e instalación de caja de paso de fabricación especial en acero inoxidable de 1000x1000, incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varilla rosca galvanizada en caliente.	UND	0,00	\$ 6.370.585,00	\$ -	41,00	\$ 261.193.985,00		\$ -	4,00	\$ 25.482.340,00	4,00	\$ 25.482.340,00
15.A.25	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1-1/2" incluye excavación, tubería y empalmes.	ML	0,00	\$ 50.693,00	\$ -	400,00	\$ 20.277.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.26	Construcción de caja de inspección 600x600. Incluye tubería de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	UND	0,00	\$ 3.590.347,00	\$ -	18,00	\$ 64.626.444,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.A.27	Suministro e instalación de alimentador en 3x 500F+4 500+4 100F. Incluye terminales de compresión NOTA: Construcción de alambre con aislamiento Therm-Therm-2. Alimentador para recorrido desde transformador hasta Tablero de Control de Energía. Alimentador para recorrido desde subestación hasta Tablero de Control de Energía.	ML	0,00	\$ 261.814,00	\$ -	400,00	\$ 104.725.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3	PUNTO DE CONEXIÓN RED DE TENDIDO												
15.3.1	Suministro e instalación de alambre de aluminio 120x100mm. Incluye transporte y empalmes.	UND	0,00	\$ 3.888.033,00	\$ -	1,00	\$ 3.888.033,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.2	Suministro e instalación de crucetas, herrajes y accesorios para montaje de alambres en postes de distribución.	UND	0,00	\$ 3.475.261,00	\$ -	1,00	\$ 3.475.261,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.3	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para punto de conexión. Incluye tubería de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	UND	0,00	\$ 1.532.928,00	\$ -	1,00	\$ 1.532.928,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.4	Suministro e instalación de sistema de equipamiento de medio tensión. Incluye tubería de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	UND	0,00	\$ 43.602.847,00	\$ -	1,00	\$ 43.602.847,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.5	Suministro e instalación de protecciones de medio tensión. Incluye tubería de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	UND	0,00	\$ 6.035.808,00	\$ -	1,00	\$ 6.035.808,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.6	Suministro e instalación de cableado de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	ML	0,00	\$ 872.351,00	\$ -	6,00	\$ 5.234.118,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.3.7	Suministro e instalación de cableado de 1/2" a 3/4" de 0.80 m. A 0.8 m en profundidad en concreto armado de 3000PSI con un nivel de piso terminado. Tapa en acero inoxidable 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 1/2".	ML	0,00	\$ 222.858,00	\$ -	80,00	\$ 17.828.640,00		\$ -		\$ -		\$ -

024
JCO

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tuberia PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y seccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via	ML	0,00	\$ 584.600,00	\$ -	52,00	\$30.399.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.5,9	Construccion de caja de inspeccion SB300. Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16" Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	0,00	\$ 6.471.668,00	\$ -	4,00	\$25.886.672,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexi3n hasta Subestacion Principal)	ML	0,00	\$ 379.207,00	\$ -	92,00	\$34.887.044,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldados para uso exterior (instalacion en punto de conexi3n)	UND	0,00	\$ 742.245,00	\$ -	3,00	\$2.226.735,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldados para uso interior (instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	0,00	\$ 667.910,00	\$ -	6,00	\$4.007.460,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.5,13	Suministro e instalacion de puestas en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	0,00	\$ 210.477,00	\$ -	6,00	\$1.262.862,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA: CELDAS MEDIA TENSI3N, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS												
15.6,1	Suministro e instalacion de celda de remorte autoaportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrolitica. Grado Proteccion IP 20. Incluye barra de tierra. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 5.536.051,00	\$ -	1,00	\$5.536.051,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operaci3n bajo carga 630Amp en SF6. Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexi3n superior 630Amp, indicador de presen- cia de tensi3n, varillaje para disparo tripolar por fusi3n. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 45.040.230,00	\$ -	1,00	\$45.040.230,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16. Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 12.686.661,00	\$ -	1,00	\$12.686.661,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200V-480V incluye DPS 15 KV, sistema de ventilaci3n forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 80.684.147,00	\$ -	1,00	\$80.684.147,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribuci3n N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrolitica (CGD-1), equipamiento segun diagrama unifilar. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 31.601.409,00	\$ -	1,00	\$31.601.409,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribuci3n N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrolitica (CGD-2), equipamiento segun diagrama unifilar. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 7.988.534,00	\$ -	1,00	\$7.988.534,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribuci3n N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrolitica (CGD-3), equipamiento segun diagrama unifilar. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Graderias Playa)	UND	0,00	\$ 12.949.660,00	\$ -	1,00	\$12.949.660,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribuci3n N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrolitica (CGD-4), equipamiento segun diagrama unifilar. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	0,00	\$ 12.544.197,00	\$ -	1,00	\$12.544.197,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrolitica para albergar al banco de condensadores 30 KVAR (5 pesos moviles de 5 KVAR cada uno) segun diagrama unifilar. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 18.573.236,00	\$ -	1,00	\$18.573.236,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 480/208-120V clase H, incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Graderias Playa y Subestacion Principal)	UND	0,00	\$ 17.464.412,00	\$ -	1,00	\$17.464.412,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 480/208-120V clase H, incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificaci3n RETE. (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	0,00	\$ 21.837.617,00	\$ -	2,00	\$43.675.234,00		\$ -		\$ -		\$ -

ONG
Barranquilla

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.254.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,12	Suministro e instalación de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 480 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitación. Incluye breaker totalizador, silenciador tipo crítico, baterías de servicio pesado, soporte antivibratorio, tanque de combustible para 7 horas de autonomía. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 221.449.346,00	\$ -	1,00	\$221.449.346,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,13	Suministro e instalación de tablero de transferencia bomba contra incendio, lemnis galvanizada calibre 15 y puesta electrostática, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 22.464.729,00	\$ -	1,00	\$22.464.729,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,14	Suministro e instalación de tablero de agua potable en lemnis galvanizada y puesta electrostática, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 9.032.863,00	\$ -	1,00	\$9.032.863,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
15,7,1	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra disposición cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2,4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotérmica, registro de inspección. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	0,00	\$ 7.631.633,00	\$ -	3,00	\$22.894.899,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,2	Suministro e instalación de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electroplateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte: aisladores, tornillos, bujes y arandelas (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	0,00	\$ 889.710,00	\$ -	3,00	\$2.669.130,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,3	Suministro e instalación de línea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)	ML	0,00	\$ 95.718,00	\$ -	200,00	\$19.143.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,4	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporte por medio de perfil estructural y grapa perpendicular (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	200,00	\$7.792.800,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,5	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 188.235,00	\$ -	6,00	\$1.129.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,6	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 169.891,00	\$ -	2,00	\$339.782,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS												
15,8,1	Suministro e instalación de punto de energía aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12M/750KGF. - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Batería Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tornacorreinte tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40. - Soportes y herrajes.	UND	0,00	\$ 16.909.244,00	\$ -	6,00	\$101.455.464,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8,2	Construcción de caja de inspección SB325, Medidas 0,72 m x 0,86 m x 0,9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4".	UND	0,00	\$ 3.530.841,00	\$ -	6,00	\$21.185.046,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS												
15,9,1	Servicio de inspección RETIE. Distribución para redes de media tensión, subestación eléctrica, UFI, Fija.	GL	0,00	\$ 23.120.625,00	\$ -	1,00	\$23.120.625,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,2	Servicio de inspección RETILAP para iluminación interior / exterior	GL	0,00	\$ 36.506.250,00	\$ -	1,00	\$36.506.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,3	Servicio de pagos para trámites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobación de diseño eléctrico, revisión de materiales, descargo de energización.	GL	0,00	\$ 6.690.135,00	\$ -	1,00	\$6.690.135,00		\$ -		\$ -		\$ -
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS												
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$ 3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS												
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$ 3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN												
18,00	SEÑALIZACIÓN	GLB	1	\$9.471.000	\$ 9.471.000,00	1	\$9.471.000,00		\$ -		\$ -		\$ -

DRS

[Firma]

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIÓNES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE ABRIL DE 2023
PERÍODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.664.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,52%
% DE AVANCE ACUMULADO	53,91%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
19	PROVISIONES				\$ 1.304.261.390,00								
19.01	PMA	GLB	1	\$ 663.125.000	\$ 663.125.000,00	1	\$ 663.125.000,00	0,1814	\$ 171.502.963,04	0,00449	\$ 2.972.000,04	0,18589	\$ 124.540.963,08
19.02	PMT	GLB	1	\$ 65.700.505	\$ 65.700.505,00	1	\$ 65.700.505,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.03	CERTIFICACIONES REZE Y RETILAP (TRAANTES ANTE OPERADOR DE REZE)	GLB	1	\$ 22.419.600	\$ 22.419.600,00	1	\$ 22.419.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.04	TOTEMES DE INFORMACIÓN	UNO	10	\$ 86.870.000	\$ 868.700.000,00	10	\$ 868.700.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.05	PROVISIÓN PUERTAS Y VENTANAS	GLB	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000,00	1	\$ 400.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	1	\$ 67.146.784	\$ 67.146.784,00	1	\$ 67.146.784,00		\$ -		\$ -		\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 63.434.048.707,60		\$ 63.434.048.707,60		\$ 31.864.033.332,08		\$ 2.236.380.583,34		\$ 34.196.413.515,42
ADMINISTRACIÓN					20,00%		\$ 12.686.809.341,54		\$ 6.392.806.385,42		\$ 446.076.116,07		\$ 6.838.882.501,09
IMPUESTOS					5,00%		\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.598.201.596,61		\$ 111.519.029,17		\$ 3.709.720.625,76
UTILIDAD					5,00%		\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.598.201.596,61		\$ 111.519.029,17		\$ 3.709.720.625,76
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					\$ 82.664.264.620,00		\$ 82.664.264.620,00		\$ 41.553.343.581,72		\$ 2.899.494.758,35		\$ 44.452.738.270,07

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atórnica al décimo (10) día del mes de abril de 2023.


ROBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
CONTRATISTA


DIEGO ROLDÁN ALZATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR SA


RAFAEL LAPORT DE SALAS
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR


PEDRO AMFONDO GUTIÉRREZ VIESCA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
INTERVENITOR


ANGELLA LORA
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR SA



PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-541-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CAÑIBE SA (EDURCAI SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UF3 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF3 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.364.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	30 DE ABRIL DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
03	OBRAS PRELIMINARES	\$ 623.882.582,00	\$ 197.061.267,05	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 61.891.484,10	\$ 61.891.484,10
03	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$ 1.948.804.815,63		\$ 97.440.240,78	\$ 194.880.481,56	\$ 97.440.240,78	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 311.808.770,50	\$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	\$ 26.895.525.568,38	\$ 14.369.221.205,54	\$ 1.495.908.522,33	\$ 1.495.908.522,33	\$ 1.745.226.609,18	\$ 1.745.226.609,18	\$ 1.869.885.652,91	\$ 1.869.885.652,91	\$ 2.491.180.870,54			
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	\$ 18.505.304.491,05	\$ 2.595.277.372,61	\$ 954.801.827,11	\$ 1.279.802.189,48	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 2.068.303.525,40	\$ 2.068.303.525,40
05	BARRANDAS EN MADERA	\$ 4.847.070.333,62				\$ 278.814.225,02	\$ 464.707.033,36	\$ 650.585.846,71	\$ 650.585.846,71	\$ 743.533.253,38	\$ 743.533.253,38	\$ 1.115.296.880,07	\$ 1.115.296.880,07
06	EDIFICACIONES EN MADERA	\$ 7.883.059.490,30			\$ 353.653.984,52	\$ 705.305.969,03	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84	\$ 916.897.759,74	\$ 916.897.759,74	\$ 916.897.759,74	\$ 1.410.611.938,06	\$ 1.057.958.951,55
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 954.877.482,22			\$ 47.843.870,06	\$ 47.843.870,06	\$ 66.981.418,09	\$ 124.394.062,16	\$ 124.394.062,16	\$ 124.394.062,16	\$ 124.394.062,16	\$ 133.962.836,17	\$ 162.669.158,21
08	RAMPOSTERIA Y ACABADOS	\$ 209.149.887,96					\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66	\$ 34.858.314,66
08	PSOS Y ENCHAPES	\$ 389.958.440,82					\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47
08	OJOS RASOS	\$ 11.098.815,78					\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63
11	PAVIMENTOS Y ANILLOS	\$ 891.018.299,60			\$ 44.550.914,98	\$ 44.550.914,98	\$ 62.371.280,97	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 124.742.561,94	\$ 151.473.110,93
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 98.935.378,14										\$ 32.973.123,39	\$ 32.973.123,39
12	URBANOISMO Y EXTERIORES	\$ 33.366.619,00											\$ 33.366.619,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RO	\$ 2.230.000.000,00									\$ 729.300.000,00	\$ 729.300.000,00	\$ 751.400.000,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 7.762.775.477,60								\$ 931.533.057,31	\$ 2.173.577.133,73	\$ 2.328.832.643,28	\$ 2.328.832.643,28
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4.250.000.000,00										\$ 2.145.000.000,00	\$ 2.145.000.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	\$ 4.290.000.000,00										\$ 1.672.500.000,00	\$ 1.501.500.000,00
18	PRELUPUESTO DETALLIZACION	\$ 12.332.500,00										\$ 4.063.059,00	\$ 4.063.059,00
19	PROVISIONES												
	PMIA	\$ 860.762.500,00	\$ 99.229.081,21	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 289.382.698,38	\$ 289.382.698,38
	PMI	\$ 85.438.787,80		\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53
	CERTIFICACIONES RETE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	\$ 29.145.480,00											\$ 29.145.480,00
	TOTEMS DE INFORMACION	\$ 113.953.800,00										\$ 53.267.130,00	\$ 53.267.130,00
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	\$ 530.000.000,00										\$ 171.600.000,00	\$ 171.600.000,00
	SISTEMA DE RIEGO	\$ 87.290.823,30										\$ 43.645.409,60	\$ 43.645.409,60
INVERSION MENSUAL				\$ 2.253.379.025,88	\$ 3.020.227.768,64	\$ 4.037.834.623,38	\$ 4.608.829.501,15	\$ 5.426.501.473,87	\$ 5.612.384.287,21	\$ 7.881.243.159,06	\$ 8.170.896.593,60	\$ 11.820.730.934,58	\$ 12.371.451.374,18
% DE INVERSION MENSUAL				2,73%	3,66%	4,90%	5,59%	6,54%	6,81%	9,56%	9,91%	14,33%	15,00%
INVERSION ACUMULADA				\$ 82.464.262.620,00	\$ 10.514.167.954,30	\$ 22.534.380.722,96	\$ 26.572.215.346,34	\$ 31.181.054.847,49	\$ 36.607.556.321,36	\$ 42.219.940.608,57	\$ 50.103.189.767,64	\$ 58.272.080.361,23	\$ 82.464.264.620,00
% DE INVERSION ACUMULADA				100,00%	21,66%	27,33%	32,27%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,66%	100,00%
EJECUTADO MENSUAL				\$ 3.461.952.945,32	\$ 3.411.534.139,78	\$ 3.201.796.207,74	\$ 3.574.401.315,44	\$ 2.402.162.442,68	\$ 3.024.994.368,76	\$ 2.886.125.237,20	\$ 3.009.308.548,01	\$ 2.782.130.303,68	\$ 2.899.494.758,35
EJECUTADO ACUMULADO				\$ 17.240.788.928,43	\$ 20.672.323.068,21	\$ 23.874.119.275,95	\$ 27.448.520.611,39	\$ 29.850.683.054,07	\$ 32.875.677.422,83	\$ 35.761.802.660,03	\$ 38.771.111.208,04	\$ 41.553.241.511,72	\$ 44.452.736.270,07
% EJECUTADO MENSUAL				4,30%	4,14%	3,88%	4,33%	2,51%	3,67%	3,65%	3,73%	3,52%	3,52%
% EJECUTADO ACUMULADO				10,91%	25,07%	28,95%	31,29%	36,20%	39,87%	43,37%	47,02%	50,99%	53,91%

ACTA DE COBRO SOCIO AMBIENTAL #6

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERIODO COBRADO ENERO DE 2023

PRESUPUESTO TOTAL \$ 662.125.000,00

ACUMULADO \$ 124.540.963,08

VALOR ACTA \$ 2.972.000,04

EN BOLSA \$ 537.584.036,92

MEDIO	FICHA CÓDIGO	ITEM	PROGRAMA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	SOPORTE DE COBRO
Abiótico	FMA-1	1	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO					
		2	PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS Y ESPECIALES					
		2.4	Manejo RCD según Resolución No. 472 de febrero 28 de 2018					
	FMA-2	2.4.1	Inscripción al proyecto como generador de RCD ante Autoridad Competente	0,25% S.M.M.L.V	\$ 253.745,00	0	\$ 0,00	
		2.5	Brigada de Orden, Aseo y Limpieza BOAL	UND	\$ 1.750.000,00	0	\$ 0,00	
		2.6.2	Disposición final de Residuos de Construcción y Demolición RCD	M3	\$ 6.500,00	0	\$ 0,00	
		4	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO					
		4.1	Gestión solicitud permiso de Ocupación de Cauce					
		4.1.1	Evaluación ambiental según AUTO No. 464 de oct/27/2021	GLOBAL	\$ 13.921.517,00	0	\$ 0,00	
		4.1.2	Publicación AUTO 464 de oct/27/2021	GLOBAL	\$ 208.000,00	0	\$ 0,00	
		4.1.3	Cobro por concepto de seguimiento ambiental anual según Resolución CRA No. 641 de nov/19/2021	GLOBAL	\$ 8.614.326,00	0	\$ 0,00	
		4.2	Publicación Resolución CRA No. 641 de nov/19/2021	GLOBAL	\$ 208.000,00	0	\$ 0,00	
		4.3	Cobro seguimiento ambiental DIMAR	MES	\$ 6.821.000,00	0	\$ 0,00	
		4.4	Cobro por cesión de permisos ambientales. Cesión Resolución 257/2021 Declara viabilidad ambiental a UF1	UND	\$ 4.811.384,00	0	\$ 0,00	
		4.5	Alquiler de baños portátiles (servicio de transporte agua residual)	UND		0		
		4.5.1	Mes enero de 2023	UND	\$ 353.333,34	3	\$ 1.060.000,02	ANEXO 01
		4.5.2	Mes febrero 2023	UND	\$ 353.333,34	3	\$ 1.060.000,02	ANEXO 02
		4.6	Alquiler de lavamanos (servicio de transporte agua residual)	UND		0	\$ 0,00	
		4.7	Bolsa plástica 35x349 PQ*18 UND	UND	\$ 21.200,00	0	\$ 0,00	
		4.8	Bolsa plástica 35x349 PQ*25 UND	UND	\$ 33.600,00	0	\$ 0,00	
		4.9	Punto ecológico 55 LT (colores blanco-verde-negro)	UND	\$ 426.000,00	2	\$ 852.000,00	ANEXO 03
		4.10	Caracterización físicoquímica, microbiológica e hidrobiológica, según Resolución CRA No. 641 de 2021 permiso ocupación de cauce	UND	\$ 11.578.105,00	0	\$ 0,00	
		4.11	Publicación diario La Libertad Resolución 685 de octubre 31 de 2022, por medio de la cual se concede una prórroga de ocupación de cauce sobre la Ciénaga Mallorquín	UND	\$ 234.000,00	0	\$ 0,00	
Biótico	FMA-5	5	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE SEDIMENTOS Y MANEJO DE SUELO					
		5.1	Kit de derrame 10 Gal Male	UND	\$ 760.000,00	0	\$ 0,00	
	FMA-6	6	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN					
		6.1	Señales de seguridad en el trabajo	GLOBAL	\$ 1.589.916,00	0	\$ 0,00	
		7	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL					
		7.1	Evaluación ambiental según AUTO No. 737 de dic/18/2021	GLOBAL	\$ 15.671.275,00	0	\$ 0,00	
		7.2	Publicación AUTO No. 737 de dic/18/2021	GLOBAL	\$ 208.000,00	0	\$ 0,00	
		7.3	Cobro por concepto de seguimiento ambiental anual según permiso (77 árboles)	GLOBAL	\$ 15.671.275,00	0	\$ 0,00	
		7.4	Publicación según permiso	GLOBAL	\$ 208.000,00		\$ 0,00	
		7.5	Compensaciones ambientales	GLOBAL	\$ 110.526.916,00	0	\$ 0,00	
		7.6	Especialista Forestal	GLOBAL	\$ 20.000.000,00	0	\$ 0,00	
		7.7	Tratamientos silviculturales	GLOBAL	\$ 30.000.000,00	0	\$ 0,00	
		7.8	Disposición de residuos provenientes tratamientos silviculturales	M3	\$ 6.500,00	0	\$ 0,00	
	FMB-2	8	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA					
		9	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA ACUÁTICA	GLOBAL				
		9.1	Barrera absorbente Oleofílica 100% Polio 1,2mx3pul	UND	\$ 41.000,00	0	\$ 0,00	
		9.2	Barrera absorbente Oleofílica 100% Polio 1,2mx3pul	UND	\$ 46.500,00	0	\$ 0,00	
		9.3	Tela Oleofílica para derrames de sustancias químicas 76cmx46m	UND	\$ 564.000,00	0	\$ 0,00	
		9.4	Tela Oleofílica para derrames de sustancias químicas 76cmx46m	UND	\$ 450.000,00	0	\$ 0,00	
	FMB-5	10	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE	GLOBAL				
		10.1	Actividades de rescate y ahuyentamiento (profesional biólogo)	GLOBAL	\$ 10.000.000,00	0	\$ 0,00	
		12	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS GRUPOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS					

ACTA DE COBRO SOCIO AMBIENTAL #6

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERIODO COBRADO

ENERO DE 2023

PRESUPUESTO TOTAL

\$ 662.125.000,00

VALOR ACTA

\$ 2.972.000,04

ACUMULADO

\$ 124.540.963,08

EN BOLSA

\$ 537.584.036,92

MEDIO	FICHA CÓDIGO	ITEM	PROGRAMA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	SOPORTE DE COBRO
Socio económico	FMS-1	12,1	Reunión de socialización de Inicio, avance, solicitadas y de finalización (alquiler de video beam, equipo de sonido, transporte y refrigerio)	UND	\$ 300.000,00	0	\$ 0,00	
		12,2	Buzón de sugerencias	UND	\$ 240.000,00	0	\$ 0,00	
		12,3	Tablero en corcho	UND	\$ 240.000,00	0	\$ 0,00	
	FMS-2	13	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL PROYECTO					
		13,1	Talleres pedagógicos (transporte, ayudas didácticas)	UND	\$ 60.000,00	0	\$ 0,00	
		13,2	Kit estudiantil (lapicero negro 2, lapicero rojo 2, cuaderno 100 hojas, caja de colores, tajalapliz y borrador de nata)	UND	\$ 7.518,00	0	\$ 0,00	
	FMS-3	14	PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, BIENES Y SERVICIOS					
	FMS-4	15	PROGRAMA PARA EL APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA					
	FMS-5	16	PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA					
		16,1	Diseño e implementación	GLOBAL	\$ 7.500.000,00	0	\$ 0,00	
	FMS-6	17	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS					
SST	SST	18	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST					
		18,1	Camilla en polietileno	UND	\$ 170.000,00	0	\$ 0,00	
		18,2	Extintor 20 ABC 20 libras	UND	\$ 85.000,00	0	\$ 0,00	
		18,3	Botiquín Morral Tipo B REF 3-011	UND	\$ 130.000,00	0	\$ 0,00	
			TOTAL				\$ 2.972.000,04	

Firma

Nombre: CARLOS LEONARDO DUSSÁN GARCÍA

Cargo: Residente Ambiental

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Firma

Nombre: ULIANA GALLARDO

Cargo: Residente Ambiental

Interventoría: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN



SAKATECH S.A.S.
NIT 901.216.902-5
CRA 59 No. 64-125
Tel: (035) 3682818 - Ext. 105
Barranquilla - Colombia
sakatechsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESA 799

Señores	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901.501.273-2	Teléfono	(605) 3682818
Dirección	CARRERA 59 No. 64 - 125	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/02/2023, 09:15
Expedición	06/02/2023, 09:15
Vencimiento	21/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio Transporte	3.00	353,333.34	1,060,000.02

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-21 por \$ 1,049,400.02

Observaciones:

3 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE CABINAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SAKATECH S.A.S. O CONSIGNAR EN CUENTA DE CORRIENTE No. 477-000111-92 BANCOLOMBIA, ENMAR CONSIGNACION VIA FAX AL 3682818.

Total Bruto	1,060,000.02
Retefuente 1%	10,600.00
Total a Pagar	1,049,400.02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18784034682457 aprobado en 20220826 prefijo FESA desde el número 646 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: c152e0f635995eee7d967d53c583ee9eed024f2a11c49b9fe7027800ea040e9fcd5f3a1c37e9895f5c81c9551c27a896

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S. NIT: 830.048.145-9



SAKATECH S.A.S.
NIT 901.216.902-5
CRA 59 No. 64-125
Tel: (035) 3682818 - Ext. 105
Barranquilla - Colombia
sakatechsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESA 820

Señores	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901.501.273-2	Teléfono	(605) 3682818
Dirección	CARRERA 59 No. 64 - 125	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/03/2023, 15:19
Expedición	02/03/2023, 15:19
Vencimiento	17/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio Transporte	3.00	353,333.34	1,060,000.02

Total Items: 1

Valor en Letras:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-17 por \$ 1,049,400.02

Observaciones:

3 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE CABINAS PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SAKATECH S.A.S. O CONSIGNAR EN CUENTA DE CORRIENTE No. 477-000111-92 BANCOLOMBIA, ENMAR CONSIGNACION VIA FAX AL 3682818.

Total Bruto	1,060,000.02
Retefuente 1%	10,600.00
Total a Pagar	1,049,400.02

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NL 830.046.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764034662457 aprobado en 20220826 prefijo FESA desde el número 646 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 7e0a7a2b2f99314ae6903fa75e409d4b68e5232604c485c4e1c492a3e41493c29d8a1a1cd28aa63aa991d29435e90cd5

SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL LIMITADA SE

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4669 9.60 X 1000

Nit 900025263

CLIENTE	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901501273 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 59 64 15		Barranquilla	3682818

POR CONCEPTO DE
FE 6496 REM 16964 OC 10762

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/02/2023	25/02/2023	RNANDO ELIAS DE JESUS MUVDI SALCE	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 01080	PUNTO ECOLOGICO 55 LT (COLORES: BLANCO-VERDE-NEGRO)	2	Und.	426.000	19%	80.940	852.000

Valor en Letras
UN MILLON TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 08 735 1680 DEL BANCO DE BOGOTA O A LA CUENTA CORRIENTE # 402 005 920 DEL BANCO ITAU A NOMBRE DE SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA

SUBTOTAL	852.000
DESCUENTO	0
IVA	161.880
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.013.880
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.013.880

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2023 09:16:20

CR 62 # 68-105 BR BELLAVISTA Teléfono (5) 3683172 - 3683396 Fax 3688297 Cel. 3183352386

correo: seguprotltda@hotmail.com - web www.seguprot.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.621 y S.S 772, 773, 774, S.S y C.C del código de comercio) Esta factura causara intereses por mora a la tasa legal establecida a partir de su vencimiento.



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN ✓

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capitulo: 01 - OBRAS PRELIMINARES ✓

Actividad: EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) ✓

Acta No.

Item No.

Unidad

15 ✓

5513 ✓

MES ✓

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad

Medida Total



marzo de 2023 ✓

1,00 ✓

1,00 ✓

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

1,00 ✓



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPEIRACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 01 - OBRAS PRELIMINARES

Actividad: COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA
REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL.

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-01

MES

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad

Medida Total

marzo de 2023

Frente tierra 1

1,00

1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

1,00

84,00
84,00



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

CM-04

ML

Área para Dibujo o Fotografía

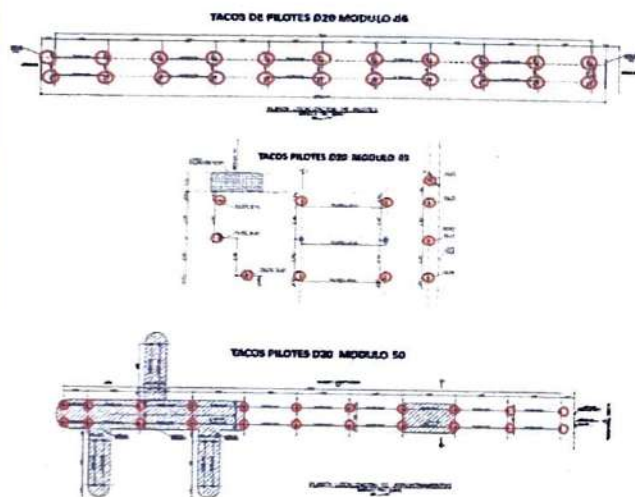

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° pilotes

Cantidad de
tacos

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGIA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
MTI/061.501.373-3

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO

Acta No.

Ítem No.

Unidad


15

CM-05


ML

Área para Dibujo o Fotografía

TACOS PILOTES D25 MODULO 48



AJUSTE DE PILOTES MODULO 40



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° pilotes

Cantidad de
tacos

Medida Total

tacos

48

0,5

80

40,00

tacos

49

0,5

4

2,00

tacos

38

0,5

8

4,00

Ajuste por corte

EJE B

40

-0,1

24

-2,40

Ajuste por corte

EJE A Y C

40

1,1


47

51,70

Quien Recibe:


Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO

95,30

95,30



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-05

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° pilotes

Cantidad de
tacos

Medida Total

TACOS PILOTES D25 MODULO 25

TACOS DE PILOTES D25 MODULO 33



Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-06

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

RIOSTRAS D15 MODULO 42

RIOSTRAS D15 MODULO 44

RIOSTRAS D15 MODULO 47

42	3,30		32	105,60
43	3,30		20	66,00
44	3,30		18	59,40
45	3,30		20	66,00
47	3,30		12	39,60
49	3,30		16	52,80
50	3,30		20	66,00
38	3,30		6	19,80

Quien Recibe:

Quien Entrega:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

475,20

TOTAL EJECUTADO

475,20



ASPECTOS DEL MANEJO DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN A T

MEMORIAS DE OBRA



NIT. 901.501.279-2

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-06


ML

Área para Dibujo o Fotografía


ARROSTRAS D15 MODULO 45



RIOSTRAS D15 MODULO 45



RIOSTRAS D15 MODULO 38



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-06

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

RIOSTRAS D15 MODULO 49



RIOSTRAS D15 MODULO 50



Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092512 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

-



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inteventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

CM-07

ML

Área para Dibujo o Fotografía

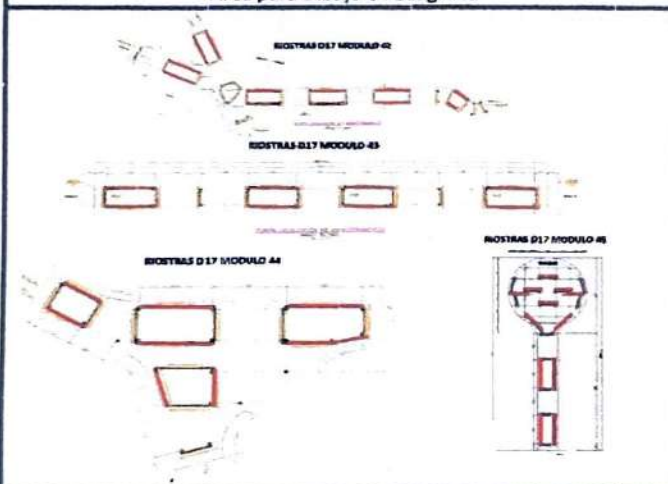

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

42

5,30

24

127,20

43

5,30

16

84,80

44

5,30

18

95,40

45

5,30

24

127,20

47

5,30

12

63,60

49

5,30

16

84,80

50

5,30

12

63,60

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

646,60

TOTAL EJECUTADO

646,60



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-07

ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 47

RIOSTRAS D17 MODULO 49

RIOSTRAS D17 MODULO 50

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capitulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-07

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrada
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inteventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

CM-08

ML

Área para Dibujo o Fotografía

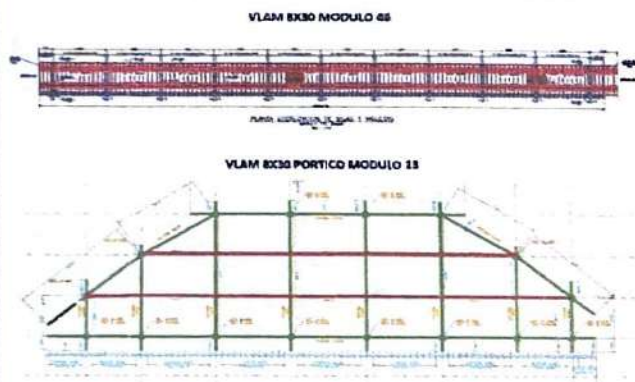

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

EJE A

EJE B

PORTICO EJE B"

PORTICO EJE C"

PORTICO DIAGONALES

PORTICO DIAGONALES

PORTICO DIAGONALES

GRADA NIVEL 1

GRADA NIVEL 2

GRADA NIVEL 3

GRADERIA

Locales, cuarto elect y gabinete (soporte canal)

Oficina y baños (soporte canal)

46

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

53,35

52,62

23,35

29,86

2

1,8

1,32

4

3,76

4,44

18,95

5,24

5,1

1

1

1

1

3

1

11

2

4

4

53,35

52,62

23,35

29,86

6

1,8

14,52

4

3,76

4,44

37,9

20,96

20,4

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

272,96

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 08202-267439 STD



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA /

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-08.

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

Telecomunicaciones (soporte canal)

Oficina y baños (soporte canal)

Enfermeria - Tickets y baños (soporte canal)

14

5,1

5,25

5,25

4

5

2

20,4

26,25

10,5

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De la Cruz
Jhorvis De la Cruz
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

57,15

TOTAL EJECUTADO

330,11



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Intevector:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	15	CM-08	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Longi
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK /

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-010

M2

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)


Area (m2)

Cantidad

Medida Total

DECK CURVO MODULO 36

DECK CURVO MODULO 38

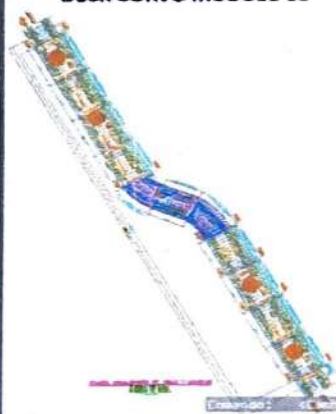

38

13,35

36

33,60

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

46,95

TOTAL EJECUTADO

46,95



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

C/M-011

M2

Área para Dibujo o Fotografía

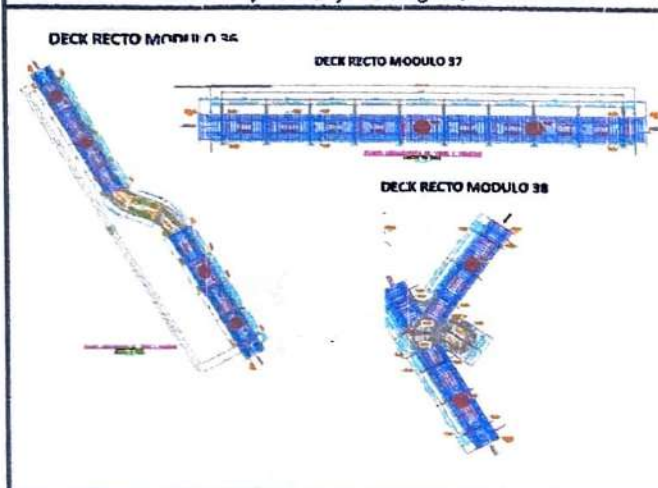

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

		36	40,50	3	121,50		121,50
		37	45,62	3	136,86		136,86
		38			94,17		94,17
		39	31,08	3	93,24		93,24
		41	49,29	3	147,87		147,87
HUELLA	GRADA NIVEL 1	13	18,27	0,76	13,89		13,89
CONTRAHUELLA	GRADA NIVEL 1		18,31	0,41	7,51		7,51
HUELLA	GRADA NIVEL 2		18,16	0,74	13,44		13,44
CONTRAHUELLA	GRADA NIVEL 2		18,22	0,48	8,75		8,75
HUELLA	GRADA NIVEL 3		18,02	0,76	13,70		13,70
CONTRAHUELLA	GRADA NIVEL 3		18,13	0,36	6,53		6,53
HUELLA	GRADA NIVEL 4		17,84	0,71	12,67		12,67
CONTRAHUELLA	GRADA NIVEL 4		18,06	0,35	6,32		6,32

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

676,43

684,99



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15 ✓

CM-12 ✓

ML ✓

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Módulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° de lados

Medida Total

Eje superior

Eje inferior

Eje superior

Eje inferior

13 ✓

35 ✓

3,79

3,5

6,11

2,48

3,79

3,50

6,11

2,48

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

15,88

TOTAL EJECUTADO

15,88



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA /

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE: PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES /

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15 /

CM-13 /

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)


N° de lados

Medida Total

BARANDA RECTA MODULO 13



BARANDA RECTA MODULO 34



Eje superior

Eje inferior

Eje superior

Eje inferior

Eje superior

Eje inferior

13 /

34 /

35 /

61,94

6,37

50,67

50,63

44,54

46,27

1

1

1

1

1

1

61,94 /

6,37 /

50,67 /

50,63 /

44,54 /

46,27 /

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrada
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

260,42 /

TOTAL EJECUTADO

260,42 /



ESTUDIO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y TERRITORIAL S.A.S.

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Acta No.

Ítem No.

Unidad

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

15

CM-13

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° de lados

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 08202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA

Acta No.

Ítem No.

Unidad

15

CM-22

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo


Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

VLAM 13X50 PORTICO MODULO 13



(D"-C") - (0"-1")

13

3,14

3,14

(C"-B") - (1"-2")

13

4,55

4,55

(B"-A") - (2"-3")

13

5,36

5,36

(D"-C") - (8"-9")

13

1,77

1,77

(C"-B") - (8"-7")

13

4,4

4,40

(B"-A") - (7"-6")

13

5,44

5,44

D"- (0"-1")

13

2,33

2,33

D"- (8"-9")

13

1,28

1,28

Voladizos

13

5,92

5,92

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

34,19

TOTAL EJECUTADO

34,19



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

CM-23

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Módulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

(0"-1")

13

3,43

3,74

4,06

4,3

4,34

5,04

5,61

5,82

6,15

6,43

6,7

6,98

7,23

7,53

8,07

8,30

8,64

8,93

3,43

3,74

4,06

4,30

4,34

5,04

5,61

5,82

6,15

6,43

6,70

6,98

7,23

7,53

8,07

8,30

8,64

8,93

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 08202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

111,30



MEMORIAS DE OBRA




INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Intevector:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	15	CM-23	ML

Área para Dibujo o Fotografía	Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
				Longitud (m)				
	(2"-3")	13	9,21				9,21	
			9,48				9,48	
			9,76				9,76	
			10,05				10,05	
			10,28				10,28	
			10,44				10,44	
			10,76				10,76	
	(3"-4")	13	119,26				119,26	
	(4"-5")		119,26				119,26	
	(5"-6")		119,26				119,26	
	(6"-7")	13	10,75				10,75	
			10,46				10,46	
			10,2				10,20	
			9,95				9,95	
			9,63				9,63	
			9,38				9,38	
			9,07				9,07	
			8,80				8,80	


Quien Recibe:


Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

506,00

707,62

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL

Actividad: Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", Incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.

Acta No.

Item No.

Unidad

15

15.1.4

UND

Área para Dibujo o Fotografía



Ubicación

Modulo

Dimensiones

cantidad

% Instalado

Cantidad a cobrar

Medida Total

DERECHA

IZQUIERDA

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

57,40

Quien Recibe:

Quien Entrega:



Cynthia Viegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL



Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL

Actividad: Suministro e Instalacion de circuito rama para iluminacion en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.

Acta No.

Ítem No.


Unidad

15

15.1.5

ML

Área para Dibujo o Fotografía

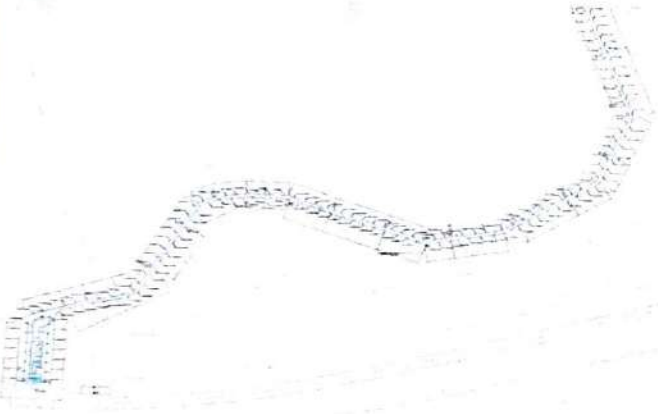

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

Diametro de cajas 15x15

Total de cajas

Cantidad

% Instalado (sin incluir cableado)

Cantidad a cobrar

Medida Total

DERECHA

IZQUIERDA

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

484,11

Quien Recibe:

Quien Entrega:

Cynthia Villegas Andrade

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/03/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capitulo: 15.4 ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION

Actividad: Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.

Acta No.

Item No.


Unidad

15

15.4.24

UND

Área para Dibujo o Fotografía

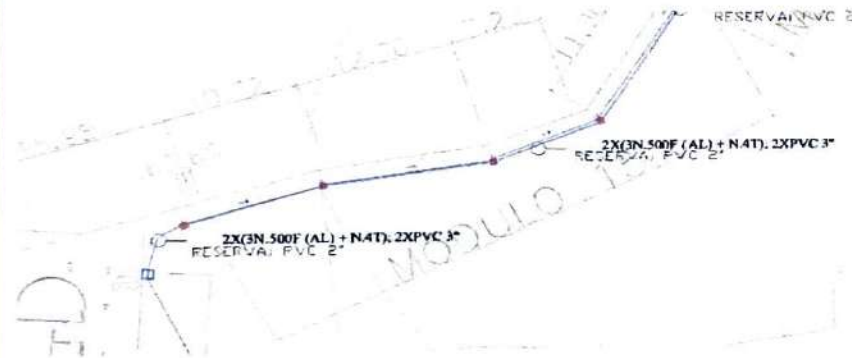

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

15

4

4,00

DERECHA


CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

4,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
01	OBRAS PRELIMINARES		
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	1,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	1,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACIÓN.	ML	
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
5913	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	
03	PILOTAJE EN MADERA		
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	84,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	95,30
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	475,20
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	646,60
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA		
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	330,11
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	46,95
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	684,99
05	BARANDAS EN MADERA		
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	15,88
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	260,42
06	EDIFICACIONES EN MADERA		
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 - PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	34,19
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	707,62

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
7,1	CIMENTACIONES		
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7,2	ESTRUCTURA		
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	
7,3	TANQUE		
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F" C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL O SIMILAR.	M2	
7,4	ACERO DE REFUERZO		
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS		
8,1	LISTONES EN MADERA		
8,2	MESONES		
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA		
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS		
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS		
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	
09	PISOS Y ENCHAPES		
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	

Jan

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	
10	CIELOS RASOS		
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	
11	PAVIMENTOS Y ANDENES		
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	
4742	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TÁCTIL Y GUÍA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	

[Firma manuscrita]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	
13	URBANISMO Y EXTERIORES		
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI		
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
15,1	SALIDAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL		
15,1,1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en cielo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

Handwritten signature

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	57,40 /
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	484,11 /
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Firma]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCL. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES		
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	

[Firma]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolaes (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolaes (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolaes (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolaes (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolaes (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolaes (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolaes (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	
15,3	LUMINARIAS Y POSTES		
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tension Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminica: 7125lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref SculLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tension Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	

[Firma]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. Incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tension Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION		
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/OT. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA	ML	
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2	ML	
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB	ML	
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III	ML	
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ	ML	
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE	ML	
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	

[Firma manuscrita]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1	ML	
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2	ML	
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P	ML	
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .	ML	
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3	ML	
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4	ML	
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D	ML	
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	4,00 ✓
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,26	Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio	ML	
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION		
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentacion.	UND	
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion.	UND	
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexon.	UND	
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metalica, herrajes)	UND	
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion IMC de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tubería de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tubería PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y deteccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via.	ML	
15,5,9	Construccion de caja de inspeccion SB300: Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)	ML	
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior (Instalacion en punto de conexión)	UND	
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (Instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSION, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS		
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operacion bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tension, varillaje para disparo tripolar por fusion. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	

[Firma manuscrita]

PREACTA N° 15

OBRA EJECUTADA


PRESENTE ACTA



ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa)	UND	
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica para albergar el banco de condensadores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa y Subestacion Principal)	UND	
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Incluye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterias de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomia. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,6,14	Suministro e instalacion de tablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)	ML	
15,7,4	Suministro e instalacion de tubería PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	ML	

[Firma]

 PREACTA N° 15			OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS		
15,8,1	Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF, - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes	UND	
15,8,2	Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS		
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tension, Subestacion Eléctrica. Uso Final	GL	
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energizacion	GL	
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS		
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS		
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION		
18,00	SEÑALIZACION	GLB	
19	PROVISIONES		
19,01	PMA	GLB	0,00449
19,02	PMT	GLB	
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	


JHORVIS DE LUQUE
 RESIDENTE DE OBRA
 M.P. # 68202-267439 STD


CYNTHIA VILLEGAS
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 M.P. # 08202-092612 ATL

	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16										
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02										
		Fecha: 11-11-2021	Página: 1 de 1										
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TIPO DE CONTRATACION</td> <td>Orden/Contrato de Compra de Suministro</td> <td></td> <td rowspan="4">ACTA No. 15</td> </tr> <tr> <td>Orden de Prestación de Servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de Interventoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de Obra</td> <td>X</td> </tr> </table>				TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 15	Orden de Prestación de Servicios		Contrato de Interventoría		Contrato de Obra	X
TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 15										
	Orden de Prestación de Servicios												
	Contrato de Interventoría												
	Contrato de Obra	X											
1. INFORMACION DEL CONTRATO:													
No. del Contrato u Orden de Servicio		EDU-561-2021											
Objeto		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA											
Contratante		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.											
Contratista		CONSORCIO JCO MALLORQUIN											
Valor		\$ 82.464.264.620											
Fecha de Firma del Contrato/Orden		21 DE JULIO DE 2021											
Fecha de Inicio del Contrato/Orden		01 SEPTIEMBRE DE 2021											
Fecha Terminación del Contrato/Orden		30 DE ABRIL DE 2023											
2. INFORMACION POLIZA:													
Tipo de Póliza		Calidad del servicio No. BQ-100043007											
Vigencias		Desde	30/04/2023										
		Hasta	30/04/2028										
Tipo de Póliza		Cumplimiento No. BQ-100043007											
Vigencias		Desde	23/06/2022										
		Hasta	30/10/2023										
Tipo de Póliza		Salarios y prestaciones No. BQ-100043007											
Vigencias		Desde	23/06/2022										
		Hasta	30/04/2026										
Tipo de Póliza		Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003											
Vigencias		Desde	1/09/2021										
		Hasta	30/07/2023										
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:													
		VALOR(\$)	\$ 2.899.494.758,35										
VALOR EN LETRAS		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS											
Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla al decimo (10) día del mes de abril de 2023.													
 ANGELLY CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.		 DIEGO RADA ALTHONA SUPERVISOR EDUBAR S.A.											
 ADALBERTO VIVERO CORONEL Representante Legal CONTRATISTA													

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CUIRE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPANQUE UFI, DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA OENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	30 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.626,00

PROVEEDOR	MATERIAL COTIZADOS EN MONEDA EXTRANJERA	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA (USD)	TRM AJUSTE	TCF	TCe	Var: (TCF/TCe-1)	Pa	Pc: Pa*(1-Var)	DIFERENCIA Pa	Pc	UNID	CANTIDAD	AJUSTE CANT	IDE*
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 30 CM	2596935	11/08/2021	\$ 35.708,16	\$ 3.988,80	\$ 3.979,80	\$ 3.826,02	0,098	\$ 252.000,00	\$ 276.588,80	\$ 24.580,80	ML	1.170,43			
	PILOTE D= 25 CM	2596935	11/08/2021	\$ 11.083,04	\$ 3.988,80	\$ 3.979,80	\$ 3.826,02	0,098	\$ 353.345,00	\$ 420.746,83	\$ 37.401,83	ML	290,70			
	DECK	2596935	11/08/2021	\$ 70.730,80	\$ 3.988,80	\$ 3.979,80	\$ 3.826,02	0,098	\$ 493.413,33	\$ 541.654,20	\$ 48.140,87	M2	1.220,86			
				\$ 118.188,18												
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 35 CM	2674425	28/12/2021	\$ 47.218,82	\$ 3.988,80	\$ 3.988,41	\$ 3.826,02	0,100	\$ 353.345,00	\$ 421.782,81	\$ 38.417,81	ML	1072,9			41.218.812,35
	RIOSTRA D= 15 CM	2674425	28/12/2021	\$ 10.830,84	\$ 3.988,80	\$ 3.988,41	\$ 3.826,02	0,100	\$ 123.200,00	\$ 135.546,77	\$ 12.346,77	ML	814,4			11.238.888,78
				\$ 58.989,66												
HARBOR EXPORTS	PILOTES D=28CM	2690780	1/10/2022	\$ 24.000,37	\$ 3.988,80	\$ 4.980,94	\$ 3.826,02	0,286	\$ 353.345,00	\$ 485.398,82	\$ 102,011,82	ML	881,88			98.278.751,40
	BARANDAS	2690780	1/10/2022	\$ 115.833,23	\$ 3.988,80	\$ 4.980,94	\$ 3.826,02	0,286	\$ 348.825,00	\$ 441.387,58	\$ 82.772,58	ML	304,00			28.292.884,89
	PILOTES D=20CM	2690780	1/10/2022	\$ 3.737,85	\$ 3.988,80	\$ 4.980,94	\$ 3.826,02	0,286	\$ 252.000,00	\$ 319.058,71	\$ 87.058,71	ML	115,82			7.788.898,20
	RIOSTRA D= 15 CM	2690780	1/10/2022	\$ 7.415,18	\$ 3.988,80	\$ 4.980,94	\$ 3.826,02	0,286	\$ 123.200,00	\$ 155.984,75	\$ 32.784,75	ML	628,13			17.347.292,55
				\$ 181.888,63												
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2588990	31/08/2022	\$ 45.982,17	\$ 3.988,80	\$ 4.400,16	\$ 3.826,02	0,213	\$ 348.825,00	\$ 423.054,87	\$ 74.429,87	ML	316,00			23.519.878,32
HARBOR EXPORTS	DECK	2588175	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559178	19/10/2022	\$ 15.835,52	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 348.825,00	\$ 458.117,44	\$ 107.482,44	M2	388,80			41.558.576,73
HARBOR EXPORTS	DECK	2559177	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559178	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559179	19/10/2022	\$ 16.488,86	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 348.825,00	\$ 458.117,44	\$ 107.482,44	ML	398,00			42.781.888,50
HARBOR EXPORTS	DECK	2559181	19/10/2022	\$ 6.287,78	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	392,00			89.837.873,35
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559182	19/10/2022	\$ 17.197,44	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 348.825,00	\$ 458.117,44	\$ 107.482,44	ML	423,00			45.489.306,39
HARBOR EXPORTS	DECK	2559183	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559184	19/10/2022	\$ 15.835,52	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 348.825,00	\$ 458.117,44	\$ 107.482,44	M2	388,80			41.558.576,73
HARBOR EXPORTS	DECK	2559186	19/10/2022	\$ 7.492,80	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	245,00			37.273.170,84
HARBOR EXPORTS	DECK	2559187	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559188	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559189	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559191	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559192	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 483.413,33	\$ 645.548,72	\$ 162.135,39	M2	810,00			82.802.588,63
HARBOR EXPORTS	PILOTES D=25CM	2559140	18/10/2022	\$ 10.238,85	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 353.345,00	\$ 501.542,74	\$ 118.197,74	ML	288,22			31.702.888,38
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2771175	19/10/2022	\$ 8.871,82	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 167.365,00	\$ 218.988,06	\$ 51.623,06	ML	885,22			30.188.738,27
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 15 CM	2771176	19/10/2022	\$ 7.571,69	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.826,02	0,308	\$ 123.200,00	\$ 161.188,57	\$ 37.988,57	ML	877,82			33.345.371,23

Seu

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIPE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO ACO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.670,00

PROVEEDOR	MATERIAL COTIZADOS EN MONEDA EXTRANJERA	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA (USD)	TRM AJUSTE	TCF	TCe	Var: (TCF/TCe)-1	Pa	Pte Pa*(1+Var)	DIFFERENCIA Pa	UNO	CANTIDAD	AJUSTE CANT)	(DIF - CANT)
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777177	19/10/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 187.505,00	\$ 216.569,06	\$ 51.834,56	ML	553,22	\$	30.186.728,27
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777178	19/10/2022	\$ 3.564,83	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	- 0,326	\$ 167.365,00	\$ 216.062,08	\$ 51.604,08	ML	296,51	\$	14.785.084,28
	DECK	2777178	19/10/2022	\$ 900,00	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 483.415,33	\$ 645.846,72	\$ 162.135,39	ML	25,75	\$	3.822.140,69
				\$ 4.264,33											
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 15 CM	2777179	19/10/2022	\$ 6.730,38	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 129.200,00	\$ 161.186,57	\$ 37.986,57	ML	780,28	\$	28.640.541,02
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 16 CM	2156190	19/10/2022	\$ 507,23	\$ 3.988,80	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 123.200,00	\$ 161.186,57	\$ 37.986,57	ML	80,96	\$	2.316.901,33
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777181	11/09/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,80	\$ 4.905,32	\$ 3.626,02	0,204	\$ 167.365,00	\$ 201.486,82	\$ 34.123,82	ML	586,21	\$	19.988.486,23
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777183	21/11/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,80	\$ 4.904,61	\$ 3.626,02	0,377	\$ 167.365,00	\$ 250.534,55	\$ 83.169,55	ML	585,21	\$	36.967.454,56
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777182	11/12/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,80	\$ 4.815,59	\$ 3.626,02	0,528	\$ 167.365,00	\$ 222.271,59	\$ 54.906,59	ML	585,21	\$	32.131.883,05
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559143	7/12/2022	\$ 12.901,24	\$ 3.988,80	\$ 4.816,32	\$ 3.626,02	0,325	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	268,22	\$	33.806.510,16
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559141	7/12/2022	\$ 12.901,24	\$ 3.988,80	\$ 4.816,32	\$ 3.626,02	0,325	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	268,22	\$	33.806.510,16
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559142	7/12/2022	\$ 12.901,24	\$ 3.988,80	\$ 4.816,32	\$ 3.626,02	0,325	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	268,22	\$	33.806.510,16
SUB TOTAL														\$	1.854.193.390,67
ADMINISTRACION A.M.														\$	330.838.878,13
IMPREVISTOS I.M.														\$	82.709.669,53
UTILIDAD U.M.														\$	82.709.669,53
TOTAL														\$	2.150.451.497,87

MONEDA DE CONTROL				
TRM CONTRATO (TCe)		AJUSTE 10%		TOTAL AJUSTE (U-may)
\$	3.626,02	\$	362,60	\$ 3.988,62
		AJUSTE -10%		TOTAL AJUSTE (U-min)
		\$	362,60	\$ 3.263,42

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico al día (20) del mes de abril de 2023

ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ACO MALLORQUIN
CONTRATISTA

Diego Rada Althaus
DIEGO RADA ALTHAUS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

Rafael Lapont de Sales
RAFAEL LAPONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UFI MALLORQUIN
INTERVENTOR

Angelley Ciales
ANGELLEY CIALES VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

Dea

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	15
Contrato N°		EDU-561-2021	
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contrato de obra		
Nombre del contratista	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 82.464.264.620	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 82.464.264.620	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
01-09-2021	30-04-2023	-	-
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	30/04/2023 30-04-2028
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-10-2023
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100011003	01-09-2021 30-07-2023
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA Incluido)		\$ 82.464.264.620	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 82.464.264.620	
Porcentaje del Anticipo	0 %	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.150.451.407,87	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 46.603.187.677,94	
No. Factura o Cuenta de Cobro		016	

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios	se solicitó a la Interventoría proceder con el trámite de reconocimiento del reajuste de precios, para lo cual se tuvo en cuenta las condiciones establecidas dentro de las condiciones contractuales, teniendo

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la Selección Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las obras, objeto de esta interventoría. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría. 15. Incluir dentro de las pólizas que ampara el contrato de interventoría como beneficiario, además de EDUBAR S.A al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de objeto de la interventoría. 17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas pro EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal	en cuenta los materiales catalogados como bienes cotizados en moneda extranjera. El 20 de abril de 2023 se suscribió el acta de reajuste N° 1 al contrato.
--	--

DMA



FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-05-2021

manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 35. Acompañar a EDUBAR S.A en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19


Versión: 02 Fecha: 23-08-2021


prorrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A en razón del Convenio interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al 28 de febrero de 2023.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla al día veinte (20) del mes de abril de 2023.


DIEGO RADA ALTAHONA

	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02
			Fecha: 11-11-2021
			Página: 1 de 1
TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. Reajuste 1
	Orden de Prestación de Servicios		
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra	X	
1. INFORMACION DEL CONTRATO:			
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-561-2021		
Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.		
Contratista	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
Valor	\$ 82.464.264.620		
Fecha de Firma del Contrato/Orden	21 DE JULIO DE 2021		
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021		
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023		
2. INFORMACION POLIZA:			
Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	30/04/2023	
	Hasta	30/04/2028	
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	23/06/2022	
	Hasta	30/10/2023	
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	23/06/2022	
	Hasta	30/04/2026	
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003		
Vigencias	Desde	1/09/2021	
	Hasta	30/07/2023	
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:			
		VALOR(\$)	\$ 2.150.451.407,87
VALOR EN LETRAS	DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS		
Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla al día veinte (20) del mes de abril de 2023.			
 ANGELLY CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.		 DIEGO RADA ALTHOUA SUPERVISOR EDUBAR S.A.	
 ADALBERTO VIVERO CORONEL Representante Legal CONTRATISTA			

PROVEEDOR	MATERIAL COTIZADOS EN MONEDA EXTRANJERA	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA (USD)	TRM AJUSTE	TCf	TCc	Var: (TCf/TCc)-1	Pa	Pn: Pa*(1+Var)	DIFERENCIA Pa) (Pn- Pa)	UNID	CANTIDAD	AJUSTE (DIF * CANT)
HARBOR EXPORTS	PILOTE D: 20 CM	2598935	11/08/2021	\$ 35.708,16	\$ 3.988,60	\$ 3.979,80	\$ 3.626,02	0,098	\$ 252.000,00	\$ 276.586,89	\$ 24.586,89	ML	1.170,43	La tasa correspondiente a esta fecha esta por debajo del umbral
	PILOTE D: 25 CM	2598935	11/08/2021	\$ 11.683,04	\$ 3.988,60	\$ 3.979,80	\$ 3.626,02	0,098	\$ 383.345,00	\$ 420.746,83	\$ 37.401,83	ML	266,70	
	DECK	2598935	11/08/2021	\$ 70.798,90	\$ 3.988,60	\$ 3.979,80	\$ 3.626,02	0,098	\$ 493.413,33	\$ 541.554,20	\$ 48.140,87	M2	1.220,86	
				\$ 118.190,10										
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2674425	28/12/2021	\$ 47.219,92	\$ 3.988,60	\$ 3.989,41	\$ 3.626,02	0,100	\$ 383.345,00	\$ 421.762,81	\$ 38.417,81	ML	1072,9	\$ 41.218.312,35
	RIOSTRA D= 15 CM	2674425	28/12/2021	\$ 10.830,64	\$ 3.988,60	\$ 3.989,41	\$ 3.626,02	0,100	\$ 123.200,00	\$ 135.546,77	\$ 12.346,77	ML	914,4	\$ 11.289.889,78
				\$ 58.050,56										\$ -
HARBOR EXPORTS	PILOTES D=25CM	2690780	1/10/2022	\$ 24.000,27	\$ 3.988,60	\$ 4.590,94	\$ 3.626,02	0,266	\$ 383.345,00	\$ 485.356,92	\$ 102.011,92	ML	551,69	\$ 56.278.751,40
	BARANDAS	2690780	1/10/2022	\$ 115.933,23	\$ 3.988,60	\$ 4.590,94	\$ 3.626,02	0,266	\$ 348.625,00	\$ 441.397,58	\$ 92.772,58	ML	304,00	\$ 28.202.864,69
	PILOTES D=20CM	2690780	1/10/2022	\$ 3.737,85	\$ 3.988,60	\$ 4.590,94	\$ 3.626,02	0,266	\$ 252.000,00	\$ 319.059,71	\$ 67.059,71	ML	115,82	\$ 7.766.855,30
	RIOSTRA D= 15 CM	2690780	1/10/2022	\$ 7.415,18	\$ 3.988,60	\$ 4.590,94	\$ 3.626,02	0,266	\$ 123.200,00	\$ 155.984,75	\$ 32.784,75	ML	529,13	\$ 17.347.392,55
				\$ 151.086,53										
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2888690	31/08/2022	\$ 45.892,17	\$ 3.988,60	\$ 4.400,16	\$ 3.626,02	0,213	\$ 348.625,00	\$ 423.054,97	\$ 74.429,97	ML	316,00	\$ 23.519.870,32
HARBOR EXPORTS	DECK	2559175	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559176	19/10/2022	\$ 16.835,52	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 348.625,00	\$ 456.117,44	\$ 107.492,44	M2	386,60	\$ 41.556.575,73
HARBOR EXPORTS	DECK	2559177	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559178	19/10/2022	\$ 18.547,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559179	19/10/2022	\$ 16.488,96	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 348.625,00	\$ 456.117,44	\$ 107.492,44	ML	398,00	\$ 42.781.989,50
HARBOR EXPORTS	DECK	2559181	19/10/2022	\$ 6.287,76	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	392,00	\$ 59.637.073,35
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559182	19/10/2022	\$ 17.197,44	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 348.625,00	\$ 456.117,44	\$ 107.492,44	ML	423,00	\$ 45.469.300,39
HARBOR EXPORTS	DECK	2559183	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	BARANDAS	2559184	19/10/2022	\$ 16.835,52	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 348.625,00	\$ 456.117,44	\$ 107.492,44	M2	386,60	\$ 41.556.575,73
HARBOR EXPORTS	DECK	2559186	19/10/2022	\$ 7.462,80	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	245,00	\$ 37.273.170,84
HARBOR EXPORTS	DECK	2559187	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559188	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559189	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559191	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	DECK	2559192	19/10/2022	\$ 18.574,08	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	610,00	\$ 92.802.588,63
HARBOR EXPORTS	PILOTES D=25CM	2559140	19/10/2022	\$ 10.236,65	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 383.345,00	\$ 501.542,74	\$ 118.197,74	ML	268,22	\$ 31.702.998,39
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777175	19/10/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 167.365,00	\$ 218.969,08	\$ 51.604,08	ML	585,22	\$ 30.199.738,27
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 15 CM	2777176	19/10/2022	\$ 7.571,69	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 123.200,00	\$ 161.186,57	\$ 37.986,57	ML	877,82	\$ 33.345.371,23
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777177	19/10/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 167.365,00	\$ 218.969,08	\$ 51.604,08	ML	585,22	\$ 30.199.738,27
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777178	19/10/2022	\$ 3.364,33	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 167.365,00	\$ 218.969,08	\$ 51.604,08	ML	286,51	\$ 14.785.084,26
	DECK	2777178	19/10/2022	\$ 900,00	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 493.413,33	\$ 645.548,72	\$ 152.135,39	M2	25,78	\$ 3.922.140,69
				\$ 4.264,33										
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 15 CM	2777179	19/10/2022	\$ 6.730,39	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 123.200,00	\$ 161.186,57	\$ 37.986,57	ML	780,29	\$ 29.640.541,02
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 15 CM	3186190	19/10/2022	\$ 507,22	\$ 3.988,60	\$ 4.744,04	\$ 3.626,02	0,308	\$ 123.200,00	\$ 161.186,57	\$ 37.986,57	ML	60,96	\$ 2.315.661,33
HARBOR EXPORTS	RIOSTRAD= 17 CM	2777181	11/09/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,60	\$ 4.365,32	\$ 3.626,02	0,204	\$ 167.365,00	\$ 201.488,62	\$ 34.123,62	ML	585,21	\$ 19.969.486,23
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA D= 17 CM	2777183	21/11/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,60	\$ 4.994,61	\$ 3.626,02	0,377	\$ 167.365,00	\$ 230.534,55	\$ 63.169,55	ML	585,21	\$ 36.967.454,56
HARBOR EXPORTS	RIOSTRA= 17 CM	2777182	1/12/2022	\$ 6.871,82	\$ 3.988,60	\$ 4.815,59	\$ 3.626,02	0,328	\$ 167.365,00	\$ 222.271,59	\$ 54.906,59	ML	585,21	\$ 32.131.883,85
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559143	7/12/2022	\$ 12.314,82	\$ 3.988,60	\$ 4.818,32	\$ 3.626,02	0,329	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	256,03	\$ 32.272.752,55
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559141	7/12/2022	\$ 12.901,24	\$ 3.988,60	\$ 4.818,32	\$ 3.626,02	0,329	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	268,22	\$ 33.809.310,19
HARBOR EXPORTS	PILOTE D= 25 CM	2559142	7/12/2022	\$ 12.901,24	\$ 3.988,60	\$ 4.818,32	\$ 3.626,02	0,329	\$ 383.345,00	\$ 509.395,67	\$ 126.050,67	ML	268,22	\$ 33.809.310,19

SUB TOTAL			\$ 1.654.193.390,67
ADMINISTRACIÓN	A =	20%	\$ 330.838.678,13
IMPREVISTOS	I =	5%	\$ 82.709.669,53
UTILIDAD	U =	5%	\$ 82.709.669,53
TOTAL:			\$ 2.150.451.407,87

INDICE DE CONTROL			
TRM CONTRATO (TCc)		AJUSTE 10%	TOTAL AJUSTE (Umax)
\$ 3.626,02		\$ 362,60	\$ 3.988,62
		AJUSTE -10%	TOTAL AJUSTE (Umin)
		\$ 362,60	\$ 3.263,42



Harbor Exports
1011 Fairfield Dr.
West Palm Beach, FL 33407
954-834-6200

INVOICE
2598935
11/08/2021

Order No
Order Date

Invoice Address
CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address
CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4610 McIntOSH RD.
FT. LAUDERDALE, FL, 33316

Customer CJCO1
Your Ref booking # 10831704 (5)
Taken By Amanda Fricla
Sales Rep Default
Delivery On 11/30/2021
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



Page 1 of 1

Special Instructions	Notes
BOOKING NUMBER: 10831704 DNA REF # 352613	ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	8T40 1170143	Pile 8" tip x 40 ft - 2.5CCA Pile 20m	96 Each	371.96	Each	35,708.16
2	10T35	Pile 10" tip x 35ft - 2.5CCA Pile 25m	9 Each	463.42	Each	4,170.78
3	10T40	Pile 10" tip x 40ft - 2.5CCA	14 Each	536.59	Each	7,512.26
4	MAR16	Marine Deck 2x6x16	1,792 Each	23.04	Each	41,287.68
5	210P20	actual dimensions: 1.5" x 5.5" x 16' Deck	400 Each	36.68	Each	14,672.00
6	210P10	2x10x20 #1 .60CCA actual dimensions: 1.5" x 9.25" x 20'	814 Each	18.23	Each	14,839.22
7		2x10x10 #1 .60 CCA actual dimensions: 1.5" x 9.25" x 10'				
ALL PRICING IS USD\$						

Handwritten calculations:
4,87
0,68m²
= 1219,17m²

Total Amount	\$118,190.10
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$118,190.10



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2674425
12/28/2021

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4610 McINTOSH RD.
FT. LAUDERDALE, FL, 33316

Customer

Your Ref booking # 10838843 (9)
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 12/28/2021
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10838843
DNA REF # 313219

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T40 = 1072,996 m	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA Pilote 25cm	88 Each	536.59	Each	47,219.92
2	6T10	Pile 6"tip x 10ft - 2.5CCA 25cm 15cm	296 Each	36.59	Each	10,830.64
3	} 914,4 m	ALL PRICING IN USD\$				
4		Pile 6"tip x 10ft - 2.5CCA 25cm 15cm over-shipped no charge	4 Each	0.00	Each	0.00

Total Amount	\$58,050.56
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$58,050.56



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2690780
01/10/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4610 McINTOSH RD.
FT. LAUDERDALE, FL, 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10841887 (10)
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 01/10/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10841887
DNA REF # 353222

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T35	Pile 10"tip x 35ft - 2.5CCA 490,728 ml	46 Each	463.42	Each	21,317.32
2	10T40	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA 60,96 ml	5 Each	536.59	Each	2,682.95
3	310P10RC60	3x10x10 #1 .60 CCA RGH	18 Each	54.59	Each	982.62
4	414P10RC60	4x14x10 #1 .60 CCA RGH	8 Each	430.38	Each	3,443.04
5	414P20RC60	4x14x20 #1 .60 CCA RGH	28 Each	1,174.59	Each	32,888.52
6	414P24RC60	4x14x24 #1 .60 CCA RGH	2 Each	1,737.73	Each	3,475.46
7	314P20RC60	3x14x20 #1 .60 CCA RGH	89 Each	844.31	Each	75,143.59
8	8T35	Pile 8" tip x 35 ft - 2.5CCA 74,676 ml	7 Each	335.37	Each	2,347.59
9	8T45	Pile 8"tip x 45 ft - 2.5CCA 41,148 ml	3 Each	463.42	Each	1,390.26
10	6T16	Pile 6"tip x 16ft - 2.5CCA 468,17 ml	96 Each	67.08	Each	6,439.68
11	6T20	Pile 6" tip x 20ft - 2.5CCA 60,96	10 Each	97.55	Each	975.50
12		ALL PRICING IN USD\$				

$$0,1016 \times 0,3556 \times 3,048 = 0,11 \text{ m}^3 \times 8 = 0,88$$
$$0,1016 \times 0,3556 \times 6,096 = 0,22 \text{ m}^3 \times 28 = 6,17$$
$$0,1016 \times 0,3556 \times 7,31 = 0,26 \text{ m}^3 \times 2 = 0,52$$
$$0,0762 \times 0,3556 \times 6,096 = 0,16 \text{ m}^3 \times 89 = 14,70$$

Total Amount	\$151,086.53
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$151,086.53

23,33 m³



Harbor Exports
 245 SW 33rd St.
 Ft. Lauderdale, FL 33315
 954-834-6200

INVOICE
2888690
 08/31/2022

Order No
 Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
 NUMBER 901.501.273-2
 CONSORCIO JCO MALLORQUIN
 ID NUMBER 901.501.273-2
 c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
 NUMBER 901.501.273-2
 c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
 FCA PORT EVERGLADES (SUN
 TERMINALS INC SOUTH)
 4610 McINTOSH RD.
 FT. LAUDERDALE, FL, 33316

Customer

CJCO1
 Your Ref booking # 10905539 (19) s
 Taken By Amanda Fricia
 Sales Rep Default
 Delivery On 08/31/2022
 Contact Name SANTIAGO
 Contact Number +57 310 6144246
 Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions	Notes
BOOKING NUMBER: 10905539 DNA REF NUMBER: 354005	ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	312P12RC60	3x12x12 #1 .60 CCA RGH	149 Each	126.29	Each	18,817.21
2	38P12RC60	3x8x12 #1 .60 CCA RGH	41 Each	76.90	Each	3,152.90
3	314P12RC60	3x14x12 #1 .60 CCA RGH	94 Each	254.49	Each	23,922.06
4		all pricing in USD\$				
		$0,0762 \times 0,3047 \times 3,6576 =$ $0,0762 \times 0,2032 \times 3,6576 =$ $0,0762 \times 0,3556 \times 3,6576 =$ $0,085 \times 149 =$ $0,056 \times 41 =$ $0,099 \times 94 =$ $12,66$ $2,30$ $9,306$ $24,266m^3$				
		$0,092 m^3 \rightarrow 1,2 ml$ $24,266 \rightarrow x$ $x = 316 ml$				

Total Amount	\$45,892.17
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$45,892.17



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2559175
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -1 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions	Notes
BOOKING NUMBER: 10916903 DNA REF NUMBER: 354312	ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 610m ²	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$ 13.97 x 4,8768 = 0,68 m ² x 6.58m				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2559176
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Your Ref booking # 10916903 (20) -2 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	24N10P	2x4x10 #1 Prime - GC DECK	1,976 Each	8.52	Each	16,835.52
2		ALL PRICING IN USD\$ 610 m ²				

Total Amount	\$16,835.52
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$16,835.52

Subject to our terms and conditions of sale. Further copies available on request.



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2559177
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -3 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10916903 DNA REF NUMBER: 354312			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 610m ²	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559178

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -4 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10916903 DNA REF NUMBER: 354312			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 610m ²	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2559179
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -5 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	24N8P	2x4x8 #1 Prime - GC	1,896 Each	6.36	Each	12,058.56
2	24N10P	2x4x10 #1 Prime - GC	520 Each	8.52	Each	4,430.40
3		ALL PRICING IN USDS				
Barro $0,050 \times 0,10 \times 2,43 = 0,012 \times 1896 = 22,75$$0,050 \times 0,10 \times 3,048 = 0,015 \times 520 = 7,8$$30,55 \text{ m}^3$ $0,092 \text{ m}^3 \rightarrow 12 \text{ mL}$$30,55 \rightarrow x$$x = 398 \text{ mL}$						

Total Amount	\$16,488.96
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$16,488.96



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559181
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -6 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	24N10P	2x4x10 #1 Prime - GC <i>deck</i>	738 Each	8.52	Each	6,287.76
2	MAR16	Marine Deck 2x6x16 <i>392 m2</i>	576 Each	20.73	Each	11,940.48
3		all pricing in USD\$				

Total Amount	\$18,228.24
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,228.24



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559182

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -7 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	24N8P	2x4x8 #1 Prime - GC <i>Baranda ml???</i>	2,704 Each	6.36	Each	17,197.44
2		ALL PRICING IN US\$				
		<i>Baranda</i>				
		$0,012 \times 2704 = 32,45 m^3$				
		<i>*Baranda 1,2ml</i>				
		<i>Diagonal = 3,6cm x 8cm x 55cm</i>				
		$0,036 \times 0,08 \times 0,55 = 0,0016 m^3$				
		$Marcos = 0,036 \times 0,06 \times 1,12 \times 2 = 0,0048 m^3$				
		$Paral = 0,07 \times 0,16 \times 1,15 \times 2 = 0,047 m^3$				
		$Barrote = 0,036 \times 0,08 \times 1,40 \times 7 = 0,028 m^3$				
		$Paromano = 0,036 \times 0,23 \times 1,2 = 0,0099 m^3$				
		$0,092 m^3 / 1,2ml Baranda$				

$$0,092 m^3 \rightarrow 1,2ml$$

$$32,45 \rightarrow x$$

$$x = 423 ml$$

Total Amount	\$17,197.44
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$17,197.44



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2559183
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -8 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 610m ²	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2559184
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer CJCO1
Your Ref booking # 10916903 (20) -9 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	24N10P	2x4x10 #1 Prime - GC <i>DECK 610m²</i>	1,976 Each	8.52	Each	16,835.52
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$16,835.52
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$16,835.52



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559186

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -10 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16	360 Each	20.73	Each	7,462.80
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$7,462.80
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$7,462.80



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559187
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McIntosh Rd., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -11 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 610 m ²	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559188

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Customer CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -12 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$ 610m ²				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559189

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer CJC01
Your Ref booking # 10916903 (20) -13 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10916903 DNA REF NUMBER: 354312			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

2559191
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -14 s
Taken By Amanda Fricla
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2559192
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -15 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	MAR16	Marine Deck 2x6x16 <i>610m²</i>	896 Each	20.73	Each	18,574.08
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$18,574.08
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$18,574.08



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-8200

INVOICE

2559140

10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref Booking # 10916903 (20) -17 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10916903 DNA REF NUMBER: 354312			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T40	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA	11 Each	344.18	Each	3,786.03
2	10T40	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA	11 Each	586.42	Each	6,450.62
3		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$10,236.65
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$10,236.65



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2777175
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Customer CJC01
Your Ref Booking # 10916903 (20) -16 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/06/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10916903
DNA REF NUMBER: 354312

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA <i>Q10388 17cm</i>	96 Each	71.58	Each	6,871.82
2		ALL PRICING IN USD\$ <i>585,21 ml</i>				

Total Amount	\$6,871.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,871.82



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2777176
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Your Ref booking # 10927276 (21)-1 s
Taken By Amanda Fricla
Sales Rep Default
Delivery On 02/25/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10927276
DNA REF NUMBER: 354917

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	6T16	Pile 6"tip x 16ft - 2.5CCA <i>clostr 15cm</i>	180 Each	42.06	Each	7,571.69
2		ALL PRICING IN USD\$ <i>877,82ml</i>				

Total Amount	\$7,571.69
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$7,571.69



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-8200

INVOICE
2777177
10/19/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10927276 (21)-2 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 02/25/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10927276
DNA REF NUMBER: 354917

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA	96 Each	71.58	Each	6,871.82
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$6,871.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,871.82



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2777178
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10927276 (21)-3 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 02/25/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10927276
DNA REF NUMBER: 354917

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20 286,51m ²	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA Q103802 17	47 Each	71.58	Each	3,364.33
2	210P12 20,4m ²	2x10x12 #1 .60 CCA Deck	30 Each	30.00	Each	900.00
3		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$4,264.33
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$4,264.33



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2777179
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Customer CJCO1
Your Ref booking # 10927276 (21)-4 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/18/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10927276
DNA REF NUMBER: 354917

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	6T16 780,29 ml	Pile 6"tip x 16ft - 2.5CCA <i>2.5CCA IS</i>	160 Each	42.06	Each	6,730.39
2		ALL PRICING IN US\$				

Total Amount	\$6,730.39
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,730.39



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
3186190
10/19/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Customer CJCO1
Your Ref booking # 10927276 (21)-4a s
Taken By Angel Wolfe
Sales Rep Default
Delivery On 10/19/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes				
BOOKING NUMBER: 10927276 DNA REF NUMBER: 354917			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO				
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total	
1	6T10	Pile 6"tip x 10ft - 2.5CCA	20 Each	25.36	Each	507.22	
2		ALL PRICING IN USD\$					

Total Amount	\$507.22
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$507.22



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2777181
11/09/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking # 10935121 (22)
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 11/10/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10935121
DNA REF NUMBER: 354924

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA	96 Each	71.58	Each	6,871.82
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$6,871.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,871.82



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2777183
11/21/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer CJC01
Your Ref booking # 10939099 (23) s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 10/18/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



This is a reprint

Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10939099
DNA REF NUMBER: 354928

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA	96 Each	71.58	Each	6,871.82
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$6,871.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,871.82



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE
2777182
12/01/2022

Order No
Order Date

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer CJCO1
Your Ref booking #10940596 (24) s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 12/01/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10940596
DNA REF NUMBER: 354931

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	7T20	Pile 7"tip x 20ft - 2.5CCA	96 Each	71.58	Each	6,871.82
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$6,871.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$6,871.82



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

INVOICE

Order No
Order Date

2559143
12/07/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

Your Ref booking #10945460 (26)-1 s
Taken By Amanda Fricla
Sales Rep Default
Delivery On 12/01/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



This is a reprint

Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10945460 DNA REF NUMBER: 354935			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T40 256,03 ml	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA	21 Each	586.42	Each	12,314.82
2		ALL PRICING IN USD\$				

Total Amount	\$12,314.82
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$12,314.82

Subject to our terms and conditions of sale. Further copies available on request.



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2559141
12/07/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking #10942869 (25)-1 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 12/01/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax

This is a reprint



Page 1 of 1

Special Instructions

BOOKING NUMBER: 10942869
DNA REF NUMBER: 354933

Notes

ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW
PINE
SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE
AND TREATMENT INFO

Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T40 268,22m ^l	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA	22 Each	586.42	Each	12,901.24
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$12,901.24
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$12,901.24



Harbor Exports
245 SW 33rd St.
Ft. Lauderdale, FL 33315
954-834-6200

Order No
Order Date

INVOICE
2559142
12/07/2022

Invoice Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS

Delivery Address

CONSORCIO JCO MALLORQUIN ID
NUMBER 901.501.273-2
c/o KING OCEAN/ DNA LOGISTICS
FCA PORT EVERGLADES (SUN
TERMINALS INC SOUTH)
4601 McINTOSH RD., FT.
LAUDERDALE, FL 33316

Customer

CJCO1
Your Ref booking #10942869 (25)-2 s
Taken By Amanda Fricia
Sales Rep Default
Delivery On 12/01/2022
Contact Name SANTIAGO
Contact Number +57 310 6144246
Contact Fax



Page 1 of 1

Special Instructions			Notes			
BOOKING NUMBER: 10942869 DNA REF NUMBER: 354933			ALL LUMBER SOLD IS SOUTHERN YELLOW PINE SEE "DESCRIPTION" SECTION FOR GRADE AND TREATMENT INFO			
Line	Product Code	Description	Qty/Footage	Price	Per	Total
1	10T40 268,22m	Pile 10"tip x 40ft - 2.5CCA	22 Each	586.42	Each	12,901.24
2		ALL PRICING IN USDS				

Total Amount	\$12,901.24
Sales Tax	\$0.00
Order Total	\$12,901.24

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1549 211129CAFEC0BBAXXX0591035337
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : IRVTUS3NXXX
        THE BANK OF NEW YORK MELLON
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : ae694828-a213-42e8-a33a-4aa59ca79bd0
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    013860309801
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 29 Nov 2021
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #141.579,49#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE
    1/HARBOR EXPORTS
    2/1281 COURT ST CLEARWATER
    3/US/CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/TRANSFER FUNDS
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:0D9175490FA9}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1337 211209CAFEC0BBAXXX0601074643
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : BOFAUS3NXXX
          BANK OF AMERICA, N.A.
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 58bcff45-33b5-4c54-83ff-7b98d2972aef
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   013881049101
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 09 Dec 2021
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #215.420,01#
50K: Ordering Customer
   /0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125 TEL.3215724205
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
   1/EXPORTS
   2/1281 COURT ST. CLEARWATER FL 3375
   3/US/CLEARWATER
70: Remittance Information
   /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:90607C7B8206}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1706 211214CAFEC0BBAXXX0606108438
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : IRVTUS3NXXX
          THE BANK OF NEW YORK MELLON
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 67a38752-aeed-4dd6-90df-0af5a5068e62
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   013890300301
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 15 Dec 2021
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #92.103,63#
50K: Ordering Customer
   /.0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE
   1/HARBOR EXPORTS
   2/1281 COURT ST
   3/US/CLEARWATER FL
70: Remittance Information
   /RFB/TRANSFER FUNDS
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:8FE5127B9709}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1435 211222CAFEC0BBAXXX0614141842
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : BOFAUS3NXXX
        BANK OF AMERICA, N.A.
        NEW YORK, NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : a90550d7-20ab-4907-994f-24ba518d36d8
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    013907777101
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 22 Dec 2021
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #196.555,36#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORTS
    3/US/ CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/ PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:9A700B8B0163}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1512 220112CAFEC0BBAXXX0636211584
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : BOFAUS3NXXX
        BANK OF AMERICA, N.A.
        NEW YORK, NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 8db87d65-25a8-4457-a696-659982754cda
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    013943935001
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 12 Jan 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #203.123,25#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE
    1/HARBOR EXPORTS
    3/US/CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/TRANSFER FUNDS
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:BF5F97F90CD1}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1138 220217CAFEC0BBAXXX0673342921
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CITIUS33XXX
        CITIBANK N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 54bff5ab-8634-44a7-81f6-4808699c0347
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014007463401
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 17 Feb 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #37.419,57#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59: Beneficiary Customer
    /898102762377
    HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    EXPORTS
    CLEARWATER, USA
70: Remittance Information
    /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:A19A74B1F386}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1123 220222CAFEC0BBAXXX0679358933
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CITIUS33XXX
        CITIBANK N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : d54a7c88-1bd6-490a-ac47-ea5ed50136f8
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014015150401
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 22 Feb 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #15.355,95#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORTS
    3/US/ CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/ PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:20106A85BD67}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1128 220301CAFEC0BBAXXX0686387556
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : IRVTUS3NXXX
          THE BANK OF NEW YORK MELLON
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 50335e95-d0c7-4a0a-9418-efc4151faff4
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   014027175201
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 01 Mar 2022
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #64.294,82#
50K: Ordering Customer
   /0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125 TEL.3215724205
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
   1/EXPORTS
   2/1281 COURT ST CLEARWATER
   3/US/CLEARWATER
70: Remittance Information
   /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:21928D9876E2}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1419 220302CAFEC0BBAXXX0687393095
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : CITIUS33XXX
          CITIBANK N.A.
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : c8a8b9fb-0912-4289-845a-80b111b0f9b3
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   014029571001
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 02 Mar 2022
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #16.889,36#
50K: Ordering Customer
   /0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125 TEL.3215724205
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE
   1/HARBOR EXPORTS
   2/1281 COURT CLEARWATER 33756
   3/US/MIAMI
70: Remittance Information
   /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:8B0CC42BACBD}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1033 220303CAFEC0BBAXXX0688397102
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : IRVTUS3NXXX
          THE BANK OF NEW YORK MELLON
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : eded5187-b4b0-4762-8332-86e4157fb381
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   014031943601
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 03 Mar 2022
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #100.000,00#
50K: Ordering Customer
   /0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125 TEL.3215724205
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE
   1/HARBOR EXPORTS
   2/1281 COURT ST,CLEARWATER FL 33756
   3/US/USA
70: Remittance Information
   /RFB/TRANSFER FUNDS
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:ACDD32747F36}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1714 220331CAFEC0BBAXXX0713518281
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : IRVTUS3NXXX
        THE BANK OF NEW YORK MELLON
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 4411c85d-494c-48cf-9fc0-49dc1f27d12b
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014080678401
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 31 Mar 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #109.216,88#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORTS
    2/1281 COURT ST CLEARWATER FL 33756
    3/US/USA
70: Remittance Information
    /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:EF9BC620E314}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1723 220411CAFEC0BBAXXX0724560122
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CITIUS33XXX
        CITIBANK N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 00fc1ee1-42d2-434e-b63f-7909d97d84ce
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014101369101
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 11 Apr 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #49.633,20#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE
    1/HARBOR EXPORTS
    2/1281 COURT ST
    3/US/USA
70: Remittance Information
    /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:76B56914DA09}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1514 220728CAFEC0BBAXXX0832981915
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CITIUS33XXX
        CITIBANK N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : 394c53e9-f8bc-43cf-9246-b9bf56930e81
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014316680101
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 28 Jul 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #19.601,38#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORTS
    3/US/ CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/ PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:236838038F47}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority      : Normal
Message Input Reference : 1504 220804CAFEC0BBAXXX0839012059
----- Message Header -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender   : CAFEC0BBXXX
          BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
          BOGOTA CO
Receiver  : CHASUS33XXX
          JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
          NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : d59b924d-febb-4a6e-8556-fb02b61255ec
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
   014331404401
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
   Date      : 04 Aug 2022
   Currency   : USD (US DOLLAR)
   Amount     : #9.521,50#
50K: Ordering Customer
   /0560024169996444
   CONSORCIO JCO MALLORQUIN
   ID9015012732
   KR 59 64 125 TEL.3215724205
   /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
   BOFAUS3NXXX
   BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
   /898102762377
   1/HAVEN DOCK AND MARINE
   1/HARBOR EXPORT
   2/1281 COURT ST CLEARWATER FL 33756
   3/US/FLORIDA
70: Remittance Information
   /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
   OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:B6E7D0633A9F}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1633 220920CAFEC0BBAXXX0885193390
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CHASUS33XXX
        JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : f141a325-7896-4f16-b156-9a5006442109
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    014428123901
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 20 Sep 2022
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #9.998,40#
33B: Currency/Instructed Amount
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #9.998,40#
50K: Ordering Customer
    /.0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59: Beneficiary Customer
    /898102762377
    HAVEN DOCK MARINE HARBOR EXPORTS
    1281 COURT ST CLEARWATER FL 33756
    US/CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/TRANSFER FUNDS
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:63AFC9F7A666}}

```

{1: FIN MESSAGE/Sesion/ISN F01 CAFECOBXXXX}
{2: Input Message Type 103 104-Mensaje 103 RED
Sent to IRVTUS3NXXXX
. BANK OF NEW YORK}
{3: Service Type Identifier {111:001}
Unique End to End Transaction Reference
{121:09c41d1a-2597-4c85-87f2-9d585ffba480}}

* Transaction Reference No:
:20:013870277101
* Bank Operation Code:
:23B:CRED
* Value Date/Currency/Interbank Settled Amount:
:32A:211203USD63262,80
* Ordering Customer:
:50K:/0560024169996444
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
ID9015012732
KR 59 64 125 TEL.3215724205
/CO/BARRANQUILLA
* Account With Institution
:57A:BOFAUS3NXXX
*BANK OF AMERICA, N.A.
* Beneficiary Customer:
:59F:/898102762377
1/HAVEN DOCK AND MARINE
1/HARBOR EXPORTS
2/1281 COURT ST CLEARWATER
3/US/CLEARWATER
* Remittance Information
:70:/RFB/TRANSFER FUNDS
* Details of Charges
:71A:OUR

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1438 211109CAFEC0BBAXXX0573964188
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : BOFAUS3NXXX
        BANK OF AMERICA, N.A.
        NEW YORK, NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : efcbcbeb-042b-4d2b-b082-cb48398ed2f3
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    013825418301
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 09 Nov 2021
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #237.210,89#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORTS
    3/US/ CLEARWATER
70: Remittance Information
    /RFB/ PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:CA28BA8F691F}}

```

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1508 211123CAFEC0BBAXXX0585013605
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFEC0BBXXX
        BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.)
        BOGOTA CO
Receiver : CITIUS33XXX
        CITIBANK N.A.
        NEW YORK,NY US
SLA Identifier : 001
Unique End-to-End Transaction Reference : d96c62ba-892c-4f35-ba8f-2f338a080db3
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    013850451301
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    Date : 23 Nov 2021
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #46.868,59#
50K: Ordering Customer
    /0560024169996444
    CONSORCIO JCO MALLORQUIN
    ID9015012732
    KR 59 64 125 TEL.3215724205
    /CO/BARRANQUILLA
57A: ACCOUNT With Institution
    BOFAUS3NXXX
    BANK OF AMERICA, N.A.
59F: Beneficiary Customer
    /898102762377
    1/HAVEN DOCK AND MARINE HARBOR
    1/EXPORT
    2/1281 COURT ST CLEARWATER
    3/US/CLEANWATER
70: Remittance Information
    /RFB/PAYMENT IMPORT
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{5:{MAC:00000000}{CHK:2BE646154FDF}}

```
