

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO							
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
ACTA No.	2						
FECHA DEL ACTA	22/06/2023						
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 - 26/12/2022						
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA						
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0						
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3						
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4					
	C.C./NIT	901662105					
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CRISTIAN MATEUS ACEVEDO					
	C.C./NIT	91232278					
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS					
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura					
	C.C.	91278629					
INTERVENTOR	NOMBRE:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.					
	C.C./NIT:	810002747					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.165.900.979,00						
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00						
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	\$ 649.770.293,70						
CDP	NÚMERO:	6597, 1518					
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023					
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica					
	FECHA:	No Aplica					
RP	NÚMERO:	12535, 1126					
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023					
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica					
	FECHA:	No Aplica					
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023					
	Fecha de Finalización	23/08/2023					
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica					
	Duración	SEIS (7) MESES					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final		
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato		
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones			
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
	GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					Desde	Hasta	
		SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$ 649.770.293,70
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$ 649.770.293,70	

		INVERSION DEL ANTICIPO				
		RESPONSABILIDAD	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	\$ 300.000.000,00
		CIVIL	96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
		EXTRACONTRACTUAL				
		PAGO DE SALARIOS,	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	\$ 216.590.097,90
		PRESTACIONES	96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	\$ 216.590.097,90
		SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
		CALIDAD Y CORRECTO	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	\$ 433.180.195,80
		FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	\$ 433.180.195,80
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$ 433.180.195,80
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	\$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	\$ 433.180.195,80
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS		17/01/2023, 17/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023				
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO DE COBRO		DESDE: 01/04/2023				
		HASTA: 30/04/2023				
VALOR A COBRAR		\$ 45.491.079,90				
ANTICIPO AMORTIZADO		30.00 % Valor a amortizar: \$ 13.647.323,97				
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
	Abril	05/05/2023	9450670069		\$ 25.528.001,00	
	Abril	10/05/2023	9450799665		\$ 4.200.000,00	
	Abril	10/05/2023	9450792770		\$ 1.160.000,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver planilla anexa		Ver planilla anexa		Ver planilla anexa	
	VR PAGADO \$ 1.235.800,00		VR PAGADO \$ 4.756.700,00		VR PAGADO \$ 2.076.100,00	
CONSTANCIAS						
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra CRISTIAN MATEUS ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO V4, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.						
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada						
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.						
4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:						

Handwritten signature

Handwritten mark


Valor ejecutado en la presente acta:	2	\$ 45.491.079,90
Valor IVA:		\$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 13.647.323,97
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 31.843.755,93

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300250893	\$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300250893	\$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 22 de Junio de 2023.

Interventor



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.
Interventor

Contratista



CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ

Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO

Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON

Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACRUZ

Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA



CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 02 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 02 del contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022		
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.165.900.979,00		
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	\$ 649.770.293,70		
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	-		
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	-		
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 2.165.900.979,00		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	\$ 649.770.293,70		
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL No1:	-		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	SIETE (7) MESES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN MATEUS ACEVEDO C.C. 91.232.278		
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	-	-	-
ACTA DE REINICIACIÓN	-	-	-
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	-
N° DE CDP Y FECHA	00006597 - 29/09/2022 INICIAL	00001518 - 22/01/2023 RESERVA	-
VALOR DE CDP	\$ 13.883.717.658,77	\$ 2.165.900.979,00	-
N° DE RP Y FECHA	00012535 - 27/12/2022 INICIAL	0001126 - 22/01/2023 RESERVA	-



VALOR DE RP	\$ 2.165.900.979,00	\$ 2.165.900.979,00	-
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	00001126 - 22/01/2023	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO		

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de junio de 2023.



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoria



	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 2

DEPENDENCIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO	
ACTA No.		2	
FECHA DEL ACTA		15 DE JUNIO DE 2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4	
	C.C/ NIT	901.662.105-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CRISTIAN MATEUS ACEVEDO	
	C.C	91.232.278	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	
	C.C/NIT	810.002.747-0	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.165.900.979	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
VALOR ADICIONADO	-	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 649.770.293,70		
CDP	NÚMERO: 00006597	NÚMERO: 00001518	
	FECHA: 29/09/2022	FECHA: 22/01/2023	
CDP ADICIONAL	-		
	-		
RP	NÚMERO: 00012535	NÚMERO: 00001126	
	FECHA: 27/12/2022	FECHA: 22/01/2023	
RP ADICIONAL	-		
	-		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023	
	Fecha de Finalización:	23/08/2023	
	Nueva fecha de terminación:	-	
	Duración:	7 MESES	



	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 2 de 4

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
	Suspensiones	-	-	-	-
	Prórrogas	-	-	-	-
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	-	-	-	-
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	-	-	-	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$433.180.195,80
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$649.770.293,70
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$649.770.293,70
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	\$216.590.097,90
			96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	\$216.590.097,90
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	\$433.180.195,80
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	\$433.180.195,80
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	\$300.000.000,00
96-40-101062974-3	24/01/2023		24/08/2023	\$348.000.000,00		

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	Principal	17/01/2023
	Acta de Inicio	17/02/2023


DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01/04/2023
	HASTA: 30/04/2023
VALOR A COBRAR (Contrato)	\$45.491.079.90
ANTICIPO AMORTIZADO	\$13.647.323,97



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><th>PERIODO DE COTIZACIÓN</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>Nro. PLANILLA INTEGRADA</th><th>INGRESO BASE DE COTIZACIÓN</th></tr><tr><td rowspan="3">ABRIL 2023</td><td>05/05/2023</td><td>9450670069</td><td>\$25.528.001</td></tr><tr><td>10/05/2023</td><td>9450792770</td><td>\$1.160.000</td></tr><tr><td>10/05/2023</td><td>9450799665</td><td>\$4.200.000</td></tr><tr><th>ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD</th><th>ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES</th><th>ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES</th></tr><tr><td>COOSALUD EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS</td><td>PORVENIR PROTECCIÓN</td><td>POSITIVA ARL</td></tr><tr><th>VR PAGADO</th><th>VR PAGADO</th><th>VR PAGADO</th></tr><tr><td>\$1.021.400 \$46.400 \$168.000</td><td>\$3.899.100 \$185.600 \$672.000</td><td>\$1.777.500 \$6.100 \$292.500</td></tr></table>	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	ABRIL 2023	05/05/2023	9450670069	\$25.528.001	10/05/2023	9450792770	\$1.160.000	10/05/2023	9450799665	\$4.200.000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	COOSALUD EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	PORVENIR PROTECCIÓN	POSITIVA ARL	VR PAGADO	VR PAGADO	VR PAGADO	\$1.021.400 \$46.400 \$168.000	\$3.899.100 \$185.600 \$672.000	\$1.777.500 \$6.100 \$292.500
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN																							
	ABRIL 2023	05/05/2023	9450670069	\$25.528.001																							
		10/05/2023	9450792770	\$1.160.000																							
		10/05/2023	9450799665	\$4.200.000																							
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES																								
	COOSALUD EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	PORVENIR PROTECCIÓN	POSITIVA ARL																								
	VR PAGADO	VR PAGADO	VR PAGADO																								
\$1.021.400 \$46.400 \$168.000	\$3.899.100 \$185.600 \$672.000	\$1.777.500 \$6.100 \$292.500																									
CONSTANCIAS																											
<p>1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS en calidad de Interventor, y por la otra CRISTIAN MATEUS ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO ALUMBRADO V4 en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.</p> <p>2. CONSORCIO ALUMBRADO V4 acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas relacionadas.</p> <p>3. CONSORCIO ALUMBRADO V4 ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 413 DE 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.</p> <p>4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <table><tr><td>Valor ejecutado en la presente acta:</td><td>\$45.491.079,90</td></tr><tr><td>Valor IVA:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Menos amortización del anticipo</td><td>\$13.647.323,97</td></tr><tr><td>Valor bruto ejecutado a pagar</td><td>\$31.843.755,93</td></tr></table> <p>5. Se adhiere y anula estampilla(s):</p> <table><tr><th>ESTAMPILLA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PRO HOSPITAL</td><td>2502300250893</td><td>\$3.900</td></tr><tr><td>ORDENANZA</td><td>2502300250893</td><td>\$390</td></tr></table>				Valor ejecutado en la presente acta:	\$45.491.079,90	Valor IVA:	N/A	Menos amortización del anticipo	\$13.647.323,97	Valor bruto ejecutado a pagar	\$31.843.755,93	ESTAMPILLA	No.	VALOR	PRO HOSPITAL	2502300250893	\$3.900	ORDENANZA	2502300250893	\$390							
Valor ejecutado en la presente acta:	\$45.491.079,90																										
Valor IVA:	N/A																										
Menos amortización del anticipo	\$13.647.323,97																										
Valor bruto ejecutado a pagar	\$31.843.755,93																										
ESTAMPILLA	No.	VALOR																									
PRO HOSPITAL	2502300250893	\$3.900																									
ORDENANZA	2502300250893	\$390																									

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el quince (15) de junio de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventoría

Contratista

CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
RL- CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

243

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

Elaboro. Ing. Luis Alfredo Bedoya – Director de Interventoria

VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino – CPS Alumbrado Publico

VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía – CPS Alumbrado Publico

VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla – CPS Alumbrado Publico

VoBo. Ing. John Fernando Larrotta – Supervisor Alumbrado Publico



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300250893

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$3.900

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300250893(3900)0000000004290(96)20230515



2068512013



3799157868

Total \$3.900

Ordenanza 012 \$390

Total a Pagar \$4.290

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300250893



2068512013



3799157868

PRO HOSPITAL \$3.900

Trámite

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección:

Número: 9016621053

Teléfono:

Total \$3.900

Ordenanza 012 \$390

Total a Pagar \$4.290



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300250893

PRO HOSPITAL \$3.900

SYC

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar \$4.290

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15

Total \$3.900

Ordenanza 012 \$390



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300250893

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL \$3.900

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300250893(3900)0000000003900(96)20230515

Total \$3.900

Ordenanza 012 \$390

Total a Pagar \$4.290

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300250893

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300250893(3900)0000000003900(96)20230515



(415)8902012356006(8020)02502300250893(3900)0000000003900(96)20230515

PRO HOSPITAL \$3.900

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 2023/05/08

Total a Pagar \$4.290

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$3.900
Ordenanza 012 \$390

Gobernación

Banco

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIROH	BUICARAMANGA-SANTANDER	6185839	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-04	2023-05	2064712831	9450670069	E	2023/05/03	2023/05/05	BANCOLOMBIA	2	\$7,816,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	Ingre	Ret	Ex	Ex	Ex	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL- PERSONAL PROFESIONAL (7 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: PERSONAL PROFESIONAL (7 Afiliados)																												
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)																												
1	CC	1216971535	FUENTES ALEJANDRO																									
2	CC	105823625	MATEUS CRISTIAN																									
3	CC	91232278	MATEUS CRISTIAN																									
4	CC	37841476	MENDOZA CLAUDIA																									
5	CC	91332849	MORA JAVIER																									
6	CC	1058771495	MUTOIA SERGIO																									
7	CC	1058774743	MEGA CARLOS																									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Ingre	Ret	Ex	Ex	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL- PERSONAL OPERATIVO (11 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: PERSONAL OPERATIVO (11 Afiliados)																																			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																																			
8	CC	13835048																																	
9	PT	6034315																																	
10	CC	1005150353																																	
11	CC	91274822																																	
12	CC	85168927																																	
13	CC	1102359903																																	
14	CC	1085048323																																	
15	CC	85166717																																	
16	CC	1005136965																																	
17	CC	13822074																																	
18	PT	1992175																																	
Total Afiliados(18)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Días Mora	Valor
2023-04	2023-05	2064712831	945067069	E	2023/05/03	2023/05/05	BANCOLOMBIA	2	\$7,816,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR					16	\$3,899,100	\$9,400	\$0	\$3,908,500
					14	\$3,473,500	\$8,300	\$0	\$3,481,800
PROTECCION					2	\$425,600	\$1,100	\$0	\$426,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS					17	\$1,777,500	\$4,300	\$0	\$1,781,800
					17	\$1,777,500	\$4,300	\$0	\$1,781,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFENALCO SANTANDER					17	\$1,021,400	\$2,500	\$0	\$1,023,900
					17	\$1,021,400	\$2,500	\$0	\$1,023,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
COOSALUD EPS					18	\$1,098,800	\$3,100	\$0	\$1,101,900
					1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)					1	\$43,400	\$200	\$0	\$43,600
FAMISANAR					1	\$60,000	\$200	\$0	\$60,200
NUEVA E.P.S.					3	\$189,800	\$500	\$0	\$190,300
NUEVA EPS MOVILIDAD					3	\$139,200	\$400	\$0	\$139,600
SALUD TOTAL					3	\$144,800	\$400	\$0	\$145,200
SANITAS					6	\$475,200	\$1,200	\$0	\$476,400
TOTAL					17	\$7,796,800	\$19,300	\$0	\$7,816,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80401031	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2073427661	9450792770	E	2023/05/18	2023/05/10	BANCOLOMBIA	0	\$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$0	\$185,600	\$185,600
COLPENSIONES		25-14	900.336.004	7	1	\$185,600	\$0	\$185,600	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,100	\$0	\$6,100	\$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860.011.153	6	1	\$6,100	\$0	\$6,100	\$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$46,400	\$46,400
COMPENALCO SANTANDER		CCF40	890.201.578	7	1	\$46,400	\$0	\$46,400	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$46,400	\$46,400
SANITAS		EPS005	800.251.440	6	1	\$46,400	\$0	\$46,400	\$46,400
TOTAL					1	\$284,500	\$0	\$284,500	\$284,500



Hoja 1 de 5

CONDICIONES ORIGINALES										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
	3.04	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3/4" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	23.00	\$ 80,494.00	\$ 1,851,362.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
	3.05	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4/2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomil. Incluye topomil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	358.00	\$ 594,407.00	\$ 212,797,706.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	18.00	\$ 10,699,326.00	18.00	\$ 10,699,326.00		\$ 10,699,326.00		
	3.06	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4/2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	454.00	\$ 100,063.00	\$ 45,428,602.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	82.40	\$ 8,245,191.20	82.40	\$ 8,245,191.20		\$ 8,245,191.20		
	3.07	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5/2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomil. Incluye topomil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	430.00	\$ 741,283.00	\$ 318,751,690.00	59.50	\$ 44,106,338.50		59.50	\$ 44,106,338.50	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	59.50	\$ 44,106,338.50		
	3.08	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5/2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	600.00	\$ 119,633.00	\$ 71,779,800.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	221.90	\$ 26,546,562.70	221.90	\$ 26,546,562.70		\$ 26,546,562.70		
TOTAL CAPITULO 3								\$ 49,872,962.50			\$ 45,491,079.90						\$ 95,364,042.40		
CAPITULO 4 ESTRUCTURAS																			
	4.01	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X860 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marca y contramarcos metálicos soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND	86.00	\$ 1,434,988.00	\$ 123,408,968.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
	4.02	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	UND	620.00	\$ 51,193.00	\$ 31,739,660.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
	4.03	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra compuesto por un electrodo tipo varilla de 2,4m x 5/8" y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND	13.00	\$ 490,741.00	\$ 6,379,633.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
TOTAL CAPITULO 4								\$ 161,528,261.00			\$ 0.00						\$ 0.00		
CAPITULO 5 REDES																			
	5.01	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 1 AI No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 AI No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 AI No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	1500.00	\$ 19,271.00	\$ 28,906,500.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
	5.02	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 3 AI No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 AI No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 AI No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	5100.00	\$ 26,829.00	\$ 136,827,900.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00

CONDICIONES ORIGINALES										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			
	5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchado 75/600V y accesorios de instalación.	ML	3700.00	\$ 18,582.00	\$ 68,753,400.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
TOTAL CAPITULO 5						\$ 234,487,800.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
CAPITULO 6 SALIDAS																					
	6.01	Suministro, transporte e instalación de luminaria DECO LIRA 60 W - 32 LEDS, 8460 Lm, CCT 4000 K, 373 mA, CRI 70, CL I. Incluye soporte top post en aluminio inyectado, sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Negro Mate RAL 9005	UND	12.00	\$ 5,732,623.00	\$ 68,791,476.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
	6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V, B.F.C, 7 Pines, CL II, FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND	137.00	\$ 1,945,229.00	\$ 266,496,373.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
TOTAL CAPITULO 6						\$ 335,287,849.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
CAPITULO 7 POSTES																					
	7.01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 4.5 m de altura total, niple dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad, Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Hornado doble Laca mate y 50cm de pintura epóxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP DECO LIRA.Incluye Canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28.07Kg aprox.	UND	12.00	\$ 1,491,880.00	\$ 17,902,560.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
	7.02	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 10.5m de altura total, 4'73" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Hornado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Philips. Incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47,17Kg.	UND	6.00	\$ 4,250,873.00	\$ 25,505,238.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
	7.03	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 10.5m de altura total, 6'7 2 1/2" Brazo Doble curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Hornado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Philips. Incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 202,90 Kg.	UND	39.00	\$ 6,637,808.00	\$ 258,874,512.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			

CONDICIONES ORIGINALES																						
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1												CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANT	VALOR PARCIAL		VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL				
	7.04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliéster aplicada de manera electrolitica, Hornado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas vasas y arandelas galvanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93,94Kg.	UND	15.00	\$ 3,547,045.00	\$ 53,205,675.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
TOTAL CAPITULO 7						\$ 355,487,985.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				
CAPITULO 8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS																						
	8.01	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	1577.00	\$ 2,112.00	\$ 3,330,624.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.02	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	87.00	\$ 72,911.00	\$ 6,343,257.00	76.67	\$ 5,590,086.37	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	76.67	\$ 5,590,086.37				
	8.03	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	68.00	\$ 180,666.00	\$ 12,285,288.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.04	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	1268.00	\$ 156,206.00	\$ 198,069,208.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.05	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquín fácil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	28.00	\$ 43,850.00	\$ 1,227,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.06	Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, con espaldar en madera teka incluye soldado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	33.00	\$ 796,799.00	\$ 26,294,367.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.07	Construcción de Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 20 cm) Tipo BS.002, incluye soldado, formaleta desdencofrante y acero de refuerzo	MIL	219.00	\$ 122,227.00	\$ 26,767,713.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.08	Construcción de piso en concreto de 3000 psi mezclado en sitio. Acabado rayado con cepillo metálico texturizador.	M3	6.00	\$ 1,193,241.00	\$ 7,159,446.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
	8.09	Suministro e Instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achafianado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m. Incluye sello de juntas	MIL	141.00	\$ 102,860.00	\$ 14,503,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
TOTAL CAPITULO 8						\$ 295,980,963.00		\$ 5,590,086.37		\$ 0.00		\$ 5,590,086.37		\$ 0.00		\$ 5,590,086.37		\$ 5,590,086.37				
CAPITULO 9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																						
	9.01	Implementación del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (malelines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND	1.00	\$ 55,389,647.00	\$ 55,389,647.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
TOTAL CAPITULO 9						\$ 55,389,647.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				
CAPITULO 10 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.																						
	10.01	Elaboración de planos y memorias de calculo AS Build.	UND	1.00	\$ 1,540,565.00	\$ 1,540,565.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				

CONDICIONES ORIGINALES										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL					
	10.02	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1.00	\$ 4,704,422.00	\$ 4,704,422.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00		\$ 0.00					
	10.03	Certificación plena de conformidad con RETILAP expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1.00	\$ 4,529,278.00	\$ 4,529,278.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00		\$ 0.00					
TOTAL CAPITULO 10						\$ 10,774,265.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00		\$ 0.00					
VALOR TOTAL CONTRATO						\$ 2,165,900,979.00		\$ 55,463,048.87		\$ 45,491,079.90		\$ 100,954,128.77									
SALDO POR EJECUTAR:																			\$ 2,064,946,850.23		

ACTA No 1		
	\$55,463,048.87	
	\$16,638,914.66	
	\$38,824,134.21	

ACTA No 2		
	\$45,491,079.90	
	\$13,647,323.97	
	\$31,843,755.93	


VALOR PRESENTE ACTA
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron



Firma:
Nombre: CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
RL CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista



Firma:
Nombre : ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Interventor


Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya - Director Interventoria
Vo. Bo. Ing. Carlos Pino - Apoyo a la supervision
Vo. Bo. Arq. Libardo Mejia - Apoyo a la supervision

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

LOTE 3	FECHA	DÍA	30	MES	4	AÑO	2023
CONTRATISTA	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022					
SUPERVISOR INTERVENTORIA	CONTRATO INTERVENTORIA No.	422 DE 2022					
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.						

CAPITULO	3 CANALIZACIONES	REF.	Contractual
ITEM: 3.05	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomislil. Incluye topomislil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	UND.	ML
		REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

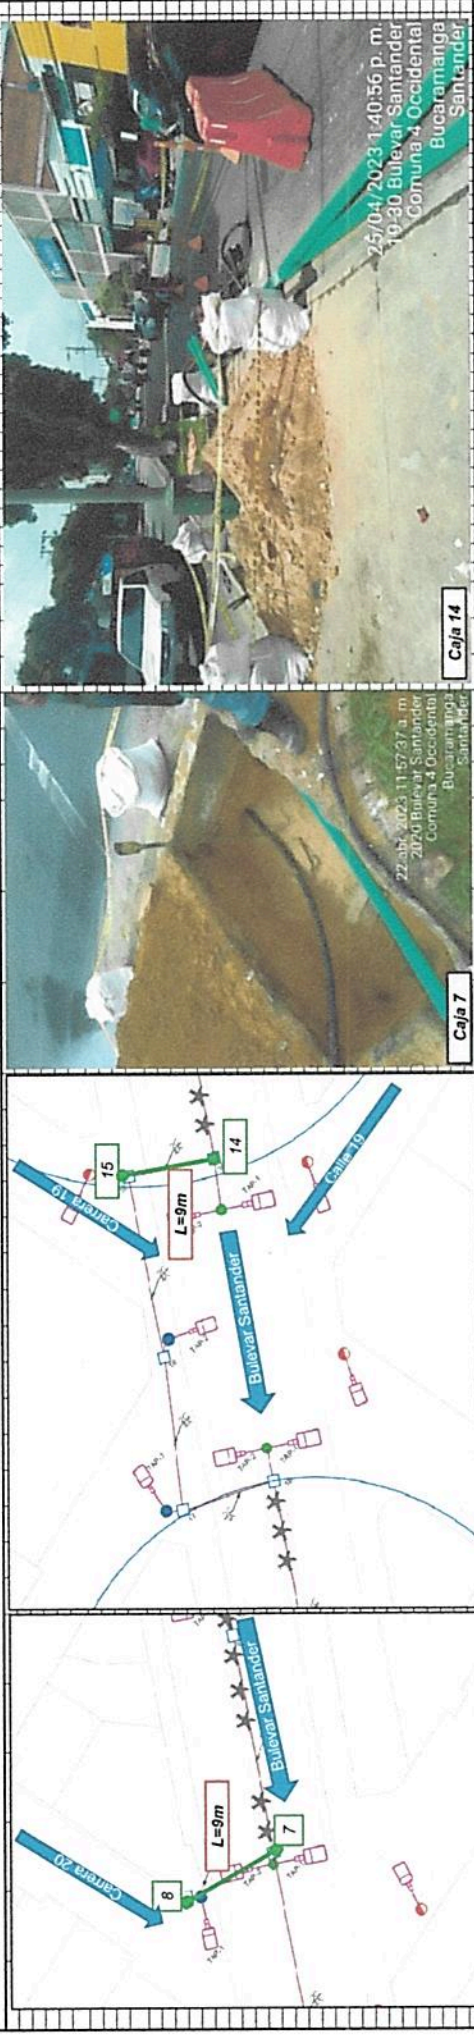

Observaciones	Pag. 2 de 7
---------------	-------------


ING. CRISTIAN MATEUS ÁCEVEDO
CONTRATISTA


ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	FECHA	D/A	30	MES	4	AÑO	2023
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA	CONTRATO OBRA No.		413 DE 2022				
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORIA No.		422 DE 2022				

CAPITULO	3 CANALIZACIONES	REF.	Contractual
ITEM: 3.06	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	Hoja 1


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS			CANT. PARCIAL	VANOS		% Desperd.	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO		LARGO	ANCHO			
GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ									
CAJA 83 - CAJA 84					19.40			19.40	
CAJA 84 - CAJA 85					16.50			16.50	
CAJA 85 - CAJA 88					25.50			25.50	
CAJA 86 - CAJA 87					21.00			21.00	

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

LOTE 3	FECHA	DÍA	30	MES	4	AÑO	2023
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4						
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA						
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.						
	CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022						
	CONTRATO INTERVENTORIA No. 422 DE 2022						

CAPITULO	3 CANALIZACIONES	REF.	Contractual
ITEM: 3.06	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

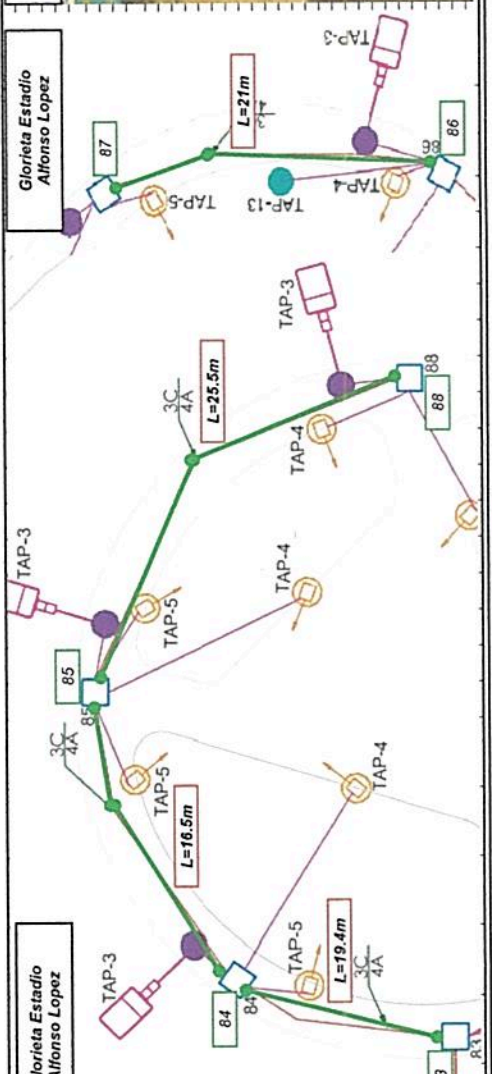

Observaciones

Pag. 4 de 7



ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA


ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

LOTE 3	FECHA	DÍA	30	MES	4	AÑO	2023
CONTRATISTA	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022					
SUPERVISOR INTERVENTORIA	CONTRATO INTERVENTORIA No.	422 DE 2022					
INTERVENTORIA							

CAPITULO	3 CANALIZACIONES	REF.	Contractual
ITEM: 3.08	Suministro,transporto e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	Hoja 2

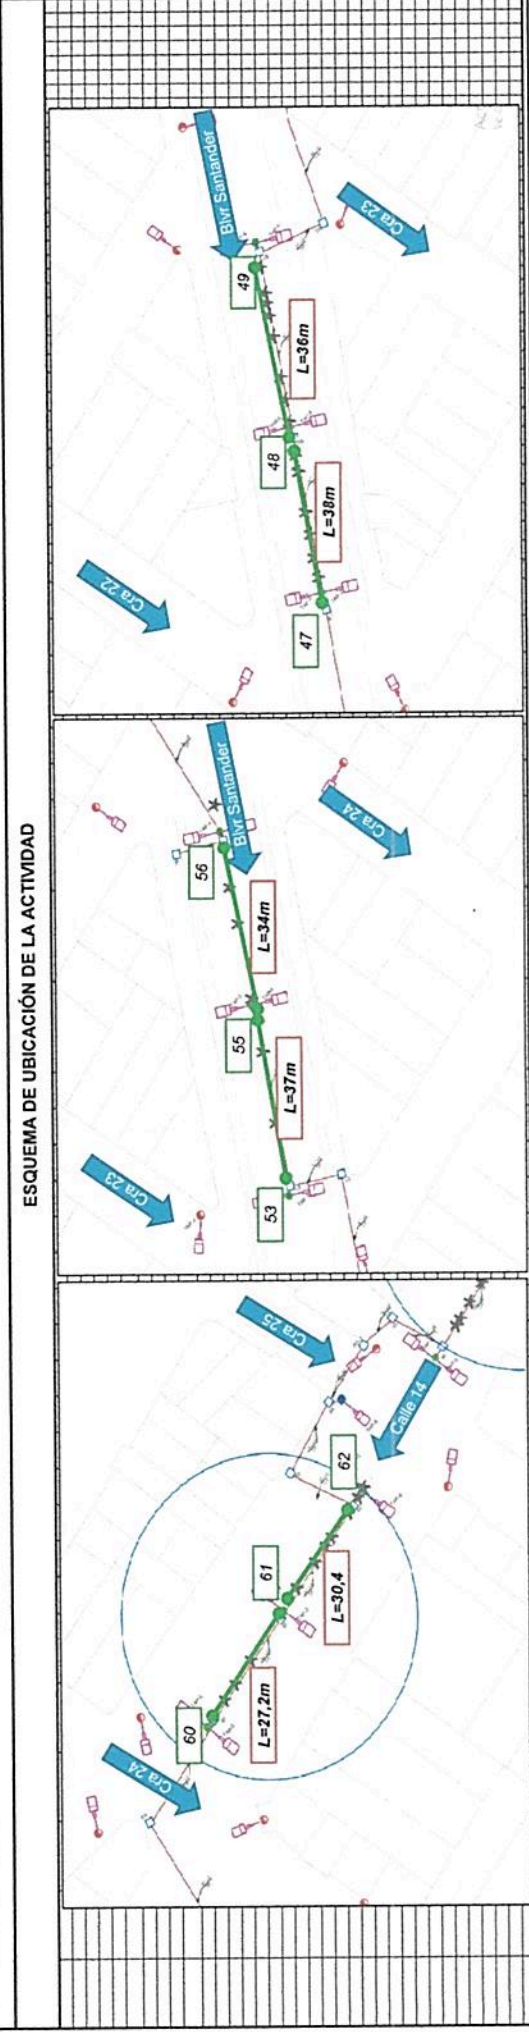

Observaciones	Pag. 6 de 7
---------------	-------------

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA


ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

LOTE 3	FECHA	DÍA	30	MES	4	AÑO	2023
CONTRATISTA	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022					
SUPERVISOR INTERVENTORIA	CONTRATO INTERVENTORIA No.	422 DE 2022					
INTERVENTORIA							

CAPITULO	3 CANALIZACIONES	REF.	Contractual
ITEM: 3.08	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de paja, relleno compactado en arena de paja y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML
		REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

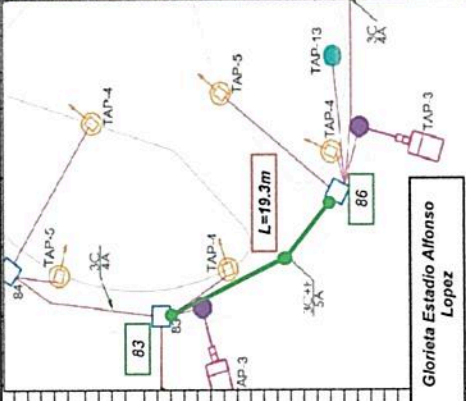

Separador Bivr Santander Cra 24 - Cra 23

Separador Bivr Santander Cra 24 - Cra 23

Separador Calle 14 Cra 25 - Cra 24

Separador Calle 14 Cra 25 - Cra 24

Observaciones	Pag. 7 de 7
---------------	-------------


ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA


ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR
