



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago
DESCOBRAR
194

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01166

Fecha de Pago: 31-03-2023

Estado: PAGADO

PAGADO A:

.. ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,Id: 900157444

DESCRIPCIÓN:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FCATURA N° FE00-1053 Acta Parcial #:3

PGNOR

Vir Bruto: 26,939,725.00 Vir Deducc.: 5,399,264.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 21,540,461.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
45 INSTITUTO PARA DLO ANTIC	39-10012465	Transferencia	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,I	\$21,540,461.00
Total:				\$21,540,461.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5)	2.5	\$22,638,424	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$22,638,424
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$22,638,424	11.RETEF/TE HONORARIO P.JDICAS (11%)	11	\$22,638,424
24. RETEICA COMERCIAL	0.5	\$22,638,424	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FACT)	15	\$4,301,301
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$22,638,424			
TOTAL Deducibles:		\$5,399,264.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

295-1022
PG:3
SIA:
SECOPI

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGOS ARIAS

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

**MUNICIPIO DE BARBOSA**Usuario Ordenó
YPEREZ

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-194

Fecha/Estado

Comprobante: 11 : 11.EGR.CONTRATACION PROYECTOS INVERSIÓN

15/02/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación**CONTRATO:** CO.302**PAGADO A:** ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,Id: 900157444**DESCRIPCIÓN:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FCATURA N° FE00-1053 Acta Parcial #3

PAGADO**Vir Bruto:** 26,939,725.00**Vir Deducc.:** 5,399,264.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 21,540,461.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
-20211694	022233	1.2.3.3.04.7	360.5	2.3.2.01.01.001.03.02.01.13	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS
					Vir. x Código
					\$26,939,725.00

TOTAL: \$26,939,725.00**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5%)	2.5	\$22,638,424	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$22,638,424
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$22,638,424	11.RETEF/TE HONORARIO P.JDICAS (1.1%)	11	\$22,638,424
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%)	0.5	\$22,638,424	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FAC)	15	\$4,301,301
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$22,638,424			

TOTAL Deducibles:

\$5,399,264.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		565,961.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		452,768.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		226,384.00
2.4.36.03	HONORARIOS		2,490,227.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		113,192.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		645,195.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		271,661.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		633,876.00
1.6.40.19.02	INSTALACIONES-UNIDADES DEPORTIVAS	26,939,725.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		21,540,461.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVACLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE**REVISADO** 17 FEB 2023

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.9.90.02.01	CONVENIOS AMVÁ -AREÁ METROPOL VALLE ABURRA	26,939,725.00	
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		26,939,725.00
		53,879,450.00	53,879,450.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUÑOZ HENAO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE



10404-

Medellín,
Febrero 28 de 2023


Señores.
IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Asunto: autorización para realizar desembolso para pago del acta N°3 del contrato 295 de 2022 con cargo al convenio 834 de 2021 por valor de \$26.939.725,15 de la cuenta del IDEA 10012465.

Cordial Saludo,

Por favor autorizar retiro de la cuenta del IDEA 10012465 por la suma de \$26.939.725,15 por concepto de pago de acta N°3 del contrato de interventoría 295 de 2022, para cofinanciar con el municipio de Barbosa la construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha de futbol 11 en la unidad deportiva los Búcaros, los cuales una vez retirados deberán ser consignados por el Municipio de Barbosa a la cuenta corriente N° 420052334 Banco de Occidente a nombre de ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C con Nit. 900.157.444-6 por un valor de \$24.245.752 y al municipio de Barbosa por concepto de retenciones de impuestos por un valor \$2.693.973.

Cordialmente


DIEGO ALBERTO RIVERA GARCÉS
Profesional Universitario
Supervisor Convenio



Futuro sostenible

f t i y @areametropol
www.metropol.gov.co

☎ (57-4) 385 60 00
Carrera 53 N° 40A 31
Medellín-Antioquia Colombia



MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

2022

Pág. 1 de 1
VIGENTE
EGOMEZ

COMPROMISO NÚMERO : 2333 /

Fecha de Impresión: 11-Jul-2022 Fecha del Compromiso: 07/07/2022 00:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CO.302	900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S . .	175,374,112.00
Tipo Compromiso:	63. CONSULTORIAS PRSONAS JCAS CON IVA	
DESCRIPCIÓN:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	07/07/2022 00:00:00	175,374,112.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vir Reservado
-20211694	1.2.3.3.04.7	360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.0	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS	175,374,112.00
Total:				175,374,112.00

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA

SECRETARIO DE HACIENDA

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGÓ ARIAS

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co



Certificado de Disponibilidad Nro: -20211694

Fecha de Impresión: 29-Mar-2022

Fecha de la Reserva: 01-Jan-2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vir Reservado
360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.01.13	1.2.3.3.04.7	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$2,499,990,717.00

Total: \$2,499,990,717.00

Que se Reserva la suma de : . (\$2,499,990,717.00)

Descripción:

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA A TODO COSTO. INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES O NACIONALES. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 834-2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. CODIGO BPIM:2020050790042.

Información Complementaria:

MGA - Productos

4302036- Canchas de alto rendimiento adecuadas

BPIM

No Registra

CPC - Bienes y servicios

96590- Otros servicios deportivos y recreativos

ELDA GOMEZ NINO

PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ROGELIO CORDOBA HOYOS

ALCALDE (E)

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA

SECRETARIO DE HACIENDA

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGOS ARIAS


Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

Viernes, 31 de marzo de 2023

Solicitud **100447**



Cliente:	MUNICIPIO DE BARBOSA	NIT:	8909804457
Tipo Retiro:	ARCHIVO PLANO	Valor:	\$26.939.725
Responsable:	MARLENY DEL SOCORRO SOSA RESTREPO	Documento:	39206433

Plano:	8909804452023331101718.txt	Nro Registros:	7
--------	----------------------------	----------------	---

Identificación	Nombre	Valor	Nro. Cta	Banco	Referencia
9001374246	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC	\$21.543.461	423052334	23	CCNV834 2021ACTA3CP194
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$113.192	344001759	-	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$228.384	55147220338	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$31.335.422	55154211611	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$452.768	55157742773	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$906.537	55171495754	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$565.961	55100000911	7	


1342

7

\$26.939.725



ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUB SECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA: INTERVENCIONES DE CALIDAD A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

NOMBRE: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

NUMERO DE CONTRATO: 0295 de 2022

VALOR DEL CONTRATO CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M.L (\$ 175.374.112.00 M/L)

DIA: 07 **MES:** JULIO **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del Valor de contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

PLAZO: Siete (07) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.



REPORTE DE ACTIVIDADES

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista de obra y la interventoría, que corresponden al contrato No. 293 DE 2022 el cual se ejecuta en el Municipio de Barbosa:

- Se realiza la construcción de viga de cimentación para muro y cerramiento perimetral con el armado de acero de refuerzo y posterior vaciado de concreto.
- Se da inicio a la construcción del cárcamo lateral para la recolección y evacuación del agua lluvia del drenaje de la cancha
- Se realiza armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el tramo del cárcamo
- Se inicia excavación manual en material común para la construcción de zapata en graderías con los ejes ajustados.
- Se realiza vaciado de concreto para la construcción de zapatas
- Se alcanzaron niveles propuestos para excavaciones según las recomendaciones de los especialistas y las características del material encontrado, apto para cimentar estructura de gradería.
- Nivelación del material filtrante en el área de la cancha (se realiza con retroexcavadora, pero la mayoría de la actividad se ejecuta manualmente)
- Lleno con material proveniente de las excavaciones en los bordes externos de las vigas de cimentación.
- Nivelación del terreno en las graderías, para la colocación del entresuelo que servirá de soporte a la placa de contrapiso en la zona de servicios sanitarios, oficina y locales comerciales de la gradería.
- Encofrado de columnas con formaleta metálica y vaciado de las mismas con concreto de 28 Mpa.

PERIODO INFORMADO Y COBRADO: DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.



ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO



Barbosa Social
¡Es la gente!

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades. Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

PARÁGRAFO: se autoriza el pago por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L (\$ 26.939.725,15)** Soportado en la factura FE00-1053 anexa a este documento, el cual afectara el compromiso presupuestal N.º 2333

Para constancia se firma en Barbosa a los 27 días del mes de enero del 2023

GUILLERMO GIL RIOS

Representante legal ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Interventoría de obra

CAROLINA SOSSA ARANGO

Supervisora

CARLOS ARTURO HERRERA MOSQUERA

Apoyo a la supervisión.



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 295 DEL 2022



Barbosa Social ¡Es la gente!

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 295 del 07 de julio de 2022, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	12	2022	AL	30	12	2022
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA			FINANCIERO			
	78.33 %			62.97 %			

1. Datos del Interventor

INTERVENTORIA	ESTRUCTURAS Y AGUAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	GUILERMO GIL RIOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HUMBERTO MARIN CORTÉS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOSE LANDAZURI
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	HERNANDO GONZALEZ HENAO
RESIDENTE SST	YESMIN ADRIANA CUADRO DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL	ALEJANDRO GIL POSADA

Datos del contratista de obra

REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN ANDRES MONTAÑEZ R
DIRECTOR DE OBRA	LUIS MANJEL CORZO P.
RESIDENTE DE OBRA	SONIA SANDOVAL C.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	EDGAR VILLEGAS P.
RESIDENTE SST	LUIS ORLANDO VERGEL P
RESIDENTE AMBIENTAL	PAOLA ANDREA ROMAN
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	PLINIO CARO

2. Datos del contrato

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	295	07/07/2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	20211694	01/01/2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2333	06/07/2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	49-44-101213429	14/07/2022
	49-40-101066013	14/07/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	07/07/2022	
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS Y AGUAS C SAS	



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

NIT	900.157.444-6
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES, DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.834-2021 SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
VALOR	\$ 175.374.112.00 M/L
PLAZO	7 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	01/08/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	01/03/2023
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Objeto del contrato: Interventoría técnica, administrativa ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar en arenilla de fútbol 11 en la unidad deportiva los búcaros en el municipio de Barbosa, Antioquia.

Alcance del objeto:



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

Tanto el objeto como el alcance del mismo se vienen cumpliendo satisfactoriamente por parte del contratista.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas que requiere el proyecto en cada una de las actividades, como lo es; la calidad de los materiales utilizados en obra, la implementación de topografía, el cumplimiento con las dimensiones requeridas de los elementos, y la realización de los ensayos pertinentes a los materiales.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: el contratista ha desarrollado las actividades técnicas cumpliendo con sus obligaciones.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: el contratista ha hecho entrega de todos los documentos exigidos.
- Porcentaje de ejecución física del contrato bajo seguimiento de interventoría: actualmente el porcentaje de ejecución física del contrato de obra corresponde al 50% del total del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	59831756	\$ 86.600	N/A	\$ 11.100	\$ 180.300
Diciembre	59833172	\$ 160.000	\$ 640.000	\$ 278.400	\$ 1.278.400
Diciembre	59833172	\$ 40.000	\$ 160.000	\$ 69.600	\$ 309.600
Diciembre	59608215	\$200.000	\$ 800.000	\$ 348.000	\$ 1.598.000

- Modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: (N/A)
- cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales: (N/A)
- Materialización de riesgos y su mitigación. No se presentaron eventualidades y por lo tanto no se hizo uso de la matriz de riesgos y su mitigación.



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

- observaciones adicionales frente al desempeño del contratista. (N/A)
- Si el contrato ha sido auditado por parte de los entes de control. (N/A)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1.2.3.3.04.7	360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.01	-20211694	- 20214862	\$ 2.217.575.955
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- cambios o reservas presupuestales al presente contrato. (N/A)
- Relación de los pagos realizados.

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
- 20214862	175.374.112	1	11-12-2022	83.496.675,46	\$91.877.436,54	47,61%
- 20214862	175.374.112	2	30-12-2022	26.939.725,15	\$64.937.711,39	62.97%

COMPROMISO PRESUPUESTAL (ADICIÓN)	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se autoriza realizar el primer pago correspondiente a los meses de noviembre del 2022, por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L (\$ 26.939.725,15)**
Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 175.374.112
Adición	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 175.374.112



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



Barbosa Social
¡Es la gente!

Pagos Realizados (Acumulado)	S 110.436.400,61
Pago autorizado del mes de diciembre.	S 23.939.725,15
Porcentaje de ejecución financiera	78,33 %

Si el contrato cuenta con anticipos o es un contrato interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso)
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A
--	-----

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado del mes	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

- Multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. N/A
- Estado de las garantías del contrato



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

1. DE CUMPLIMIENTO:

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
ACTO:	PAGO PARCIAL		
RIESGOS AMPARADOS:	AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADORA
Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N° 49-44-101139963 ANEXO 0	Cumplimiento del Contrato	07/07/2022 hasta 07/06/2023	\$ 35.074.822,40
	Pago de Salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/07/2022 hasta 07/02/2026	\$ 8.768.705,60
	Calidad del servicio	07/02/2022 hasta 07/02/2028	\$ 17.537.411,20
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA -ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A		

2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

CONTRATO:	CONTRATO N° 000295 DE 2022		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
ACTO:	ACTA DE INICIO		
RIESGOS AMPARADOS:	AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADORA
Póliza de garantía responsabilidad civil extracontractual N° 65-40-101066013 ANEXO 0	Predios, labores y operaciones.	07/07/2022 hasta 07/02/2023	\$ 200.000.000,00
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA -ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A		



**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO 295 DEL 2022**



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L (\$ 26.939.725,15)**

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-01-2023

Atentamente,

Carolina Sossa A
CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

GUILLERMO GIL RIOS
Representante legal ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Interventoría de obra



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 20ed101f673a434221e34d667923d2419bbc058054010c173c0b5d4c2e6d1f
08f7aac0cc80cb7bcd06fd92ba00a275c6
Número de Factura: FE00-1053
Fecha de Emisión: 24/01/2023
Fecha de Vencimiento: 23/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 24/01/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTRUCTURAS Y AGUAS S.A.S.
Nombre Comercial: ESTRUCTURAS Y AGUAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900157444
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 51 51 17 OF 700 OF 608
Teléfono / Móvil: 6045117997
Correo: estructurasyaguas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE BARBOSA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CALLE 15 NO. 14-82
Teléfono / Móvil: 4548300
Correo: carolina.sossa@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								EVA	%	INC	%	
1	01	INTERVENCIÓN	NIU	1,00	\$ 22.538.424,80	\$ 3,00	\$ 0,00	\$ 4.331.300,55	19,00			\$ 22.538.424,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro.	Nombre Campo	Valor Campo
------	--------------	-------------

Anticipos

Nro.	Valor	Fecha recibido
------	-------	----------------


Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Acta de pago No.3 desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 del contrato No. 000295 del 7 de julio de 2022, Cuyo Objeto del contrato es : Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Jurídica para la obra de construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar en arena de fútbol 11 en la Unidad Deportiva Los Búcaros en el Municipio De Barbosa-Antioquia
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE OCCIDENTE 420.052.334 A NOMBRE ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-01-24 11:18:13
Documento generado el: 2023-01-24 11:18:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.638.424,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.638.424,50
IVA	4.301.300,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.301.300,65
Total neto factura (=)	26.939.725,15
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.939.725,15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.358.305,47
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764033060036

Rango desde: 1008

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2023-08-08

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14845872945



(415)7707212489984(8020) 000001484587294 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 5 7 4 4 4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

36. Nombre comercial

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 51 51 17 OF 700 OF 608

42. Correo electrónico estructurasyaguas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 5 1 1 7 9 9 7

45. Teléfono 2

4 1 1 7 4 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 7,0 5,0 9

4 2 9 0

2 0 0 7,0 5,0 9

4 9 2 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48- Impuesto sobre las ventas - IVA
52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 09 / 11 : 06: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL RIOS GUILLERMO

985. Cargo Representante legal Certificado



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CONTRATO No. 000295 DEL 2 DE JULIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ZONA DE RIBERA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

CONTRATISTA
INTERVENIEN
SUPERVISOR:

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

CAROLINA SOSA ARANGO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 175.374.112,00

PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

VIGENCIA:

En Barbosa a los DIESECHOCHOCHO (18) días del mes de ENERO de 2023 se reunieron Guillermo Gil Ríos, representante legal de la empresa Estructuras y Aguas IC SAS el contratista y Carolina Sossa Arango, supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial según condiciones que se detallan a continuación:

GRUPO AJUSTE	ITEM No.	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	PRESTACION	DEDICACION	VALOR UNIT. INDIRECTO	VALOR UNIT. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

**INFORME MENSUAL No. 05 – CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA
LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUÍA.**

MES DE DICIEMBRE DE 2022



Figura 1: Render del proyecto y cancha en proceso de ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 295 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

BARBOSA (ANTIOQUIA)

2022

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	4
1.2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	5
2	RESUMEN EJECUTIVO	6
2.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	6
2.2	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	7
2.3	RESUMEN INVERSIONES	8
3.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	9
3.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	9
3.2	ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	10
3.3	ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.	11
3.4	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	12
4.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	12
4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	12
4.2	ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	13
4.3	ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.	14
4.4	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	15
5.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	15
6.	CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES	16
6.1	RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	16
6.2	CERTIFICADOS DE MATERIALES.	16
7.	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16
7.1	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	16
8.	CONTROL DEL CLIMA	17
8.1	CONTROL CLIMATOLÓGICO	17
9.	ACTAS DE COMITÉ	17



Barbosa Social
iEs la gente!

9.1	ACTAS DE COMITÉ	17
10	. BITÁCORA DE OBRA	18
10.1	BITÁCORA FIRMADA	18
11	. REGISTRO FOTOGRÁFICO	18
11.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO	18
12	CONCLUSIONES.	21



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen los avances del contrato de interventoría No. 295 DE 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.", como también los aspectos generales en cuanto al desarrollo de la obra y su respectivo seguimiento, así mismo las labores concernientes a ésta y el estado actual de la misma, siempre teniendo en cuenta las condiciones de calidad, eficiencia y eficacia para un buen avance del proyecto y procurando garantizar las condiciones de seguridad de la misma, para el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2022.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A través del contrato de interventoría No. 295 del 7 de julio de 2022, se realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y en seguridad y salud en el trabajo, de la construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar fútbol 11 en arenilla, ubicada dentro de la unidad deportiva Los Búcaros delINDER, en el municipio de Barbosa, departamento de Antioquia.

Este proyecto tiene las siguientes características: una cancha de fútbol 11 con medidas aproximadas de 47 metros de ancho por 82 m largo, la cual pasará de ser en arenilla a grama sintética; con porterías en los extremos oriental y occidental, una tribuna o gradería compuesta por una estructura aporticada con vigas y columnas en concreto reforzado; estas gradas tendrán 2.6 metros de altura inicial y 5.07 m en la altura superior; con una estructura de cubierta metálica, en teja tipo termo-acústica; en el primer nivel se construirán dos (2) locales comerciales, una (1) oficina y una (1) zona de servicios de baños para mujeres, hombres y PMR.

En cuanto al urbanismo, el proyecto contará con una plazoleta en piso duro en adoquín, por la zona posterior de las graderías, una rampa de acceso desde el área de juegos existente delINDER, varias zonas blandas y espacios para actividades lúdicas y para mascotas.

Los capítulos de instalaciones eléctricas y ciclo-sendero contemplados en el presupuesto inicial del contrato, no se podrán ejecutar, porque no hay disponibilidad de recursos para realizarlos.

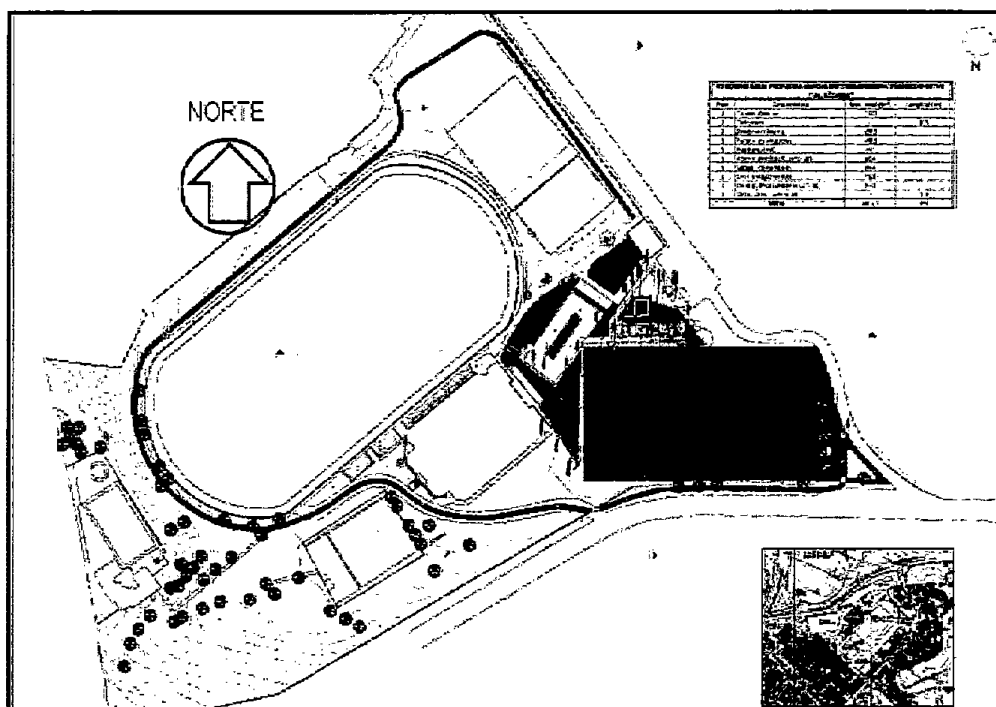


Figura 2. Planta general del proyecto

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la calle 19 con la carrera 20 de la unidad deportiva Los Bucaros del municipio de Barbosa, departamento de Antioquia.

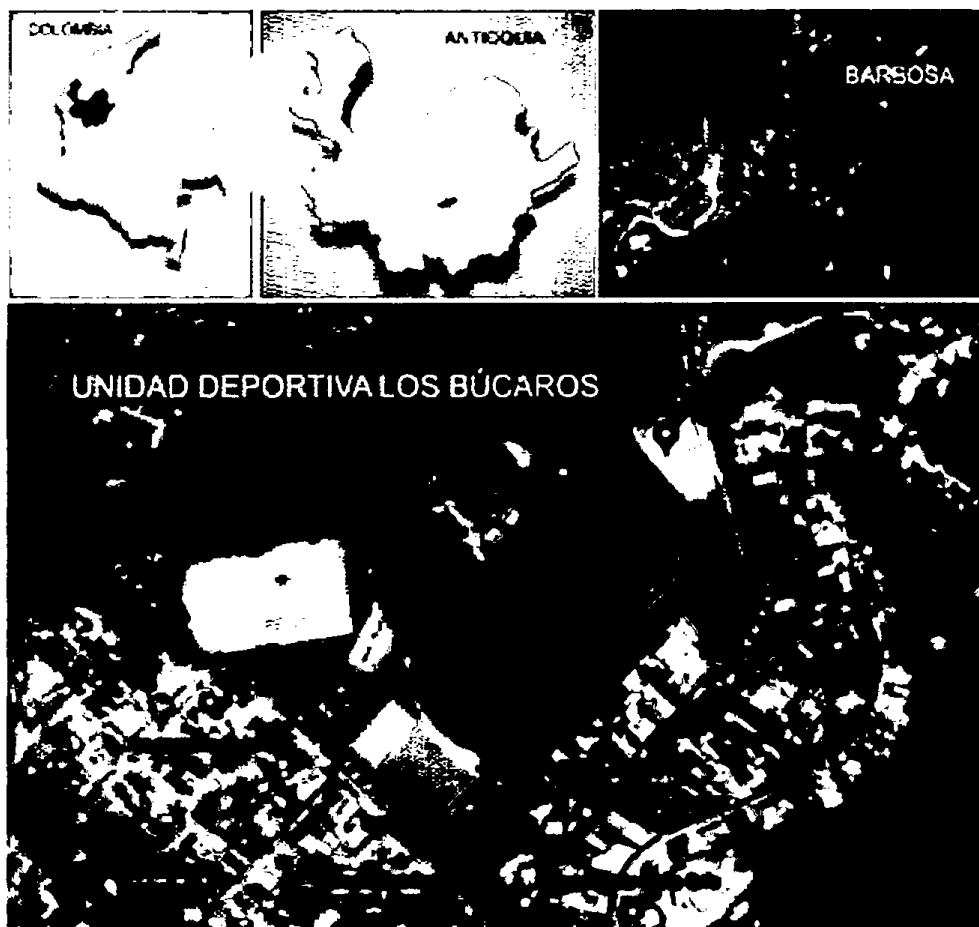


Figura 3. Ubicación del proyecto (Forma aérea en planta extraída de Google Maps)

2 RESUMEN EJECUTIVO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DE CONTRATO:	295 del 7 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL
MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

Valor inicial del contrato:	\$ 175.374.112
Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 175.374.112
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00

FECHA DE INICIACIÓN:	01 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de marzo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	\$ 110.436.400,61

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	293 del 6 de julio de 2022.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 834- 2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

Valor inicial del contrato:	\$ 2.217.575.955
-----------------------------	------------------

Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.217.575.955
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	\$ 862.642.004

2.3 RESUMEN INVERSIONES

En el inicio del proyecto, el contratista presentó una programación de obra junto con una proyección de flujo de fondos, la cual está amarrada al presupuesto de obra inicial; sin embargo, esta información está supeditada a cambios que dependen de una nueva reprogramación, la cual fue entregada a la interventoría el 28 de diciembre de 2022, junto con una solicitud de prórroga de treinta (30) días.

En cuanto al plazo, al 31 de diciembre de 2022, han transcurrido 153 días de los 184 días calendario inicial, correspondiente al 83% del plazo contractual.


Inversión programada con corte al 31 de diciembre de 2022:

De acuerdo a la reprogramación de obra entregada por el contratista el 28 de diciembre, se presentan un valor programado total de obra: \$ 857.097.817 equivalente al 38,93%, en relación al 100% del valor del proyecto.

Inversión ejecutada aproximada con corte al 31 de diciembre de 2022: \$748.121.649, equivalente al 33,98%, en relación al 100% del valor del proyecto.

Diferencia del -4,95%.

En este orden de ideas, se muestra en la siguiente gráfica, los valores de la inversión programada vs la ejecutada:

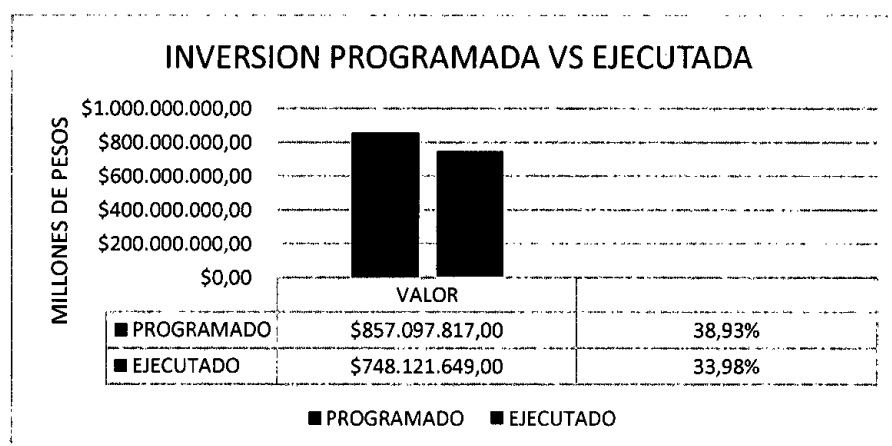

	\$ 2.217.575.955,00	100%	VALOR CONTRACTUAL
	\$ 857.097.817,00	38,93%	PROGRAMADO
	\$ 748.121.649,00	33,98%	EJECUTADO

Figura 4. Inversión programada vs ejecutada



Barbosa Social
iEs la gente!

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	INTERVENTORÍA	
No. del contrato	000295 del 07 de julio de 2022	
Contratista:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	
Cedula / NIT	900.157.444-6	
Representante Legal:	INGENIERO GUILLERMO GIL RÍOS	
Identificación:	1.040.731.254	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:		
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	07 de julio de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	7 Meses	
Valor inicial:	\$175.374.112	
Anticipo:	00,00%	\$ 00,00
Fecha de inicio:	1º de agosto de 2022	
Fecha de terminación:	1º de marzo de 2023	
CONDICIONES FINALES		
Total suspensiones (días):	N.A.	
Total prórrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo final (meses):	N.A.	7 Meses
Valor Final:	\$175.374.112	
Fecha de terminación final:	1 de marzo de 2023	

MODIFICACIÓN No. 1		
Número de contrato adicional:	N.A.	
Fecha:		
Plazo adicional (meses):		
Valor adicional:		
Valor final del contrato:		
Fecha de terminación:		



Barbosa Social
iEs la gente!

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Motivo:	
Días de suspensión:	

PRÓRROGA No. 1		
Fecha de autorización:	N.A.	
Plazo adicional (meses):		
Motivo:		

3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TOMADOR: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.
Identificación: 900.157.444-6
Dirección: CR 51 NRO. 51-17 OF 608
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5119854

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
NIT: 890980446-7 / 890984423-3

Tabla 1. Control de pólizas – contrato de interventoría

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		05 de agosto de 2022
No. de póliza:	65-44-101213429		Anexo: N/A
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 35.074.822,40	1-ago.-22	2-jul.-23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 8.768.705,30	1-ago.-22	4-mar.-26
Calidad del servicio	\$ 17.537.411,20	4-mar.-23	3-mar.-28

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		05 de agosto de 2022
No. de póliza:	65-43-101066013		Anexo: N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Fredios labores y operaciones	\$ 200.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23
Contratistas y subcontratistas	\$ 100.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23
Vehículos propios y no propios	\$ 100.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23
Responsabilidad civil patronal	\$ 100.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23
Responsabilidad civil cruzada	\$ 100.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23
Gastos médicos	\$ 100.000.000,00	1-ago.-22	4-mar.-23

3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 2. Balance del contrato de intervención

ACTA DE INTERVENCIÓN No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
1	31/10/2022	\$33.436.375,46	\$33.436.375,46	\$91.877.436,64
2	30/11/2022	\$26.939.735,15	\$110.436.400,61	\$64.937.711,39

RESUMEN DE FACTURACION

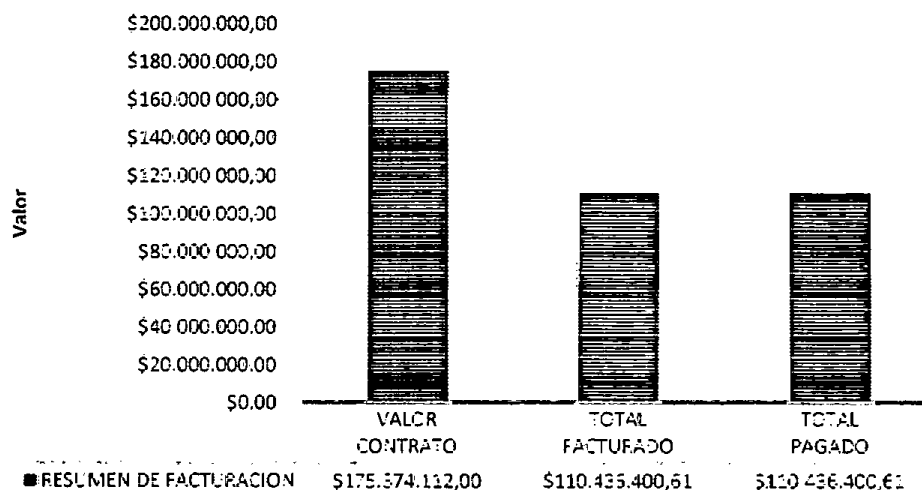


Figura 5. Resumen de facturación

Tabla 2. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del anticipo:	\$00,00
Porcentaje de anticipo:	00,00%
Valor contrato:	\$ 175.374,112
Valor de las adiciones:	\$00,00
Valor final del contrato:	\$ 175.374,112
Total facturado	\$ 110.436,400,61



Barbosa Social
¡Es la gente!

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Índice de facturación	62.97%
Total pagado	\$ 110.436,40061
Índice de pagos	62.97%
Saldo por pagar a la fecha	\$64.937,71139

3.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 3. Presupuesto inicial de interventoría

Valor inicial del contrato	\$ 175.374.112
Adiciones:	\$ 00,00
Valor facturado:	\$ 110.436.400,61
Saldo del contrato	\$64.937.711.39

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	OBRA	
No. del contrato	293 del 6 de julio de 2022	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11	
Cedula / NIT	901609434-7	
Representante Legal:	JOHAN ANDRÉS MONTAÑEZ RAMÍREZ	
Identificación:	1.090.505.735	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES, DERIVADOS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 834 DE 2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	6 de julio de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	6 Meses	
Valor inicial:	\$2.217.575.955	
Anticipo:	00,00%	\$ 00,00
Fecha de inicio:	lunes, 01 de agosto de 2022	

Fecha de terminación:	01 de febrero de 2022	
CONDICIONES FINALES		
Total suspensiones (días):	N.A.	
Total prórrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo final (meses):	N.A.	6 Meses
Valor final:	\$2.217.575.955	
Fecha de terminación final:	01 de febrero de 2022	

MODIFICACIÓN No. 1		
Número de contrato adicional:	N.A.	
Fecha:		
Plazo adicional (meses):		
Valor adicional:		
Valor final del contrato:		
Fecha de terminación:		

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1		
Acta de suspensión No.:	N.A.	
Fecha de suspensión:		
Fecha de reiniciación:		
Motivo:		
Días de suspensión:		

PRÓRROGA No. 1		
Fecha de autorización:	N.A.	
Plazo adicional (meses):		
Motivo:		

4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11

Identificación: 901309434-7

Dirección: Calle 11 # 3-44 oficina 301

Ciudad: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Teléfono: 313-8728814

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

NIT: 890960445-7 / 890984423-3



Barbosa Social
iEs la gente!

Tabla 5. Control de pólizas - contrato de obra.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		24 de agosto de 2022	
No. de póliza:	49-44-101028444		Anexo	N/A
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	\$ 443.515.191	1-ago.-22	1-jun.-22	
Pago de salarios, prestaciones sociales, egales e indemnizaciones laborales	\$ 443.515.191	1-ago.-22	1-feb.-23	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 665.272.786.50	5 años, 6 meses y -1 días.		

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		24 de agosto de 2022	
No. de póliza:	49-43-101008803		Anexo:	N/A
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	\$ 300.000.000,00	1-ago.-22	1-feb.-22	

4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 6. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
1	31/10/2022	\$516.385.535	\$516.353.535	\$1.501.212.370
2	30/11/2022	\$246.273.419	\$662.642.004	\$1.354.933.951

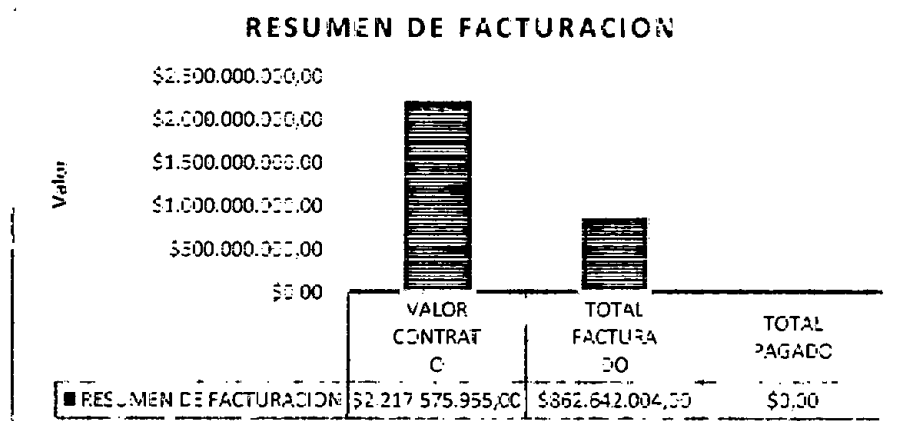


Figura 6. Resumen de facturación

Tabla 7. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del anticipo:	\$00,00
Porcentaje de anticipo:	00,00%
Valor contrato:	\$ 2.217.575,955
Valor de las adiciones:	\$00,00
Valor final del contrato:	\$ 2.217.575,955
Total facturado	\$862.342,004
Índice de facturación	38,90%
Total pagado	\$862.342,004
Índice de Pagos	38,90%
Saldo por pagar a la fecha	\$1.354.933,951

4.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 8. Presupuesto inicial contrato de obra

Valor inicial del contrato	\$ 2.217.575,955
Adiciones:	\$ 00,00
Valor facturado:	\$862.342,004
Saldo del contrato	\$1.354.933,951

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por el contratista de obra, durante el periodo del mes de diciembre de 2022; dichas actividades quedan registradas en el informe quincenal (**ANEXO N°01**) y por medio del informe semanal en bitácora de obra y a través de los registros fotográficos:

— Nivelación del material filtrante en el área de la cancha (se realizó con retroexcavadora, pero la mayoría de la actividad se ejecutó manualmente)

— Lleno con material proveniente de las excavaciones en los bordes externos de las vigas de cimentación.

— Lleno con material de subbase que servirá como soporte de la placa de contrapiso en la zona de servicios sanitarios, oficina y locales comerciales de la gradería.

— Encofrado de columnas con formaleta metálica y vaciado de las mismas con concreto de 28 Mpa.

— Encofrado de vigas aéreas del nivel +2.80 m y de la losa maciza de 20 cm de espesor del mismo nivel, y que corresponde al área de circulación de las graderías.

— Vaciado de concreto de 21 Mpa para vigas aéreas del nivel +2.80 m y de la losa maciza de 20 cm de espesor del mismo nivel, y que corresponde al área de circulación de las graderías; dicho vaciado no se pudo realizar completo en este mes de diciembre, pues un premezclado que tenían en turno para esta actividad, se suspendió porque no estaban completos ni la encofrada ni la colocación de



Barbosa Social
¡Es la gente!

refuerzo; la labor se viene ejecutando con concreto preparado en obra, que conlleva un menor rendimiento, y con el agravante que se cuenta con poco personal para llevar a cabo este tipo de tarea.

---Retiro de la malla eslabonada existente en los costados norte y oriente de la cancha.

---Reconstrucción del cerramiento en malla eslabonada en el costado oriental de la cancha.

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

6.1 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

A la fecha del presente informe, el contratista ha entregado los resultados de ensayos de la subbase granular, arena de concreto, triturado de ¾" y ensayo Próctor de la subbase. **ANEXO N°02**; dichos resultados cumplen con las especificaciones técnicas.

A través del oficio UTF11-048, con asunto ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLAS 23 MPA, con fecha del 3 de octubre de 2022, el contratista de obra presentó a la interventoría correspondiente a lo enunciado en dicho asunto; el 22 de diciembre del año en curso, se remitieron ensayos a la compresión simple de cilindros de concreto para 21 y 28; todos los resultados cumplen las resistencias requeridas, pero con la falencia que no se indica la ubicación de cada elemento; lo antes mencionado también hace parte de **ANEXO N°02**.

6.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES.

El contratista hizo entrega de los resultados de ensayos de la subbase granular, arena para concreto, triturado de ¾" y ensayo Próctor de la subbase, pero a la fecha del presente informe, solo se ha presentado el certificado de la TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA DE PVC RÍGIDA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, por lo cual el paquete de los certificados de los materiales que se vienen utilizando en las distintas actividades, como el caso del geotextil, las barras de acero, entre otros, se le han solicitado al contratista de obra en la bitácora y en comités de obra #05 y #06, que a la fecha del presente informe este compromiso ha sido parcialmente cumplido.

7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

El listado del equipo y maquinaria puestos por el contratista de obra para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto durante el mes de diciembre de 2022, es el siguiente:

- Tres (3) volquetas sencillas.
- Una (1) retroexcavadora.
- Dos (2) soldadores eléctricos.
- Dos (2) tronadoras.
- Formaleta metálica para columnas, losas y vigas aéreas.



Barbosa Social
¡Es la gente!

- Dos (2) pulidoras.
- Un (1) vibrador de concreto.
- Una (1) concretadora.
- Una (1) sierra circular.
- Herramienta menor.

El contratista de obra viene presentando la documentación requerida para estos equipos, y la interventoría lleva un estricto control de la misma.

Se anexa tabla con la respectiva información del control de maquinaria y equipos, ANEXO N° 03

8. CONTROL DEL CLIMA

8.1 CONTROL CLIMATOLÓGICO

Del 01 al 31 de diciembre de 2022, el clima fue muy benévolo para el desarrollo de las actividades del proyecto, pues fueron muy pocas las horas de lluvia que se presentaron durante este periodo. El control de lluvias se relaciona en la tabla Control Climatológico, ANEXO N° 04

9. ACTAS DE COMITÉ

9.1 ACTAS DE COMITÉ

Durante el presente periodo se realizaron los comités de obra números 17 y 18, correspondientes a los días 14 y 29 de diciembre de 2022, los dos de manera virtual; los participantes y temas tratados se relacionan en las respectivas actas de comité, las cuales se presentan en el ANEXO N° 05.

Los puntos más relevantes del comité # 17 son los siguientes:

- Una vez firmada el acta de condiciones actualizadas de obra por todas las partes, la entrega por parte del contratista de la reprogramación acompañada de un plan de contingencia; compromiso que quedó para el 15 de diciembre de 2022.
- Solicitud por parte del contratista, de una prórroga de un mes para terminar las obras, la cual será analizada por la interventoría, y cuyo concepto será dado a conocer a la entidad contratante.

Lo más importante del comité # 18 fue lo siguiente

- La entrega por parte del contratista de obra, de la reprogramación en proyecto el 29 de diciembre de 2022, junto con un oficio solicitando treinta (30) días de prórroga para la culminación de la obra; dicha solicitud será analizada por la interventoría para emitir su concepto a la entidad contratante.



Barbosa Social
¡Es la gente!

—Se hace por parte del contratista de obra de obra, un recuento de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Nivelación del material filtrante en triturado de ¾" en el área de la cancha; construcción de columnas, vigas aéreas y losa maciza del nivel +2.80 m; reconstrucción del cerramiento en malla eslabonada en el costado oriental de la cancha, y llegada a puerto de la grama, el 14 de diciembre de 2022, para continuar con el proceso de nacionalización y posterior transporte al municipio de Barbosa.

10 . BITÁCORA DE OBRA

10.1 BITÁCORA FIRMADA.

En la bitácora de obra se dejan plasmados todos los pormenores relacionados con la ejecución del proyecto, como son: Estado del clima, personal laborando, tanto de la interventoría como del contratista, actividades ejecutadas, equipos y maquinarias utilizadas, visitas técnicas realizadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas con sus respectivos comentarios y decisiones, entre otros. La bitácora se entrega escaneada como **ANEXO N°06** al informe mensual.

11 . REGISTRO FOTOGRÁFICO

11.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de todo el mes, se presenta como **ANEXO N°07** al informe mensual. A continuación, se adjuntan las imágenes más representativas:




Fotografía 1- Corte y armado de estructura para malla eslabonada en el costado este del cerramiento de la cancha.




Fotografía 2- Corte, figurado y armado de acero en vigas aéreas de las graderías de la cancha



Barbosa Social
¡Es la gente!

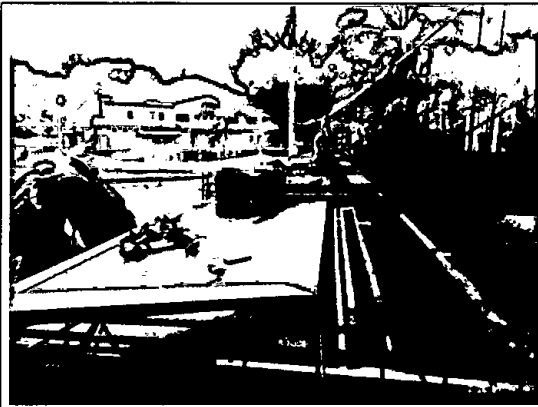


Fotografía 3- Encofrado de vigas aéreas y losa entrepiso, nivel +2.80 m, en graderías de la cancha.

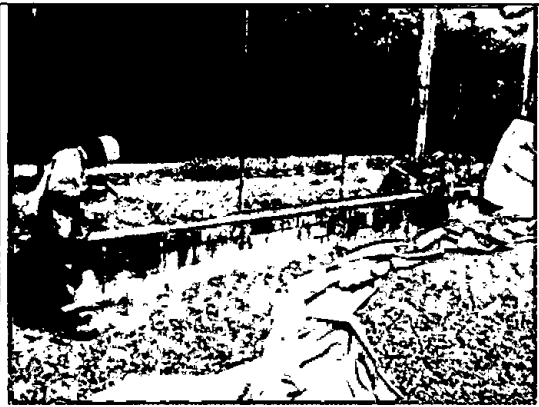


Fotografía 4- Demolición de piso malla en cerramiento en malla eslabonada en el costado este de la cancha.




Fotografía 5- Revisión de niveles de formaleta para vigas aéreas del nivel +2.80 m, en las graderías de la cancha.

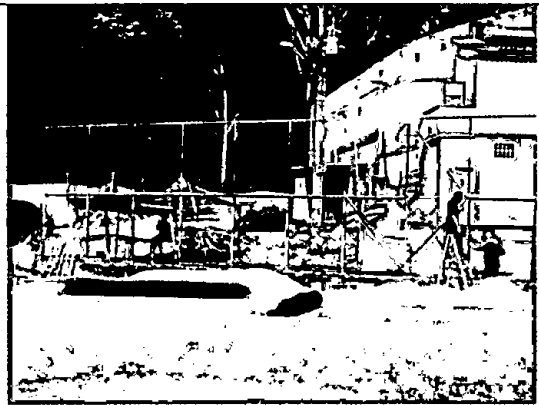

Fotografía 6- Colocación de cerramiento en malla eslabonada en el costado esta de la cancha.

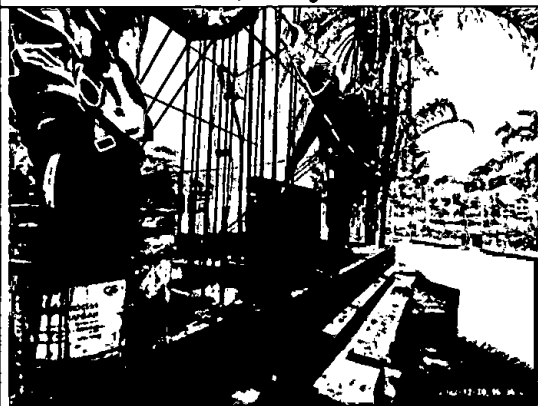

Fotografía 7- Vaciado de concreto en vigas aéreas del nivel +2.80 m de las graderías.

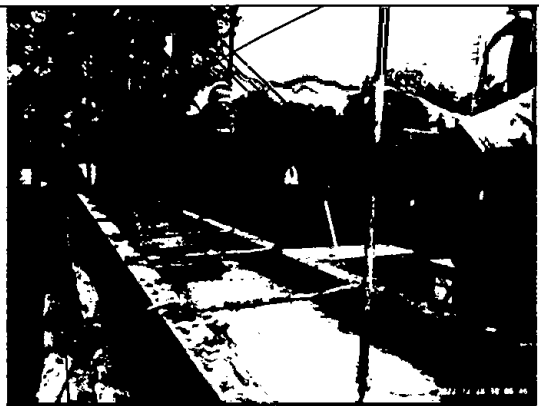

Fotografía 8 - Verificación de niveles del vaciado de concreto en vigas aéreas del nivel +2.80 m de las graderías.



Barbosa Social
¡Es la gente!



Fotografía 9- Toma de muestra de asentamiento de concreto para columnas y vigas aéreas de nivel +2.80 m de las graderías.



Fotografía 10- Toma de muestras de concretos para columnas y vigas aéreas del nivel +2.80 m de las graderías.



Fotografía 11- Aplicación de anticorrosivo a estructura del cerramiento en malla estabonada del costado este de la cancha.



Fotografía 12- Corte, figuración y colocación de acero de refuerzo para losa de entrepiso del nivel +2.80 m de las graderías.



Fotografía 13- Corte, figuración y colocación de acero de refuerzo para las vigas aéreas y losa de entrepiso del nivel +2.80 m de las graderías.



Fotografía 14- Vaciado de concreto para losa de entrepiso del nivel +2.80 m de las graderías.



**Barbosa Social
¡Es la gente!**

12 CONCLUSIONES.

Las actas números 1 y 2, tanto de obra como de interventoría, fueron tramitadas ante la entidad contratante, para sus respectivos pagos.

Con la entrega por parte del contratista de obra, de la reprogramación en project, el 29 de diciembre de 2022, la interventoría hará un seguimiento sobre los avances reales programados y ejecutados, para tener una idea clara sobre los temas anteriores y darlos a conocer tanto a La Secretaría de Obras Públicas como al Área Metropolitana del Valle de Aburra.

La solicitud de prórroga por parte de La Unión Temporal Fútbol 11, por treinta (30) días para la culminación de la obra será analizada por la interventoría para emitir su concepto a la entidad contratante.

El recuento de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022, es el siguiente: Nivelación del material filtrante en triturado de $\frac{3}{4}$ " en el área de la cancha; construcción de columnas, vigas aéreas y losa maciza del nivel +2.80 m; reconstrucción del cerramiento en malla eslabonada en el costado oriental de la cancha, y llegada a puerto de la grama, el 14 de diciembre de 2022, para continuar con el proceso de nacionalización y posterior transporte al municipio de Barbosa; según lo expuesto anteriormente, los diferentes frentes de obra están siendo adelantados en su ejecución, pero lo preocupante es la cantidad tan reducida del personal de obra; no pasa de cuatro (4) oficiales más cinco (5) ayudantes, y éste no es el personal suficiente, en especial para los vaciados de concreto que está programando el contratista de obra.

Para finalizar, la interventoría seguirá en la labor de generar las alertas cuando sean necesarias y dar soluciones que permitan avanzar en el desarrollo del proyecto.

A continuación, se relacionan los anexos del presente informe:

- ANEXO 01 - INFORME QUINCENAL
- ANEXO 02 - CONTROL DE CALIDAD
- ANEXO 03 - CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- ANEXO 04 - CONTROL DE CLIMA
- ANEXO 05 - ACTAS DE COMITE
- ANEXO 06 - BITACORA DE OBRA
- ANEXO 07 - REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXO 08 - CORRESPONDENCIA
- ANEXO 09 - INFORME SISOMA



Barbosa Social
iEs la gente!

Elaborado por:

HUMBERTO MARÍN CORTÉS

Director de Interventoría.

Estructuras y Aguas I.C. S.A.S.



Seguridad Social

Medellín, enero de 2023

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES**

Los suscritos, **WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI**, en calidad de Revisor Fiscal y **GUILLERMO GIL RÍOS**, en calidad de Representante Legal de la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**, hace saber que la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS** con NIT. **900.157.444-6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



WILLMAR DARIO GONZALEZ E.
Matr. Profe. 134170-T
C.C. 71.250.329
Revisor Fiscal



Guillermo Gil Rios
Representante Legal
C.C. 1.040.731.254

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.250.329

GONZALEZ ECHEVERRI

APELLIDOS

WILLMAR DARIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DEFECTO

FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1967

DABEIBA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

02-SEP-1987 CAREPA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00021362-M-0071250329-20080709

0000886059A 1

2160005504

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134170-T
WILLMAR BARRIO
GONZALEZ SCHIVERT
C.C. 71380478
RESOLUCION INSCRIPCION 127
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FECHA 06/03/2008


LUIS ALONSO CUELLO ROBERTO

FIRMA DEL TITULAR **56911**
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

 LONOPCOP-989 S.A. 1726 1228007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71250329 de CAREPA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134170-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICC REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Período Servicio 202212

Tecnología • Información • Conocimiento

PAGADA 2022-12-07 15:50:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

III. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES

Página 1 de 1

PAGADA 2022-12-15 16:20:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURINAS Y AGUAS IC SAS		
Documento	NI 900157444	Dirección	CHIA 51-51-17
Tipo de Empresa	EMPLEADORA	Teléfono	5117432
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIL PÍOS GUILLÉNMO	Identificación	CC: 1040731254
Total Afiliados		4	

II. DATOS DEL AFILIADO


Documento	CC 14622414	Residente	Exonerado	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00			LANDAZURI CADIZAS JOSÉ JHEMIAS	5819000 - 05		ANTIOQUIA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Nómina	Pensión				Salud				Hiceros				Uaja				Parafiscales			
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión		Total Aportes FSP		Total Aportes FSPS		Total Aportes Salud		Total Aportes Riesgos		Total Aportes Cajas		Total Aportes SENA		Total Aportes ICBF		Total Aportes ESAP		Total Aportes MEN		Total Final	
PROTECCIÓN		FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		FPO GUINIA		SEGUROS DE VIDA GUILLERMO S.A.		COMFAMA		SENA		ICBF		ESAP		MEN			
\$ 640.000		\$ 20.000		\$ 20.000		\$ 100.000		\$ 278.400		\$ 160.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 1.278.400	



7

Periodo Servicio 21/12/22-12

PAGADA 2022-12-15 16:20:13.0

III. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CAJA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV: TOTALES

Página 1 de 1



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

Time Planning

Periodo Cotización 202211

THE 13th - 14th

PAGADA 2022-12-14 16:12:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS LTDA SAS		
Documento	NI 900157444	Dirección	CRA 51 51-17
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5117432
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIL RIOS GIL J FRMO	Identificación	CC 1040731254
		Total Afiliados:	8

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037611037	Residente	Exonerado	Sí	Apellidos y Nombres		Código Ciudad Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00								
									ANTIOQUIA


III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV. TOTALS

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 800.000	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 200.000	\$ 348.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.000





Periodo Cotización 202211

PAGADA 2022-12-15 16:20:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS			
Documento	NI 900157444	Dirección	CRA 51 51-17	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5117432	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 4
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	Identificación	CC 1040731254	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1005678692	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00							
					CUADRADO DIAZ YESMIN ADRIANA			
					5001000 - 05			
					ANTIOQUIA			

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades			Salario		Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
			Tipo salario		Código AFP	Tarifa AFP	IPC	Total Aportes AFP	Total Aportes FICAF	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aportes Salud UPC	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aportes Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aportes Caja SENA	Tarifa SENA	Aportes RCF	Tarifa RCF
ING																								
RET																								
TOR																								
TAB																								
TAP																								
VSP																								
COR																								
SUN																								
KIE																								
LAC																								
VAC																								
ACT																								
CCF																								
RCF																								
AFP																								
SAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								
CAF																								

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000	\$ 139.200	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200





Información Contractual

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 N° 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com



MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag 1 de 1
09-Feb-2023 09:24:41
User: NCROJO

Código: CO.302

Fecha Contrato: 07/07/2022

Contrato: INTERVENTORIA

Valor Contrato: 175,374,112.00 Valor Adición: 0.00

Contratista: 530157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

CDPs: RA-20211594

# Acta	Fecha	Porc. (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			137,376,125.76			
1	20/12/2022	47.61	83,496,675.46	PARCIAL	2022	VIGENTE
2	26/12/2022	15.35	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
3	06/02/2023	15.35	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
78.33			137,376,125.76			



SOSSA ARANGO CAROLINA
Interventor

SAMMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas
