

MEMORIAS DE CALCULO

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1	
I. DATOS GENERALES									
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS						
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	AGTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	88,00		
ITEM:	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad :	m3	Cantidad Mayores y Menores:	-50,88	
							Cantidad Total:	37,12	
II. REGISTRO									
DESCRIPCION		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO	
Excavación para sumideros		11,00	LONGITUD	ALTO	ANCHO	18,33	18,33	18,33	
Excavación para tubería sumidero a la cámara K0-016 Izq		1,00	1,30	1,40	0,40	0,73	0,73	19,05	
Excavación para tubería sumidero a la cámara K0-016 der		1,00	3,50	1,40	0,40	1,96	1,96	21,01	
Excavación Acometida Hidráulica Ø 1/2" Vivienda # K0431 Margen Derecha		1,00	8,00	0,60	0,60	2,88	2,88	23,89	
Excavación Acometida Hidráulica Ø 1/2" Vivienda # K0439 Margen Derecha		1,00	7,00	0,60	0,60	2,52	2,52	26,41	
Excavación para sumideros		5,00	1,70	1,80	0,70	10,71	10,71	10,71	
OBSERVACIONES:		<p>Pagado Acta 1: 26,41</p> <p>Pagado Acta 2: 10,71</p> <p>TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS: 37,12</p> <p>TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 37,12</p> <p>TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 0,00</p>							
IV. FIRMAS									
									
RESIDENTE DE OBRA					RESIDENTE DE INTERVENTORIA				



MUNICIPIO DE PALMIRA
ALCALDIA MUNICIPAL

891.380.007 - 3



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
MEMORIAS DE CÁLCULO

Total Páginas: 1

I. DATOS GENERALES						
CONTRATO DE OBRA No.	MP - 1096 - 2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL			
UBICACION:	VIA AMAIME - BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25-feb-23	Cantidad Contratada: 88.00
ITEM:	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar				Cantidad Mayores y Menores: -50.88
			Unidad :	m3		Cantidad Total: 37.12

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTIENE	EXCAVACIÓN DE TUBERÍA	CONTIENE	EXCAVACION SUMIDERO	CONTIENE	EXCAVACION SUMIDERO
					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	CONTIENE	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	CONTIENE	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
ITEM:	610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación		Unidad:	m3
				Cantidad Contratada:	20,00
				Cantidad Mayores y Menores:	-1,06
				Cantidad Total:	18,94
II. REGISTRO					
DESCRIPCION		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES		VALOR TOTAL (Área/ Volumen)
			LONGITUD	ALTO	
Relleno para sumideros		11,00	4,40	1,40	6,78
Lleno para tubería del sumidero a la recámara K0+016 izquierda		1,00	1,50	1,40	0,84
Lleno para tubería del sumidero a la recámara K0+016 Derecha		1,00	3,50	1,40	1,96
Lleno Acometida Hidráulica Ø 1/2" Vivienda # K0431 Margen Derecha		1,00	8,00	0,60	2,88
Lleno Acometida Hidráulica Ø 1/2" Vivienda # K0439 Margen Derecha		1,00	7,00	0,60	2,52
Relleno para sumideros		5,00	4,40	1,80	3,96
					Pagado Acta 1
					Pagado Acta 2
					TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:
					18,94
					TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:
					0,00
OBSERVACIONES:					
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
   					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CÁLCULO		Total Páginas: 1					
I. DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS				
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023		
ITEM:	640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.		Unidad :	kg		
				Cantidad Contratada:	1.137,80		
				Cantidad Mayores y Menores:	-1.009,02		
				Cantidad Total:	148,78		
II. REGISTRO							
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO
		LONGITUD	PESO	CANTIDAD POR FILTRO			
Pantalla Inferior Vertical	11,00	1,15	0,56	4,00	28,31	28,31	28,31
Pantalla Inferior Horizontal	11,00	0,40	0,56	16,00	39,42	39,42	87,74
Dique Superior Horizontal	11,00	0,40	0,56	7,00	17,25	17,25	84,98
Dique Superior Vertical	11,00	0,50	0,56	4,00	12,32	12,32	97,30
Pantalla Inferior Vertical	5,00	1,15	0,56	4,00	12,87	12,87	12,87
Pantalla Inferior Horizontal	5,00	1,15	0,56	4,00	12,87	12,87	25,74
Dique Superior Horizontal	5,00	1,15	0,56	4,00	12,87	12,87	38,61
Dique Superior Vertical	5,00	1,15	0,56	4,00	12,87	12,87	51,48
					Pagado Acta 1	97,30	
					Pagado Acta 2	51,48	
					TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:		148,78
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:		148,78
					TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:		0,00
OBSERVACIONES:							
III. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA:							
							
IV. FIRMAS							
							
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CÁLCULO			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVÍAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
ITEM:	NP-01	Tubería de plástico pvc norma NTC 200mm de diámetro incluye transporte.	Unidad :	M	Cantidad Contratada: 0,00 Cantidad Mayores y Menores: 0,00 Cantidad Total: 11,20
II. REGISTRO					
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES		VALOR TOTAL (Área/ Volumen)
Tubería de plástico pvc norma NTC 200mm de diámetro incluye transporte.		1,00	LONGITUD	ALTO	11,20
					11,20
			Total Acta 3		11,20
OBSERVACIONES:		TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS: 11,20 TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 0,00 TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 11,20			
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 Alcalde de Palmira	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION				MEMORIAS DE CALCULO	
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/12/2023
ITEM:	NP 04	Construcción Sumideros Tipo B Sencillo (Tipo EMCALI)		Unidad :	M
		Cantidad Contratada:	0,00		
		Cantidad Mayores y Menores:	16,00		
		Cantidad Total:	16,00		
II. REGISTRO					
DESCRIPCION		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES		VALOR TOTAL (Area/ Volumen)
			LONGITUD	ALTO	
Construcción Sumideros Tipo B Sencillo (Tipo EMCALI)		9,00			9,00
Construcción Sumideros Tipo B Sencillo (Tipo EMCALI)		7,00			7,00
					Pagado Acta 1 9,00
					Pagado Acta 2 7,00
OBSERVACIONES:		TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS: 16,00			
		TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 16,00			
		TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 0,00			
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1	
I. DATOS GENERALES									
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVÍAS						
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	2.586.94		
ITEM:	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar		Unidad :	m3	Cantidad Mayores y Menores:	-1.109.16		
						Cantidad Total:	1.477.78		
II. REGISTRO									
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO	
			LONGITUD	Área Sección Inicio	Área Sección Fin				
Calleo Pavimento	K0+000	a	1,00	10	0,71	1,77	12,40	12,40	12,40
Calleo Pavimento	K0+010	a	1,00	10	1,77	1,72	17,45	17,45	29,85
Calleo Pavimento	K0+020	a	1,00	10	1,72	1,79	17,55	17,55	47,40
Calleo Pavimento	K0+030	a	1,00	10	1,79	1,82	18,05	18,05	65,45
Calleo Pavimento	K0+040	a	1,00	10	1,82	1,82	18,20	18,20	83,65
Calleo Pavimento	K0+050	a	1,00	10	1,82	1,83	18,25	18,25	101,90
Calleo Pavimento	K0+060	a	1,00	10	1,83	1,87	18,50	18,50	120,40
Calleo Pavimento	K0+070	a	1,00	5	1,87	1,9	9,43	9,43	129,83
Calleo Pavimento	K0+075	a	1,00	5	1,9	1,97	9,68	9,68	139,50
Calleo Pavimento	K0+080	a	1,00	5	1,97	1,98	9,88	9,88	149,38
Calleo Pavimento	K0+085	a	1,00	5	1,98	2	9,95	9,95	159,33
Calleo Pavimento	K0+090	a	1,00	10	2	1,88	19,40	19,40	178,73
Calleo Pavimento	K0+100	a	1,00	10	1,88	1,91	18,95	18,95	197,68
Calleo Pavimento	K0+110	a	1,00	10	1,91	1,91	19,10	19,10	216,78
Calleo Pavimento	K0+120	a	1,00	10	1,91	1,77	18,40	18,40	235,18
Calleo Pavimento	K0+130	a	1,00	10	1,77	1,77	17,70	17,70	252,88
Calleo Pavimento	K0+140	a	1,00	10	1,77	1,78	17,75	17,75	270,63
Calleo Pavimento	K0+150	a	1,00	10	1,78	1,73	17,55	17,55	288,18
Calleo Pavimento	K0+160	a	1,00	5	1,73	1,75	8,70	8,70	296,88
Calleo Pavimento	K0+165	a	1,00	5	1,75	1,79	8,85	8,85	305,73
Calleo Pavimento	K0+170	a	1,00	5	1,79	1,78	8,93	8,93	314,65
Calleo Pavimento	K0+175	a	1,00	5	1,78	1,73	8,78	8,78	323,43
Calleo Pavimento	K0+180	a	1,00	5	1,73	1,75	8,70	8,70	332,13
Calleo Pavimento	K0+185	a	1,00	5	1,75	1,79	8,85	8,85	340,98
Calleo Pavimento	K0+190	a	1,00	5	1,79	1,9	8,45	8,45	359,43
Calleo Pavimento	K0+200	a	1,00	10	1,9	1,86	18,80	18,80	378,23
Calleo Pavimento	K0+210	a	1,00	10	1,86	1,77	18,15	18,15	396,38
Calleo Pavimento	K0+220	a	1,00	10	1,77	1,85	18,10	18,10	414,48
Calleo Pavimento	K0+230	a	1,00	10	1,85	2,08	19,65	19,65	434,13
Calleo Pavimento	K0+240	a	1,00	10	2,08	1,69	18,85	18,85	452,98
Calleo Pavimento	K0+250	a	1,00	10	1,69	1,66	16,75	16,75	469,73
Calleo Pavimento	K0+260	a	1,00	10	1,66	1,69	16,75	16,75	486,48
Calleo Pavimento	K0+270	a	1,00	10	1,69	1,36	15,25	15,25	501,73
Calleo Pavimento	K0+280	a	1,00	10	1,36	1,61	14,85	14,85	516,58
Calleo Pavimento	K0+290	a	1,00	5	1,61	1,78	8,48	8,48	525,05

54
12

55
fc

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 Alcalde de Palmira		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		CONTRATO DE OBRA No. MP-1096-2022		OBJETO		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		FECHAS: 25/2/2023		Unidad : m3		Cantidad Contratada: Cantidad Mayores y Menores: Cantidad Total:		2.586.94 -1.109.16 1.477.78			
UBICACION:		690.1.1		VIA AMAIME-BOYACA		ACTA No. 3		Excavaciones varias sin clasificar		II. REGISTRO		DESCRIPCION		CANTIDAD ELEMENTOS		DIMENSIONES		CANTIDAD PAGADA		VALOR TOTAL (Area/ Volumen)		VALOR ACUMULADO	
ITEM:																							



MUNICIPIO DE PALMIRA
ALCALDIA MUNICIPAL
891.380.007-3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MEMORIAS DE CALCULO



Total Páginas: 1

CONTRATO DE OBRA No.

MP-1096-2022

UBICACION:

VIA AMAIME-BOYACA

ITEM:

606.1.1

OBJETO

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS

FECHA:

25-2-2023

CANTIDAD CONTROLADA:

2.586,94

CANTIDAD MAYORES Y MENORES:

-1.109,16

CANTIDAD TOTAL:

1.477,78

ACTA No.

3

UNIDAD:

m3

Excavaciones varias sin clasificar

II. REGISTRO

DESCRIPCION	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Area/ Volumen)	VALOR ACUMULADO
		LONGITUD	Area Sección Inicial	Area Sección Fin			
Cajeo Pavimento K0+580	1,00	10	2,13	2,11	21,20	21,20	1.113,40
Cajeo Pavimento K0+590	1,00	10	2,11	2,09	20,85	20,85	1.134,25
Cajeo Pavimento K0+600	1,00	10	2,06	2,05	20,55	20,55	1.154,80
Cajeo Pavimento K0+610	1,00	10	2,05	2,05	20,50	20,50	1.175,30
Cajeo Pavimento K0+620	1,00	10	2,05	2,08	20,65	20,65	1.196,95
Cajeo Pavimento K0+630	1,00	10	2,08	2,01	20,45	20,45	1.216,40
Cajeo Pavimento K0+640	1,00	10	2,01	1,96	19,85	19,85	1.236,25
Cajeo Pavimento K0+650	1,00	10	1,96	2,09	20,25	20,25	1.256,50
Cajeo Pavimento K0+660	1,00	10	2,09	2,17	21,30	21,30	1.277,80
Cajeo Pavimento K0+670	1,00	10	2,17	1,44	18,05	18,05	1.296,85
Cajeo Pavimento K0+680	1,00	10	1,44	1,07	12,55	12,55	1.308,40
Cajeo Pavimento K0+690	1,00	10	1,07	1,26	11,85	11,85	1.320,05
Cajeo Pavimento K0+700	1,00	10	1,26	1,46	13,60	13,60	1.333,65
Cajeo Pavimento K0+710	1,00	10	1,46	1,87	16,65	16,65	1.350,30
Cajeo Pavimento K0+720	1,00	10	1,87	2,34	21,05	21,05	1.371,35
Faltos K0+045 - K0+065	1,00	10,00	0,80	2,00	18,00	18,00	1.387,35
Faltos K0+060 - K0+062	1,00	2,00	0,60	1,50	1,80	1,80	1.389,15
Faltos K0+320 - K0+322,7	1,00	2,70	0,60	2,50	4,05	4,05	1.393,20
Faltos K0+115 - K0+117	1,00	2,00	0,40	0,80	0,64	0,64	1.393,84
Faltos K0+240 - K0+270	1,00	30,00	0,60	1,10	19,80	19,80	1.413,64
Faltos K0+270 - K0+280 lq	1,00	10,00	0,60	1,10	5,60	5,60	1.420,24
Faltos K0+330 - K0+340	1,00	10,00	0,80	5,00	40,00	40,00	1.460,24
Faltos K0+340 - K0+350	2,00	10,00	0,60	1,20	14,40	14,40	1.474,64
Faltos K0+580 - K0+600	1,00	5,62	0,70	0,80	3,14	3,14	1.477,78
OBSERVACIONES:					Pagado Acta 1	1.322,48	
					Pagado Acta 2	155,05	
					TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:	1.477,78	
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:	1.477,53	
					TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:	0,25	

IV. FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MUNICIPIO DE PALMIRA
ALCALDIA MUNICIPAL
891.380.007-3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
MEMORIAS DE CALCULO









Total Páginas: 1

I. DATOS GENERALES			
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS
UBICACION: ITEM:	VIA AMAIME-BOYACA 800.1.1	ACTA No.	3
		Fecha:	25/2/2023
		Unidad :	m3
		Cantidad Contratada:	2,586.94
		Cantidad Mayores y Menores:	-1,109.16
		Cantidad Total:	1,477.78

II. REGISTRO

III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:





57

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	AGTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
ITEM:	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar		Unidad:	m3
		Cantidad Contratada:	Cantidad Mayores y Menores:		2.586,94
		Cantidad Total:			-1.109,16
					1.477,78
II. REGISTRO					
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
					

 MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 891.380.007-3		MEMORIAS DE CALCULO I. DATOS GENERALES		Total Páginas: 2	
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVÍAS				
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	974,38
ITEM:	320.3	Sub-Base Granular Clase C	Unidad :	m3		Cantidad Mayores y Menores:	45,65
						Cantidad Total:	1.020,03

II. REGISTRO									
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO		
		LONGITUD	ALTO	ANCHO					
Instalación de subbase Granular tipo C - K0+000 a K0+570	1,00	670,00	0,22	5,50	810,70	810,70	810,70		
Fallos K0+045 - K0+055 Izq	1,00	10,00	0,80	2,00	16,00	16,00	826,70		
Fallos K0+060 - K0+062	1,00	2,00	0,80	1,50	1,80	1,80	828,50		
Fallos K0+320 - K0+322,7	1,00	2,70	0,80	2,50	4,05	4,05	832,55		
Fallos K0+115 - K0+117	1,00	2,00	0,40	0,80	0,64	0,64	833,19		
Fallos K0+240 - K0+270	1,00	30,00	0,80	1,10	19,80	19,80	852,99		
Fallos K0+270 - K0+280 Izq	1,00	10,00	0,80	1,10	6,60	6,60	859,59		
Fallos K0+330 - K0+340	1,00	10,00	0,80	5,00	40,00	40,00	899,59		
Fallos K0+340 - K0+350	2,00	10,00	0,80	1,20	14,40	14,40	913,99		
Fallos K0+590 - K0+600	1,00	10,00	0,70	0,80	5,60	5,60	919,59		
Fallos K0+602 - K0+606	1,00	4,00	0,70	0,80	2,24	2,24	921,83		
Fallos K0+280 - K0+290 Izq	1,00	10,00	0,80	1,00	8,00	8,00	929,83		
Fallos K0+260 - K0+260 Der	1,00	20,00	0,80	1,10	17,60	17,60	947,43		
Instalación de subbase Granular tipo C - K0+670 a K0+692	1,00	22,00	0,22	5,50	26,62	26,62	974,05		
Instalación de subbase Granular tipo C K0+692 a K0+730	1,00	36,00	0,22	5,50	45,98	45,98	1.020,03		
OBSERVACIONES:					Pagado Acta 1	947,43			
					Pagado Acta 2	26,62			
TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:						1.020,03			
TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:						974,05			
TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:						45,98			

III. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA:	
	

IV. FIRMAS	
	
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007 - 3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 2			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP - 1096 - 2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25-feb-23
ITEM:	320.3	Sub-Base Granular Clase C		Unidad :	m3
				Cantidad Contratada:	974,38
				Cantidad Mayores y Menores:	45,65
				Cantidad Total:	1.020,03
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			



MUNICIPIO DE PALMIRA

ALCALDIA MUNICIPAL

891.380.007-3



Alcaldía de Palmira

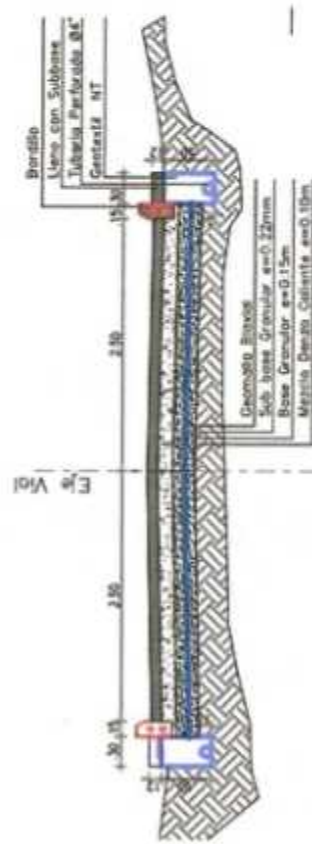
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

Total Páginas: 2

CONTRATO DE OBRA No.		MP-1096-2022	OBJETO	I. DATOS GENERALES				
UBICACION:		VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	615.39
ITEM:		330.3	Base Granular Clase C	Unidad:	m3	Cantidad Mayores y Menores:	Cantidad Total:	562.83
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS								
II. REGISTRO								
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO	
		LONGITUD	ALTO	ANCHO				
Base granular calice C K0+000 al K0+730 Hasta Nivel de Bordillo	1.00	670.00	0.07	5.30		248.57	248.57	
Base granular calice C K0+000 al K0+730 Entre bordillos	1.00	670.00	0.08	5.00		268.00	516.57	
Base granular calice C K0+000 al K0+730 Hasta Nivel de Bordillo	1.00	60.00	0.07	5.30		22.26	22.26	
Base granular calice C K0+000 al K0+730 Entre bordillos	1.00	60.00	0.08	5.00		24.00	46.26	
OBSERVACIONES:						Pagado Acta 1	516.57	
						Pagado Acta 2	46.26	
						TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:	562.83	
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:		562.83	
					TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:		0.00	

III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:



IV. FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007 - 3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 2			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP - 1096 - 2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25-feb-23
ITEM:	330.3	Base Granular Clase C	Unidad :	m3	
		Cantidad Contratada:			0,00
		Cantidad Mayores y Menores:			0,00
		Cantidad Total:			562,83
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			



MUNICIPIO DE PALMIRA
ALCALDIA MUNICIPAL
891.380.007-3

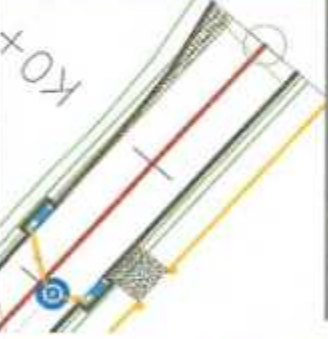


Alcaldía de Palmira

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
MEMORIAS DE CÁLCULO


Total Páginas: 1

I. DATOS GENERALES									
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS						
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	3.418,86		
ITEM:	420.1	Riego de Imprimacion con emulsion asfaltica CRL - 0			Unidad :	m2	Cantidad Mayores y Menores:	14,33	
							Cantidad Total:	3.433,19	
II. REGISTRO									
DESCRIPCION	CANTIDAD ELEMENTOS		DIMENSIONES		CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Areal/ Volumen)	VALOR ACUMULADO		
	LONGITUD	ALTO	ANCHO						
	1,00	680,00	5,00	3400,00				3.400,00	
	1,00	13,00	0,63	8,19				3.408,19	
Area de Imprimación con emulsión Sobre Ancho Empalme Cuneta Existente	1,00	5,00		25,00	3.433,19				
Area de Imprimación con emulsión					Pagado Acta 1	0,00			
					Pagado Acta 2	3.408,19			
OBSERVACIONES:	TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS: 3.433,19								
	TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 3.408,19								
	TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 25,00								
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:									
<div></div>									
IV. FIRMAS									
RESIDENTE DE OBRA									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA									

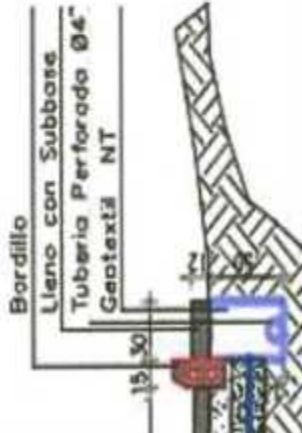
		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No. MP-1098-2022	OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS			
UBICACION: 450.2P	ACTA No. 3	Fecha: 25/2/2023	Cantidad Contratada: 341.89		
ITEM: Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19		Unidad: m3	Cantidad Mayores y Menores: 24.23		
			Cantidad Total: 366.12		
II. REGISTRO					
DESCRIPCIÓN INSTALACION MEZCLA ASFALTICA Llave Inicial Llave de Remate Sobre 730 Sobre Ancho Empalme Cuneta Existente INSTALACION MEZCLA ASFALTICA	CANTIDAD ELEMENTOS 1.00 1.00 1.00 1.00	DIMENSIONES LONGITUD 680.00 0.50 0.35 13.00	ALTO 0.10 0.07 0.07 0.10	CANTIDAD PAGADA 5.00 5.00 5.00 0.63	VALOR TOTAL (Área/ Volumen) 340.00 0.18 0.12 0.82
		VALOR TOTAL 25.00	Pagado Acta 1 0.00		
			Pagado Acta 2 341.12		
OBSERVACIONES:		TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 341.12			
		TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 25.00			
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
    					
IV. FIRMAS					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
CONTRATO DE OBRA No. MP-1098-2022		OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	I. DATOS GENERALES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION: ITEM:	450-2P	ACTA No. 3	Fecha: 25/2/2023	Unidad: 0	Cantidad Contratada: 341,09 Cantidad Mayores y Menores: 24,23 Cantidad Total: 365,12
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No. MP-1096-2022	OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		Fecha: 25/2/2023	
UBICACION: 700.1	ACTA No. 3	Unidad: m	Cantidad Contratada: 1,713.12	Cantidad Mayores y Menores: 93.88	Cantidad Total: 1,807.00
II. REGISTRO					
DESCRIPCION Línea lateral continua Línea central continua	CANTIDAD ELEMENTOS 2.00 1.00	DIMENSIONES LONGITUD: 730.00 ANCHO: 347.00	CANTIDAD PAGADA 1460.00 347.00	VALOR TOTAL (Area/ Volumen) 1460.00 347.00	VALOR ACUMULADO 1,460.00 1,807.00
OBSERVACIONES:		Pagado Acta 1 0.00 Pagado Acta 2 0.00		TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS: 1,807.00 TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES: 0.00 TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: 1,807.00	
III. REGISTRO FOTOGRAFICO VIO ESQUEMA:					
					
		IV. FIRMAS			
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No. MP-1006-2022	OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No. 3	Fecha: 25/2/2023	Cantidad Contratada: 0,00	Cantidad Mayores y Menores: 3.650,00
UBICACION: NP-07	ITEM: Instalación Geomalla Bi axial Coextruida P-BX 2020	Unidad : M2	Cantidad Total: 3.650,00		
II. REGISTRO					
DESCRIPCION Instalación Geomalla Bi axial Coextruida P-BX 2020 Instalación Geomalla Bi axial Coextruida P-BX 2020	CANTIDAD ELEMENTOS 1,00 1,00	DIMENSIONES LONGITUD ALTO ANCHO 870,00 5,00 5,00 60,00 5,00	CANTIDAD PAGADA 3350,00 300,00	VALOR TOTAL (Área/ Volumen) 3350,00 300,00	VALOR ACUMULADO 3.350,00 300,00
OBSERVACIONES:	Pagado Acta 1 3.350,00 Pagado Acta 2 300,00				
TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:		TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:		3.650,00	
TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:		0,00			
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
IV. FIRMAS					
RESIDENTE DE OBRA 	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 				

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No. MP-1096-2022	OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No. 3	Fecha: 07/11/2020	Unidad: M2	Cantidad Contratada: 0,00 Cantidad Mayores y Menores: 0,00 Cantidad Total: 0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
					
					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1	
I. DATOS GENERALES									
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVÍAS						
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	0,00		
ITEM:	MP-08	Suministro e Instalación Bordillo prefabricado en Ccto 21Mpa (0.15*0.35*0.80) Biselado		Unidad :	ML	Cantidad Mayores y Menores:	1.467,70		
						Cantidad Total:	1.467,70		
II. REGISTRO									
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES		CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO		
Suministro e Instalación Bordillo prefabricado en Ccto 21Mpa (0.15*0.35*0.80) Biselado		1,00	LONGITUD	ALTO	ANCHO	800,00	800,00	800,00	
Suministro e Instalación Bordillo prefabricado en Ccto 21Mpa (0.15*0.35*0.80) Biselado		1,00	800,00			800,00	800,00	800,00	
BORDILLO CONTORNO SUMIDERO ADICIONAL		1,00	7,70			7,70	7,70	667,70	
						Pagado Acta 1	800,00		
						Pagado Acta 2	0,00		
OBSERVACIONES:		III. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA:							
									
IV. FIRMAS									
									
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA							

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1	
I. DATOS GENERALES									
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIVAS						
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	0,00		
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO	Unidad :	m3		Cantidad Mayores y Menores:	375.84		
						Cantidad Total:	375.84		
II. REGISTRO									
DESCRIPCION	Cantidad Elementos	DIMENSIONES			VALOR TOTAL (Area Volument)	VALOR ACUMULADO			
		Longitud	Area Sección Inicio	Area Sección Fin					
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,242	0,261	2,52	2,52			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,261	0,28	2,71	5,22			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,28	0,335	3,58	8,80			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,335	0,366	3,66	12,45			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,366	0,454	3,95	16,40			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,454	0,494	5,35	21,75			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,494	0,539	5,57	27,32			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,539	0,598	4,18	31,49			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,598	0,622	3,08	34,56			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,622	0,31	3,16	37,74			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,31	0,322	3,16	40,90			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,322	0,369	3,46	44,36			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,369	0,297	3,33	47,69			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,297	0,28	2,89	50,57			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,28	0,394	3,37	53,94			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,394	0,343	3,69	57,63			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,343	0,374	3,59	61,21			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,374	0,345	3,60	64,81			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,345	0,246	2,96	67,76			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,246	0,293	2,70	70,46			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,293	0,322	3,06	73,53			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,322	0,355	3,39	76,92			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,355	0,333	3,44	80,36			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,333	0,263	2,93	83,29			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,263	0,309	2,81	86,10			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,309	0,306	3,02	89,12			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,306	0,275	3,01	92,12			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,275	0,259	2,91	95,03			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,259	0,356	2,67	97,70			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,356	0,598	3,06	100,77			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,598	0,477	4,77	105,54			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,477	0,341	4,20	109,74			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,341	0,352	2,97	112,70			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,352	0,267	3,10	115,80			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,267	0,286	2,77	118,56			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,286	0,404	3,45	122,01			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,404	0,479	4,42	126,43			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1,00	10	0,479	0,627	5,53	131,96			

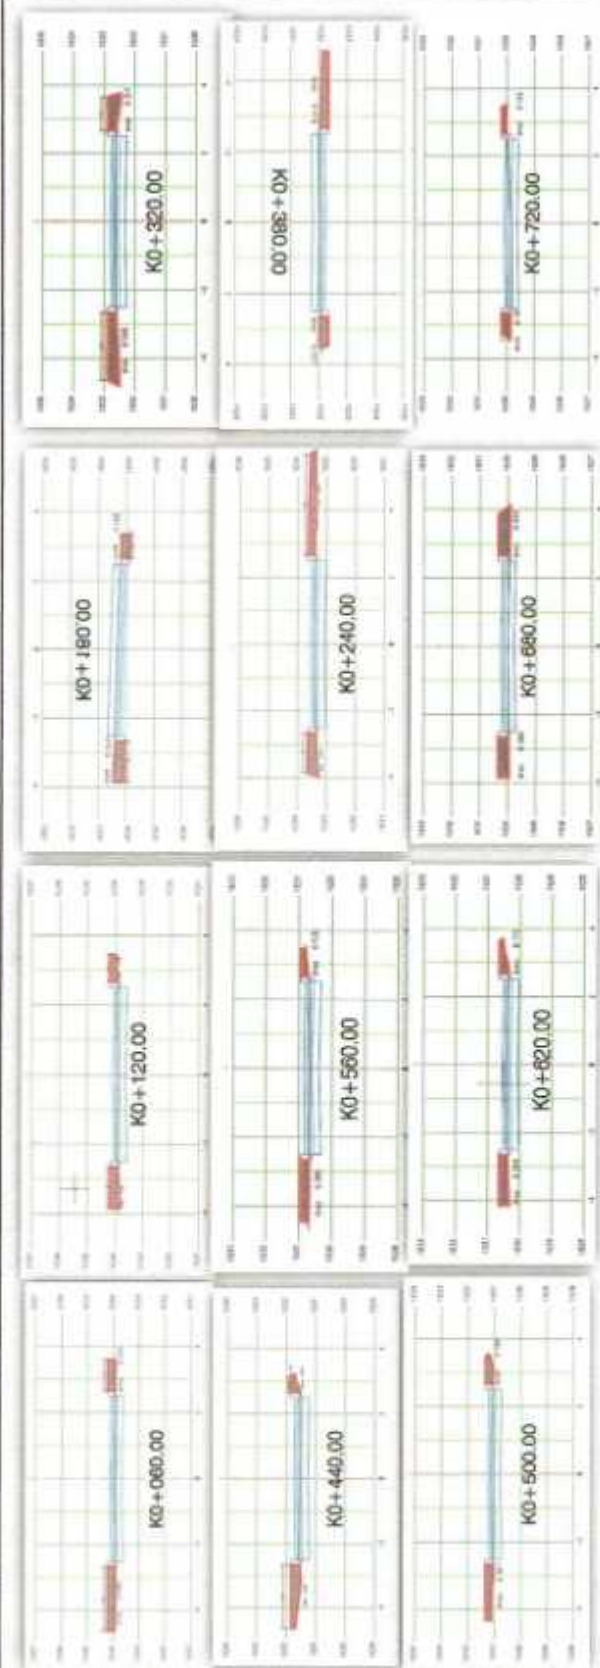
<div></div> <div>MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3</div>		<div></div> <div>MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3</div>		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1	
CONTRATO DE OBRA No.		MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS			
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/02/2023	Cantidad Contratada:	0.00
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO		Unidad :	m3	Cantidad Mayores y Menores	375.84
						Cantidad Total:	375.84
I. DATOS GENERALES							
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS							
II. REGISTRO							
DESCRIPCIÓN	Cantidad Elementos	DIMENSIONES			Área Sección Inicial	Área Sección Fin	VALOR TOTAL (Área/Volumen)
		Longitud	Área Sección Inicial	Área Sección Fin			
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.627	0.456	5.42	5.42	137.37
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.456	0.438	4.47	4.47	141.84
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.438	0.281	3.60	3.60	145.44
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.281	0.515	3.98	3.98	149.42
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.515	0.418	4.67	4.67	154.08
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.418	0.242	3.30	3.30	157.38
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.242	0.371	3.07	3.07	160.45
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.371	0.318	3.45	3.45	163.89
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.318	0.366	3.42	3.42	167.31
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.366	0.296	3.31	3.31	170.62
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.296	0.367	3.32	3.32	173.94
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.367	0.433	4.00	4.00	177.94
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.433	0.483	4.58	4.58	182.52
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.483	0.333	4.08	4.08	186.60
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.333	0.373	3.53	3.53	190.13
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.373	0.348	3.61	3.61	193.73
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.348	0.386	3.67	3.67	197.40
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.386	0.422	4.04	4.04	201.44
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.422	0.383	4.03	4.03	205.47
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.383	0.306	3.45	3.45	208.91
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.306	0.312	3.09	3.09	212.00
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.312	0.342	3.27	3.27	215.27
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.342	0.345	3.44	3.44	218.71
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.345	0.308	3.27	3.27	221.97
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.308	0.352	3.30	3.30	225.27
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.352	0.198	2.75	2.75	228.02
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.198	0.207	2.48	2.48	230.50
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.207	0.322	3.10	3.10	233.59
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.322	0.38	3.51	3.51	237.10
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.38	0.325	3.53	3.53	240.63
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.325	0.212	2.69	2.69	243.31
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.212	0.208	2.10	2.10	245.41
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.208	0.191	2.00	2.00	247.41
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.191	0.143	1.67	1.67	249.08
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.143	0.143	0.72	0.72	249.79
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.143	0.228	2.15	2.15	251.94
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.228	0.236	2.32	2.32	254.26
Relleño Compactado Margen Izquierda	1.00	10	0.236	0.25	2.43	2.43	256.69

73

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 Alcalde de Palmira			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION				Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIAS				
UBICACION:	VIA AMAIME BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023		
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO		Unidad :	m3		
		Cantidad Contratada:		Cantidad Mayores y Menores:	0.60		
				Cantidad Total:	375.84		
II. REGISTRO							
DESCRIPCION		Cantidad Elementos	DIMENSIONES			VALOR TOTAL (Area/ Volumen)	VALOR ACUMULADO
			Longitud	Area Sección Inicio	Area Sección Fin		
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.25	0.23	2.40	259.09
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.23	0.234	2.32	261.41
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.234	0.211	2.23	263.63
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.211	0.191	2.01	265.64
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.191	0.205	1.98	267.62
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.205	0.175	1.90	269.52
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.175	0.184	1.80	271.32
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.184	0.158	1.71	273.03
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.158	0.176	1.67	274.70
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.176	0.227	2.02	276.71
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.227	0.214	2.21	278.92
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.214	0.288	2.51	281.43
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.288	0.24	2.64	284.07
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.24	0.189	2.15	286.21
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.189	0.209	1.99	288.20
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.209	0.194	2.02	290.22
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.194	0.187	1.91	292.12
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.187	0.236	2.12	294.24
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.236	0.825	4.31	298.54
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.825	0.581	6.03	304.57
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.581	0.248	4.15	308.72
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.248	0.267	2.53	311.24
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.257	0.137	1.97	313.21
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.137	0.171	1.54	314.75
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.171	0.142	1.57	316.32
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.142	0.432	2.87	319.19
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.432	0.27	3.51	322.70
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.27	0.317	2.94	325.63
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.317	0.206	2.62	328.25
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.206	0.195	2.01	330.25
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.195	0.181	1.88	332.13
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.181	0.202	1.92	334.05
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.202	0.243	2.23	336.27
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.243	0.227	2.35	338.62
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.227	0.128	1.78	340.40
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.128	0.29	2.09	342.49
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.29	0.125	2.08	344.56
Relleno Compactado Margen Derecha		1.00	10	0.125	0.085	1.05	345.61

P.2.c

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Alcaldía de Palmira Total Páginas: 1	
CONTRATO DE OBRA No.		MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIAS					
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA		ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023		Cantidad Contratada:	0.00
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO			Unidad :	m3		Cantidad Mayores y Menores	375.84
						Cantidad Total:		375.84	
II. REGISTRO									
DESCRIPCION		Cantidad Elementos	DIMENSIONES			Cantidad Pagada	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO	
			Longitud	Área Sección Inicio	Área Sección Fin				
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+410	1.00	10	0.085	0.14	1.13	1.13	346.74	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+420	1.00	10	0.14	0.101	1.21	1.21	347.94	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+430	1.00	10	0.101	0.075	0.88	0.88	348.82	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+440	1.00	10	0.075	0.142	1.09	1.09	349.91	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+450	1.00	10	0.142	0.137	1.40	1.40	351.30	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+460	1.00	10	0.137	0.087	1.12	1.12	352.42	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+470	1.00	10	0.087	0.107	0.97	0.97	353.39	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+480	1.00	10	0.107	0.184	1.46	1.46	354.85	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+490	1.00	10	0.184	0.144	1.64	1.64	356.49	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+500	1.00	10	0.144	0.162	1.53	1.53	358.02	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+510	1.00	10	0.162	0.226	1.94	1.94	359.96	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+520	1.00	10	0.226	0.274	2.50	2.50	362.46	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+530	1.00	10	0.274	0.167	2.21	2.21	364.66	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+540	1.00	10	0.167	0.125	1.46	1.46	366.12	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+550	1.00	10	0.125	0.153	1.39	1.39	367.51	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+560	1.00	10	0.153	0.143	1.48	1.48	368.99	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+570	1.00	10	0.143	0.187	1.65	1.65	370.64	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+580	1.00	10	0.187	0.23	2.09	2.09	372.73	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+590	1.00	10	0.23	0.221	2.26	2.26	374.99	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+600	1.00	10	0.221	0.173	1.97	1.97	376.95	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+610	1.00	10	0.173	0.128	1.51	1.51	378.46	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+620	1.00	10	0.128	0.173	1.51	1.51	379.96	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+630	1.00	10	0.173	0.187	1.80	1.80	381.76	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+640	1.00	10	0.187	0.148	1.68	1.68	383.44	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+650	1.00	10	0.148	0.121	1.35	1.35	384.78	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+660	1.00	10	0.121	0.459	2.90	2.90	387.68	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+670	1.00	10	0.459	0.38	4.20	4.20	391.88	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+680	1.00	10	0.38	0.424	4.02	4.02	395.90	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+690	1.00	10	0.424	0.359	3.92	3.92	399.81	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+700	1.00	10	0.359	0.122	2.41	2.41	402.22	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+710	1.00	10	0.122	0.248	1.85	1.85	404.07	
Relleno Compactado Margen Derecha	K0+720	1.00	10	0.248		1.24	1.24	405.31	

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 Alcaldía de Palmira	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CÁLCULO				Total Páginas: 1	
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIVAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO	Unidad :	m3	Cantidad Contratada: 0.00
					Cantidad Mayores y Menores 375.84
					Cantidad Total: 375.84
V. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 Alcalde de Palmira	
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278, SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
ITEM:	NP-10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO	Unidad :	m3	Cantidad Contratada:
					Cantidad Mayores y Menores
					Cantidad Total:
					0.00
					375.84
					375.84
V. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:					
					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No. ITEM:	MP-1098-2022 318.1	OBJETO VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No. 3	Fecha: 25/2/2023	Cantidad Contratada: 18,216.00 Cantidad Mayores y Menores: 0.00 Cantidad Total: 18,216.00
		Unidad : m2			
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS					
II. REGISTRO					
DESCRIPCION	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES LONGITUD ALTO ANCHO	CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Area/ Volumen)	VALOR ACUMULADO
Tramo 1: de la estacion electrica hasta la interseccion Amaime - Boyaca K0+000 al K0+800	1.00	800.00 7.50 6000.00	6000.00	6,000.00	6,000.00
Tramo 1: de la estacion electrica hasta la interseccion Amaime - Boyaca K0+800 al K0+850	1.00	50.00 6.00 300.00	300.00	300.00	6,300.00
Tramo 1: de la estacion electrica hasta la interseccion Amaime - Boyaca K0+850 al K0+950	1.00	100.00 5.50 550.00	550.00	550.00	6,850.00
Tramo 1: de la estacion electrica hasta la interseccion Amaime - Boyaca K0+950 al K1+150	1.00	200.00 7.50 1500.00	1500.00	1,500.00	8,350.00
Tramo 1: de la estacion electrica hasta la interseccion Amaime - Boyaca K1+150 al K1+200	1.00	50.00 6.50 325.00	325.00	325.00	8,675.00
Tramo 2: Pampa K0+000 al K0+100	1.00	100.00 7.00 700.00	700.00	700.00	9,375.00
Tramo 2: Pampa K0+100 al K0+200	1.00	100.00 5.70 570.00	570.00	570.00	9,945.00
Tramo 2: Pampa K0+200 al K0+350	1.00	150.00 6.50 975.00	975.00	975.00	10,920.00
Tramo 3: Pampa K0+350 al K3+950	1.00	1800.00 4.05 7296.00	7296.00	7,296.00	18,216.00
OBSERVACIONES:					
IV. FIRMAS					
					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1006-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAV		
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/7/2023
ITEM:	316.1	Conformación de calzada		Unidad :	m2
		III. ESQUEMA TRAMO 1:		Cantidad Contratada:	18.216,00
				Cantidad Mayores y Menores:	0,00
				Cantidad Total:	18.216,00

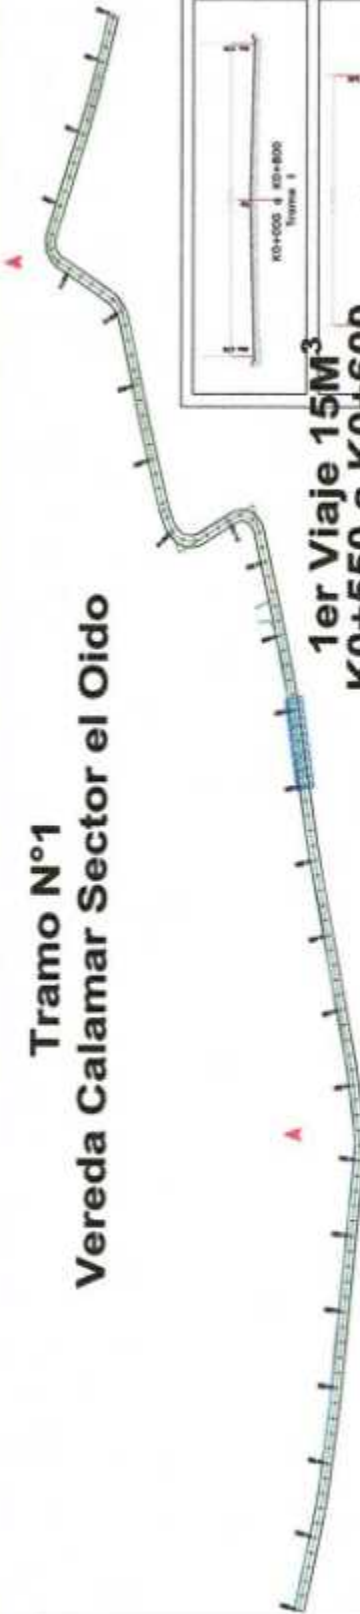
Tramo N°1

Vereda Calamar Sector el Oido




1er Viaje 15M³

K0+550 a K0+600



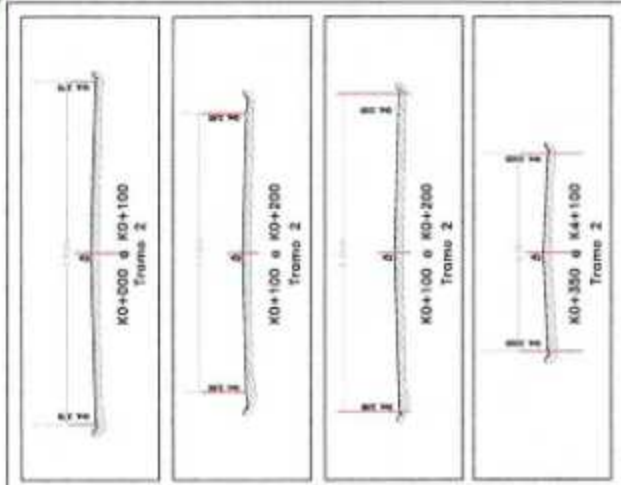
K0+550 a K0+600
Tramo 1

K0+600 a K0+650
Tramo 1

K0+650 a K0+700
Tramo 1


K0+700 a K1+150
Tramo 1

K1+150 a K1+200
Tramo 1

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.360.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION:	VIA AMAME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25-2-2023
ITEM:	310.1	Conformación de calzada	Unidad :	m2	Cantidad Contratada:
					18.214,00
					Cantidad Mayores y Menores:
					0,00
					Cantidad Total:
					18.214,00
III. ESQUEMA TRAMO 2:					
					
					
					
					
					

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CALCULO		Total Páginas: 1			
I. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1006-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS		
UBICACION: ITEM:	VIA AMAIME-BOYACA 310.1	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023
			Conformación de calzada		
			Unidad :	m2	
			Cantidad Contratada:		18.216,00
			Cantidad Mayores y Menores:		0,00
			Cantidad Total:		18.216,00
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA TRAMO 1:					
<div>    </div> <div>   </div> <div>   </div>					

		MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3		 <small>Alcalde de Palmira</small>		Total Páginas: 1	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CÁLCULO							
I. DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No.	MP-1096-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVÍAS				
UBICACION:	VIA AMAIME-BOYACA	ACTA No.	3	Fecha:	25/2/2023	Cantidad Contratada:	90,00
ITEM:	311.1	Afirmado		Unidad :	m3	Cantidad Mayores y Menores:	0,00
						Cantidad Total:	90,00
II. REGISTRO							
DESCRIPCION	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES			CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL (Área/ Volumen)	VALOR ACUMULADO
		LONGITUD	ALTO	ANCHO			
Afirmado Tramo 1 K0+540 al K0+600	1,00	40,00	0,05	7,00	14,00	14,00	14,00
Afirmado Tramo 2 K0+350 al K0+400	1,00	50,00	0,12	5,50	33,00	33,00	47,00
Afirmado Tramo 2 K0+418 al K0+460	1,00	42,00	0,11	6,00	26,46	26,46	73,46
Afirmado Tramo 2 K2+000 al K2+080	1,00	80,00	0,05	4,00	16,54	16,54	90,00
						Pagado Acta 1	90,00
						Pagado Acta 2	0,00
TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS:							90,00
TOTAL CANTIDADES PAGADAS EN ACTAS ANTERIORES:							0,00
TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA:							0,00
IV. FIRMAS							
							
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					

	MUNICIPIO DE PALMIRA ALCALDIA MUNICIPAL 891.380.007-3	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MEMORIAS DE CÁLCULO		Total Páginas: 1
I. DATOS GENERALES		
CONTRATO DE OBRA No. MP-1096-2022	OBJETO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS	FECHA: 25/2/2023
UBICACION: 311.1	ACTA No. 3	FECHA: 25/2/2023
ITEM:	Afirmado	Unidad: m3
Cantidad Contratada:	Cantidad Mayor y Menores:	Cantidad Total:
90,00	0,00	90,00
III. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA:		
		
		
		

14/03



**ACTA COSTOS
IMPLEMENTACIÓN PMA**

GRUPO QUIMBAYA S.A.S

CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE
CONECTA A LOS
CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y
BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA DE
COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.
2278. SUSCRITO CON EL INVIAS.

ACTA COSTOS IMPLEMENTACIÓN P.M.A

CONTRATO DE OBRA: MP-1096-2022 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS"

 **Grupo Quimbaya**

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PMA


ITEM	DESCIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Elaboración de informes de avance y final	Und	3	\$ 535.500	\$ 1.606.500
2	Capacitaciones mensuales al personal de obra	Und	2	\$ 59.500	\$ 119.000
3	Reuniones Socialización Inicial / Final del Proyecto	Und	2	\$ 59.500	\$ 119.000
4	Bolsas para manejo de residuos solidos ordinarios: verde, blanca, negra	Und	150	\$ 1.190	\$ 178.500
5	Puntos ecologicos 55 Lt	Und	3	\$ -	\$ -
6	Recoleccion y transporte de residuos solidos	Kg	100	\$ -	\$ -
7	Recoleccion y disposicion final de residuos peligrosos generados en obra	Kg	300	\$ -	\$ -
8	Agua utilizada para aplicacion de afirmado, subbase, base y elaboracion de obras hidráulicas	M3	390	\$ 774,00	\$ 301.860
9	Arrendamiento bodega/campamento	Und	2	\$ 1.011.500,00	\$ 2.023.000
				TOTAL	\$ 4.347.860,00

NOTAS ACLARATORIAS AL ACTA:

1 las adquisiciones de elementos se soportan con la respectiva factura

Listado de Anexos:

1. Ver anexo **16. Informe PMA** de los Informes Mensuales de Obra 1,2 y Final.
2. Anexo 1. Asistencia a Capacitaciones.
3. Anexo 2. Evidencias Socialización Inicial-Final.
4. Anexo 3. Factura de compra: Bolsas plásticas.
8. Anexo 4. Comprobante Suministro de Agua.
9. Anexo 5. Comprobantes de Arrendamientos.


Director de Obra
Grupo Quimbaya SAS


Director de Interventoría
DAC Ingeniería SAS

**Ver anexo 16. *Informe PMA* de los
Informes Mensuales de Obra 1,2 y
Final.**

Anexo 1. Asistencia a Capacitaciones.



FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

Fecha: 9-Dic-2022

Capacitador: Jessica Isaura Penafiel Martinez

Centro de Trabajo: Via Amante Botala

Tema: Uso adecuado del recurso tecnico.

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Didier Rivas	98394783	Auxiliar	Didier Rivas
2	Guillermo Gontulez	1686460	Motobike	Guillermo G.
3	✓ E M	6393181	Auxiliar	✓ E M
4	Guillermo -	1147953160	Auxiliar	Guillermo
5	UHOH	1002839752	AYUDANTE	GUILLERMO
6	Miguel	1061203402	Motobike	Miguel
7	Russelto S.V.	16281111	Oficial	Russelto
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				


FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST



FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

Fecha: 30/Enero/2023

Capacitador: Jessica Lorena Penafiel

Centro de Trabajo: Vía Amairne Boyaca.

Tema: Uso eficiente de la energía

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Marcela Linares	1114829869	Asistente	
2	Luis Angel Perez T.	1113690430	Asistente	
3	Jhon Cuervo	1002639752	Asistente	Jhon
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST



FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

Fecha: 20/Enero/2023

Capacitador: Jessica Lora Peratet.

Centro de Trabajo: Vía Amaraime Bayaca.

Tema: Reparación en la fuente. - Rendos Ordeados - Cómicos -

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Alexander Pardo	1114 839 864	Ayudante	
2	Luis Angel Pardo	1113093070	Ayudante	
3	Jhon Cuervo	1062839752	ayud ante	Jhon
4	Orlando Munoz A.	7541499	Maestro	
5	Eder Garmy Garmy	98.701.323	Auxiliar	
6	Flavio Fabian Subajay	16.305.163	Tapador	
7	Jhon Alex Pardo	100.2330052	Ayudante	JOHN A. PARD
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

FIRMA DEL RESPONSABLE


Fecha: 6/ febrero/ 2023

Capacitador: Jessica Lorena Penafiel

Centro de Trabajo: Vía amaima Boyaca.

Tema: Muro y, Sección de obra de obra (bata cemento)

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Alexander Lora	114829869	regulante	
2	Luis Angel Perez	113692000	Arbolero	
3	Jhon Corno	100283972	Asistente	Jhon
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST

Anexo 2. Evidencias Socialización Inicial-Final.

Socialización Inicial

República de Colombia

Departamento del Valle del Cauca

Alcaldía Municipal de Palmira

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA



Alcaldía de Palmira

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

LUGAR DE LA REUNIÓN		FECHA		NOMBRE					
ASISTENTE		FECHA		NOMBRE					
Sociedad de Desarrollo Comunal Boyutá		Nov-12-2022							
Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº DE CÉDULA	EMPRESA - ENTIDAD DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	Asistencia de esta sesión
1	Proctora	Castro	29689269		Arma de cosa		312310366	<i>[Signature]</i>	
2	Quirón	Quirón	114444240	Amasme	Arma de cosa	maribela313@hotmail.com	3235206526	<i>[Signature]</i>	
3	Pala Mora	Pala Mora	6665235	Amasme	Arma de cosa		31460098	<i>[Signature]</i>	
4	Wendymar	Arce Caldas	112303430	Amasme	Arma de cosa		3174619549	<i>[Signature]</i>	
5	Fanny Bella	Pell...	6358405	Boya...			3138256143	<i>[Signature]</i>	
6	Heber Guila	Guila	6358405				713755172	<i>[Signature]</i>	
7	Wendymar	Romero	29689269	Amasme		magyromero22803@gmail.com	315649905	<i>[Signature]</i>	
8	Javier	Castro	31843644		Armando		314639414	<i>[Signature]</i>	
9	Arce de	Arce	6388744				3132902832	<i>[Signature]</i>	
10	Josue Carlos	Arce	6388744	Boya...			315742110	<i>[Signature]</i>	
11	John	Espinoza	667768	Boya...	Pedro	magyromero22803@gmail.com	31532608	<i>[Signature]</i>	
12	John	Espinoza	29689269						
13	Wendymar	Romero							
14	Wendymar	Romero	29689269	Boya...			316419026	<i>[Signature]</i>	
15	Wendymar	Romero	29689269	Boya...					





Alcaldía de Pácora

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Pácora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA










LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

FECHA: 10-12-2022

LOCAL DE LA REUNIÓN: Saludación

ASUNTO O EVENTO: Reunión con la Alcaldía de Pácora

Importante: En el cumplimiento de la ley 1801 de 2012 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se garantiza que los datos personales de los sujetos de datos que se encuentren en esta lista, serán tratados de manera confidencial y no serán divulgados a terceros. Los datos que se encuentran en esta lista son de carácter público y no son susceptibles de ser objeto de solicitud de acceso a la información pública. Los datos que se encuentran en esta lista son de carácter público y no son susceptibles de ser objeto de solicitud de acceso a la información pública.

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº DE CÉDULA	EMPRESA - ENTIDAD - DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	Asistencia de las partes
									SI NO
1	Luz Mary	Rivera	6660360	Alcaldía de Pácora	Asesoría	rivera.mary@gmail.com	3127711133		
2	Leonardo	Del Real	14955682		Asesoría	leonardo.delreal@gmail.com	3184848828		
3	Ana Vibe	Vergara	66659691		Asesoría	vergara.vibe@gmail.com	3124530403		
4	Hernando	Díaz	16859419		Asesoría	hernando.diaz@gmail.com	3127591900		
5	Luz Myrian	Hernández	31603558		Asesoría	luzmyrian.hernandez@gmail.com	3104821097		
6	Alonso	Chaparro	13032236		Asesoría	alonso.chaparro@gmail.com	15013236		
7	Luis	Montoya	113693767	Alcaldía de Pácora	Asesoría	luis.montoya@gmail.com	3127711133		
8	Patricia	Pérez	5402929	Alcaldía de Pácora	Asesoría	patricia.perez@gmail.com	3127711133		
9	Reynaldo	Pérez	13011111	Alcaldía de Pácora	Asesoría	reynaldo.perez@gmail.com	3127711133		
10	Marcelo	Requena	3177878	Alcaldía de Pácora	Asesoría	marcelo.requena@gmail.com	3127711133		
11	Chad	Almaguer	29679572	Alcaldía de Pácora	Asesoría	chad.almaguer@gmail.com	3127711133		
12	Fabiola	Viveros	1.6787878	Alcaldía de Pácora	Asesoría	fabiola.viveros@gmail.com	3127711133		
13	Angela M.	Ruiz	113693741	Alcaldía de Pácora	Asesoría	angela.ruiz@gmail.com	3127711133		
14									
15									



Socialización Final

 Alcaldía Municipal de Palmira NIT. 851.380.007-3	PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS FORMATO ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN	 Grupo Quimbaya		
CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° MP - 1096 - 2022	FECHA 02 Marzo 2023		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2278 SUSCRITO CON EL INVIAS"			
INTERVENTOR: DAC INGENIERIA & CONSULTORÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1700 de 2022			
ASISTENCIA				
NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Aparell de S. Perez	Comunidad		3217378386	Aparell de S. Perez
alexandra oscar Collozos	Comunidad	alexandraoscar@gmail.com	3174619549	alexandra oscar Collozos
John Jairo Espinosa	Comunidad	jjespinosa23@gmail.com	3143146608	John Jairo
Sandra Flavelia Botina Villota	Comunidad	marcelabotina@gmail.com	3235706626	Sandra Flavelia Botina
Shary Riza	Comunidad		3122221000	Shary Riza
ana Cristina tenorio	Comunidad		3136089344	ana Cristina tenorio
Maria Irene Arias	Comunidad		3167504174	Irene Arias
Johan Acuña	Comunidad		3138756258	Johan Acuña
Matthieu Hernandez	Comunidad	matthieu107@gmail.com	3176203299	Matthieu Hernandez

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA: MP-1096-2022 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS"



- **Anexo 3. Factura de compra: Bolsas plásticas.**

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1

Cra 19 # 39-33 bodega 1

Teléfono: 7312323

email : facturas@inversionesqde.com

Armenia

www.quimicosdeleje.com



Factura de Venta POS	
Número	120162
Fecha	
Página	1

Cliente GRUPO QUIMBAYA S.A.S
 Dirección: BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CASA 16
 Teléfono 0
 Ciudad ARMENIA QUINDIO

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
 Resolución Factura Electrónica DIAN POS No.
 Formulario 18764002572467 de 19/08/2023
 habilitada desde 216.685 hasta la 300.000 / vigencia 18 meses
 Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

Fabricante de SoftWare Technote! FEI-650164459

Código Cliente		NIT	Referencia				Términos		
2233		900805213					Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante				Vencimiento		
JOSE CLAVIJO		Nacional COP					24 de Octubre del 2022		
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dcto.	Imp.	Vr. Total
1	2233		PRI	5.00	UN	11,900.00		19.00	59,500.00
2	2231	BOLSA GRANDE BLANCA *10	PRI	5.00	UN	11,900.00		19.00	
3	2232	BOLSA GRANDE NEGRA *10	PRI	5.00	UN	11,900.00		19.00	
4	594		PRI	4.00	UN	10,680.00			42,720.00
Observaciones:							Subtotal		192,720.00
							Dcto. parcial		
							Dcto. Global		
							Miscelaneos		
							Impuesto		28,500.00
							TOTAL		221,220.00
Firma Empresa							Firma Cliente		

Anexo 4. Comprobante Suministro de Agua.

GRUPO QUIMBAYA S.A.S

NIT 900805213-2 RESPONSABLE DE IVA
BRR BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 18

Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. DSGQ194

INFORMACION DEL PROVEEDOR				FECHA
DAGOBERTO GTOMEZ				2023/02/18
NI No. : 6288814-7				TOTAL
DIRECCION : VIA BOYACA (ANAIME PALMIRA) OK 580				\$ 302,000.00
TELEFONO :				
CIUDAD : Palmira PAIS : Colombia				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
513525	VR SUMINISTRO AGUA Y MANGUERA RIEGO MATERIALES DAGOBERTO GOMEZ	1	\$ 302,000.00	\$ 302,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 302,000.00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS DOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

Dagoberto Gomez
C.C. O NIT.

FRM-018V (NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSot, Nit 819.000.630-9 www.ccontapyme.com



Sello de firma:

LE7pDh3AeJ'Ehgl,geP34thCyBgP8u8sovsyNjok1VX1VbJW26Bce9QHHHeCynXmDzLDuRYF8VAdgprQyuRu86d5GHGMz40GEekYpZMr1g8MEObb
Q5Cwgd*GEceHf2Qdn1d8CXUmw4HdVn2mG888pL_F2uKuz+emoRQ8qVv7w7Uuag8mz7FLHMP5Cm0QAysTweLmTX+R8m8CAue40N8DmM0XMO8
wW0rvFTUogsAAAB3G+KsMYqxUDCPKvDkCpt5oL8+M8hTL4eHN8YTEVms5y3DuZbQPSZINuRLRsMqjyB28VE7HAqTO3ne5HjQ==

CUDS: 101bcb1a3f73371f591d3fad4131aa041d38b3d68580bea9fe1770cdae459b27dcec66716ebbbdb0635b32eaca423

Fecha emision: 2023-02-18 10:29:31

Fecha validación DIAN: 2023-02-18 10:29:34-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Anexo 5. Comprobantes de Arrendamientos.

GRUPO QUIMBAYA S.A.S

NIT 900805213-2 RESPONSABLE DE IVA
BRR BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16

**Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar**
No. DSGQ218

INFORMACION DEL PROVEEDOR				FECHA
ALONSO BUENO TAPASCO				2023/02/16
NI No. : 15919286-1				TOTAL
DIRECCION : BRR SAN ANDRES MZ 12 5				\$ 1,100,000.00
TELEFONO :				
CIUDAD : Armenia PAIS : Colombia				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
512010	VR ARRENDAMIENTO BODEGA ALONSO BUENO TAPASCO	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 1,100,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENT MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

Alonso Bueno Tapasco
C.C. O NIT.

FRM-018V (NIF) Impreso con ContaPytme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.830-9 www.contapytme.com



Sello de firma:

La/2nFHeSseBRXK8nc7kxpmehH0ISWUWwkyrVqgnUPCRO6FwAO4ke9Bau1Ny4Uhrw7b7mOSU0BwJ1+khR90QXTRvXYBMLUWQq0S2dMUBcBk
cXvUmyLJH0aGmPCEVK02KU8w7nEPVW6mnyCfchCp8bA21gWwYJ2XqLj+5b68ndkM8bc2y7+sCja0QFv8Mm53ge0BUwQ+GmLn8bch0LQnGaY0vwh4
WkR+QKwR0ZQVg6OFyVAgfSS55whibzHUBnFMah9CTN\$XCwKwJaZ8gP.Jagiyh3QMGagPgaZpaH99ver55UjNtccNjyVr5U+Q==

CUDS: 99fbccba90es7a3c29c250024f7b03475f7e50ee9261ba8a1b626a2afec8b8882eddc722a33c73579f09e443fe9

Fecha emision: 2023-03-07 15:30:47

Fecha validación DIAN: 2023-03-07 15:30:50-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

GRUPO QUIMBAYA S.A.SNIT 900805213-2 RESPONSABLE DE IVA
BRR BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16**Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar**
No. DSGQ217

INFORMACION DEL PROVEEDOR		FECHA
ALONSO BUENO TAPASCO		2022/11/30
NI No. : 15919286-1		
DIRECCION : BRR SAN ANDRES MZ 12 5		
TELEFONO :		
CIUDAD : Armenia PAIS : Colombia		
		TOTAL
		\$ 1,100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
512010	VR ARRENDAMIENTO BODEGA ALONSO BUENO TAPASCO	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 1,100,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENT MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

Alonso Bueno Tapasco
C.C. O NIT.

FRM-G18V (NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. NIT 910.000.530-9 www.opolapyme.com



Sello de firma:

Lm9Bpk0Bn0vleOaUwFL0U8rrvP2bqYqzqoW02boynvGssTYzgrHdvBqJNa/dmM3EnQkTlw9B4s0cJEfltdzb0bT+4onma004h5+CY+ITpRp2vse
NOspjRC2f7WwH00sh27+kdun2F3EawMvRYTTT8KRPQw+PvQxmLd3bLlNhuAArQozx28uN+4gWWE89OpLJCeFP99fn7dyagJPRkR2Mk8d3asD7eln
OagxUwmbAbC0R:ovY+IFpvQxmpVpy0bcyNaCPnk0,0mCy+3UB7pQo+ukyp81soK0oW8mou+pZJZ+ChpLx00EQ8FA==

CUIS: 4e8abade9f9aaa1dc5d264e1a3f0b6b910fb4c46831a73d9cf82050f9016774e71ad365a6710f75bb28335afadb2ea

Fecha emisión: 2023-03-07 16:28:15

Fecha validación DIAN: 2023-03-07 15:28:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.
