



CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5
Periodo: abril 01 de 2023 a abril 30 de 2023

MAYO DE 2023
SANTIAGO DE CALI

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	6
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	7
2.1	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	7
2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	9
2.2.1	CAPÍTULOS DEL CONTRATO	9
2.3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	10
2.3.1	GESTIÓN DOCUMENTAL	12
2.3.2	GESTIÓN DE PERMISOS	12
2.3.2.1	ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ:	12
2.3.2.2	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC:	12
2.3.2.2.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP	12
2.3.2.2.2	APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA	12
2.3.3	REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES	13
2.3.4	REVISIÓN DE TOPOGRAFÍA, DISEÑOS, PLANOS Y ÁREAS DE TRABAJO	14
2.4	COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	16
2.5	PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA	16
2.6	AVANCE DE OBRA	19
2.6.1	ACTIVIDADES ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN	19
2.6.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	20
2.6.3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	21
2.6.4	REGISTRO DE LLUVIAS	22
2.7	PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO	23
2.8	AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	24
2.9	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	26
3.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	36
3.1	ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL	36
3.2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	37
3.2.1	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC	37
3.2.2	BUZÓN DE SUGERENCIAS	39
3.2.3	RECEPCIÓN DE PQRS	40
3.2.4	ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD	40
3.3	CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES	41

3.3.1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.....	41
3.4	ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO	41
3.5	CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR.....	42
3.6	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS.....	43
3.6.1	REUNIONES CON LA COMUNIDAD.....	44
3.7	SITUACIONES ADICIONALES PRESENTADAS	44
3.8	COMITÉ TÉCNICO	46
3.9	VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.....	47
3.10	CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL	47
4.	PROGRAMA SST	48
4.1	OBJETIVOS.....	48
4.2	ALCANCE	49
4.3	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	49
4.4	RELACIÓN PERSONAL	50
4.5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	52
4.5.1	VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.....	52
4.5.2	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	53
4.5.3	PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	54
4.5.4	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	55
4.5.5	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	56
4.5.6	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD.....	58
4.5.7	AUSENTISMO	58
4.5.8	PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS	59
4.5.9	DISTRIBUCION Y UBICACION ELEMENTOS DE EMERGENCIAS.....	59
4.5.10	RUTAS DE EVACUACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA - PTAP GINEBRA.....	60
4.5.11	PUNTOS DE ENCUENTRO	61
5.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	62
5.1	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES	62
5.2	CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES	63
5.3	PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES.....	63
5.4	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.....	63
5.5	MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL)	64
5.5.1	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA.....	64

5.5.2	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA.....	65
5.6	SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).....	65
5.7	MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS	66
5.8	MANEJO DE TUBERÍA, ACERO Y OTROS MATERIALES	66
6.	ANEXOS	67

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 MUNICIPIO DE GINEBRA.....	8
ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE GUACARÍ.....	8
ILUSTRACIÓN 3 PLANO DE LA PLANTA GENERAL DEL PROYECTO DONDE SE MUESTRAN LOS PUNTOS DE MAYOR IMPORTANCIA.....	15
ILUSTRACIÓN 4 ESTRUCTURA TIPO PARA EXCAVACIONES EN LOS TRES TRAMOS, LA DIFERENCIA ES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.....	15
ILUSTRACIÓN 5 REVISIÓN DE COTAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	21
ILUSTRACIÓN 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON DIAGRAMA DE GANTT, AJUSTADO A LOS TIEMPOS REALES DE EJECUCIÓN.....	24
ILUSTRACIÓN 7 PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANO	38
ILUSTRACIÓN 8 BUZÓN DE SUGERENCIAS COSTA RICA	39
ILUSTRACIÓN 9 BLOQUEO DE LA COMUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	40
ILUSTRACIÓN 10 VOLANTE INICIAL CONVOCATORIA CANCELADA	44
ILUSTRACIÓN 11 PLANTÓN SECTOR LA ESMERALDA	46
ILUSTRACIÓN 12 COMITÉ TÉCNICO	46
ILUSTRACIÓN 13 INDUCCIÓN PERSONAL	54
ILUSTRACIÓN 14 CAPACITACIÓN PERSONAL EN OBRA	55
ILUSTRACIÓN 15 PAUSAS ACTIVAS PERSONAL EN OBRA	56
ILUSTRACIÓN 16 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN Y ENTREGA DE EPP	57
ILUSTRACIÓN 17 UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS	60
ILUSTRACIÓN 18 RUTAS DE EVACUACIÓN	61
ILUSTRACIÓN 19 PUNTOS DE ENCUENTRO	61
ILUSTRACIÓN 20 SEÑAL VIAL INSTALADA TRAMO 3	63
ILUSTRACIÓN 21 PUNTO ECOLÓGICO OBRA.....	66
ILUSTRACIÓN 22 CUBRIMIENTO Y AISLAMIENTO DE ACERO DE REFUERZO	66

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO	16
TABLA 2 PERSONAL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	17
TABLA 3 RESUMEN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN EL MES	19
TABLA 4 CONSOLIDADO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.....	20
TABLA 5 CUADRO RESUMEN DEL REGISTRO DE PRECIPITACIONES PRESENTADAS DURANTE EL MES DE ABRIL	23
TABLA 6 ACTIVIDADES REALIZADAS GESTIÓN SOCIAL	37
TABLA 7 TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD	41
TABLA 8 TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO	42
TABLA 9 VISIBILIZACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN GENERAL	47
TABLA 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	49
TABLA 11 RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.....	50
TABLA 12 RELACIÓN PERSONAL OPERATIVO.....	51
TABLA 13 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	53
TABLA 14 REPORTE DE EMO	55
TABLA 15 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.....	56
TABLA 16 RESUMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL ÁREA AMBIENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	62
TABLA 17 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	62
TABLA 18 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL)	64

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fecha de Iniciación:	1 de Diciembre de 2022
Fecha de Terminación:	1 de Enero de 2024
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ

INFORME CON CORTE A:

30 de abril de 2023

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en los municipios de Ginebra y Guacarí.

- **GINEBRA:**

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca (ver ilustración 1).

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 "Por medio de la cual se confirma la creación del Municipio de Ginebra" está definida de la siguiente manera.

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites con el Municipio de Guacarí.

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las coordenadas: 3°45'50" Latitud N 76°16.7'20" Longitud O.



Ilustración 1 Municipio de Ginebra

- **GUACARÍ:**

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 2).

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 3°45'55" Latitud N 76°20'1" Longitud O.

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca.



Ilustración 2 Municipio de Guacarí

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento (captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, desarenador, macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO

- Preliminares.
- Bocatoma.
- Línea de aducción.
- Desarenador.
- Macromedidor.
- Línea de conducción.
- Cámara de quiebre.
- Cámaras de purga.
- Cámara distribuidora de caudal.
- Intervenciones en la PTAP de Ginebra.
- Intervenciones en la PTAP de Guacarí.
- Tanque de almacenamiento Ginebra.
- Tanque de almacenamiento Guacarí.
- Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental.

2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- Recorrido y acompañamiento de las actividades realizadas por la comisión de topografía para inicio de levantamiento de trazados en los tramos 2 y 3 de la línea de conducción, en el tramo 2 se hizo un 80% de la actividad (entre la planta de Ginebra y la vía principal que conduce al corregimiento de Costa Rica), En el Tramo 3 se ha realizado un 25% de la actividad iniciando en la Abscisa K0+200 hasta la Abscisa K2+100.
- Se continúa adelantando toda la logística con proveedores y empresas de suministro de equipos y materiales para el inicio de las obras físicas del proyecto.
- Continúan realizándose actividades de la etapa de Pre-Construcción, como la actualización de algunos permisos y licencias, también la revisión de todas las cantidades del proyecto, se trabaja en el balance complemento del informe cero con todos sus anexos, se chequean las actividades para la construcción de todas las obras, esto con el fin de evitar reprocesos o demoras en la etapa constructiva.
- Solicitud ensayos de laboratorio de la cantera proyectada para suministro de rellenos con material importado, como la granulometría, el Proctor Modificado, entre otros factores que son indispensables para el trabajo de instalación de tubería.
- Recorridos con personal administrativo para definir estratégicamente los puntos de acopio para maquinaria y materiales para la ejecución de instalación de línea de conducción, también se ha realizado el acercamiento con varios propietarios de los predios para realizar un acuerdo económico y trámite del contrato para utilizar predios como bodegaje y almacenamiento de materiales, maquinaria y equipos.
- No se han podido revisar las posibles opciones de intervención en el tramo de la placa huella ubicada en el sector de Puente Rojo por resistencia civil realizada en contra del proyecto, esta revisión tiene como finalidad poder determinar la viabilidad de estudiar otras alternativas para instalación de tubería utilizando metodologías sin zanja para evitar afectaciones en la placa huella nueva, como lo es el proceso de instalación de tubería con perforación dirigida.
- Reuniones con la comunidad para explicar y aclarar las inquietudes generadas por la ejecución del proyecto.

- Inicio de Actividades Constructivas en Frente Ginebra.
 - ❖ Se finaliza con la construcción de la caja de inspección sanitaria para poder realizar el traslado de la caja sanitaria existente que se encontraba dentro del área donde se realizará la excavación para la construcción del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra.
 - ❖ Se encuentran suspendidas las actividades de excavación para construcción del tanque de almacenamiento de agua en la planta Ginebra (esto por falta del permiso de aprovechamiento forestal solicitado a la entidad competente CVC por parte de Acuavalle, a la fecha no se ha emitido factura para su visita previa y concepto).
 - ❖ Continúan con las actividades de adecuaciones de instalaciones para oficina administrativa en planta y almacén de obra, también se hacen las adecuaciones en la planta para mejorar los tiempos y las labores de construcción del tanque y optimización de la planta.
 - ❖ Adecuación de estructuras para mejorar el acopio del acero de refuerzo figurado del tanque de almacenamiento de agua de la planta Ginebra.
 - ❖ Levantamiento topográfico de estructuras y chequeo de cotas de la excavación.
 - ❖ Chequeo de cotas y coordenadas de las estructuras existentes en la planta.
 - ❖ Construcción de unidades sanitarias para el uso del personal que estará a cargo de la optimización de las estructuras de la planta, el personal que construirá el tanque de almacenamiento de agua y el personal administrativo, se construyeron dos unidades sanitarias y un lavamanos.
 - ❖ Se retira el material sobrante de la excavación que se encontraba acopiado en la planta de tratamiento, ha sido trasladado al punto de acopio de material alquilado por el consorcio para realizar la selección del material de sitio que puede ser utilizado en el relleno en las excavaciones.
- Inicio de Actividades Constructivas en Frente Guacarí.
 - ❖ Inicio de Actividades de instalación de tubería sobre el tramo No. 03 (entre la CADICA y la planta de tratamiento de aguas de Guacarí).

- ❖ Chequeo de puntos y cotas en las estructuras existentes en la Planta de Tratamiento de Guacarí.
- ❖ Visita a la planta de Guacarí para coordinar la logística de inicio de actividades para la optimización de sus estructuras.

2.3.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría:

- Informe Mensual Marzo.
- Bitácora de obra.
- Informe de Actividades sociales e incidentes en la zona.

2.3.2 GESTIÓN DE PERMISOS

2.3.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí:

Se encuentra en revisión por parte de la UMATA los documentos para radicación del permiso de aprovechamiento forestal de la bocatoma, para atender la solicitud por parte de CVC, quien envía un comunicado a inicio de este mes para ser atendida y continuar con el proceso de la solicitud del permiso.

2.3.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC:

2.3.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP

Se continúa esperando la respuesta por parte de C.V.C. Sobre la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal de las especies en la Planta Ginebra tramitado por Acuavalle, hasta la fecha no se ha emitido la factura para programar visita y realizar el concepto técnico sobre la solicitud.

2.3.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma

El consorcio radica solicitud del permiso teniendo como respuesta por parte de CVC que el trámite debe ser radicado por la Alcaldía del Municipio de Ginebra.

Ver anexo ambiental.

2.3.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES.

Durante el mes de abril de 2023 se realizaron las siguientes reuniones con las partes interesadas:

- **Abril 7:** Se realiza Comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P. con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos.
- **Abril 14:** Se realiza Comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P. con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos.
- **Abril 20:** Se realiza reunión con la comunidad y líderes que están realizando la resistencia civil en contra del proyecto, esto obedeciendo a las inconformidades que presenta por la captación del agua en el punto que se tiene proyectado, los perjuicios que generan a la comunidad y establecimientos turísticos, entre otras inconformidades, se han reunido el contratista, la interventoría, el Gerente de Vallecaucana de Aguas y la comunidad para acordar fecha de reunión donde presentarán todas sus inconformidades y propuestas.
- **Abril 21:** Se realiza Comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P. con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos.
- **Abril 28:** Se realiza Comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P. con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos.
- Se han realizado reuniones con dueños de predios para negociar el alquiler del terreno para poder acopiar materiales y equipos para el proceso constructivo tanto de la instalación de la tubería como de la construcción del tanque de almacenamiento de agua de Ginebra.
- Adicionalmente, se han realizado diversas reuniones con subcontratistas de obra civil e instalación de tuberías para definir procesos constructivos, metodologías, solicitud de documentación entre otras necesidades para un correcto inicio de actividades.

2.3.4 REVISIÓN DE TOPOGRAFÍA, DISEÑOS, PLANOS Y ÁREAS DE TRABAJO

Continúa realizándose las revisiones a todos los componentes del diseño con el fin de identificar las diferencias y faltantes que se deban tener en cuenta , se realizaron las siguientes actividades para el mes de abril:

- Planos: Revisión en proceso de cantidades y comparativo con especificaciones técnicas. (Se ha evidenciado que algunos planos no se encuentran en formato DWG y en algunos casos otros no se encuentran en PDF, por esta razón se está realizando un listado de planos con su descripción, versión y en qué tipo de archivo se encuentra para poder solicitar a la entidad contratante los planos faltantes)
 - También se ha evidenciado la ausencia de algunos planos que son necesarios para la ejecución del proyecto, se anexa el listado de planos.
- Diseños: Revisión en proceso de los diseños y comparativo con especificaciones técnicas, en donde se ha encontrado algunas diferencias tanto en la parte estructural como en los accesorios y elementos necesarios para la buena ejecución del proyecto.
 - Se ha evidenciado una diferencia de niveles en la cota de entrada del tanque de almacenamiento proyectado vs las cotas de terreno, lo cual genera inquietud en el funcionamiento del tanque, por esta razón se realizará un chequeo en el tanque proyectado para poder tener claridad con las cotas de terreno y en el proceso constructivo del tanque.
- Topografía: Durante el mes se han realizado diversas reuniones entre la comisión de topografía del contratista con la comisión de topografía de la interventoría y la entidad Vallecaucana de Aguas, esto con el fin de definir las verdaderas cotas y suprimir las diferencias que se tenían con las cotas del diseño. Se espera una respuesta por parte de la entidad contratante Vallecaucana de Aguas, respecto a la entrega de los planos actualizados con las cotas reales de campo.
 - Adicionalmente se ha realizado trabajo de campo para replantear y trazar el recorrido de la tubería (definición de trazado de la tubería) en los tramos 2 y 3 del proyecto, esta actividad se suspende el 20 de abril del 2023 por una segunda resistencia civil por parte de la comunidad que se opone al proyecto, en el tramo 1 no se ha realizado ninguna actividad porque se encuentra suspendido por la resistencia Civil desde el 21 de marzo del 2023.
 - Durante el mes de abril la comisión de topografía realiza actividades de chequeo de cotas, verificación de coordenadas, ajuste de medidas, materialización de puntos de las estructuras proyectadas para su construcción.



Ilustración 3 Plano de la planta general del proyecto donde se muestran los puntos de mayor importancia.

En la revisión del diseño y los planos se está verificando las cantidades de cada una de las estructuras proyectadas para la construcción de este contrato, en donde se evalúan las cantidades de aceros, concreto, excavaciones, rellenos, entre otras, esto con el fin de tener las cantidades más ajustadas a la realidad del proyecto.

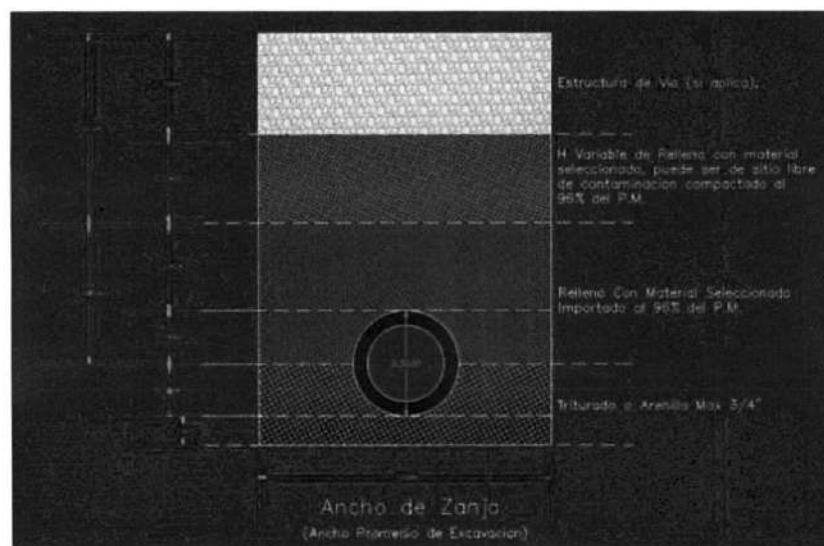


Ilustración 4 Estructura tipo para excavaciones en los tres tramos, la diferencia es el diámetro de la tubería.

2.4 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el mes de abril no se tramitan solicitudes de desembolso de anticipo.

A continuación, se resumen los desembolsos solicitados.

Tabla 1 Resumen desembolsos anticipo

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO				
DESEMBOLSO	NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DESEMBOLSO	CONCEPTO	VR. A DESEMBOLSAR
No. 1	901.378.127-8	CAL SAS	Bocatoma, línea de aducción y macromedidor	\$ 1.330.764.263
	900.521.827-4	CONSTRUCTORA NBI SAS	Tanque de almacenamiento Ginebra	\$ 825.783.347
	805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e instalación pantallas deflectoras en fibra, canaletas en fibra	\$ 1.744.905.660
No. 2	800.022.371-4	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A - EXTRUCOL	Suministro accesorios y tubería PEAD	\$ 2.955.952.978
	800.022.371-4	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A - EXTRUCOL	Obras, instalación tubería conducción	\$ 423.162.896

2.5 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA

Durante este periodo se inicia con las actividades constructivas y ya se cuenta con el siguiente personal para atender las necesidades iniciales del proyecto, iniciar con las obras físicas, cumplir con los planes de trabajo, tramitar los permisos y licencias, calcular las cantidades reales del proyecto y toda la logística para el inicio de las obras físicas.

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el **Capítulo 7. Información sobre el personal Profesional**, en el numeral **a. Requisitos del personal**, en donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 2 Personal del Consorcio.

Tabla 2 Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nombre completo	PERSONAL MOC CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
	Identificación	Cargo	Formación	Tipo de Mano de Obra	Procedencia
CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	89006184	INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO	INGENIERO CIVIL. ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA.	Mano de Obra Calificada - MOC	ARMENIA
LINA MARCELA BURITICA	42736562	COORDINADORA DE OBRA	INGENIERO CIVIL.	Mano de Obra Calificada - MOC	PEREIRA
DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILUMAS	31658574	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERIA AMBIENTAL	Mano de Obra Calificada - MOC	GUADALAJARA DE BUGA
GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES	1144140957	RESIDENTE HIDRAULICA	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL	Mano de Obra Calificada - MOC	TUMACO - NARIÑO
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	1026277221	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL. ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	Mano de Obra Calificada - MOC	NEIVA
JOHN EDUAR DIAZ OBANAGA	1143852425	AUXILIAR AMBIENTAL	INGENIERIA AMBIENTAL	Mano de Obra Calificada - MOC	CALI
FLOR MARIA MARTINEZ CUERVO	31644927	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTION	Mano de Obra Calificada - MOC	GUADALAJARA DE BUGA
MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	38856496	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	TRABAJO SOCIAL. ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO	Mano de Obra Calificada - MOC	GUADALAJARA DE BUGA
JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	14636383	TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	Mano de Obra Calificada - MOC	GUAPI (CAUCA)
JOHN JANER CUERO OLAVE	1113662973	TECNICO EN CONSTRUCCION	CONSTRUCCION. ESPECIALIZACION SUPERVISION PARA OBRAS CIVILES	Mano de Obra Calificada - MOC	PALMIRA (VALLE)

Por otro lado, se ha contado con un grupo de trabajo en el frente de instalación de tubería que han iniciado labores en el tramo 3 y está conformado por las siguientes personas.

- Rubenz Benítez (supervisor obra).
- Guillermo Álvarez (operador de maquinaria).
- Luis Miguel Esterilla (Operador Máquina).
- John Cedeño (conductor).
- Maicol Caicedo (Ayudante).
- Johan Caicedo (ayudante).
- Lady Mosquera (Inspector SST).

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su conocimiento, como lo son el ingeniero Forestal, especialistas, algunos ingenieros de apoyo, los asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y suministro de equipos, asesores legales, entre otros.

También se cuenta con una comisión de topografía de tiempo completo en el proyecto (Topógrafo y Cadenero) para atender las necesidades que se requieran en la ejecución, durante el mes han chequeado puntos y coordenadas, materializado estructuras e iniciado con las actividades de identificación del trazado de los Tramos 2 y 3 de la línea de conducción para poder iniciar con la instalación de la tubería (Se anexa en el presente informe Certificado del Equipo de topografía utilizado).

Por último, se cuenta con una cuadrilla interna del consorcio conformada por un oficial y un ayudante, quienes realizan actividades preliminares, apoyan las áreas ambientales, sociales y SST, también realizan la construcción de las unidades sanitarias que utilizara el personal administrativo y operativo del consorcio, cerramientos, soporte y traslado de de acero de refuerzo del tanque de almacenamiento de agua, entre otras actividades necesarias para la buena ejecución del proyecto.

Para esta etapa del proyecto ya se cuenta con maquinaria pesada, ya que continúan con las actividades de excavación para la construcción del tanque de almacenamiento de aguas en la PTAP Ginebra, excavación para instalación de tubería en el tramo 3, se cuenta con una volqueta, dos retroexcavadoras y una mini retroexcavadora, descritas en la siguiente tabla y la documentación es anexada en el informe.

Tabla 3 Resumen de Maquinaria y equipo utilizado en el mes

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
Maquinaria y Equipo	Referencia / Placa
Retroexcavadora (Planta Ginebra)	Caterpillar 420D
Retroexcavadora (Tubería)	Caterpillar 420D
Mini Retroexcavadora (Tubería)	JCB
Volqueta Sencilla capacidad 9m3	UFK-231
Camioneta	BOK 800
Turbo Foton	ZNN 959
Termofusión	Machine

2.6 AVANCE DE OBRA.

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo:

2.6.1 ACTIVIDADES ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN

- Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias de intervención de espacio público, los permisos de movilidad y el permiso de ocupación del cauce, los permisos de aprovechamiento forestal están en trámite, el de la PTAP se encuentran radicado, se espera respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, el de la bocatoma se encuentra pendiente el radicado por parte de la Alcaldía del Municipio de Ginebra. Esperando que se cuente con todos los permisos requeridos lo más pronto posible para la buena ejecución del contrato.
- Evaluación y chequeo de cantidades de todas las estructuras que contempla el alcance de proyecto como lo es la Bocatoma, Desarenador, Línea de Conducción, CADICA, Cámaras de Quiebre, Cámaras Ventosas, Cámaras Purgas, Tanque de Almacenamiento, entre otras estructuras contempladas en el contrato.
- Se encuentra pendiente para completar el balance presupuestal la entrega por parte de Acuavalle de la propuesta de intervención en cada unas de las PTAP de Ginebra y Guacarí, como también la entrega de detalles y aclaraciones solicitadas al diseñador del proyecto.

2.6.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA

- La excavación del tanque de almacenamiento de agua en la planta ginebra se encuentra suspendida por falta del permiso de aprovechamiento forestal que no ha sido entregado por la entidad ambiental competente (CVC), durante el mes se ha realizado el retiro del material acopiado que puede ser utilizado para rellenos, este material se ha transportado hasta un punto autorizado por el consorcio para acopio (predio de Don Horacio Gutiérrez).
- Construcción de unidades sanitarias y lavamanos para personal administrativo y operativo del consorcio.
- Continúan con las actividades de construcción de soporte para mejorar el acopio del acero de refuerzo para la construcción del tanque.
- Se instala el cerramiento del área de excavación para el tanque de almacenamiento.
- Adecuación de vías dentro de la planta para poder continuar con el cargue y retiro de material sobrante, recepción de materiales para la ejecución del proyecto.
- Adecuaciones eléctricas dentro de la planta para poder atender las necesidades del proyecto y poder no retrasar las actividades.
- Se retira el material sobrante de la excavación.

Tabla 4 Consolidado retiro de material sobrante

SITIO	M3		VIAJES	
PREDIO HORACIO	153	M3	17	VIAJES
RCD TIERRA				
Total General	153	M3	17	VIAJES

- La localización y replanteo del tanque del almacenamiento proyectado de Ginebra indica que la losa de cubierta de la estructura está quedando por debajo del terreno natural a una profundidad aproximada de 2 m por uno de los lados y 0.70 m por el otro, por tal motivo, se realiza un chequeo hidráulico de los niveles del tanque de almacenamiento y el tanque de contacto de cloro existente, encontrando que el nivel máximo del tanque de almacenamiento se encuentra 17 cm por encima del nivel del tanque de contacto de cloro. Para un adecuado funcionamiento del tanque de almacenamiento, su nivel máximo debería estar al menos 10 cm por debajo del nivel del agua del tanque de cloro, lo que corrobora que la estructura quedaría aún más enterrada.

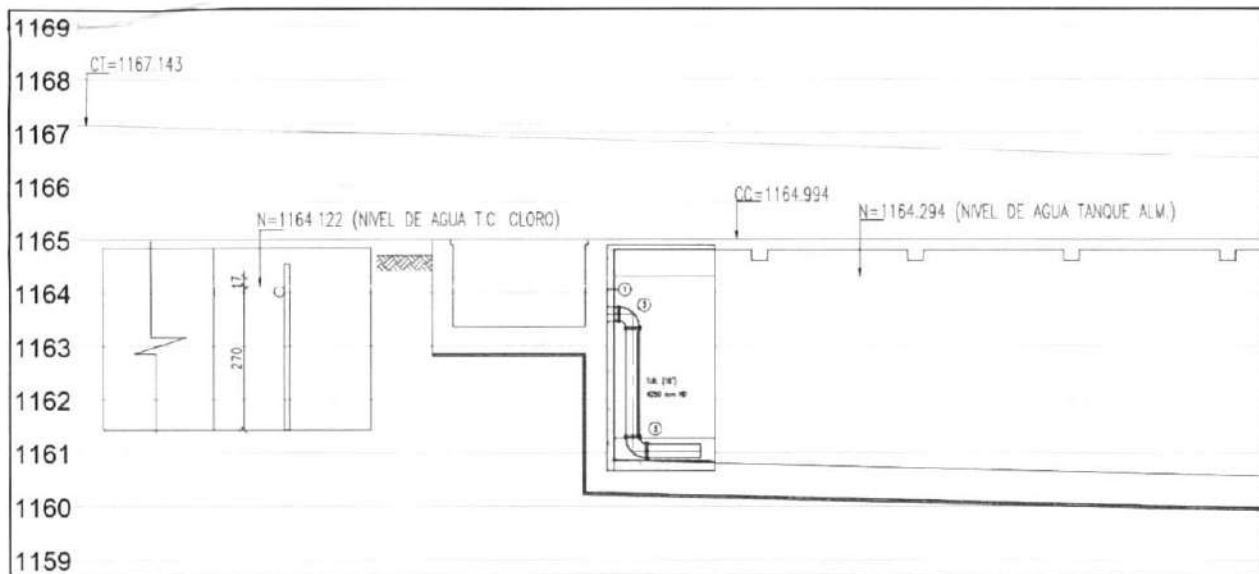


Ilustración 5 Revisión de cotas tanque de almacenamiento

2.6.3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN

- La comisión de topografía continúa con la localización del trazado del tramo 3 (Tubería PEAD de 14").
- En la PTAP de Ginebra se realizó el conteo de las láminas deflectoras y se tomó las medidas de los floculadores para las actividades de optimización de los mismos.
- Se realizó recorrido con el hijo de la señora Graciela Blum, propietaria del predio contiguo a la PTAP de Ginebra, con el objetivo de informar y solicitar permiso para iniciar labores del tramo 2, sin embargo, no fue posible ya que ACUAVALLE tiene unos compromisos pendientes con la hacienda la victoria, predio vecino de la planta de ACUAVALLE y no ha cumplido, por lo tanto, la propietaria manifiesta que no autorizan el permiso para intervenir ese tramo mientras no se dé cumpliendo a los acuerdos.
- Se realizaron dos recorridos por el tramo 3 (tubería PEAD de 14") desde la Hacienda La Esmeralda hasta la PTAP de Guacarí, para georreferenciar las tuberías existentes en dicho tramo, uno de los recorridos se hizo con el acompañamiento de personal operativo de ACUAVALLE y el otro con el fontanero del ingenio Pichichi, cada uno indicó la localización de las tuberías del acueducto de ACUAVALLE y tuberías de riego del ingenio Pichichi respectivamente.

- Se continuó el recorrido por el tramo 3 para localización de la tubería existente, esta vez hicieron acompañamiento el fontanero del ingenio pichichi y el fontanero del acueducto El Placer, que también tiene tubería enterrada en el tramo 3.
- Se definió el punto de inicio de instalación de tubería, llegó la maquinaria para instalación de tubería al sitio de acopio en la Hacienda La Esmeralda.
- El 19 de abril se da inicio a las actividades de instalación de tubería, entre ellas, pega de tubería PEAD de 14" por termofusión (7 tubos x 12ml), excavación a máquina con profundidad promedio de 1,40 m. El ancho de la excavación fue variable debido a las piedras encontradas, en su mayoría de gran tamaño, lo cual no permitió realizar el corte regular. Se realizó acarreo de material menor a 5 km.
- El 20 de abril de 2023 se suspenden actividades de instalación de tubería en el tramo 3 por manifestaciones de la comunidad en contra del proyecto, a través de una resistencia civil iniciada por la comunidad de Puente Rojo. Se dejó señalizada con cuartones y cinta peligro la zanja realizada para la instalación de tubería. Sobre la vía se dejan 27 tubos s PEAD de diámetro 14"x12ml sueltos, y 7 tubos PEAD de diámetro 14"x12ml termofundidos.
- Los días siguientes la resistencia civil continúa en el tramo 3 y no permite realizar ninguna actividad en ninguna parte del tramo, por lo tanto, las actividades de instalación de tubería continúan suspendidas.
- Se retiran las máquinas del sitio de acopio de la Hacienda La Esmeralda debido al plantón de la resistencia civil.

2.6.4 REGISTRO DE LLUVIAS

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de abril, las cuales son resumidas en la siguiente tabla.

Ver anexo

Tabla 5 Cuadro resumen del registro de precipitaciones presentadas durante el mes de abril

**CONSORCIO
REDES Y PTAPs
VALLE**

CUADRO DE LLUVIAS - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003-2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

ABRIL DE 2023



**VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.**

Fecha	DÍA	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	TOTAL Puntos	TOTAL Tiempo perdido por Noche	NOB DE INVENTORIA	OBSERVACIONES
1-Abr	Sábado																						
2-Abr	Domingo																						
3-Abr	Lunes																						
4-Abr	Martes																						
5-Abr	Miércoles																						
6-Abr	Jueves																						
7-Abr	Viernes																						
8-Abr	Sábado																						
9-Abr	Domingo																						
10-Abr	Lunes																						
11-Abr	Martes																						
12-Abr	Miércoles																						
13-Abr	Jueves																						
14-Abr	Viernes																						
15-Abr	Sábado																						
16-Abr	Domingo																						
17-Abr	Lunes																						
18-Abr	Martes																						
19-Abr	Miércoles																						
20-Abr	Jueves																			4.0	4.0		
21-Abr	Viernes																			1.0	1.0		
22-Abr	Sábado																						
23-Abr	Domingo																						
24-Abr	Lunes																						
25-Abr	Martes																						
26-Abr	Miércoles																						
27-Abr	Jueves																						
28-Abr	Viernes																						
29-Abr	Sábado																						
30-Abr	Domingo																						
TOTAL																				5.0	5.0		
TOTAL																				5.0			

Conversiones

Luz de día

2.7 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO.

Debido a las situaciones presentadas las cuales han impedido la ejecución de las actividades programadas, se ajusta la programación proyectando hitos de socialización y permisos, los cuales se esperan resolver para dar continuidad a las obras . A continuación, se muestra el cronograma con su diagrama de Gantt.

Es importante tener en cuenta que las modificaciones al cronograma y la no ejecución de las actividades son por situaciones presentadas ajenas al contratista, lo cual afecta directamente la programación y el flujo económico de la obra. Se requiere desplazar las actividades que no se pueden ejecutar, lo cual, generará una ruta crítica en el cronograma de ejecución, así como también probablemente un mayor tiempo de obra. En la programación y flujo económico todavía se encuentran los capítulos del tanque de almacenamiento de Guacari y caseta del operador de Ginebra, capítulos los cuales se deben modificar cuando se tengan definidas las actividades a ejecutar en cada una de las PTAPS.

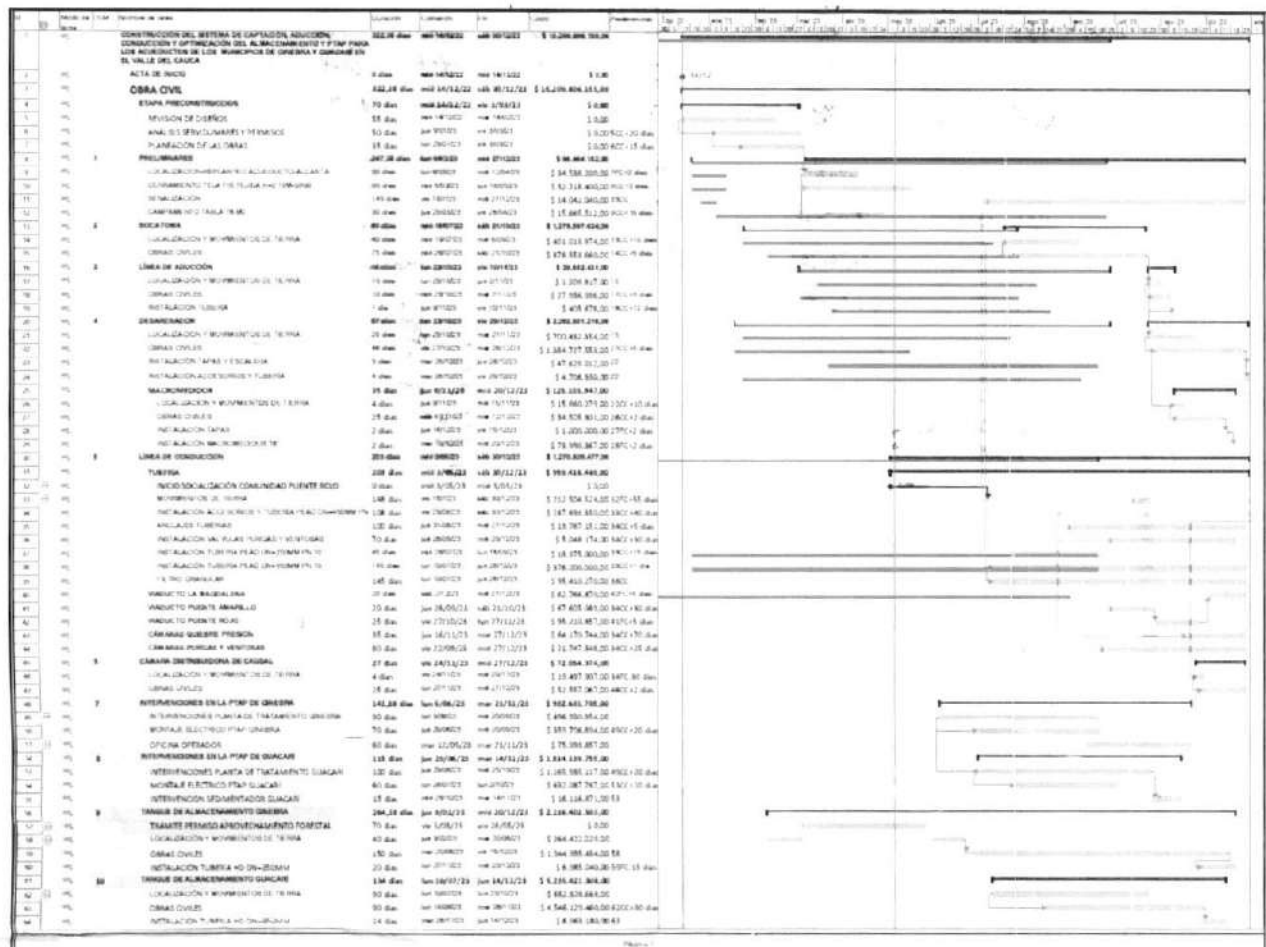


Ilustración 6 Cronograma de Actividades con Diagrama de Gantt, ajustado a los tiempos reales de ejecución

Ver anexo técnico
Cronograma
Flujo económico

2.8 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la ejecución de contrato se vienen presentado situaciones externas ajenas a nuestra gestión, las cuales están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto. A continuación, se detallan cada una de las condiciones presentadas:

- Permiso de aprovechamiento forestal PTAP Ginebra: Trámite a cargo de Acuavalle S.A E.S.P, radican la solicitud de permiso el día 3 de marzo del presente año, a la fecha no se

tiente respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Debido a la falta de este permiso se encuentran suspendidas las actividades de construcción del tanque de almacenamiento, se realizó parcialmente la excavación mecánica. Se requiere el permiso para continuar con las actividades.

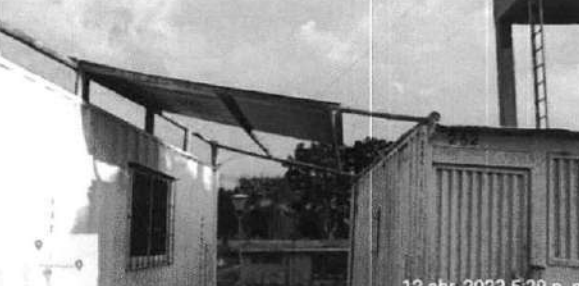
- Permiso de aprovechamiento forestal Bocatoma: El día 9 de marzo de 2023 se entrega a Acuavalle S.A E.S.P toda la documentación para radicar la solicitud de este permiso. El día 23 de marzo el Ing. Iroldo Gómez de Acuavalle informa que este permiso no lo radicarán ya que el predio no es de propiedad de esta entidad. El día 31 de marzo se radica la solicitud del permiso a nombre del Consorcio, CVC envía respuesta el 10 de abril notificando que esta solicitud debe ser radicada por el Municipio de Ginebra. Actualmente se encuentra gestionando con la Alcaldía de Ginebra la solicitud para gestionar este radicado.
- Pendientes diseñador: a la fecha aún se encuentra pendiente entrega de planos en formato Autocad, detalles de diseño y aclaración de especificaciones por parte del diseñador, al igual que la mesa técnica solicitada. Esta información es de gran importancia tanto para el desarrollo de las obras como para la proyección del balance presupuestal actualizado.
- Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Se encuentra pendiente por parte de Acuavalle la entrega de la propuesta de actividades a ejecutar en cada una de las plantas. Propuesta requerida para la proyección de las obras, planeación y balance presupuestal.
- Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.
- Problemas comunidad sector de Puente Rojo: desde el inicio de las socializaciones se ha tenido inconvenientes con la comunidad de este sector, aumentando con el tiempo la problemática social, esta situación ha impedido la ejecución de labores topográficas, recorridos y demás verificaciones requeridas a llevar a cabo en el tramo de instalación de la tubería de diámetro 18" (Bocatoma – Cadica), como también en el área de construcción de la bocatoma, desarenador y macromedidor. Las actividades en este tramo fueron suspendidas desde el mes pasado, ya que la comunidad no se encuentra conforme con el punto de construcción de la bocatoma y tiene varias inconformidades con el proyecto

- El día 20 de abril la comunidad del sector de Puente Rojo en las primeras horas de la mañana, se presenta en el frente de trabajo de instalación de tubería PEAD de diámetro 14" del tramo 3 (Cadica a PTAP Guacari), impidiendo la ejecución de las actividades. Hacen presencia de manera hostil, manifestando dañar la tubería que se encuentra en sitio, realizan plantón e impiden todo tipo de actividad en la obra, argumentando no estar de acuerdo con la construcción de la bocatoma en el punto de diseño del proyecto. Por esta razón se suspenden labores, se realiza inventario de la tubería que se encuentra sobre la vía y se señala el tramo de excavación que se encuentra abierta, quedan sobre la vía 27 tubos PEAD sueltos de diámetro 14" (longitud c/u 12ml) y 7 tubos PEAD termofundidos de diámetro 14" (longitud c/u 12ml).

2.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

 1 abr. 2023 9:08 a. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 1 abr. 2023 11:39 a. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 1. Se retoma con la actividad de instalación de cerramiento provisional en guadua y tela verde.	Fotografía 2. Se retoma con la actividad de instalación de cerramiento provisional en guadua y tela verde.
 1 abr. 2023 4:26 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 3 abr. 2023 4:35 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 3. Se realiza instalación de cable No. 10 y No. 12 para acometida eléctrica de los containers, se instala tablero de distribución bifásico de 4 circuitos, se pone en funcionamiento el aire acondicionado minisplit, el circuito de tomacorrientes e iluminación; se realizan pruebas y todo funciona correctamente.	Fotografía 4. Continúa construcción de estructura en madera para instalación acero, continúa traslado del mismo

 4 abr. 2023 11:58 a. m. Ginebra CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 5 abr. 2023 11:40 a. m. Guacarí CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 5. Se instala estructura metálica y pendón para valla informativa, lugar autorizado en el municipio de Ginebra. 	Fotografía 6. Se instala pendón- valla informativa en el lugar autorizado en el municipio de Guacarí.  11 abr. 2023 4:27 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 7. Se realiza la puesta en funcionamiento de la bomba sumergible para evacuación de agua estancada en la excavación del tanque.  11 abr. 2023 4:26 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	Fotografía 8. se realiza toma de medidas para optimización de floculadores de la planta Ginebra. '  12 abr. 2023 2:34 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 9. Ambiental Se instala punto ecológico en el lugar autorizado por acuavalle, solo pendiente instalar la respectiva señalización.	Fotografía 10. Recorrido de obra para verificar avance de la comisión de topografía del tramo 3, aproximadamente están ubicados sobre 1+500m, mañana continúa las labores de localización.

 12 abr. 2023 9:05 a. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 12 abr. 2023 5:29 p. m. Costa Rica CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 11. Continúa construcción de estructura en madera para instalación de tubería, continúa traslado de forma Manual del mismo.	Fotografía 12. Continúa construcción de cubierta en guadua y teja de zinc (Adecuaciones locativas para operaciones en planta Ginebra).
 13 abr. 2023 5:18 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 13 abr. 2023 1:43 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 13. Llegada de señalización de obra para trabajos en la instalación de la tubería (todo de acuerdo al PMT).	Fotografía 14. Termina construcción de cubierta en teja de zinc para adecuación parqueadero motos y almacenamiento de equipo.
 13 abr. 2023 4:14 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 13 abr. 2023 3:06 p. m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 15. Se instala señalización punto de encuentro.	Fotografía 16. Continúa construcción de estructura en madera para instalación de tubería, continúa traslado de forma manual del mismo.



Fotografía 17. Se han realizado las actas de vecindad y entorno en el tramo 2 del proyecto.



Fotografía 18. Continúa la construcción de estructura madera (burros) para organización y traslado de acero.



Fotografía 19. Continúa la comisión de topografía con el trazado de la línea de conducción del tramo 3.



Fotografía 20. Continúa construcción de estructura madera (burros) para organización y traslado de acero.



Fotografía 21. Se realiza visita a la hacienda la victoria, se hace recorrido donde se ubica la casa principal hasta la planta de acuavalle teniendo una distancia de 1.5km, se informa a la ingeniera Lina Marcela Burica.



Fotografía 22. Continúa retiro de material sobrante a lugar autorizado (Material Acopiado para utilizarlo en relleno de tubería).

 17 abr. 2023 7 3.7624N 7 CONSORCIO REDES Y PTA	 17 abr. 2023 9:51 a. m. 3.7680N 76 2216W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 23. Debido a las fuertes lluvias que se presentaron el domingo, se realiza evacuación de agua estancada con la bomba sumergible.	Fotografía 24. Comisión de topografía de Jimmy realizó levantamiento en puente amarillo y pinte rojo.
 17 abr. 2023 10:30 a. m. 3.7665N 76.2308W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 18 abr. 2023 3:41 p. m. 3.7627N 76.2367W Ginebra CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 25. Comisión de topografía de Jimmy realizó levantamiento en puente amarillo y pinte rojo.	Fotografía 26. Se realiza localización y replanteo de los baños provisionales de la obra.
 19 abr. 2023 11:12 a. m. 3.7669N 76.2333W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 19 abr. 2023 5:21 p. m. 3.7669N 76.2323W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 27. Se realiza instalación de tubería sanitaria para instalación de los baños provisionales.	Fotografía 28. Se realiza instalación de tubería sanitaria para instalación de los baños provisionales.



Fotografía 29. Instalación de señalización PMT para instalación de tubería en el tramo No. 03 (14" de Diámetro).



Fotografía 30. Se realiza instalación de tubería sanitaria para instalación de los baños provisionales.



Fotografía 31. Las actividades de instalación de tubería en el tramo 3 se suspenden por manifestaciones en contra del proyecto.



Fotografía 32. Las actividades de instalación de tubería en el tramo 3 se suspenden por manifestaciones en contra del proyecto.



Fotografía 33. El director de Vallecaucana de Aguas se ha reunido con los líderes y la comunidad para poder llegar a un acuerdo, pero la resistencia civil solicita reunión con todas las entidades competentes y espera que la fecha no sea lejana, mientras tanto toda la obra en los tres tramos quedan suspendidas.



Fotografía 34. Se realizan el comité de obra para evaluar el estado de avance de las actividades constructivas del proyecto.

 21 abr. 2023 11:08 a.m. Calle Monica Resendiz Calle del Caspa	 21 abr. 2023 11:16 a.m. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 35. Se realizan el comité de obra para evaluar el estado de avance de las actividades constructivas del proyecto.	Fotografía 36. Llegada de 2 contenedores 1 para oficina y otro para bodega. Se ubica en la zona de parqueaderos de la planta.
	 22 abr. 2023 11:36 a.m. 3.7628N 76.2368W Ginebra CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 37. Se realiza instalación de cubierta para los baños provisionales.	Fotografía 38. Se realizan pruebas a la tubería sanitaria e hidráulica que funcionen correctamente.
 24 abr. 2023 4:57 p.m. 3.7628N 76.2368W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 25 abr. 2023 8:19 a.m. 3.7518N 76.2327W Ginebra CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Fotografía 39. se realiza fundición de piso en concreto para construcción de los baños provisionales.	Fotografía 40. se realiza instalación en la oficina de Camilla, botiquín, extintor y cinta antideslizante sobre las escalera con el objetivo de prevenir una caída.



Fotografía 41. Recorrido tramo 3 CADICA PTAP GUACARÍ, tubería diámetro 14"



Fotografía 42. se realiza instalación en la oficina de Camilla, botiquín, extintor y cinta antideslizante sobre las escalera con el objetivo de prevenir una caída.



Fotografía 43. Se instala estructura Dry-Wall, perfiles para instalar lamina superboard, para construcción de muros de para los baños provisionales de la obra.



Fotografía 44. Se instala estructura Dry-Wall, perfiles para instalar lamina superboard, para construcción de muros de para los baños provisionales de la obra.



Fotografía 45. Se realiza la puesta en servicio de los baños provisionales de la obra.



Fotografía 46. Se construye sitio para punto ecológico y se realiza la respectiva instalación.



Fotografía 47. Comision de Topografia localizando tramo 3



Fotografía 48. Comision de Topografia poniendo estacas



Fotografía 49. Recorrido con operario de ACUAVALLE



Fotografía 50. Recorrido con fontanero de Pichichi



Fotografía 51. Recorrido con fontanero acueducto El Placer



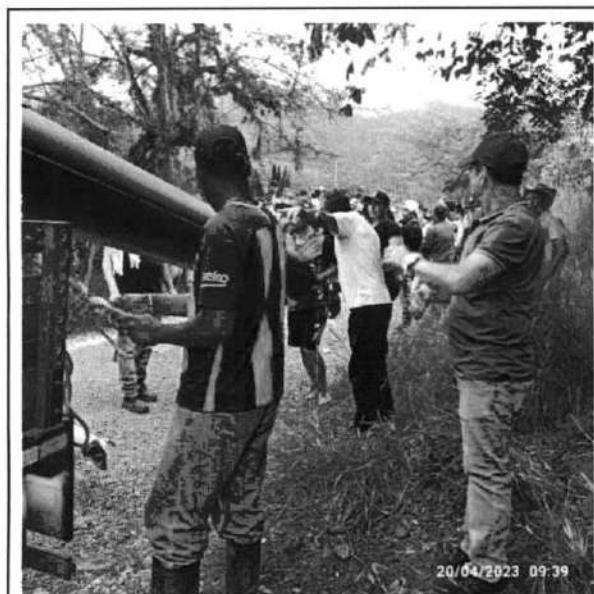
Fotografía 52. Trasiego de tubería PEAD de 14"



Fotografía 53. Pega de tubería PEAD 14" por Termofusión



Fotografía 54. Excavación mecánica



Fotografía 55. Protestas de la comunidad contra el proyecto



Fotografía 56. Chequeo niveles del tanque almacenamiento

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del presente informe.

Dichas actividades se realizaron entre el 1 y el 30 de abril en los municipios de Ginebra y Guacarí.

Tabla 6 Actividades realizadas Gestión Social

DESCRIPCIÓN	AVANCES / LOGROS	PERIODICIDAD	CUMPLIMIENTO	REGISTRO /VERIFICACIÓN
Para efectos de que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el FONDO para el desarrollo del objeto contractual, según los lineamientos definidos para tal fin en la Estrategia de Auditorías Visibles	Durante este periodo se convocó a las entidades territoriales de los municipios Ginebra y Guacarí como a líderes, habitantes para realizar reuniones informativas a la comunidad.	Una vez (1) en etapa de Construcción	Esta actividad no se realizó para el 15 de abril del 2023 en el municipio de Ginebra	Volante de convocatoria
Convocar a los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto interesados, que acompañarán el proceso de acompañamiento del proyecto. Conformación de veeduría	Identificación de líderes de los municipios de Guacarí y Ginebra	Una vez (1) en etapa construcción. el 11 de abril -2023	se cancela reunión por parte de vallecaucana por conflictos con grupo que se convoco	No se toma foto y acta porque no se logra el objetivo los líderes de Guacarí
Reconocimiento del territorio donde se ejecutará el proyecto	Se hace recorrido de las plantas de tratamiento de los dos municipios con entidad contratante, interventoría y contratista quien ejecutará el proyecto	Dos veces (2) en etapa de Construcción	no se realiza porque los líderes de la protesta exigen que se haga reunión con vallecaucana y se suspendan actividades constructivas	Registro fotográfico
Recorrido para reconocimiento del sitio de construcción de la bocatoma como población aledaña a la obra	Se realiza recorrido en puente piedra para identificar el sector donde se implementará la obra como el número de actas de vecindad que se deben realizar	Una vez (1) en etapa de - Construcción	no Se realiza actividad grupo de resistencia civil impide paso a área de bocatoma y donde el consorcio debe hacer obras	Registro fotográfico
Foro Inicial de presentación del proyecto y socialización ante la comunidad y la administración municipal.	no se realiza	Una vez (1) en etapa de - Construcción.	no se realiza	

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC



Ilustración 7 Punto de atención ciudadano

El punto de atención continúa con la apertura en los horarios establecidos desde el inicio de la obra (martes de 08:00am a 12m y jueves 02:00 pm a 5:00 pm), ya conocido por todos los líderes y habitantes del sector de influencia del proyecto. Se encuentra ubicado en la carrera 5 No. 10-46 segundo piso. A la fecha, la comunidad lo ha visitado para entrega de hojas de vida. Es importante tener en cuenta que la atención a la comunidad se realiza permanente.

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS

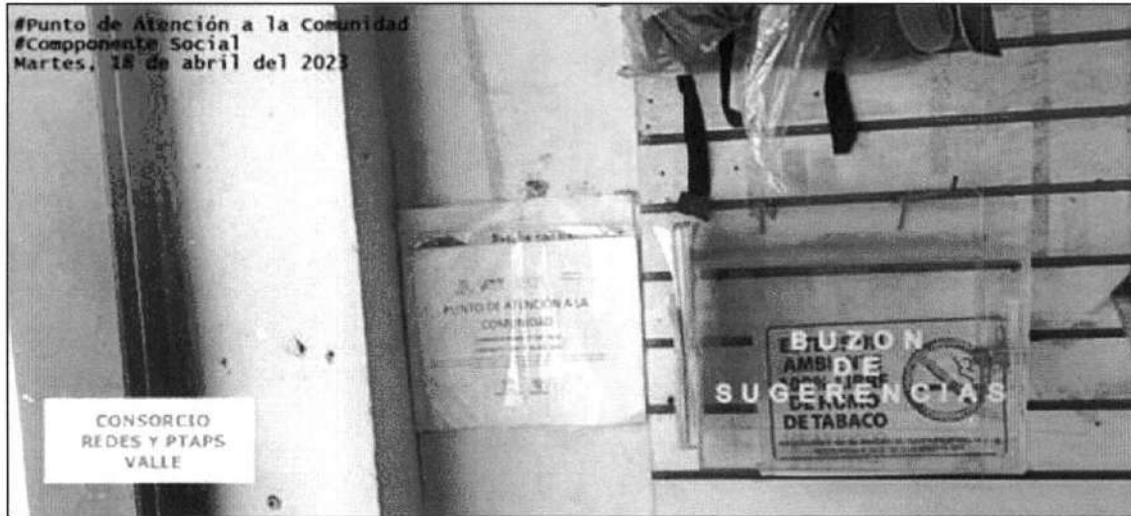


Ilustración 8 Buzón de sugerencias Costa Rica

Sigue funcionando el primer buzón de sugerencias en el corregimiento de Costa Rica en el municipio de Ginebra, en la dirección carrera 5 No. 10-46 primer piso, con la respectiva identificación.

A la fecha no hay ningún requerimiento.

Ante la situación que se viene presentando con los líderes denominado grupo de resistencia civil donde expresan están cobijados negritudes, indígenas y otras organizaciones, el equipo profesional ,administrativo, operativo y social sigue manteniendo su actitud de escucha y respeto y dejando claro en sus encuentros con la comunidad que están abiertos al diálogo y resolver dudas frente al proyecto. Se evidencia en las organizaciones sociales del municipio de Ginebra con reconocimiento legal una actitud de distanciamiento y silencio frente a lo que se ha generado con el grupo denominado resistencia civil esperando se resuelva este conflicto y definir si desean hacer parte del comité de veeduría.

Cabe anotar que en el mes de abril por la posición de los líderes de Puente Rojo frente a la ejecución y construcción de la bocatoma en el sector de Puente Piedra definieron no dejar subir personal del consorcio a realizar ninguna actividad, además solicitaron se enviara oficio informando pare de actividades hasta que se haga la reunión con ellos.

3.2.3 RECEPCIÓN DE PQRS

No se reciben PQR'S durante el mes de abril.

ITEM	SECTOR	MOTIVO	SEGUIMIENTO /ESTADO	ANEXO
2	Grupo resistencia civil	Solicitan reunión con Vallecaucana de Aguas, CVC y Acuavalle	ABIERTA	Se programó reunión para el día 3 de mayo

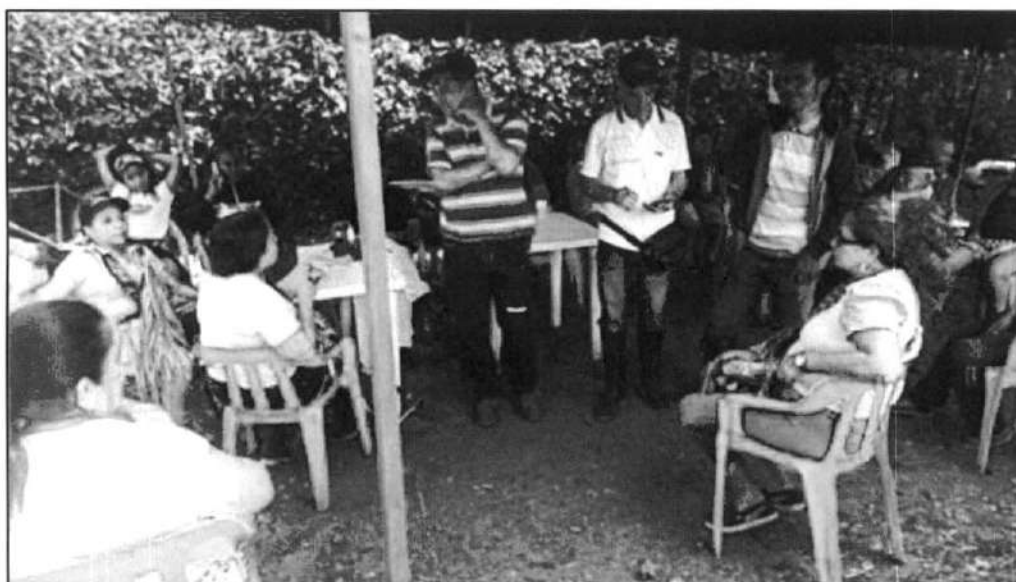


Ilustración 9 Bloqueo de la comunidad en la ejecución de las actividades

3.2.4 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

En este mes no se realizó perifoneo, todas las actividades o comunicaciones con líderes se realizaron a través de plataforma virtual WhatsApp, como fue la convocatoria para reunión 11 de abril con líderes del sector, Vallecaucana de Aguas, Acuavalle y Consorcio, esta convocatoria fue suspendida puesto que la comunidad no estuvo de acuerdo con el sitio por considerarlo pequeño, dicho lugar puede ser ocupado por 100 personas, para la comunidad, esta convocatoria tiene como objetivo la asistencia de más de 300 personas.

Tabla 7 Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad

Actividad	Programado	Ejecutado	Pendiente	Porcentaje de Ejecución
Distribución de volantes de Inicio de elaboración de actas	1	1	0	100%
Reunión inicial (Socialización del proyecto)	1		0	
Reuniones con la veeduría ciudadana				

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.

Se tienen identificados los líderes que desean hacer parte del comité de veeduría, sin embargo, en conversaciones entabladas con representantes de Ginebra han manifestado su posición por lo que viene ocurriendo con el grupo denominado resistencia civil han definido esperar que se resuelve este conflicto y poder decidir si participan

3.4 ELABORACAIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Este objetivo se cumplió por medio de la "ELABORACIÓN DEL ACTA DE VECINDAD O ACTA DE FACHADA" el cual es un instrumento de recolección de información que tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la ejecución del proyecto.

Se realizan actas en el tramo 3 sector de la Magdalena o Esmeralda, este sector pertenece al municipio de Guacarí. Se encuentran viviendas en pequeños conglomerados y colinda con predios de grandes extensiones, fincas que pertenecen por información al Ingenio Pichichí o

personas que tienen casas que ocupan en vacaciones o fines de semana. Este sector cuenta con fincas de recreación, o venta de ganado, cultivos de caña, está ubicado el acueducto del Ingenio Pichichí y Guabas que abastece la población de Guacarí y alrededores. Cuenta con servicio de acueducto y energía. No se observó en la realización de las actas servicio transporte público la movilidad, se da por jeep o las personas y la comunidad se movilizan en moto a todos los sectores. La infraestructura institucional es deficiente. Sector donde los pequeños dueños de los predios cultivan para surtir a los municipios de frutas verduras, pescado y otros productos.

Actualmente se han realizado las actas en Regaderos Ginebra	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra	4 actas de inicio

Pendiente Puente Rojo sector turístico y vereda, hasta que se realice reunión nuevamente con toda la comunidad del sector.

Tabla 8 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado,

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	48	22	68,6%

NOTA:

Iniciando la ejecución y proceso constructivo del proyecto, se levantaron actas de vecindad de fachada 48 en este punto de la obra, quedando pendientes 22. Hasta que no se logre con los líderes de puente Rojo acuerdos en la ejecución de la obra, puesto que ellos no desean que la bocatoma se construya en el sitio definido por el contrato.

Ver anexo social

3.5 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Población que tiene como actividad la agricultura, criadero de gallinas y vende sus productos en Costa Rica, Ginebra y otros sectores, cerca al área tienen puesto de salud y se encuentran sectores de la vía que cuenta con pavimentación y mejora la movilidad en el sector, prestan servicios públicos los jeeps, pero se movilizan las personas en su propia motocicleta. En los habitantes del sector se percibe desconfianza a dar información y solo permiten tomar foto las que se encontraban en sus viviendas cuando se realizaron las actas, se entregó volante y se informó sobre visita a través de los representantes de junta de acción comunal

3.6 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS

En este programa se orienta a transferir información a la comunidad de las veredas de Puente Rojo que pertenecen al municipio de Guacarí y las veredas de Floresta, Bello Horizonte y corregimiento de Costa Rica que hacen del municipio de Ginebra, especialmente por ser eje donde se desarrolla el proyecto denominado.

El escenario con el que cuenta hoy la ejecución del proyecto es el siguiente:

- Rechazo del grupo que se denomina resistencia civil y sus representantes están ubicados en la parte alta las veredas juntas, cocuyos, su posición es de hablar con las directivas de Vallecaucana y Acuavalle sobre el proyecto, donde para ellos el sitio de ubicación de la Bocatoma no es aceptada de manera rotunda y plantean otro lugar sin mirar los documentos técnicos que han soportado la decisión de ubicación de la bocatoma.
- Los líderes de los otros sectores no están de acuerdo en su mayoría por las acciones de este grupo y por temor han decidido distanciarse del conflicto y prefieren esperar cuando se haga la reunión ,que se define y poder decidir si nos acompañan en el comité de veeduría.
- La etapa o el proceso con la comunidad es actualmente de manejo de conflicto y conciliación para la aceptación del proyecto por parte de la comunidad rural de las veredas Puente Rojo, y por la mala información que manejan específicamente el sector turístico y la parte alta de las veredas de Ginebra con relación al comportamiento del río con la construcción de la bocatoma y la afectación en sus negocios.

Aunque se realizaron socializaciones de manera individual desde los meses de enero y febrero del 2023 con los corregimientos como Costa Rica y las veredas de bello Horizonte, la Floresta, se logró que dichas comunidades entendieran los alcances del proyecto, en el sector de Puente Rojo y el sector turístico, aún ven con desconfianza el proyecto y no aceptan la ejecución de este por percepciones que pueden aclarar, como es el creer que el río se secará con la intervención de la obra. Presentan inconformidad con la ubicación de la bocatoma, dudando de los estudios técnicos que definieron el sitio de construcción, de igual manera en el mes de marzo se realizó reunión con junta de acción comunal puente rojo donde se quedó como compromiso reunión con directivas de Vallecaucana de Aguas y de Acuavalle que sigue en proceso de organización pues el sitio definido no fue aceptado por la comunidad

En el mes de abril no se realizó reuniones con comunidad a pesar de hacerse la convocatoria el día 11 de abril que se canceló debido a que la comunidad de Puente Rojo no estuvo de acuerdo con el sitio.

3.6.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

**CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.
2000.13.05.003.2022**

INVITACIÓN SOCIALIZACION

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

MARTES 11 DE ABRIL
4:00 PM

**SEDE BOMBEROS
CARRERA 5 # 4-58
CORREGIMIENTO
COSTARICA
MUNICIPIO DE
GINEBRA**

**REUNION INFORMATIVA PARA
LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
GUACARI Y GINEBRA - VEREDAS
PUENTE ROJO, BELLO
HORIZONTE, FLORESTA,**

CONSORCIO INTERGUACARI VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE PAP-POA

Ilustración 10 Volante inicial convocatoria cancelada

No se realizaron reuniones, se realizó convocatoria para el día 11 de abril pero fue cancelada porque la comunidad de Puente Rojo, quien es el grupo que está en contra del proyecto no estuvo de acuerdo con el sitio por considerarlo pequeño, pues tiene capacidad para 100 personas, se definió dicho sitio por accesibilidad como también por comodidad porque el promedio de personas que han asistido a las convocatorias o reuniones informativas no superan las 40 personas y el auditorio de bomberos del corregimiento costa rica tiene capacidad para 100 personas.

3.7 SITUACIONES ADICIONALES PRESENTADAS

El día 20 de abril la comunidad de Puente Rojo realiza plantón en el área de intervención de la instalación de tubería del tramo 3 (Guacari-Cadica), en el sector de la Esmeralda, realizan presencia de manera hostil, obligando la suspensión de actividades, manifestando dañar la tubería en caso de no acatar la suspensión, la misma comunidad realiza el levantamiento de parte de la tubería al camión que se tiene en sitio para movilizar los equipos, agreden de manera verbal al personal del Consorcio. Por tal motivo, a partir de esta fecha se retiran equipos y el personal en este frente de trabajo.

La comunidad de Puente Rojo solicita reunión con los directivos de las entidades involucradas en el proyecto. Dicha reunión se llevará a cabo el día 3 de mayo con el fin de dar respuesta a las inquietudes que presenta frente a la ejecución del contrato, las cuales son:

- Ubicación de la bocatoma en otro lugar diferente al planteado en el contrato.
- No intervención de la vía de Puente Rojo por donde está la placa huella que fue entregada el diciembre del 2022.
- Caudal del río se disminuye y se secará según la comunidad por la construcción de la bocatoma.
- Respuesta al cabildo porque no se hizo la consulta previa a la comunidad indígena y negritudes, es un proyecto que para ellos tiene impacto ambiental y es un territorio sagrado para ellos.

Desconocen e invalidan los estudios técnicos que han aportado las instituciones para la definición de la bocatoma y su proceso constructivo y consideran que la obra no tiene beneficio social para ello sino para el área urbana, la perciben como una amenaza para el sector turístico porque se puede secar el río, pero no ven como riesgo la contaminación que se está generando por la explotación de minería, cultivo de trucha y otros cultivos, donde todos los residuos caen al río, como los residuos domiciliarios que tampoco tiene pozos sépticos todas las viviendas.

Presentan actitud poco conciliadora donde solo se exigen derechos, pero no se vela por el cumplimiento de las obligaciones como habitantes y grupo de líderes, deben velar por el bienestar de la comunidad, donde todos aportan al cuidado del río y del medio ambiente.



Ilustración 11 Plantón sector La Esmeralda

3.8 COMITÉ TÉCNICO



Ilustración 12 Comité técnico

Asistencia comité técnico del 29 de abril en oficina de Vallecaucana de Aguas, donde se analizó el manejo de la reunión que se tendrá con las comunidades de Puente Rojo y los lineamientos

para dicha reunión que se efectuará el 3 de mayo a las 9am con las organizaciones sociales de los municipios de Ginebra y Guacarí, los alcaldes de dichos municipios y sus colaboradores como funcionarios del ente nacional, quienes ayudarán a despejar inquietudes a la comunidad.

3.9 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

La labor constructiva comienza a requerir mayor mano de obra y se espera suplir con el recurso humano de la región. En este momento está concentrada en las actividades preliminares del tanque de almacenamiento en la planta de tratamiento de Ginebra, ubicada en el sector de Puente Rojo

Tabla 9 Visibilización mano de obra calificada y no calificada en general

CATEGORÍA	ACTIVOS
Mano de obra calificada	0
Mano de obra No calificada	3
Operadores	1
TOTAL	4

3.10 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL

Frente a las actividades realizadas que contempla el plan de gestión se han programado las ejecutadas para el mes de abril, sin embargo, no se ha logrado el resultado del 100% que es el esperado como es la elaboración inicial de actas de vecindad en su totalidad y la conformación del comité de veeduría pues estas han estado obstaculizadas por los acuerdos que se logren con los líderes del sector de Puente Rojo, quienes han tenido desde que se hizo la primera socialización una actitud radical y de oposición al proyecto, al no estar de acuerdo con la ubicación de la bocatoma, esta actitud obedece a que no tienen confianza en los estudios que sustentan la decisión de aprobación del proyecto que se ejecuta por el consorcio y no han permitido espacios de comunicación cuando se han realizado las socializaciones con dicho sector.

Han tomado la protesta en la obra como mecanismos de presión y buscando alianzas con otras organizaciones sociales que no hacen parte del territorio donde se hace el proceso de obra, obstaculizando las actividades en bocatoma y línea de conducción. Los líderes de las otras veredas o sectores, aunque no están de acuerdo con dicha posición y actitud de los líderes de Puente Rojo prefieren tomar distancia, toman una posición de silencio y esperan para participar en el proceso de acompañamiento al proyecto.

Se puede evidenciar que la manera de resolver los conflictos entre las diferentes organizaciones dista de utilizar y construir espacios de diálogo, colocar en balanza los efectos positivos que generará a los habitantes de los municipios del área urbana de Ginebra y Guacarí, siendo un termómetro para analizar cómo las organizaciones sociales ante el desconocimiento de la ley y la debilidad en la utilización de herramientas asertivas para solucionar el disenso. Es claro para los grupos en conflicto y no conflicto que el consorcio Redes y PTAPS sólo ejecuta la obra y está cumpliendo con los términos y compromisos del contrato.

4. PROGRAMA SST

En el periodo comprendido entre el 01 hasta el 30 de abril del 2023, se evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1 OBJETIVOS

- Informar a la dirección del proyecto **“LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ”** sobre las medidas de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.
- Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

- Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto.

4.2 ALCANCE

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante **LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ**, está orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar cobertura a todo el personal directo, contratistas y subcontratistas con el fin de controlar los factores de riesgos que pueden generar condiciones sub-estándar.

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabla 10 Documentos de referencia

DOCUMENTO	NORMA de referencia
Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Decreto 1072/2015
Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Res. 0312/2019
Medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19	Res 0692/2022 - Res 1238/2022
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados	Res. 0491/ 2020
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas	Res. 4272 / 2021

4.4 RELACIÓN PERSONAL

Tabla 11 Relación personal administrativo y operativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consortiado	Sura	Sura	Colpension es
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		Director de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Lina Marcela Buriticá	42.136.662	01/12/2022		Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpension es
4	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	23/01/2023		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
5	Gina Leidy López	1.144.140.957	17/02/2023		Residente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
6	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01/02/2023		Ingeniera Ambiental	N EPS		Colpension es
7	John Edward Díaz	1.143.852.425	09/02/2023		Ingeniero Aux ambiental	Sanitas	Sura	Porvenir
8	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/2023		Profesional social	Sura	Sura	Colpension es
9	Flor María Martínez	31.644.927	25/02/2023		Profesional-SST	S.O.S.	Sura	Colpension es
10	John Janner Cuero	1.113.662.973	17/02/2023		Inspector de obra	Salud total	Sura	Porvenir
11	Luis André Medina	14.652.802	07/03/2023		Oficial	Emssanar	Sura	Porvenir
12	Alexander Cardona	14.651.320	07/03/2023		Ayudante de obra	Emssanar	Sura	Colfondos
13	Ramiro Bedoya	14.651.124	11/04/2023		Ayudante de obra	Emssanar	Sura	Porvenir

Tabla 12 Relación personal operativo

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	Jimmy Sinisterra	14.636.383	24/01/2023		Topógrafo	S.O.S.	Colmena	Protección
2	Guillermo Ortiz	12.965.254	06/03/2023		Topógrafo	SURA	La Equidad	N/A
3	Oscar Joany Villa	14.652.136	01/03/2023	31/03/2023	Cadenero	Emssanar	La Equidad	Porvenir
4	Jairo Ruiz	16.858.250	12/04/2023		Cadenero	Sanitas	La Equidad	Porvenir

PERSONAL OPERATIVO MAQUINA-VOLQUETA								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
4	Luis Humberto Vásquez	14.650.512	01/03/2023		Conductor volqueta	N.EPS	Sura	Porvenir
2	Alexander González	94.468.921	09/02/2023		Operario retro- llantas	N. EPS	Sura	Porvenir

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	Rubens Benitez	94.427.406	18/04/2023		Supervisor	Sura	Sura	Porvenir
2	Guillermo Alvarez	94.302.942	18/04/2023		Operador Maquina	S.O.S	Sura	Porvenir
3	Johan Caicedo	1.113.514.103	18/04/2023		Pegador tubería	Sura	Sura	Porvenir
4	Maicol Caicedo	1.143.938.113	18/04/2023		Ayudante de pega	Sura	Sura	Porvenir
5	Jhon cedeño	1.118.295.266	18/04/2023		Conductor turbo	Sura	Sura	Protección
6	Luis Miguel Esterilla	1.143.953.941	18/04/2023		Operario Mini retro	Comfenalco	Sura	colfondos
7	Lady Mariana Mosquera	1.144.046.196	18/04/2023		Inspector SST	Sura	Sura	Porvenir

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.5.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2023, se realiza verificación del pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo.

Tabla 13 Aportes a la Seguridad Social Integral

NIT EMPRESA O DOCUMENTO PERSONA NATURAL	CONTRATISTA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	OPERADOR
89.008.184	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	21/04/2023	12/04/2023	PILA ARUS
901648319	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	10/04/2023	12/04/2023	PILA ARUS
38. 856.496	MARIA FERNANDA MARTINEZ	26/04 2023	02/05/2023	Aportes en línea
14.650.512	LUIS HUMBERTO VASQUEZ	05/04/2023	13/04/2023	PILA ARUS
31.658.574	DIANA MARCELA ECHAVARRÍA	20/04/2023	20/05/2023	PILA ARUS
901074094	INNOMARS SAS (Operario Retro)	26/04/2023	21/04/2023	PILA ARUS
805030454	CONINGENIERIA S.A.S	13/04/2023	12/04/2023	Aportes en Línea
14.636.383	JIMMY SINISTERRA	24/04/2023	24/04 /2023	Aportes en línea
901.114.758	FOMENTO Y DESARROLLO COORPORATIVO S.A.S	20/04/2023	19/04/2023	PILA ARUS
900618239	INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES	13/04/2023	11/04/2023	Aportes en línea

Ver Anexo SST

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.

4.5.2 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En el mes de abril del 2023, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los siguientes:

- Políticas de seguridad y salud en el trabajo y no alcohol, drogas y fumadores del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE.
- Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo.
- Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST.

- Clasificación de residuos sólidos.
- Rutas de evacuación y puntos de encuentro.



Ilustración 13 Inducción personal

**Ver Anexo SST
Registros de inducción**

4.5.3 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de abril del 2023, se realizan las siguientes charlas de seguridad y capacitación programada en el plan de capacitaciones:

- Charla de seguridad en riesgo Biomecanico - Mecánico
- Capacitación socialización de plan de emergencias
- ATS Clasificación y traslado de tubería
- ATS excavación línea de conducción tubería
- ATS Corte de superBoard
- Entornos y ambiente laboral (trabajo social)



Ilustración 14 Capacitación personal en obra

Ver Anexo SST
Registros de charlas y capacitaciones.

4.5.4 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el mes de abril del 2023, se verifica que el personal que ingresa nuevo se le realice el examen médico ocupacional de ingreso.

Es responsabilidad del personal que ingresa:

- Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.

El programa de pausas activas se implementa en el proyecto con el objetivo de Prevenir trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas.

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la integración grupal.

Tabla 14 Reporte de EMO

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	FECHA DE EMO	IPS OCUPACIONAL	CONCEPTO MÉDICO
Guillermo Ortiz	12.965.254	03/04/2023	FIME Cerrito	Apto para el cargo, sin restricciones
Jairo Ruiz	16.858.250	03/04/2023	FIME Cerrito	Apto para el cargo, sin restricciones
Ramiro Bedoya	14.651.124	05/04/2023	FIME Cerrito	Apto para el cargo, sin restricciones



Ilustración 15 Pausas activas personal en obra

**Ver Anexo SST
Registros de pausas activas**

4.5.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el mes de abril del 2023, se entrega dotación al personal y elementos de protección personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y herramientas y se realiza las siguientes inspecciones:

- Inspección a Máquina Retro excavadora
- Inspección a EPP
- Inspección a Pulidora

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de abril del 2023.

Tabla 15 Maquinaria, equipos y herramientas

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Retroexcavadora llantas	2	CAT-420D- CAT 420F2
Mini Retroexcavadora llantas	1	JCB
Volqueta	1	JLJ076
Camion estacas	1	FOTON-ZNN969
Maquina Termofusion	1	Butis fusion Machine
Equipos de topografia	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Pala draga	3	Herragro

Palas	1	Herragro
Machete	2	Nuevo
Segueta	1	Nuevo
Martillo	1	Nuevo
Porra	1	Nuevo
Serrucho	1	Nuevo
Cinzel	2	Nuevo
Barra	1	Nuevo
Carreta metalica	3	Herragro
Extensiones 30 m	3	Nuevo
Pulidora 4 1/2	1	DEWALT
Motobomba sumergible 2" eléctrica	1	BARNES
Mezcladora cemento ½ bto gasolina	1	TOOLCRAFT



Ilustración 16 Cerramiento y señalización y entrega de EPP

Ver Anexo SST

Registros de entrega de EPP

Registros de entrega de dotación personal

Formatos de Inspecciones

Documentos Retroexcavadoras - Camion

Hoja de vida y formato de mantenimientos preventivos y correctivos de máquina.

4.5.6 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

En el mes de abril del 2023, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen fórmulas para medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse.

- **Índice de accidentalidad**

Fórmula

$$\text{Frecuencia de accidentalidad} = \frac{\# \text{ de accidentes de trabajo en el mes}}{\# \text{ de trabajadores en el mes}} \times 100$$

$$I.F = \frac{AT \text{ en el mes de diciembre}}{Trabajadores} * 100$$

$$I.F = \%$$

- **Índice de severidad**

Fórmula

$$\text{Severidad de accidentalidad} = \frac{\# \text{ de días de incapacidad por AT en el mes} + \# \text{ días cargados en el mes}}{\# \text{ de trabajadores en el mes}} \times 100$$

$$I.S = \frac{\text{días de incapacidad}}{Trabajadores} * 100$$

$$I.S = \%$$

4.5.7 AUSENTISMO

Durante el mes de abril del 2023, se presentó incapacidad médica por 30 días de la trabajadora social, María Fernanda Martínez por accidente común, de los cuales al mes de abril del 2023 corresponden 25 días.

- Ausentismo por causa médica

Fórmula

$$\text{Ausentismo por causa médica} = \frac{\# \text{ de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\# \text{ de días programados de trabajo en el mes}} \times 100$$

$$ACM = \frac{25 \text{ días EC}}{22 \text{ días mes marzo} * 20 T} * 100$$

$$ACM = \frac{25 \text{ días}}{22 \text{ días} * 20 T} * 100$$

$$ACM = \frac{25 \text{ días}}{440 \text{ días programados}} * 100$$

$$ACM = 5.68\%$$

**En el consorcio REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de abril de 2023, se perdieron 25 días programados de trabajo por incapacidad médica, equivalente al 5.68 % del tiempo programado.*

Ver Anexo SST

Formato de asistencia

Incapacidad Medica Ma Fda Martinez

4.5.8 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Durante el mes de abril del 2023, se implementan las siguientes actividades programadas en el plan de emergencias del **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**.

- Socialización Plan de emergencias
- Conformación de la brigada de emergencias
- Ubicación y distribución de elementos de emergencias
- Señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro
- Plano rutas de evacuación planta física sede administrativa

4.5.9 DISTRIBUCION Y UBICACION ELEMENTOS DE EMERGENCIAS



Ilustración 17 Ubicación de elementos de emergencias

4.5.10 RUTAS DE EVACUACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA - PTAP GINEBRA



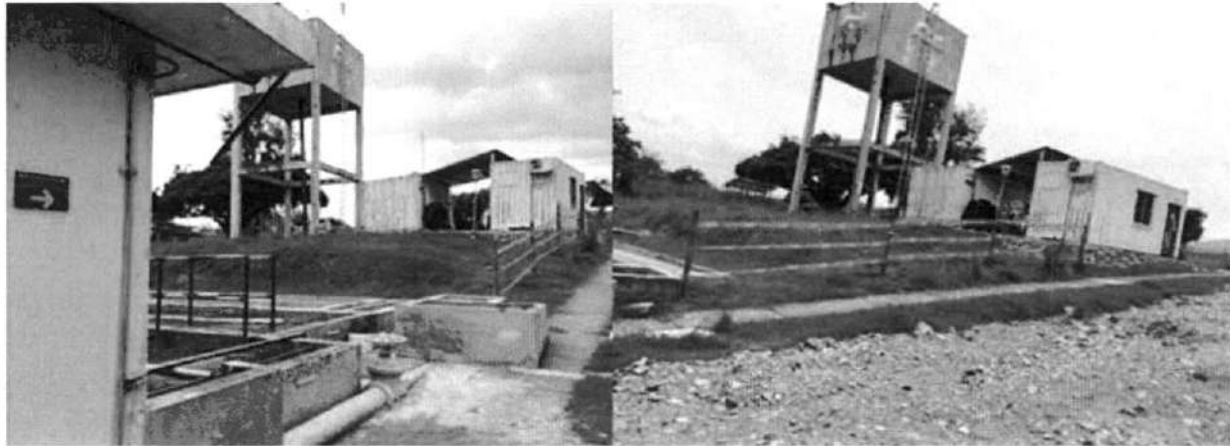


Ilustración 18 Rutas de evacuación

4.5.11 PUNTOS DE ENCUENTRO



Ilustración 19 Puntos de encuentro

Anexo SST
Documentos conformación de la brigada de emergencias
Plano planta física sede administrativa

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Dentro del componente ambiental, se realizó una adecuada gestión de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, antes de iniciar las obras, se verificó que el proyecto cumpliera con todos los requerimientos legales, para lo cual, durante la etapa Pre-constructiva, se determinó y se adelantó la gestión para obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecución de las mismas.

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

A continuación, se muestra una tabla donde se evidencia la cantidad de cada uno de los permisos y licencias que se han otorgado y que se encuentran en proceso.

Tabla 16 Resumen de permisos y licencias del área ambiental para la correcta ejecución del contrato

PERMISO/LICENCIA	CANTIDAD	ESTADO	ENTIDAD
Permiso de Concesión de aguas	1	Otorgado	CVC
Permiso de Ocupación de Cauce	1	Otorgado	CVC
Permiso de aprovechamiento forestal	2	En proceso	CVC
Licencia de Espacio Publico	2	Otorgado Ginebra, en Proceso Guacarí	PLANEACIÓN MUNICIPAL
Plan de Manejo de tránsito	2	Otorgado	Alcaldía municipal de Ginebra y Guacarí
Licencia Ambiental de Relleno Sanitario presidente	1	Otorgado	CVC

En la siguiente tabla siguiente, se muestran los indicadores de seguimiento y monitoreo, donde como resultado el 66% de los permisos están otorgados hasta el momento.

Tabla 17 Indicadores de seguimiento y Monitoreo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
NOMBRE	INDICADOR	MEDICIÓN	FRECUENCIA	TIPO DE REGISTRO
Verificación por parte de la interventoría de las gestiones y radicados ante las autoridades competentes.	(No. de permisos otorgados en la etapa de pre-construcción / No. de permisos requeridos por etapa) * 100 (9/9) * 100 = 66%	%	Mensual	Informe mensual

5.2 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

El proyecto cuenta con la concesión de aguas superficiales a nombre de Acuavalle, con la cantidad equivalente a 232 lt/seg.

5.3 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES

El día 7 de marzo se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. La prórroga del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo.

En el periodo que corresponde el informe no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo, ya que este frente de obra se encuentra suspendido por las acciones de la comunidad.

5.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT

De acuerdo al permiso otorgado por la secretaría de Tránsito de Ginebra se ha adelantado la instalación de señalización móvil informativa. Se ha usado el esquema de señalización cuando se realizaron trabajos de excavación en la vía y movimiento de maquinaria.



Ilustración 20 Señal vial instalada Tramo 3

5.5 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL)

Tabla 18 Manejo silvicultural (Intervención forestal)

INDICADORES	META	TIPO DE REGISTRO
(No. De árboles erradicados según programación mensual/No. De árboles a erradicar según resolución de la autoridad ambiental) * 100	100%	Mensual
Cumplimiento de las obligaciones impuestas en el permiso forestal %	100%	Depende del avance de las actividades de erradicación

El indicador relacionado al manejo silvicultural no se ha ejecutado ya que se está en proceso de emisión de las resoluciones de aprovechamiento forestal de árboles aislados para el sector de la PTAP Ginebra.

El componente forestal comprende varios individuos forestales localizados en el predio de la Planta Tratamiento Agua Potable del municipio de Ginebra.

5.5.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA

A la fecha se ha elaborado la siguiente documentación para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal para el predio de la Planta Tratamiento Agua Potable del municipio de Ginebra.

- Plano topográfico donde se visualice los individuos arbóreos objeto de intervención forestal.
- Fichas forestales de nueve (9) individuos arbóreos
- Plan de aprovechamiento forestal
- Inventario forestal
- Formato de solicitud de aprovechamiento forestal

El día 3 de marzo Acuavalle radica ante la CVC la solicitud de aprovechamiento forestal para nueve (09) árboles aislados. El día 17 de abril la CVC solicita la remisión de documentación predial para continuar con el trámite, ese mismo día mediante correo electrónico se remite dicha documentación. A la fecha se encuentra pendiente por parte de CVC la emisión de la factura correspondiente a la evaluación de individuos arbóreos.

5.5.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA

El día 28 de febrero se realiza la elaboración de las fichas forestales correspondientes al predio de la bocatoma. Se identificaron quince (15) individuos arbóreos los cuales son necesarios para intervención forestal de erradicación.

- Plano topográfico donde se visualice los individuos arbóreos objeto de intervención forestal.
- Fichas forestales de quince (15) individuos arbóreos
- Plan de aprovechamiento forestal
- Inventario forestal
- Formato de solicitud de aprovechamiento forestal

El día 31 de marzo el consorcio Redes y PTAPs radica con el N° 352912023 ante la CVC la solicitud de aprovechamiento forestal de quince (15) individuos arbóreos. A lo cual CVC responde el día 10 de abril con radicado N° 0740-352912023 la necesidad de que la solicitud se realice por parte de la Alcaldía de Ginebra, ya que, los predios a intervenir se encuentran como baldíos en sus certificados de tradición.

De acuerdo a la anteriormente mencionado, el consorcio remite a la alcaldía el día 20 de abril la documentación necesaria para poder realizar la solicitud de aprovechamiento forestal.

Ver anexo ambiental

5.6 SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Se cuentan con dos sitios autorizados para la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):

- Relleno Sanitario Regional Presidente, en el municipio de San Pedro, cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S, en el municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m³ para disposición final de RCD avalado por Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

Durante el mes de abril no se realiza disposición de material sobrante.

5.7 MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS

De conformidad con la nueva normatividad (Resolución 2148 de 2019) frente al nuevo código de colores para la separación de residuos en la fuente, se encuentra instalado dos (02) puntos ecológicos ubicados en el campamento de obra y en la oficina, con el fin de mantener las áreas de trabajo libre de desechos, y dar manejo apropiado de los residuos generados en las actividades diariamente desarrolladas, en las instalaciones donde se lleva a cabo la obra.



Ilustración 21 Punto ecológico obra

5.8 MANEJO DE TUBERÍA, ACERO Y OTROS MATERIALES

Se ha recibido acero y tuberías las cuales se han almacenado de manera ordenada, señalizada, cubierto y apilado en alturas que no superen los 1.5 metros, sobre caballetes elaborados con guadua. Adicionalmente el material se encuentra cubierto para la protección de la lluvia y el sol.



Ilustración 22 Cubrimiento y aislamiento de acero de refuerzo

6. ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Registro de lluvias.
2. Anexo técnico
 - Cronograma actualizado
 - Flujo económico actualizado
3. Anexo Social
 - Actas de vecindad.
4. Anexo SST
 - Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.
 - Conformación brigada de emergencia.
 - Documentos de maquinaria, equipos- camión
 - Registros de asistencia.
 - Registro de dotación.
 - Formatos de inspección.
 - Formatos pausas activas.
 - Registros ATS.
 - Registros de Capacitación.
 - Registros de inducción.
 - Incapacidad.
 - Plano planta física rutas de evacuación.
 - Registros entrega de EPP
5. Anexo Ambiental
 - Hojas de seguridad.
 - Inventario sustancias químicas.
 - Respuesta CVC permiso aprovechamiento forestal bocatomas.
6. Anexo Topográfico
 - Certificados equipos topográficos.
7. Certificado pago de aportes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA	322,38 días	mié 14/12/22	sáb 30/12/23	
	OBRA CIVIL				
1	PRELIMINARES	247,38 días	lun 6/03/23	mié 27/12/23	
	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	30 días	lun 6/03/23	mié 12/04/23	\$ 34.538.200,00
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	60 días	mié 8/03/23	jue 18/05/23	\$ 32.218.400,00
	SEÑALIZACIÓN	145 días	vie 7/07/23	mié 27/12/23	\$ 14.042.040,00
	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	30 días	jue 23/03/23	vie 28/04/23	\$ 15.665.512,00
2	BOCATOMA	80 días	mié 19/07/23	sáb 21/10/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	mié 19/07/23	mié 6/09/23	\$ 401.013.974,00
	OBRAS CIVILES	75 días	mié 26/07/23	sáb 21/10/23	\$ 878.553.660,00
3	LÍNEA DE ADUCCIÓN	16 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	10 días	lun 23/10/23	jue 2/11/23	\$ 1.209.817,00
	OBRAS CIVILES	10 días	mié 25/10/23	mar 7/11/23	\$ 27.936.936,00
	INSTALACIÓN TUBERÍA	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 405.678,00
4	DESARENADOR	57 días	lun 23/10/23	vie 29/12/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	25 días	lun 23/10/23	mar 21/11/23	\$ 700.432.354,00
	OBRAS CIVILES	48 días	vie 27/10/23	mar 26/12/23	\$ 1.384.727.553,00
	INSTALACIÓN TAPAS Y ESCALERA	3 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	\$ 47.629.012,00
	INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA	4 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	\$ 4.706.350,00
	MACROMEDIDOR	35 días	jue 9/11/23	mié 20/12/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 15.660.279,00
	OBRAS CIVILES	25 días	sáb 11/11/23	mar 12/12/23	\$ 34.505.301,00
	INSTALACIÓN TAPAS	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	\$ 1.000.000,00
	INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	\$ 73.990.367,00
5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	
	TUBERÍA	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	
	INICIO SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD PUENTE ROJO	0 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	
	MOVIMIENTOS DE TIERRA	148 días	vie 7/07/23	sáb 30/12/23	\$ 212.504.524,00
	INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA PEAD DN=450MM PN 10	108 días	vie 25/08/23	sáb 30/12/23	\$ 237.693.350,00
	ANCLAJE TUBERÍA 450MM	100 días	jue 31/08/23	mié 27/12/23	\$ 13.787.151,00
	INSTALACIÓN VALVULAS PURGAS Y VENTOSAS	70 días	jue 28/09/23	mié 20/12/23	\$ 5.048.174,00
	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10	45 días	mié 26/07/23	lun 18/09/23	\$ 18.975.000,00
	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=350MM PN 10	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	\$ 376.000.000,00
	FILTRO GRANULAR	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	\$ 95.410.270,00
	VIADUCTO LA MAGDALENA	20 días	sáb 2/12/23	mié 27/12/23	\$ 62.766.870,00
	VIADUCTO PUENTE AMARILLO	20 días	jue 28/09/23	sáb 21/10/23	\$ 67.605.989,00
	VIADUCTO PUENTE ROJO	25 días	vie 27/10/23	lun 27/11/23	\$ 95.210.857,00
	CÁMARA QUIEBRE PRESIÓN	35 días	jue 16/11/23	mié 27/12/23	\$ 64.170.744,00
	CÁMARAS PURGAS Y VENTOSAS	80 días	vie 22/09/23	mié 27/12/23	\$ 21.747.548,00
6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	27 días	vie 24/11/23	mié 27/12/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	\$ 19.497.907,00
	OBRAS CIVILES	25 días	lun 27/11/23	mié 27/12/23	\$ 52.557.067,00
7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	141,88 días	lun 5/06/23	mar 21/11/23	
	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GINEBRA	90 días	lun 5/06/23	mié 20/09/23	\$ 496.930.954,00
	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GINEBRA	70 días	jue 29/06/23	mié 20/09/23	\$ 359.706.894,00
	OFICINA OPERADOR	60 días	mar 12/09/23	mar 21/11/23	\$ 75.993.857,00
8	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	115 días	jue 29/06/23	mar 14/11/23	
	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GUACARÍ	100 días	jue 29/06/23	mié 25/10/23	\$ 1.165.935.117,00
	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GUACARÍ	60 días	lun 24/07/23	lun 2/10/23	\$ 632.087.767,00
	INTERVENCIÓN SEDIMENTADOR GUACARÍ	15 días	mié 25/10/23	mar 14/11/23	\$ 16.116.871,00
9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	264,38 días	jue 9/02/23	mié 20/12/23	
	TRÁMITE PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL	70 días	vie 3/03/23	vie 26/05/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	jue 9/02/23	mar 20/06/23	\$ 264.422.029,00
	OBRAS CIVILES	150 días	mar 20/06/23	vie 15/12/23	\$ 1.944.995.434,00
	INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=250MM	20 días	lun 27/11/23	mié 20/12/23	\$ 6.985.040,00
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ	134 días	lun 10/07/23	jue 14/12/23	
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	90 días	lun 10/07/23	lun 23/10/23	\$ 682.328.668,00
	OBRAS CIVILES	90 días	lun 14/08/23	mar 28/11/23	\$ 4.546.129.460,00
	INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=350MM	14 días	mar 28/11/23	jue 14/12/23	\$ 6.963.180,00
	TOTAL OBRA CIVIL				\$ 15.209.806.155,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	SUMINISTROS	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
1	LINEA DE ADUCCIÓN	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 5.403.000,00
2	DESARENADOR	80 días	jue 17/08/23	lun 20/11/23	
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	80 días	jue 17/08/23	lun 20/11/23	\$ 82.120.590,00
	ACCESORIOS	80 días	jue 17/08/23	lun 20/11/23	\$ 129.200.000,00
	VÁLVULAS	80 días	jue 17/08/23	lun 20/11/23	\$ 68.720.000,00
3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 9.153.126.950,00
	VÁLVULAS VENTOSAS Y PURGAS	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 146.141.813,00
	VÁLVULAS MARIPOSA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 134.829.136,00
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	LÁMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 2.235.000,00
	SUMINISTRO TUBERÍA PEAD	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 43.350.000,00
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 251.100.000,00
	CANAleta FIBRA DE VIDRIO	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 577.500.000,00
	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 363.000.000,00
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 685.100.000,00
	CANAleta FIBRA DE VIDRIO	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 997.500.000,00
	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 825.000.000,00
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 166.713.316,00
	VÁLVULA MARIPOSA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 154.166.128,00
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 294.097.473,00
	VÁLVULA MARIPOSA	170 días	mar 2/05/23	lun 20/11/23	\$ 142.971.372,00
	TOTAL SUMINISTROS				\$ 14.222.274.778,00

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Co.	Fin	Costo	Predecesoras	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23	jul '23	ago '23	sep '23	oct '23	nov '23	dic '23	ene '24
1			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA	322,38 días	mié 14/12/22	sáb 30/12/23	\$ 15.209.806.155,00															
2			ACTA DE INICIO	0 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	\$ 0,00															
3			OBRA CIVIL	322,38 días	mié 14/12/22	sáb 30/12/23	\$ 15.209.806.155,00															
4			ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	70 días	mié 14/12/22	vie 3/03/23	\$ 0,00															
5			REVISIÓN DE DISEÑOS	55 días	mié 14/12/22	mar 14/02/23	\$ 0,00															
6			ANÁLISIS SERVIDUMBRES Y PERMISOS	50 días	jue 5/01/23	vie 3/03/23	\$ 0,00 5CC+20 días															
7			PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS	15 días	lun 23/01/23	vie 3/03/23	\$ 0,00 6CC+15 días															
8		1	PRELIMINARES	247,38 días	lun 6/03/23	mié 27/12/23	\$ 96.464.152,00															
9			LOCALIZACIÓN-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	30 días	lun 6/03/23	mié 12/04/23	\$ 34.538.200,00 7FC+2 días															
10			CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2,10M-SINB	60 días	mié 8/03/23	jue 16/05/23	\$ 32.218.400,00 9CC+2 días															
11			SEÑALIZACIÓN	145 días	vie 7/07/23	mié 27/12/23	\$ 14.042.040,00 33CC															
12			CAMPAMENTO TABLA 18 M2	30 días	jue 23/03/23	vie 29/04/23	\$ 15.665.512,00 9CC+15 días															
13		2	BOCATOMA	80 días	mié 19/07/23	sáb 21/10/23	\$ 1.279.567.834,00															
14			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	mié 19/07/23	mié 6/09/23	\$ 401.013.974,00 33CC+10 días															
15			OBRAS CIVILES	75 días	mié 26/07/23	sáb 21/10/23	\$ 878.553.660,00 14CC+5 días															
16		3	LÍNEA DE ADUCCIÓN	16 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 29.552.431,00															
17			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	10 días	lun 23/10/23	jue 27/11/23	\$ 1.209.817,00 15															
18			OBRAS CIVILES	10 días	mié 25/10/23	mar 7/11/23	\$ 27.936.936,00 17CC+3 días															
19			INSTALACIÓN TUBERÍA	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 405.678,00 18CC+12 días															
20		4	DESARENADOR	67 días	lun 23/10/23	vie 29/12/23	\$ 2.262.851.216,00															
21			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	25 días	lun 23/10/23	mar 21/11/23	\$ 700.432.354,00 15															
22			OBRAS CIVILES	48 días	vie 27/10/23	mar 26/12/23	\$ 1.384.727.553,00 21CC+5 días															
23			INSTALACIÓN TAPAS Y ESCALERA	3 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	\$ 47.629.012,00 22															
24			INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA	4 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	\$ 4.706.350,00 22															
25			MACROMEDIDOR	35 días	jue 9/11/23	mié 20/12/23	\$ 125.155.947,00															
26			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 15.660.279,00 22CC+10 días															
27			OBRAS CIVILES	25 días	sáb 11/11/23	mar 12/12/23	\$ 34.505.301,00 26CC+2 días															
28			INSTALACIÓN TAPAS	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	\$ 1.000.000,00 27FC+2 días															
29			INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	\$ 73.990.367,00 28FC+2 días															
30		5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	\$ 1.370.920.477,00															
31			TUBERÍA	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	\$ 959.418.469,00															
32			INICIO SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD PUENTE ROJO	0 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	\$ 0,00															
33			MOVIMIENTOS DE TIERRA	148 días	vie 7/07/23	sáb 30/12/23	\$ 212.504.524,00 32FC+55 días															
34			INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA PEAD DN=450MM PN	108 días	vie 25/08/23	sáb 30/12/23	\$ 237.693.350,00 33CC+40 días															
35			ANCLAJES TUBERÍAS	100 días	jue 31/08/23	mié 27/12/23	\$ 13.787.151,00 34CC+5 días															
36			INSTALACIÓN VALVULAS PURGAS Y VENTOSAS	70 días	jue 28/09/23	mié 20/12/23	\$ 5.048.174,00 34CC+30 días															
37			INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10	45 días	mié 26/07/23	lun 18/09/23	\$ 18.975.000,00 33CC+15 días															
38			INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=350MM PN 10	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	\$ 376.000.000,00 33CC+1 día															
39			FILTRO GRANULAR	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	\$ 95.410.270,00 38CC															
40			VADUCTO LA MAGDALENA	20 días	sáb 2/12/23	mié 27/12/23	\$ 62.766.870,00 42FC+5 días															
41			VADUCTO PUENTE AMARILLO	20 días	jue 28/09/23	sáb 21/10/23	\$ 67.605.989,00 34CC+30 días															
42			VADUCTO PUENTE ROJO	25 días	vie 27/10/23	lun 27/11/23	\$ 95.210.857,00 41FC+5 días															
43			CÁMARAS QUIEBRE PRESIÓN	35 días	jue 16/11/23	mié 27/12/23	\$ 64.170.744,00 34CC+70 días															
44			CÁMARAS PURGAS Y VENTOSAS	80 días	vie 22/09/23	mié 27/12/23	\$ 21.747.548,00 34CC+25 días															
45		6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	27 días	vie 24/11/23	mié 27/12/23	\$ 72.054.974,00															
46			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	\$ 19.497.907,00 34FC-30 días															
47			OBRAS CIVILES	25 días	lun 27/11/23	mié 27/12/23	\$ 52.557.067,00 46CC+2 días															
48		7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	141,88 días	lun 5/06/23	mar 21/11/23	\$ 932.631.705,00															
49			INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GINEBRA	90 días	lun 5/06/23	mié 20/09/23	\$ 496.930.954,00															
50			MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GINEBRA	70 días	jue 29/06/23	mié 20/09/23	\$ 359.706.894,00 49CC+20 días															
51			OFICINA OPERADOR	60 días	mar 12/09/23	mar 21/11/23	\$ 75.993.857,00															
52		8	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	115 días	jue 29/06/23	mar 14/11/23	\$ 1.814.139.755,00															
53			INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GUACARÍ	100 días	jue 29/06/23	mié 25/10/23	\$ 1.165.935.117,00 49CC+20 días															
54			MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GUACARÍ	60 días	lun 24/07/23	lun 2/10/23	\$ 632.087.767,00 53CC+20 días															
55			INTERVENCIÓN SEDIMENTADOR GUACARÍ	15 días	mié 25/10/23	mar 14/11/23	\$ 16.116.871,00 53															
56		9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	264,38 días	jue 9/02/23	mié 20/12/23	\$ 2.216.402.503,00															
57			TRÁMITE PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL	70 días	vie 3/03/23	vie 26/05/23	\$ 0,00															
58			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	jue 9/02/23	mar 20/09/23	\$ 264.422.029,00															
59			OBRAS CIVILES	150 días	mar 20/09/23	vie 15/12/23	\$ 1.944.995.434,00 58															
60			INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=250MM	20 días	lun 27/11/23	mié 20/12/23	\$ 6.985.040,00 59FC-15 días															
61		10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ	134 días	lun 10/07/23	jue 14/12/23	\$ 5.235.421.308,00															
62			LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	90 días	lun 10/07/23	lun 23/10/23	\$ 682.328.668,00															
63			OBRAS CIVILES	90 días	lun 14/08/23	mar 28/11/23	\$ 4.546.129.460,00 62CC+30 días															
64			INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=350MM	14 días	mar 28/11/23	jue 14/12/23	\$ 6.963.180,00 63															

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA


El día 17 de abril del 2023, se llevará a cabo la inscripción voluntaria para elegir los Brigadistas de Emergencia del consorcio REDES Y PTAPS VALLE

A continuación se describe el perfil que deben tener los aspirantes

- Ser voluntarios
- Representar áreas y turnos.
- Tener permanencia dentro de la empresa
- Estar en adecuado estado físico y mental.
- Conocer la empresa y sus procesos
- Disciplina, responsabilidad y compromiso con la empresa.
- Personas dinámicas, serenas y fuertes
- Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.
- Buena conducta como trabajador
- Buenas relaciones personales
- Disposición para trabajar en equipo
- Disposición y voluntad para trabajar en este tipo de actividad.
- Disposición para jornadas de formación y entrenamiento

Contamos con su activa participación.

Cordialmente,


Flor María Martínez
Profesional SST

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

PERSONAL VOLUNTARIO PARA CONFORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

No	Apellidos y Nombres	Cédula	Cargo	Firma
1	John Jairo Cuervo Olave	1.113.662.993	Inspector del Bosque	[Firma]
2	Gina L. Lopez Paredes	1.144.140.957	Residente hidro	Gina L. Lopez P.
3	Lina Marcela Buitrago	42.136.662	Coordin. Proyec	[Firma]
4	Dario Enrique Florez	1026277223	Residente civil	[Firma]
5	Damiro Becerra	14.651.124	Ayudante	Ramiro Becerra
6	Alexander Cardona	14.651.320	Ayudante	[Firma]
7	Luis Andres Medina	14.652.	Oficial	[Firma]
8	Jairo Ruiz	16.858.230	Cadenero	Jairo Ruiz
9	Manuela Martinez	38856496	T-sold	[Firma]
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Firma Florencia Yantun
Responsable

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE





ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

El día 27 de abril del 2023, en las instalaciones de la PTAP DE GINEBRA, Se hizo la invitación a los voluntarios inscritos para la elección y conformación de la brigada de emergencias.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Socialización del plan de emergencias
2. Funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de los integrantes
3. Elección de los cargos
4. Firmar aceptación de cargos

La Brigada de Emergencias, queda conformada de la siguiente manera:

No	Apellidos y Nombres	Cédula	Cargo	Firma
1	Dario Florez. comite emergencia	102.627221	Coor- comite emergencia	
2	John J. Curo	1113662973	Coor- Evacuacion	
3	Ramiro Bedoya	14.65184	Coor- primeros auxilios	Ramiro Bedoya
4	Luis Andre Medina	14652802	Coor- control de incendios	
5	Naria Fda Martinez	38856456	Brigadista	
6	Jairo Ruiz	16858290	Brigadista	
7	Gina Leidy Lopez	1114140.957	Coor- comite emergencias	Gina Lopez
8	Alexander Cardona	14.651.320	Brigadista	
9	Guillermo Ortiz		Brigadista	
10	Ysabel Fdez	38856456	T-social	
11				
12				

Carlos Andrés Leyva
Representante legal


Flor Maria Martinez
Coordinador SST



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028513893

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZNN969	FOTON	BJ1065VDJDA-F1	2023
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.771	BLANCO	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	2680
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
N007267	N	LVBV3JBB9PY005505	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBV3JBB9PY005505	N	LVBV3JBB9PY005505	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
BANCO DAVIVIENDA SA	NIT 860034313		

DESTRUCCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
110

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA IMPORT.
22/09/2022

PUERTAS
2

352022000445728

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
24/02/2023

FECHA EXP. LIC. TTD.
24/02/2023

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE EL CERRITO



LT03005705501

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO | MES | DÍA
2023 | 02 | 23

VIGENCIA

DESDE
LAS 09
HORAS
DEL
AÑO | MES | DÍA
2023 | 02 | 24

HASTA
LAS 23:59
HORAS
DEL

AÑO | MES | DÍA
2024 | 02 | 23



No. DE PÓLIZA

32548704

PLACA No.

ZNN969

CLASE DE VEHÍCULO

CAMION

SERVICIO

PUBLICO INTERMUNICIPAL

CILINDRAJE/VATIOS

2771

PASAJEROS

MARCA

FOTON

3

LÍNEA
VEHÍCULO

BJ1065VDJDAF1

CARROCERÍA

No. MOTOR

N007267

No. CHASIS ó No. SERIE

LVBV3JBB9PY005505

No. VIN

LVBV3JBB9PY005505

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TELÉFONO DEL TOMADOR

TIPO DE DOCUMENTO
DEL TOMADOR

NIT

No. DE DOCUMENTO
DEL TOMADOR

8600343137

CÓDIGO DE ASEGURADORA

AT1318

CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA

3681

CLAVE PRODUCTOR

4999

No. FORMULARIO

TARIFA

310

PRIMA SOAT

\$ 537,000

CONTRIBUCIÓN FOSYGA

\$ 279,200

TASA RUNT

\$ 2,100

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS,
FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

HASTA

263
701

B. GASTOS DE TRANSPORTE
Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

8,7

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

HASTA
180

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

750

TOTAL A PAGAR \$ 818,300

Andrés G. G. G.

FIRMA AUTORIZADA

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).



Pásalo de la guantera a tu celular



sura

CONSORCIO REDES Y PTAPN VALE			FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA																	Página No. Fecha Elaboración Tamaño	
OBRAS: <u>PTAPN GINERA - CARADI</u>			SE DEBE MARCAR: ☒ Asiste ☐ No Asiste ☐ Incapacidad																		
SEMANAS: <u>17 al 29 Abril del 2013</u>			CONVENCIONES: ☒ Turno Normal ☐ Horas Extras																		
N°	N. Cedula	NOMBRES	APELLIDOS	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	OTROS	OTROS		
1	1076277227	Rodrigo E	Florez	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
2	1113662973	John Janel	Cueyo	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
3	31.644927	Flor Maria	Martinez	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
4	1144140957	Gina L	Lopez	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
5	1143882425	John E	Diaz	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
6	14.652.802	Luis Andre	Medina	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					
7	14.652.320	Alexander	Cardona	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X					
8	14.651.124	Bamiro	Rebolon	X	X	X	-	X	X		X	X	X	X	X	X					
9	38.856.496	Maribel F.	Martinez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	X	X					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
OBSERVACIONES:																					
ELABORÓ NOMBRE: <u>Flores Yaniel Martinez</u> FIRMA: CARGO: <u>Prof SST</u>				APROBÓ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ CARGO: <u>Presidente de</u>																	

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALE

Petro - Valgueta

FORMATO
CONTROL DE ASISTENCIA

Fecha: 15/04/2023
Hora: 10:00 AM
Página: 1

OBRA: PIAPS GINECA Y QUACARI

SE DEBE MARCAR: ☒ Asistió ☐ No Asistió ☐ Inapropiada

SEMANAS: 17 al 22 de Abril 2023

CONVENCIONES: ☒ Turno Normal ☐ Horas Extras

Nº	Nº CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	Nº	T	I	Car
1	94.468.927	Alexander	Gonzalez	X	X	X															
2	14.650.512	Luis Hro	Velosquez		X	X															
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:

Hro. Javier Mestura
Prof. SST

APROBÓ
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:

Residente obra

INGENIERIA Y Soluciones Cálculas 60618239.

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA		Fecha: 05/05/2023 Página: 01
----------------------------------	--	---------------------------------

OBRA: Instalación tubería Alcantarillado - Ginebra - Guayaquil	☒ Asiste ☐ No Asiste ☐ Incapacidad
SEMANAS: Del 17 al 29 de Abril - 2023	CONVENCIONES: ☒ Turno Normal ☐ Horas Extras

N°	N° CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	N° FD	T HE	T HE
				N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E			
1	94.427.406	Rubens	Benitez	/	X	X	X	X	-											
2	94.302.942	Guillermo	Alvarez	/	X	X	X	X	-											
3	1113.514.103	Thorn	caicedo	/	X	X	X	X	-											
4	1114.393.8113	Haricel	caicedo	/	X	X	X	X	-											
5	1118295266	Thorn	cedeno	/	X	X	X	X	-											
6	1143.953.941	Luis Miguel	Estenilla	/	X	X	X	X	-											
7	1144046196	Lady	Mosquera	/	X	X	X	X	-											
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				

OBSERVACIONES: Personal de Instalación trabajo hasta 21 Abril - 2023
 Se instala tubería el 19 de Abril - Quedan actividades
 suspendidas por huelga de comunidad puente Rojo.

ELABORÓ: NOMBRE: Flor Dan Martinez	APROBÓ: NOMBRE: Gina J. Lopez Paredes
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>
CARGO: PROP SST	CARGO: Residente abm

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

SUBCOORDINADISTA ARBOL 2023 - TOPOGRAFIA

FORMATO
CONTROL DE ASISTENCIA

Fecha: 14/04/2023
Versión: 01

OBRA: PTAPS GINEBRA - GUACARÍ SE DEBE MARCAR ☒ Asistió ☐ No Asistió ☐ Incapacidad
SEMANAS: 03 al 15 Abril/2023 CONVENCIONES: ☒ Turno Normal ☐ Horas Extras

N°	N° CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	N°	T	T
1	12.965.254	Guillermo	Ortiz	X	X	X	-	-	X		X	X	X	X	X	X				
2	16.858.250	Jairo	RUIZ	-							-	X	X	X	X	X				
3																				
4		Del 17 al 29 de Abril/2023																		
5																				
6	12.965.254	Guillermo	Ortiz	X	X	X	X	X	-		X	X	X	X	-	-				
7	16.858.250	Jairo	RUIZ	X	X	X	X	X	-		X	X	X	X	X	X				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				

OBSERVACIONES:

ELABORÓ
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:

Jb. Jairo, Portales
Prof. SST

APROBO
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:

Presidente del

FORMATO
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SG-SST

Fecha: Febrero/23/2023

Version: 01

OBRA: PTAPS - GINERPA - GUAKARI

SEMANAS: 03 al 15 Abril - 2023

SE DEBE MARCAR: ☒ Asistió ☐ No Asistió ☐ Incapacidad

CONVENCIONES: ☒ Turno Normal ☐ Horas Extras

				CONVENCIONES:												N		Turno Normal		E		Horas Extras													
N°	N° CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	L		M		Mi		J		V		S		D		L		M		Mi		J		V		S		D		N° Dop	T FD	T HE	Vale
				N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E				
1	1026.277.221	Daniotnrique	Florez +	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
2	1.113.662973	John Janer	cuero	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
3	31.644.927	Floir Yornia	Martinez	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
4	1.144140.957	Gina Leidy	Lopez	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
5	42.136.662	Lina Marcela	Buritica	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
6	1143.852.425	John E	Diaz	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
7	38.856.496	Ma Fernanda	Martinez	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
8	14.652.802	Luis Ande	Medina	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
9	14.652.320	Alexander	Cardona	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
10	14.651.124	Ramiro	Bedoya	X		X		X		-		-		X				X		X		X		X		X		X							
11																		X		X		X		X		X		X							
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

Floir Yornia Martinez

POOF SST

APROBÓ

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

Daniot Enrique Flore

Eng. Asistente

CONSORCIO REDES Y ETAPS VALLE		FORMATO INSPECCION DIARIA DE RETRO- EXCAVADORA CON LLANTAS		Código: SG SST											
				Fecha: Febrero/2023											
				Versión: 01											
SEMANA: 19. Febrero 2023		MARCA: CAT													
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación línea		MODELO: 2019													
de conducción tubería		LINEA: 420F2													
Tramo 3 INSPECCION PRE- OPERACIONAL:															
Item	Descripción	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado de luces de trabajo (delanteras - traseras)					✓									
2	Conexiones de la batería y los niveles de fluido					✓									
3	Nivel de Aceite del Motor					✓									
4	Nivel de combustible					✓									
6	Nivel de hidráulico					✓									
7	Nivel de refrigerante					✓									
8	Estado de los comandos					✓									
9	Relojes de temperatura					✓									
10	Estado de mando de bloqueo de avance					✓									
11	Estado de la estructura de la máquina					✓									
12	Estado del cinturón de seguridad					✓									
13	Estado del asiento del operador - giro					✓									
14	Estados de los neumaticos delanteros					✓									
16	Estado de los neumaticos traseros					✓									
16	Verificar pernos rolos en las llantas					✓									
17	Estado de las mangueras					✓									
18	Estado de los cilindros					✓									
19	Patás estabilizadoras					✓									
20	Articulacion Pala de carga					✓									
21	Articulacion cucharón					✓									
22	Estado del exhosto (tubo de escape humos)					✓									
23	Alarma de reversa o emergencia y Pito					✓									
24	Escaleras y apoyos de acceso					✓									
25	Estado de los frenos					✓									
26	Estado de las mangueras					✓									
27	Estado de las correas					✓									
28	Verificar fugas del motor					✓									
29	Verificar fugas hidráulicas					✓									
30	Extintor de 10Lbs.					✓									
31	Botiquín de primeros auxilios					✓									
FIRMA OPERADOR: GUILLERMO ALVAREZ															
FIRMA INSPECTOR SST: Flor Yessy Yantiz															
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
Fecha	Hallazgo	Acción preventiva-correctiva				Responsable				Fecha					

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALE

INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

CODIGO: SG-SST

Fecha: Abril/2023

VERSIÓN: 01

FECHA DE INSPECCIÓN:

26 Abril 2023

AREA

PIAP - GNE 22A

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

Florencia Martinez

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)					✓									
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓									
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA					✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓									
ESTADO DEL DISCO					✓									

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)					✓									
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓									
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓									
ESTADO DE LAS BROCAS					✓									

OBSERVACIONES

Florencia Martinez

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN

Ramiro Bedoya

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?			
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.			
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.			
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?			
☒ Si, proceda con la tarea.			
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.			
EQUIPO QUE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL ATS			
Nombre completo de los trabajadores (Ejecutor)	Cédula	Cargo	Firma
Ramiro Bedoya	14 651 124	Ayudante	Ramiro Bedoya
Nombre y Cédula de la persona (Emisor)-(supervisor)	Cédula	Cargo	Firma
John Jover Cuero	1113 662 923	Ins- Ob. 4.	[Firma]
Flos Juan Martinez	31 644 923	Ins- SST	Flos Juan Martinez
OBSERVACIONES			

Nombre y Cédula de la persona (Emisor) (supervisor)	Cédula	Cargo	Firma
Carro Lope2	1144-140957	Ing Residente Carro Lopez	
Flex Quin Afor tuoe	316114127	Prof 357	Flex Quin Afor tuoe
OBSERVACIONES			

CONSORCIO REDEN Y PYAPM VALEP		FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			Código: SG-807 Fecha: Marzo 2023 Version: 01
Proyecto: CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA-GUACARI				Ubicación donde se realiza el trabajo: Tramo 3	
Fecha: 14-Abril-2023		Hora de Inicio: 7:00pm		Hora de Finalización: 7:00pm	
Incluye tareas de Alto Riesgo? Requiere permiso de trabajo: SI		NO		Responsable del área: Ruben Benitez	
Descripción de la tarea a realizar: Excavacion linea de conduccion tuberia					
14" Tramo 3.					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		TAREAS DE ALTO RIESGO	
Manuales	pala	Casco con barbujero	✓	Trabajo en Alturas	N/A
Eléctricas	planta	Botas de seguridad	✓	Espacios confinados	N/A
Neumáticas		Guantes vaqueta-camaza	✓	Energías peligrosas	N/A
Hidráulicas	Maquina	Monogafa	✓	Excavaciones	1.30m
Mecánicas	Maquina Retro-	Protector respiratorio	—	Sustancias peligrosas	N/A
Otras	excavadora	Protector auditivo	✓	Izaje de carga	N/A
PASOS Y ANALISIS DE LA TAREA					
TAREAS/ACTIVIDADES (Secuencia ordenada de pasos)	DESCRIPCION PELIGROS (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES PROPUESTOS	CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS	
1 Inspeccion Retro excavadora	R. Locativo S. terreno con desnivel	Tropiezos caídas Golpes	EPP-Botas casco, Guantes.	Autocuidado en desplazamientos.	
2 Inspeccion de Area	R. Locativo S. Terreno con desniveles	Tropiezos Caídas Golpes	EPP-Botas de seguridad	Delimitar Áreas de intervención y Serializar	
3 Excavacion	R. Físicos S. Radiación solar	deshidratación (Quemaduras)	Protector Solar-Mangas	Punto de hidratación	
	R. Físico S. Ruido Maquinaria	Dolor de cabeza	Proteccion Auditiva de copra		
	R. Físico S. Vibraciones Maquina	Dolor - hormigueo miembros inferiores	Control tiempo de exposicion		
	R. Químicos S. Material Particulado	Inhalacion de polvos - Gases.	Mascarilla Industrial		
	R. Biomecánicos S. Posturas Prolongadas	Lumbalgias	Pauses Activas	Posturas Adecuadas -	
	R. Mecánicos S. Atrapamientos - Tránsito de personas.	Atropellos - Golpes	EPP - chalecos reflectivos	Auxiliares de tránsito Control peatones.	
EVALUACIÓN DEL RIESGO					
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?					
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.					
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.					
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?					
☒ Si, proceda con la tarea.					
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.					
EQUIPO QUE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL ATS					
Nombre completo de los trabajadores (Ejecutor)		Cédula	Cargo	Firma	
Guillermo Alvarez		94.302.945	operador Maquina	Guillermo Alvarez	

Nombre y Cédula de la persona (Emisor)-(supervisor)	Cédula	Cargo	Firma
Gina J. Lopez	1.144.1409157	Ing-Residente	Gina J. Lopez
Elmer Yu Martinez	31644927	prof-SSR	Elmer Yu Martinez
OBSERVACIONES			

CONSORCIO REDES Y PTAPs VALLE	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO		Código SG- SST
			Fecha: Febrero/2023
			Versión: 01

TEMA: Socialization plan de Emergencias - confirmacion Brigada
 DIRIGIDO POR: Flor Nave Nave
 CIUDAD: PTAP. Guabaria
 FECHA: 27- Abril- 2023
 HORA INICIO: 1:00 pm HORA FINAL: 3: pm

No	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ÁREA	FIRMA
1	John Jairo Guero Ojeda	1.13 662 975	INS- obra	[Firma]
2	Guillermo J. Ortiz V.	12.965.254	Topografía	[Firma]
3	Alexander Cárdenas	14.651.320	Arquitectura	[Firma]
4	Luis andré medina	14.652.802	Oficial	[Firma]
5	Fernando Ruiz CH	16.858.250	Topografía	[Firma]
6	María Fernanda M.	38.856.456	T. Sección	[Firma]
7	Ramiro bedoya	14.651.124	ayudante	Ramiro B. B. B. B. B.
8	Dario Enrique Flores	10.262.772.71	Ing. Residente Civil	[Firma]
9	Paula Tatiana Rojas	38.878.679	Ing. Residente Interu.	[Firma]
10	Gina L. Lopez Paredes	11.441.409.57	Ing. residente hidraul.	[Firma]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

OBSERVACIONES Y/O CONTENIDO: Plan de emergencias - confirmacion Brigada, PONS, Puntas evacuacion, punto de encuentro, ubicacion elementos de emergencias, Alarma. de evacuacion - consolidado Riesgo.	FIRMA DEL FACILITADOR: Flor Nave Nave
	APROBADO:

CONSORCIO REDES Y PTAPN VALE	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO		Versión No. 1
			Fecha: Febrero/2023
			Página: _ de _

TEMA: <u>Riesgo Biomecánico - Mecánico</u>			
DIRIGIDO POR: <u>Flo. Yana Marlin</u>		FECHA: <u>12. Abril 2023</u>	
CIUDAD: <u>PTAP Ginebra</u>		HORA INICIO: <u>7:00 am</u>	HORA FINAL: <u>1:30 pm</u>

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	AREA	TIEMPO
1	Alexander Caidona	14.651.320	Ayudante	<i>[Signature]</i>
2	Luis Andre Medina	14.652.802	Oficial	<i>[Signature]</i>
3	Guillermo Ortiz	12.965.254	Topografo	<i>[Signature]</i>
4	Thon Janer Cuero	1113.662.973	Inspector obra	<i>[Signature]</i>
5	Jairo Ruiz	16.858.250	Cadenero X	<i>[Signature]</i>
6	Ramiro Bedoya	14.652.802	Ayudante	Ramiro Bedoya
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

OBSERVACIONES Y/O CONTENIDO: <u>Se realiza charla de seguridad en Riesgo Biomecánico - Mecánico.</u>	FIRMA DEL FACILITADOR: <u>Flo. Yana Marlin</u>
	APROBADO:

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO	Código: SG- SST
		Fecha: Febrero 2023
		Versión: 01

TEMA: <u>Ambiente Laboral</u>	FECHA: <u>27 abril / 2023</u>
DIRIGIDO POR: <u>maria fernanda martinez</u>	HORA INICIO: .
CIUDAD: <u>Cinebra</u>	HORA FINAL:

No	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ÁREA	FIRMA
1	John Juan Curo Olave	1.113.662.973	Inspector obra	[Firma]
2	Gustavo Ortiz D.	12.965.254	Topógrafo	[Firma]
3	Alexander Carlos Ortiz	14.651.320	Asistente	[Firma]
4	Luis Andres Medina	14.682.802	Oficial	[Firma]
5	Zeina Ruiz CH	16.858.250	TOPOGRAFIA	[Firma]
6	Edy R. R. R.	38.806.496	IT Social	[Firma]
7	Ramiro Bedoya	14.651.124	Asistente	[Firma]
8	Gerardo R. R.	31.644.922	prof. SST	[Firma]
9	Gina L. Lopez Paredes	11.441.40.957	Ing. Residente hidraul.	[Firma]
10	Dario Enrique Florez	20.627.7221	Ing. Residente civil	[Firma]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

OBSERVACIONES Y/O CONTENIDO: <u>Se realiza charla sobre Ambiente Laboral a los/as miembros del consorcio con el fin de fortalecer trabajo en equipo y se definen estrategias y permisos mejor el ambiente laboral</u>	FIRMA DEL FACILITADOR: <u>[Firma]</u> APROBADO:
---	--

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO		Código SG- SST
			Fecha Febrero/2023
			Versión 01

TEMA: Inducción en SST
 DIRIGIDO POR: Flor María Martínez FECHA: 11-04-2023
 CIUDAD: PTAP- Ginebra HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 9:00 AM

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ÁREA	FIRMA
1	Damián Bedoya	14.651.124	Ayudante	Damián Bedoya
2	Jairo Ruiz	16.858.280	Cadenero	Jairo Ruiz
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

OBSERVACIONES Y/O CONTENIDO: <u>se socializan políti-</u> <u>cos en SST- no drogas, alcohol y Taba-</u> <u>quismo, reglamento de HYS, Reglamento</u> <u>interno de trabajo, Clasificación de residuos</u> <u>Sólidos. Definiciones en SST- AT- EL</u>	FIRMA DEL FACILITADOR: <u>Flor María Martínez</u>
	APROBADO:

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALE	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO	Código SG-SST
		Fecha: Febrero/2023
		Versión 01

TEMA: Inducción en SST
 DIRIGIDO POR: Fla. María Martínez FECHA: 18 Abril 2023
 CIUDAD: Cinebra - Valle HORA INICIO: 7:00 PM HORA FINAL: 9:00 AM

No	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ÁREA	FIRMA
1	<u>José Miguel Gálvez</u>	<u>1143053941</u>	<u>Tuberia</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Maicol A. Calcedo</u>	<u>1143938113</u>	<u>Tuberia</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Juan Cedeño Meneses</u>	<u>1118295266</u>	<u>Conductor</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Juan Carlos Calcedo</u>	<u>1113514103</u>	<u>Tuberia</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Guillermo Alvarez</u>	<u>94302945</u>	<u>TUBERIA</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Rubén Bantón V.</u>	<u>94487406</u>	<u>Tuberia</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Lady M</u>	<u>1144046196</u>	<u>SST</u>	<u>[Firma]</u>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

OBSERVACIONES Y/O CONTENIDO: <u>Se socializan folletos en SST- consumo de alcohol, drogas y tabaco, Reglamento de H y S- plan de emergencia- punto encuentro, Ruta evacuación, conceptos en SST- Plan residuos sólidos.</u>	FIRMA DEL FACILITADOR: <u>[Firma]</u> APROBADO:
---	---

		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: H - H.V - 148	
		HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Fecha	Revisión
				28/08/2021	1

NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOFUSION	MARCA	BUTTS FUSION MACHINE	
REF DEL EQUIPO	18051102	MODELO	SHDS160	
PROVEEDOR	China	FECHA DE COMPRA	may-18	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	ALMACEN - REGISTRO DE SALUD DEL EQUIPO SI VA PARA OBRA	RESPONSABLE	Almacenista	

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	
Modelo	SHDS160
Tamaño de tubería (mm)	50 85 75 90 110 125 140 160
Placa de calentamiento máx. Temp	270 grados
Desviación de temperatura en la superficie (170-250degrees)	± 10 grados
Tensión de trabajo	220V, 60Hz
Alimentación de la placa de calentamiento	1.0 KW
Potencia del motor de la herramienta de cepillado	0.1 KW
Potencia total	1.7 KW
Peso	57kg
Dimensión de embalaje	680* 520* 510 500* 470* 620

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	
1 adecuado para soldar tubos de plástico y / o accesorios de PE, PP, y PVDF se puede operar en cualquier condición de trabajo complejo. 2 consta de bastidor básico, herramienta de planeo, placa calefactora y soporte para herramienta de planeo y placa calefactora 3 placa de calentamiento extraíble recubierta de PTFE con control de temperatura independiente sistema 4 herramienta de planeo eléctrica 5 estar hecho de material ligero y de alta resistencia; estructura simple, pequeño y delicado, fácil de usar	

MANTENIMIENTO				
FECHA	DICIEMBRE 16 2021	REALIZADA POR		OPERARIO DIEGO CAICEDO
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
REVISION DE NIVEL ACEITE	X			
REVISION DE TEMPERATURA DE LA PLANCHAS	X			
OTRO				





REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO				
FECHA		REALIZADA POR		
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
OTRO				

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO				
FECHA	14/03/2023	REALIZADA POR		
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
Hto. Provento	X			
OTRO				

REVISADO POR	Julio H.	NOTIFICADO A	REPARADO POR
Sst			
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>

		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: H - H.V - 148			
		HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS				Fecha	Revisión
						28/08/2021	1
NOMBRE DEL EQUIPO	MINI RETROEXCAVADORA	MARCA	JCB				
REF DEL EQUIPO	JCB1CXWSP02451354	MODELO	2015				
PROVEEDOR	CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES	FECHA DE COMPRA	26/07/2019				
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBRA PTAR YUMBO	RESPONSABLE	OPERADOR MAQUINARIA				
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO							
							
DESCRIPCION DEL EQUIPO							
La retro permanente de la 1CX abre un nuevo mundo de productividad y versatilidad a este diseño de minicargador compacto y maniobrable. La propia retro está totalmente integrada en la máquina, manteniendo las dimensiones reducidas, además de poder retraerse para el transporte o desplazamientos en el lugar de trabajo							
MANTENIMIENTO							
FECHA	14/15 FEBRERO 2022		REALIZADA POR				
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES			
CAMBIO DE FILTROS	X						
PASADOR	X						
MTO ROMPA TRANSFERENCIA	X						
REPARACION PITO		X					
GALON DE HIDRAULICO	X						
OTRO							
REVISADO POR			NOTIFICADO A				
FIRMA			FIRMA				
MANTENIMIENTO							
FECHA	22/05/2022		REALIZADA POR				
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES			
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	X						
REPARACION PITO	X						
CAMBIO ESCOBILLAS	X						
OTRO							
REVISADO POR			NOTIFICADO A				
FIRMA			FIRMA				
REPARADO POR							
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ							
CERON							
FIRMA							

MANTENIMIENTO				
FECHA	6/06/2022		REALIZADA POR	
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
CAMBIO DE MANGUERA	X			
OTRO				

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO				
FECHA	22/07/2022		REALIZADA POR	
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	X			HOROMETRO 52940
Feb 10 2023 H2O PREVENTIVO	X			Impicta, ajuste
OTRO				

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
FIRMA	FIRMA	FIRMA

		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: H - H.V - 148			
		HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				Fecha	Revisión
						25/08/2021	1
NOMBRE DEL EQUIPO	PETRO EXCAVADORA (PAGARITA)	MARCA	CAT				
REF DEL EQUIPO	EJ401857	MODELO	CATERPILLAR 426 F3				
PROVEEDOR	GECOLSA CAT	FECHA DE COMPRA	23/09/2019				
UBICACIÓN DEL EQUIPO	PLANTA ISCSAS 20/05/2022	RESPONSABLE	ING RESIDENTE- SUPERVISOR DE OBRA - OPERADOR DE LA MAQUINARIA				
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO							
Potencia neta 65 kW Peso en orden de trabajo nominal 7990 kg Peso en orden de trabajo máximo 8760 kg							
DESCRIPCION DEL EQUIPO							
El 426F2 posee una estación del operador de primera categoría con un asiento con suspensión neumática, espacio adicional para las piernas y mayor visibilidad. Los controles ergonómicos de la palanca universal permiten un funcionamiento uniforme y menos esfuerzo para el operador.							
MANTENIMIENTO							
FECHA	14/07/2022	REALIZADA POR					
ELEMENTO	Buena	Regular	Mala	OBSERVACIONES			
REPARACION FUGA ASERVO	X						
OTRO							
REVISADO POR	NOTIFICADO A		REPARADO POR				
FIRMA	FIRMA		FIRMA				
MANTENIMIENTO							
FECHA		REALIZADA POR					
ELEMENTO	Buena	Regular	Mala	OBSERVACIONES			
OTRO							
REVISADO POR	NOTIFICADO A		REPARADO POR				
FIRMA	FIRMA		FIRMA				

MANTENIMIENTO				
FECHA			REALIZADA POR	
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES
REVISADO POR	NOTIFICADO A		REPARADO POR	
FIRMA	FIRMA		FIRMA	

 INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: H - H.V - 148			
		HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS				Fecha	Revisión
						28/08/2021	1
NOMBRE DEL EQUIPO	ORUGA	MARCA	HITACHI ZX135US				
REF DEL EQUIPO	HCM1R400C00086122	MODELO	2011				
PROVEEDOR	PARTEQUIPOS	FECHA DE COMPRA	2/09/2022				
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBRA JARAMILLO MORA - 13/02/2023 PASARA A OBRA COUNTRY 14/02/2022	RESPONSABLE	ING RESIDENTE- SUPERVISOR DE OBRA - OPERADOR DE LA MAQUINARIA (GUILLERMO ALVAREZ CORNELIO)				



ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Gama: intermedia, Tracción: con orugas, Tipo de motor: Tier 2, Aplicaciones: para obra de construcción, Otra característica: de radio corto, Capacidad de la pala :Max.: 590 l (155,9 gal) , Min.: 450 l (118,9 gal), Pes, o en orden de marcha, Máx.: 14.800 kg (32.628,4 lb), Min.: 14.000 kg (30.864,7 lb), Potencia del motor 69 kW (93,81 hp), Velocidad de desplazamiento: 3,3 km/h, 5,5 km/h (2,1 mph), Capacidad del depósito: Máx.: 220 l (58,1 gal) Min.: 0 l (0 gal), Profundidad de excavación 4.980 mm, 5.070 mm, 5.490 mm (196,063 in)

DESCRIPCION DEL EQUIPO

La nueva ZAXIS ofrece soluciones fiables: un impresionante ahorro de combustible, rápidos movimientos frontales y un fácil manejo. La nueva ZAXIS cuenta con las ventajas clave de la alta calidad, el bajo consumo de combustible y la alta durabilidad, todo lo cual sirve para garantizar unos bajos costes de funcionamiento. La nueva ZAXIS, que cuenta con una evolución integral, hará realidad las visiones y los sueños de los clientes, y será pionera en su colorido futuro.

- Conseguir un bajo consumo de combustible y una gran carga de trabajo
- Funcionamiento potente
- Accesorios fáciles de usar

Red interior a prueba de polvo



- Puntos de inspección remotos agrupados
- Depósito de combustible de gran capacidad
- Bajos costes del ciclo de vida

- Nuevo motor más fiable y duradero
- Diseño duradero

Mejora del rendimiento de arranque del motor en tiempo frío


MANTENIMIENTO

FECHA	27/09/2022	REALIZADA POR			PARTEQUIPOS
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES	
INSTALACION DE TORNILLOS DE SOPORTE DE RENDIDA DEL VENILADOR	X			PENDIENTE INSTALAR CHAPA DEL TARRO DEL VENTILADOR	
REPARACION DE VASTIDORES	X				
REVISION DE CABLEADO	X				
INSTALACION GPRS	X				
OTRO				28/09/2022	

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
		
FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO

FECHA	5/01/2023	REALIZADA POR			REYNEL VILLALOBOS
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES	
CAMBIO DE ACEITE	X			CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PENDIENTE	
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	X				
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	X				
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	X				
OTRO					

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
		
FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO					
FECHA			REALIZADA POR		REYNEL VILLALOBOS
ELEMENTO	Bueno	Regular	Malo	OBSERVACIONES	
OTRO					

REVISADO POR	NOTIFICADO A	REPARADO POR
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	FORMATO	Version No. 1
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha Febrero/2023
		Página 1 de 1

CÉDULA: 14.652.802
 NOMBRE: Luis Andre Medina Garzon
 CARGO: oficial

ELEMENTOS DE DOTACION	ENTREGA			DEVOLUCIÓN					FIRMA
	CANT	B	FECHA	CANT	B	R	M	FECHA	
Casco amarillo	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Barbujero 4p	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Gafa seguridad clara	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	15-03-23	1			✓	15-03-23	<i>[Signature]</i>
Guantes Coraza	1	✓	17-03-23						<i>[Signature]</i>
Mascarilla Industrial	2	✓	21-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	04-04-23				✓	04-04-23	<i>[Signature]</i>
Guantes Tipo Ing.	1	✓	14-04-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta	1	✓	19-04-23					19-04-23	<i>[Signature]</i>
Mascarilla Industrial	2	✓	25-04-23						<i>[Signature]</i>

ELABORÓ NOMBRE: FIRMA: <u>[Signature]</u> CARGO: <u>Prof 357</u>	APROBÓ NOMBRE: FIRMA: _____ CARGO: _____
---	---

CONSORCIO REDES Y PTAP'S VALE	FORMATO	Version No. 1
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION	Fecha Febrero/2023
	PERSONAL	Página 1 de 1

CÉDULA: 14.651.320

NOMBRE: Alexander Cardona Camacho

CARGO: Ayudante construccion

ELEMENTOS DE DOTACION	ENTREGA			DEVOLUCIÓN					FIRMA
	CANT	B	FECHA	CANT	B	R	M	FECHA	
Casco Amarillo	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Barbuqueo 4 p	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Gafa de seguridad clara	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	07-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	08-03-23	1			✓	08-03-23	<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta par	1	✓	17-03-23	1			✓	17-03-23	<i>[Signature]</i>
Guantes Corriente par	1	✓	17-03-23						<i>[Signature]</i>
Mascarilla Industrial	2	✓	21-03-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Tipo 2hg.	1	✓	14-04-23						<i>[Signature]</i>
Guantes Vaqueta	1	✓	19-04-23	1			✓	19-04-23	<i>[Signature]</i>

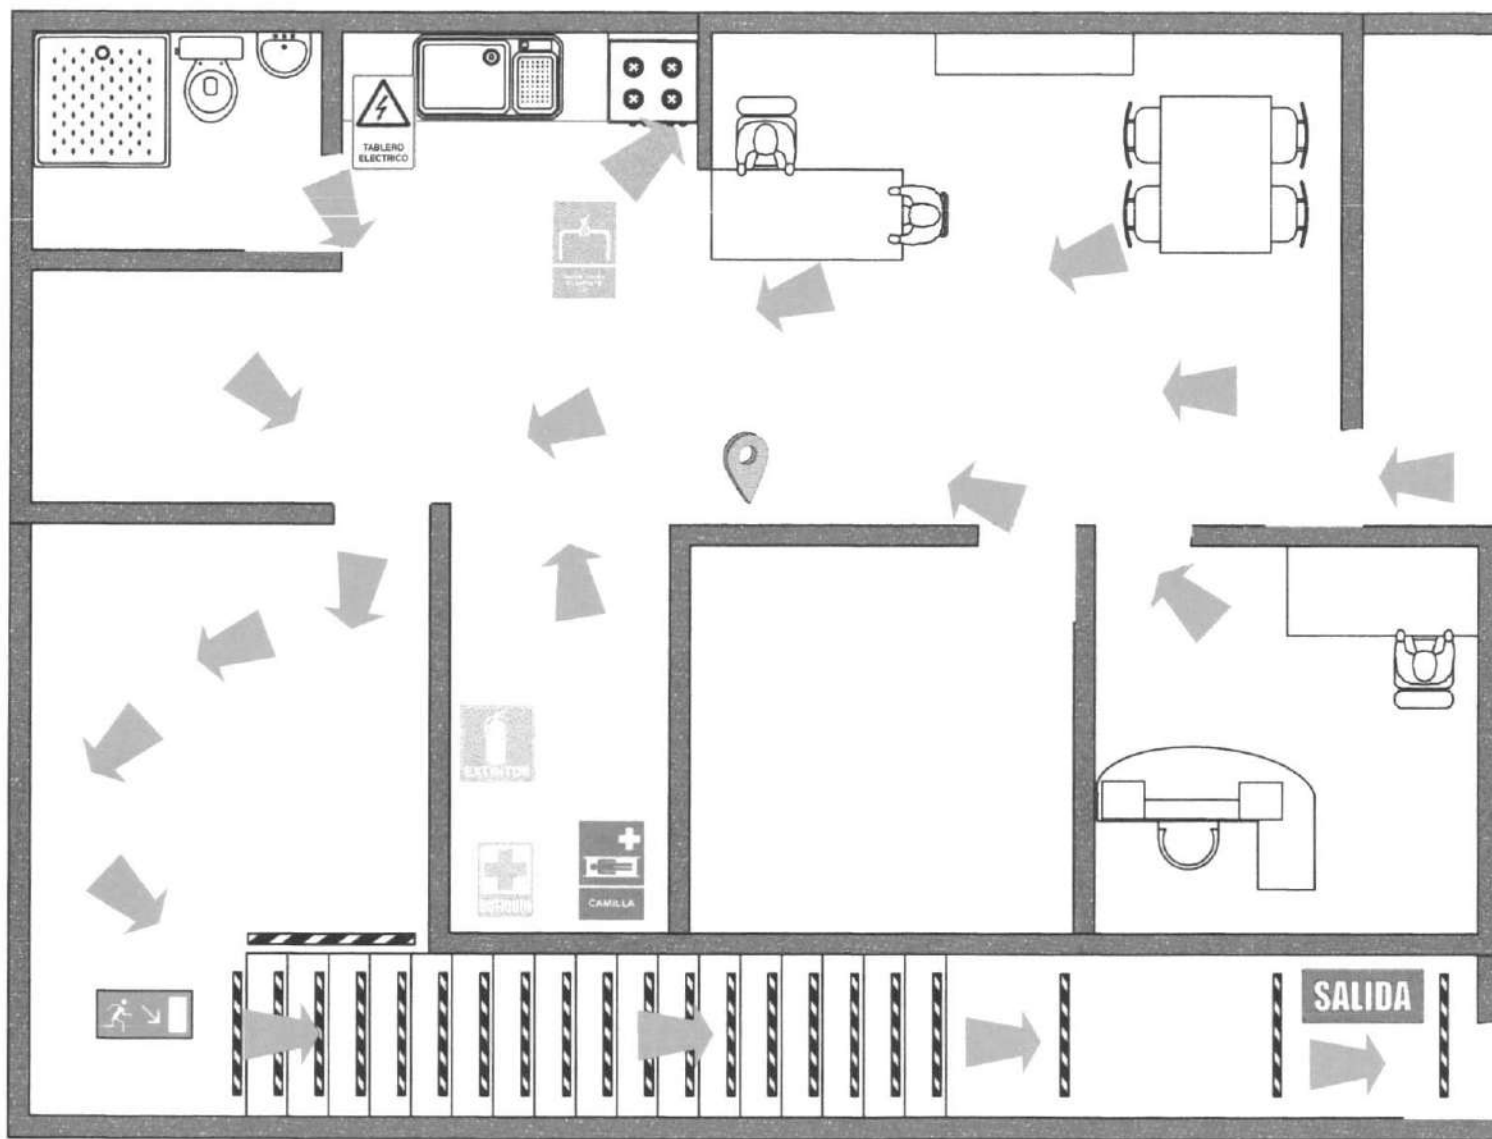
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA: <i>[Signature]</i>	FIRMA: _____
CARGO: <i>Prof SST</i>	CARGO: _____

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLER	FORMATO		Versión No. 1
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		Fecha Febrero/2023
	PERSONAL		Página 1 de 1

CÉDULA: 14.631.124
NOMBRE: Ramiro Bedoya San Martin
CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE DOTACION	ENTREGA			DEVOLUCIÓN				FIRMA
	CANT	B	FECHA	CANT	B	R	M	
casco Ind. Amarillo	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Barbiqueo Sp	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Gaantes Vaqueta par	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Mascarilla Ind	2	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
proteccion auditiva ins.	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Cafe Ind. Transparente	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Chuleco Reflektivo	1	✓	11-04-23					Ramiro Bedoya
Mascarilla Industrial	2	✓	25-04-23					Ramiro Bedoya

ELABORÓ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ CARGO: _____	APROBÓ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ CARGO: _____
--	---



Ciudad, cali abril 12 del 2023

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud de radicaciones masivas

Por medio de la presente solicitamos realizar tramite de novedad a cargo del empleador identificado como NIT 901.147.584, FOMENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO S.AS , Para las personas que detallan a continuación.

TIP O. DO C	NO. DOC. EMPLEADO	NOMBRE EMPLEADO	IBC	FECHA INGRESO EMPRESA	FECHA DE RETIRO SI APLICA	DIRECCION RESIDENCIA	MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	# CELULAR	CORREO ELECTRON ICO
CC	16.858.250	JAIRO RUIZ CHARRIA	1.160.000	01/04/2023		CRA 5 # 3- 35	CALI/VALLE	3224219 255	jairoruz@ gmail.co m
CC	16.489.485	Henry amu diaz	1.160.000	01/04/2023		CB 1* # 6*- 15	CALI/VALLE	3178058 842	henryamu @gmail.c om

Cordialmente

ALEX GRISALES O.

ALEXANDER GRISALES OROZCO

ENCARDO DE AFILIACIONES

Bogota 14.04.2023

Señores,

FOMENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO S - NI 901147584

Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 2 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2023-04-14 con numero de radicado3665638 :

Cordialmente,

Handwritten signature of Benny Saenz in black ink.

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

Medellín, 24 de Abril de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C14651124	BEDOYA SANMARATIN RAMIRO	11/04/2023		63134021	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C166131282311435812

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/04/2023 09:56:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.181.93, 192.230.104.11, 172.16.42.57

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) JAIRO RUIZ CHARRIA identificado(a) con CC número 16858250 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	FOMENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO SAS		
N° Identificación:	901147584		
Centro de trabajo:	Riesgo V - Tarifa - 6.960%	Sueldo básico:	\$ 1.160.000
Inicio de cobertura:	12/04/2023	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web <https://www.laequidadarl.coop> el día:

martes, 18 de abril de 2023 a las 02:03 PM

La información de la presente certificación debe ser confirmada telefónicamente en nuestra línea de atención en Bogotá al número 5922929 Ext. 1232 ó 317 4022427, citando el consecutivo 00008951790001289797.

Cordialmente,



LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-21 05:36:35 p.m.

Tipo Planilla E

Número Planilla 62661593

Periodo Cotización 202303

Periodo Servicio 202304

PAGADA 2023-04-21 15:55:50.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INNOMARS SAS	Dirección	Calle 3 # 17-26		
Documento	NI 901074094	Teléfono	3852851		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Ciudad	CALI	Identificación	CC 31253992		
Representante Legal	VELASQUEZ OROZCO TERESA DE JESUS				

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94468921	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00			GONZALEZ ARCILA ALEXANDER	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:																																										
Novedades														Estrangero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja			Parafiscales						
ARC	BSY	TVE	TVE	TVE	TAP	VSP	COR	VST	RE	SLN	EMA	VAG	VST				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185,500	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 80,800	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359,200





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-24, 01:01:10 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 62661078

Período Cotización: marzo de 2023

Período Servicio: marzo de 2023

PAGADO 12/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	Dirección	CARRERA 100 # 5-169 OFICINA 606 A
Documento	CC89008184	Teléfono	4837200
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellido(s) y Nombre(s)	Tipo Cotización	Importe Cotización	IBF	IBT	IBS	IBP	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	IBT	IBR	IBS	Total	
CC 89008184	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	1	0.00																									\$ 1.563.300	

III. TOTALES

IBF Pension	IBF Salud	IBF Riesgos	IBF Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MIA Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.470.000	\$ 4.470.000	\$ 4.470.000	\$ 0	\$ 214.000	\$ 255.000	\$ 304.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.563.300	\$ 0	\$ 1.563.300





Periodo Servicio: abril de 2023



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado: SENA e ICBF	
CC 14836163		SINISTERRA ORTIZ JIMMY JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C/ 30 # 01 - 35	FALMIPA-VALLE	4865667	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha:		Pago		
Persión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	39036972	9449025146	1	2023-04-24	2023-04-24	BANCO DE OCCIDENTE	C	\$411,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
COLMENA	14-25	800.226.175	3	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001.157	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$411,400	\$0	\$0	\$411,400	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14636183		SINISTERRA ORTIZ JIMMY JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C/ 10 de 101 35	PALMIRA-VALLE	4567667	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-01	3903a972	9449025346		2023/04-24	2023/04/24	BANCO DE OCCIDENTE	\$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días
Seguros(PRINCIPAL (1 afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0		
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0		
	CC 14636183	SINISTERRA JIMMY	330201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSUTB	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-01	30
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Id	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NET 10012029	1	INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES SAS	6 - AGENCIAS DE SERVICIOS TECNICO	PRINCIPAL	Cra 24 # 44-54	CALI-VALE	607-72	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	0017448428	044430275	8	2023/04/11	2023/04/11	BANCOLOMBA		\$14.837.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Descripción	Fecha	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	00000000	ALVAREZ CAROLINA		2023-03	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000
2	00000001	ARONTE ALVARO		2023-03	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793	21.167.793
3	00000002	ATENCIO CARLOS		2023-03	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000
4	00000003	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
5	00000004	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
6	00000005	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
7	00000006	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
8	00000007	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
9	00000008	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
10	00000009	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
11	00000010	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
12	00000011	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
13	00000012	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
14	00000013	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
15	00000014	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
16	00000015	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
17	00000016	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
18	00000017	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
19	00000018	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
20	00000019	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
21	00000020	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
22	00000021	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
23	00000022	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
24	00000023	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
25	00000024	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
26	00000025	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
27	00000026	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
28	00000027	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
29	00000028	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
30	00000029	BEATO LIZETH		2023-03	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000

Se certifica que CONINGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 805030454 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA MARCELA BURITICA LONDOÑO identificado(a) con CC 42136662

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9449314355	27353678	E	2023-04-10	EPS	EPS018	S.C.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449314355	27353678	E	2023-04-10	CCF	CGF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30

Este certificado se expide el día 2023-04-24 a las 10:43.

Certificado de Aportes

Se certifica que CONINGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 805030454 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN EDUAR DIAZ OBONAGA identificado(a) con CC 1143852425

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9449114355	27353678	E	2023-04-10	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	AFP	236501	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	ARL	14-11	ARL SUR4	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449114355	27353678	E	2023-04-10	CCF	CCF57	COMPANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30

Este certificado se expide el día 2023-04-24 a las 10:49.

INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS										FORMATO No.	18/2021		
										Version			
Nº	NOMBRE DE LA SUSTANCIA	ESTADO	UNIDAD DE MEDICION	PALETA DE ADVERTENCIA	USO y MANEJO	PICTOGRAMA DE PELIGRO	CLASE / DESCRIPCION DEL PELIGRO	CONSEJOS DE PRECAUCION	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO	SPR RECOMENDADOS PARA SU USO	CLASIFICACION GHS	CLASIFICACION UN	
1	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 a ISO 46 ACEITE DE TRANSMISION 80W90 - LUBRICANTE 25W90	Líquido oleoso	X	PELIGRO	Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manipular este producto. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavabos de emergencias. Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulación de cargas electrostáticas. Controlar y evitar la formación de atmósferas explosivas.	NA	H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H332 - Nocivo si se inhala.	P260 - No respirar humos, gases, neblinas, vapores o aerosoles. P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P301 + P310 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/medico. NO provocar el vomito. P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P381 - Recoger los vertidos. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la legislación nacional/internacional.	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fumar, fumar o hacer cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes. Materiales de empaque al suministrado por el fabricante. Productos incompatibles. Materiales oxidantes, fuertes, ácidos y bases.		Inhalación: Puede causar irritación en el aparato respiratorio y nariz. Contacto con la piel: Puede causar irritación. Contacto con los ojos: Puede causar irritación. Ingestión: Puede causar irritación en el aparato digestivo. Posibles náuseas y/o vómitos. Carcinogenicidad: Las bases refinadas del petróleo y los aditivos utilizados para la fabricación de este producto no son considerados ni son listados como carcinógenos por la IARC.		
	SHELL TELLUS S2 MM4	Papel hidráulico industrial											
2	ACEITE DE MOTOR MOVIL DELVAC MX P2 SAE 15W40	Líquido oleoso	X	PELIGRO	Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manipular este producto. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavabos de emergencias. Controlar y evitar la formación de atmósferas explosivas. Evitar el contacto con el producto ya usado. Evite que se produzcan pequeños derrames y fugas para prevenir el riesgo de resbalamiento. Cuando el material se manipule a granel, alguna chispa eléctrica podría provocar la ignición de vapores inflamables de los líquidos o residuos que pudiera haber presentes (p.ej. durante operaciones de cambio de una carga a otra).		H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H332 - Nocivo si se inhala. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos.	P260 - No respirar humos, gases, neblinas, vapores o aerosoles. P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P301 + P310 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/medico. NO provocar el vomito. P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P381 - Recoger los vertidos. P406 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la legislación nacional/internacional.	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fumar, fumar o hacer cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes. Materiales de empaque al suministrado por el fabricante. Productos incompatibles. Agentes oxidantes, fuertes, ácidos y bases.		Inhalación: Puede causar irritación en el aparato respiratorio y nariz. Contacto con la piel: Puede causar irritación. Contacto con los ojos: Puede causar irritación. Ingestión: Puede causar irritación en el aparato digestivo. Posibles náuseas y/o vómitos.		
3	P-602 DESGRASANTE TELIMPIADOR NEUTRO	Líquido	X	ATENCIÓN	Limpieza y remoción de suciedad pesada		No contiene componentes peligrosos pero debe darse un manejo delicado.	Mantener fuera del alcance de los niños. P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P273 - No dispersar en el medio ambiente.	Mantener en un lugar fresco y envase bien cerrado. Almacene a temperatura menor de 60° C. Almacene lejos de productos ácidos, básicos y caústicos. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No se debe comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Tener acceso a duchas de seguridad y lavabos de emergencias. Almacenar en el envase original. Almacenar en un lugar fresco y limpio. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado y alejado de la luz del sol. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Mantener los recipientes cerrados cuando no se usen.		INGESTIÓN: Levemente nocivo, puede causar malestar abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. INHALACIÓN: Los vapores pueden causar una leve irritación en el sistema respiratorio con tos. CONTACTO CON LA PIEL: Puede causar irritación con menor picazón y posible enrojecimiento ligero de la piel. El prolongado contacto se puede agravar en un problema de dermatitis irritante. CONTACTO CON LOS OJOS: Causa irritación, experimentada como picazón y malestar.		NO Peligroso para su transporte.

INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS											FORMATO No.	1/8/2021		
											Version			
Nº	NOMBRE DE LA SUSTANCIA	ESTADO	FORMA DE RESPONDER SI NO	PALABRA DE AVISADORA	USO y MANEJO	PICTOGRAMA DE PELIGRO GHS	CLASE (DESCRIPCION DEL PELIGRO)	EXPOSICIONES DE PELIGRO	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	CLASIFICACION TEMA OSHA	APPE TEE	CLASIFICACION UN	
4	GAS PROPANO	Gaseoso	X	PELIGRO	Se usa como Combustible para procesos de corte y calentamiento		H220. Gas extremadamente inflamable (Peligro. Los gases inflamables - Categoría 1) H280. Contiene gas a presión puede explotar si se calienta (Precaución gases a presión - Gas comprimido, gas licuado, gas disuelto) H336. Puede provocar asfóxia y mareos (Precaución toxicidad específica de órganos diana, sola exposición. Efectos: narcóticos)	P210. Mantener alejado del calor, la superficie caliente, chispas, llamas y otras fuentes de ignición - No fumar. P281. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. P271. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P354 + P340. En caso de inhalación: la persona si está fresco y mantenerse confortable para respirar. P312. Llamar a un centro de toxicología o a un médico / si se encuentra mal. P377. Fuga de gas en llamas: no apagar, salvo si la fuga puede detenerse con seguridad. P381. En caso de fugas, eliminar todas las fuentes de ignición. P403. Almacenar en un lugar bien ventilado. P403 + P233. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. P405. Guardar bajo llave. P410 + P403. Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. P501. Eliminar el contenido / recipiente.	Incompatible con oxidantes como clorato, perclorato de bromo, óxido de hidrógeno y fluoruro de nitrógeno. Manténgase lejos de materiales combustibles. Todo equipo eléctrico en áreas de almacenamiento debe ser compatible con los materiales inflamables almacenados. Los envases deben ser almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferentemente al aire libre. Tener en cuenta todos los riesgos y exposiciones ocultas sobre el almacenamiento de envases. Los envases almacenados deben ser controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas.		A inhalación o penetración puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan rápidamente y silenciosamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.		UN 1975	
5	GRASA DE LITIO	Semi sólida	X		En el trabajo utilizar guantes. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los recipientes vacíos deben ser drenados completamente. Use equipo protector personal adecuado. Evite el contacto prolongado y repetido con la piel. Evitar la exposición prolongada. Usar únicamente en lugares bien ventilados. Manos se lavan, se prohíbe comer, beber o fumar. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Utilizar un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Para instrucciones para el uso del producto.		H312. Nocivo en contacto con la piel. H315. Provoca irritación cutánea. H319. Provoca irritación ocular leve. H410. Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. H422. Peligro de incendio en caso de calentamiento superior a 180 °C.	P262. Evitar contacto con los ojos, la piel o la ropa. P284. Usar equipo de protección personal que proteja la respiración. P302. En caso de contacto con la piel. P305. En caso de contacto con los ojos. P331+P330. En caso de ingestión, lavar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. P305+P351+P338. En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con agua corriente abundante. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir leyendo. R411. Almacenar a temperaturas no superiores a 90 °C. P402+P404. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. P501. Evitar eliminar el producto en desagües, fosas, cuerpos de agua. Se deberá guardar en un recipiente cerrado y llevarlo a un centro de disposición final adecuado.	Mantenga el contenedor completamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Utilice contenedores etiquetados apropiadamente. Evite almacenamiento cerca de desagües, alcantarillados, afluentes y fuentes de agua en general. Reduzca al mínimo la exposición a altas temperaturas.		Grasa. Puede causar irritación leve transitoria. Piel. Este material puede causar irritación leve en la piel por contacto prolongado repetido o dermatitis. El contacto de la piel con el material caliente puede dar lugar a quemaduras severas. Ingestión. No se anticipa que sea dañino si se traga. Inhalación. No se espera que ocurran efectos significativos a la salud adversos en períodos cortos de exposición a temperatura ambiente.			
6	SOLDADURA Eléctrica Lincoln		X	SOLDADURA	No comer, beber o fumar en áreas de trabajo y evitar el contacto directo al salir de las áreas de trabajo.	N/A	H228. Líquido inflamable. H281. En contacto con el agua desprende gases inflamables. H316. Provoca irritación cutánea. H319. Provoca irritación ocular grave. H332. Nocivo en caso de inhalación. H335. Puede irritar las vías respiratorias. H373. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.	P270. No comer, beber o fumar mientras se manipule este producto.	No se requieren medidas especiales para los electrodos de soldadura en forma de barras que no sean las técnicas normativas de manipulación frías. La extracción se debe utilizar cuando se trabaje con el material en forma de partículas, polvo, humo, neblina. Evitar la inhalación prolongada de polvo. Use guantes para evitar el contacto con la piel. Almacenar en un ambiente seco.		La inhalación de los humos de soldadura, polvo y gases pueden ser peligrosos para la salud. Los electrodos que contienen níquel contienen el riesgo de producir una reacción alérgica después de un contacto prolongado o en personas ya sensibilizadas. No hay datos toxicológicos adicionales disponibles para electrodos de soldadura.			
7	OXIGENO INDUSTRIAL	PELIGRO	X	GASEOSO	Usado en combinación con gas combustible para corte y soldadura por arco eléctrico, calentado con llama, calentamiento de llamas en hornos industriales (reacta auto combustible), acelerar la quema de los gases combustibles para la obtención de una mayor combustión. Tiene amplias aplicaciones en siderurgia y metalurgia.		Oxígeno es un gas oxidante y en sí mismo. Es aproximadamente 1.1 veces más pesado que el aire y ligeramente soluble en agua y alcohol. El oxígeno solo no es inflamable, pero alimenta la combustión. El peligro físico más grave asociado con escapes de este gas se relaciona con su poder oxidante. Reacciona violentamente con metales combustibles y puede causar fuga o explosión.	P223. Mantener alejado del calor, la superficie caliente, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. Manténgase lejos de aceites y grasas. P370+P376. En caso de incendio: detener la fuga si se puede, hacerse un riesgo. P410+P403. Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.	El oxígeno es incompatible con metales combustibles y materiales inflamables, hidrocarburos, óxidos, hidratos, compuestos reducidos de boro, éter, sulfonamida, bromuro de sodio, trióxido de fósforo, trióxido de nitrógeno, tetrafluoruro de boro y compuestos que forman peróxidos fácilmente. El oxígeno puede formar compuestos explosivos cuando es expuesto a metales combustibles, aceites, grasas y otros metales hidrocarburos.		Inhalación. Altas concentraciones de este gas (50% o más) ocasiona el individuo después de 17-24 horas de exposición congestión nasal, náuseas, mareos, tos, dolor de garganta, hipoformia, problemas respiratorios, dolor en el pecho y pérdida de la visión. Respirar oxígeno puro a presión alta puede causar daño a los pulmones, afecte al sistema nervioso causando mareos, malestar, coordinación, sensación de hormigueo, molestia en los ojos y oídos, contracciones musculares, pérdida de conocimiento y convulsiones.			

INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS											FORMATO No.	18/2021
											Version	
Nº	NOMBRE DE LA SUSTANCIA	ESTADO	GRUP DE PELIGROSIDAD	PALETRA DE IDENTIFICACIÓN	PICTOGRAMA (AL PELIGRO) GHS	CLASE / DESCRIPCIÓN (GHS, PELIGRO)	CONSEJOS DE PREVENCIÓN	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	FRASE H	CLASIFICACIÓN UN
8	VARSOL	ATENCIÓN	X	LIQUIDO	 	H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular.	P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores. P103: Leer la etiqueta antes de su uso. P280: Usar guantes/lente de protección, equipo de protección para los ojos/cara. P301: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P334: Conservar únicamente en el recipiente original. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.	temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C). El almacenamiento de grandes cantidades debe ser en zona exterior. El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores. Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados.	   	ingestión: Produce náuseas y vómito. Cantidades minúsculas que absorben los pulmones y subsiguientemente producen vómito, pueden causar defeca severos a pulmones, inconsciencia. Comuñon. Piel: Dermatitis. Ojos: Irritación a los ojos pero no daña los tejidos. Producción: amojamiento. Efectos crónicos: Tras sobreexposiciones repetidas puede desarrollarse irritación crónica con síntomas orgánicos, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, pérdida de la memoria, cansancio, dolor en las articulaciones, distorsión del sueño, depresión, irritabilidad, náuseas, con la piel puede resultar en dermatitis.	 	
9	THINNER	PELIGRO	X	LIQUIDO	 	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H226: Líquido y vapores inflamables. H318: Provoca lesiones oculares graves. H319: Provoca irritación ocular grave. H332 (irritation): Nocivo si se inhala. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.	P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: No fumar sobre una flama abierta o otra flama de ignición. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.	Mantener alejado del agente pesantes, bases fuertes, ácidos fuertes. Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Conservar a distancia de toda fuente de ignición. No fumar. Evitar el acceso no autorizado. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.	   	La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones. el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de conciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con la mano puede causar la pérdida de la grasa natural de la piel dando por resultado una dermatitis no alérgica por contacto y la absorción a través de la piel. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones severas. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.	 	
10	PIRATURA DE ESMALTE (pintura)		X	LIQUIDO	 	H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H225: Líquido y vapores inflamables. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H360: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.	P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, flamas e descargas y otras fuentes de ignición. No fumar. P280: Usar guantes/lente de protección para los ojos/cara. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transfiera a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puede hacerse con facilidad. Prosiguir con el lavado. P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o sospecha, consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio, utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos a envases y residuos de emisiones respectivamente.	Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Evitar arcos fuertes, incidencia directa con componentes, ácidos o bases fuertes.	   	La ingestión de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos, o puede producir daño pulmonar. Contacto con la piel: Produce irritación cutánea. Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto. Una exposición a altas concentraciones puede motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afectación grave, pérdida de conciencia.	 	

Guadalajara de Buga, 10 de abril de 2023


Señor (a)
CONSORCIO REDES Y PTAPS
Correo Electrónico: consorcio redesyptaps@gmail.com
Santiago de Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud de documentación

Me permito comunicarle que, revisando la solicitud de permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el predio sin denominación, ubicado en la vía Ginebra Puente Rojo, jurisdicción del municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca, encuentra que dicho Derecho Ambiental debe ser solicitado por el MUNICIPIO DE GINEBRA, por ende debe diligenciarse el formulario correctamente, y adjuntar los documentos idóneos según lo recomendado en el presente texto.

Se le concede un plazo de un (1) mes contado a partir del recibo de la presente comunicación; si en ese término no ha dado cumplimiento a lo anterior, se procederá a archivar su solicitud de conformidad con el Artículo 17 Ley 1755 del 2015.
En consecuencia, sírvase proceder de conformidad.

Atentamente,



DIANA MARITZA POTES G.

Técnico Administrativo – Atención al Ciudadano.

Proyectó y elaboró: Diana Maritza Potes G. – Técnico Administrativo - Atención al ciudadano

Revisó: Mario Alberto López, Profesional Especializado – Oficina Atención al Ciudadano

Archivase en: 352912023



No. 3153

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL

Marca: TOPCON

Modelo: GTS-212

Número de Serie: LH7204

Cliente: GUILLERMO JESUS ORTIZ OBANDO

Fecha de expedición: 14 de marzo de 2023

Recomendamos ajustar: 14 de septiembre de 2023

¿Instrumento nuevo? ☐ SI ☒ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del Instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del Instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021

Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboró 
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvo.sas@gmail.com
Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio

CCV&O S.A.S.

CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio

Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

1/2

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

 TOPCON  PENTAX  SOUTH  Leica  Nikon  SOKKIA

CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvo.sas@gmail.com

TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62

Cali-Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	-----...
Precisión angular (DIN 18723)	5"	Alcance con dianas reflectivas	-----
Precisión en distancia	± 3mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	2800M

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☒	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☒	☐	☐	☐
Mantenimiento interno	☒	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☒	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☒	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☒	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☐	☒	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☒	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☐	☒	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☒	☐	☐
Chequeo del teclado	☐	☒	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☐	☒	☐	☐
Ajuste del compensador	☒	☐	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☒	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☐	☒	☐	☐	Ajuste del distanciómetro	☐	☒	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto O compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	0.5mm	.5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm

PPM: 12

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805.66	49805.1	0,32	0.10	± 2	-0.56

Fin de este documento.

2/2

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON

PENTAX

PRINCE

SOUTH

Leica

Nikon

SOKKIA

CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com

TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62

Call-Colombia
