

INFORME DE INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 28 FEBRERO 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: FEBRERO 28 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

INFORME DE INTERVENTORIA

FECHA: FEBRERO 28 DE 2023

PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023

INFORME No.03

CONTRATO: 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S			
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S			
2	CONTROL DE GARANTIAS	S			
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S			
4	CONTROL DE EJECUCION	N			
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	N			
5	ANEXOS	S			
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S			
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S			
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S			
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S			
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	N			
5.6	RECURSO HUMANO	S			
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S			
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S			
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N			
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S			
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA				
INFORME No. 03		PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	☒	OTRO ☐ ESPECIFIQUE:
1. INFORMACION GENERAL				
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA		
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01.005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."		
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL		
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES		
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022		
VALOR INICIAL: \$ 1.502.246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933		
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039 - 13040		
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023		
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A		
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A		
VALOR ACTUAL: \$ 1.502.246.766		VALOR ACTUAL: \$ 29.432.080.933		
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A		
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A		
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A		
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$ N/A		
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A		
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):		
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$		
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.		
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$		
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A		

  PAP - PDA PROYECTO ADJUNTO A LA PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 03	PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:	
DATOS DE LA SUPERVISIÓN		
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDISON ZULUAGA	
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARIA OSORIO - RAMIRO CARABALI	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No.03		PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	☒	OTRO	ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)		Observaciones (iv)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)		Observaciones (iv)

1.	Destinar a la ejecución del contrato mane de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mane de obra no calificada de la región serán mujeres.			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
	3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
	Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
	7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
	8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
	9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
	10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	SI		
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI		

El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	SI		
19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.	SI		
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI		

26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	SI		
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. I	SI		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:			
1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		

2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		
4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI		
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelación al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI		
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI		
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI		
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI		
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo case, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI		

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.	N/A		
Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio FIA para el pago del RETEICA	SI		
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizar que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		

4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		
De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y Anexos aclaratorios. El informe deberá contener los ☐ avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras, sobre e	N/A		

8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI		
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, y en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A		
15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	N/A		

16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizarla y validarla, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sine existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI		
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A		
Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		

No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honradiz y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
23. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
24. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
25. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
26. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		

27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
29. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO DE OBRA			
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE LABORES	SI		
BITÁCORA	N/A		
ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A		
INFORME FINAL	N/A		

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuación se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serialización Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	N/A		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
35. En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
38. La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	N/A		

39. El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	N/A		
40. Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.	N/A		
41. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	N/A		
42. Elaborar e implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. N se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz blanca.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
44. Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
45. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	N/A		
El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	N/A		

47. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.	N/A		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración Municipal o a terceros	N/A		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No.03

PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023

2. CONTROL DE GARANTÍAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 300.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 5.886.416.198,60	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.049,65	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Estabilidad	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

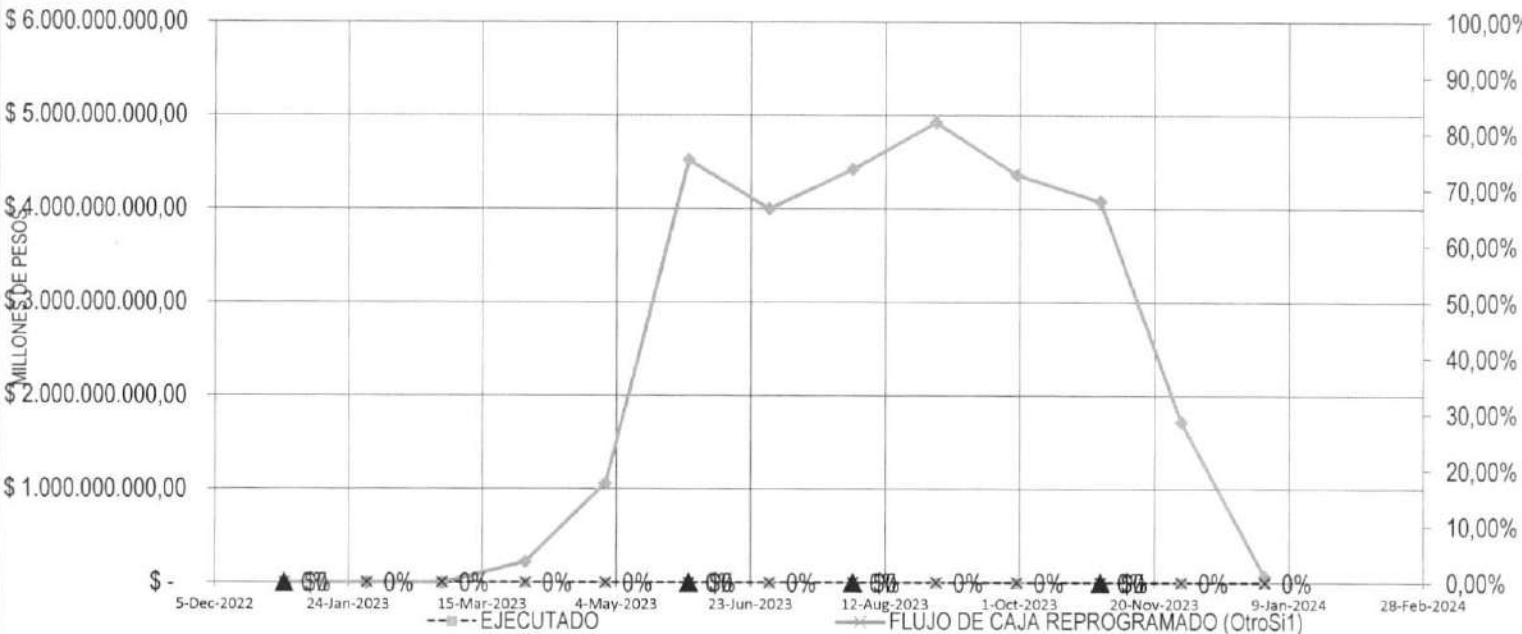
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI						Código: FO-PDA.2.1-4			
								Versión: 4			
		INFORME DE INTERVENTORIA						Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME No.03				PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023							
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (_ %)	23/12/2022	\$N/A	%		\$8.829.624.298
Acta No. 1					\$0	Acta No. 1					
Acta No. 2					\$0	Acta No. 2					
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
TOTALES		\$ -			\$450.674.030						\$8.829.624.298

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No.3

PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	\$ -			\$ -	0.00%
31-Jan-23	\$ -		\$ -		0.00%
28-Feb-23	\$ -		\$ -		0.00%
31-Mar-23	\$ 224.420.424,84		\$ -		0.00%
30-Apr-23	\$ 1.067.268.717,37		\$ -		0.00%
31-May-23	\$ 4.526.227.959,36		\$ -	\$ -	0.00%
30-Jun-23	\$ 4.005.021.133,81		\$ -		0.00%
30-Jul-23	\$ 4.427.626.354,13		\$ -	\$ -	0.0000%
30-Ago-23	\$ 4.929.632.850,25		\$ -		0.00%
30-Sep-23	\$ 4.369.665.718,03		\$ -		0.00%
31-Oct-23	\$ 4.085.267.170,59		\$ -	\$ -	0.00%
30-Nov-23	\$ 1.724.621.254,47		\$ -		0.00%
31-Dec-23	\$ 72.329.350,73		\$ -		0.00%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION NO PRESENTA INVERSION DEL FLUJO DE CAJA.

  PAP - PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA 2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 3	PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Fernando Acosta V. con número de tarjeta profesional 42.408-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.		
Firma del Interventor Contrato No. 		

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.03	PERIODO: FEBRERO 01 A 28 DE 2023	
6. ANEXOS		
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitacora).		
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.		
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.		
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.		
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir trámites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.		
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional		
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).		
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución		
6.9 Informe del Contratista (si aplica).		
6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO		
CONTINUAR CON LA TOMA DE DATOS EN CAMPO Y VERIFICAR LOS AJUSTES EN LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR BALANCE DE OBRA		
AJUSTE Y VERIFICACION DE DISEÑOS, INVOLUCRANDO AL CONSULTOR DE DISEÑO CONTRATADO CON VALLECAUCANA DE AGUAS		
CONTINUAR CON EL TRABAJO DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA SUPERAR OBSTACULOS SURGIDOS CON ALGUNOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES VECINAS AL PROYECTO		
FINIR LOS TRAMITES Y ALCANCES DE LOS MISMOS ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LLEVAR PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE CAM		
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES		
DURANTE EL PERIODO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS DE CONSTRUCCION DE Y PLANIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE LA PRIMERA VERSION DEL INFORME CERO CON ASPECTOS A REVISAR, ACLARAR Y/O CORREGIR DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA EL PROYECTO POR EL CONSULTOR DE VALLECAUCANA DE AGUAS, DESDE LAS AREAS TECNICAS (TOPOGRAFICA, GEOTECNIA, HIDROLOGICA, HIDRAULICA, DE INGENIERÍA). DESDE LOS COMPONENTES AMBIENTALES ACELERAR LOS TRÁMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL A FIN DE PODER REALIZAR LABORES EN CAMPO SIN LOS LIMITANTES QUE IMPLICA LA FALTA DE ESTOS PERMISOS. EN EL ASPECTO SOCIAL SE RECOMIENDA FORTALECER AUN MAS LOS MECANISMOS DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD		

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 3

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	ACTIVIDADES PREMILINARES Y TOPOGRÁFICAS	SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES.
	RECORRIDO A LOS SITIOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, RECORRIDO DE LAS LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION, BOCATOMA, PTAP GINEBRA, PTAP GUACARI.	SE REALIZO VISITA CONJUNTA CON VALLECAUCANA DE AGUAS, ACUAVALLE, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, EVALUANDO EL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS A INTERVENIR, PREDIOS, POSIBLES TRAZADOS A LAS LINEAS DE CONDUCCION
	INFORME CERO	DESCRIBIR EN FORMA RESUMIDA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, ASÍ COMO LA METODOLOGÍA A SEGUIR PARA LLEVARLAS A CABO; EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA. REVISION DE LOS DISEÑOS, CONTRASTANDO CON LA INFORMACION ACTUAL RECOGIDA EN CAMPO
	INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	VERIFICACION EN CAMPO DE LA ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO, CONTRASTANDO LA INFORMACION ACTUAL EN CAMPO.
	INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL VIADUCTOS DEL PROYECTO	CHEQUEO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE LA INFORMACION DE CALCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAELES DE LOS VIADUCTOS DISEÑADOS EN EL PROYECTO.

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	INFORME CERO	SE ANEXA DOCUMENTO
2	INFORME DE REVISION ESTRUCTURA VIADUCTOS	SE ANEXA DOCUMENTO
3	INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SE ANEXA DOCUMENTO
4	INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL VIADUCTOS DEL PROYECTO	SE ANEXA DOCUMENTO
5	INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTERVENTORIA	SE ANEXA DOCUMENTO
6	ACTAS DE COMITÉ	SE ANEXA DOCUMENTO
7	INFORME DE INTERVENTORIA	SE ANEXAN DOCUMENTOS
8	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 3	SE ANEXA DOCUMENTO

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES			
I. ASPECTOS SOCIALES			
ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	
1	REUNIONES DE SOCIALIZACION CON LAS ACOMUNIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION SE ANEXAN DOCUMENTOS E INFORME DE GESTION CONTRATISTA E INTERVENTORIA	
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	REUNIONES DE SOCIALIZACION CON LAS ACOMUNIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION SE ANEXAN DOCUMENTOS E INFORME DE GESTION CONTRATISTA E INTERVENTORIA	
2			
3			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4
				Versión: 4
		INFORME DE INTERVENTORIA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO				
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	- Planificar la organización de la obra. - Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. - Realizar seguimiento a los recursos designados
2	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	- Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. - Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra - Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
3	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. - Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. - Solicitar los materiales requeridos oportunamente
4	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	- Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. - Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. - Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. - Informar oportunamente antes, durante y
5	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	- Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. - Localización y replanteo de estructuras a construir. - Localización y replanteo de tuberías a instalar. - Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISIÓN DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISIÓN COMPONENTE AMBIENTAL

3	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
4	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
5	TATIANA ROJAS	ING. CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA
6	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS CAT 0420	SI		X	PTAP GINEBRA	EXCAVACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
2	VOLQUETA KENWORT	SI		X	PTAP GINEBRA	EXCAVACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	PLACA TTS 693
3							
4							
5							

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

[illegible]

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS CAT 0420	SI		X	PTAP GINEBRA	EXCAVACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
2	VOLQUETA KENWORT	SI		X	PTAP GINEBRA	EXCAVACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	PLACA TTS 693
3							
4							
5							

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

[illegible]

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS					
FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	9:00 a. m.
	28	2	2023	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00 p. m.
VEREDA/ CORREGIMIENTO:				MUNICIPIO:	GINEBRA
TRAMO/FRENTE DE OBRA:	GINEBRA			LONGITUD/ÁREA:	
CONSORCIO:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)	
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMBRE PROF. SST INTERVENTORIA:	Juliana Marulanda
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	X				
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	X				
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS		X		En el mes de febrero no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes por las labores ejecutadas	
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES		X		El contratista presenta un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo de marzo a diciembre	
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	X			Presenta formato de asistencia a la capacitación de inducción al personal administrativo y operativo	
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	X			Se recomienda alimentar la matriz según actividades nuevas o adicionales	
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)		X		Se solicita mediante oficio la preparación del plan de emergencia para los dos frentes de obra y puntos a	
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA		X		No cuentan con una brigada de emergencias	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ZONAS	X			Se delimita la zona de excavación	
CAMILLA RÍGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO		X		Aun sin implementar	
EXTINTORES		X		Aun sin implementar	
BOTIQUÍN		X		Aun sin implementar	
KIT DE DERRAMES		X		Aun sin implementar	
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCIÓN AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALÓN Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).		X		Aun sin implementar	
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCIÓN (ARL, CLÍNICAS, HOSPITALES, IPS, POLICÍA, BOMBEROS, EJÉRCITO, ETC)		X			
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL		X			
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		X			
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 ESTÁNDARES MÍNIMOS.	X			Cumple parcialmente, a la fecha no se entregan todos los documentos para evidenciar total cumplimiento	
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		X			
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS		X			
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	X				
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN		X			
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	X			Se divulga las políticas SST al personal operativo subcontratista y al personal administrativo	
PUNTO ECOLÓGICO		X			
TOTAL	8	16	0		
CUMPLIMIENTO				33%	
OTROS:					
OBSERVACIONES:					

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO PERIODO FEBRERO 01-28 DE 2023

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022					
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA *CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:	13 MESES					
VALOR ANTICIPO :	30%					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	\$ 1.744.905.661,00	\$ 1.744.905.661,00	\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	\$ 5.112.500.588,00	\$ 5.112.500.588,00	\$ 1.012.799.562,00
5	OTROS	\$ 959.418.469,00	\$ -	\$ 429.709.234,00	\$ 429.709.234,00	\$ 529.709.235,00
	TOTALES	\$ 8.829.624.280,00	-	7.287.115.483,00	7.287.115.483,00	1.012.799.562,00

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	
	28	FEB	2021	HORA DE FINALIZACIÓN :	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)	0%

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AIRE				
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X		
EMISIONES DE RUIDO		X		
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS				
OTROS:				
SUELO				
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X		
PROCESOS EROSIVOS		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X		
OTROS:				
AGUA				
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X		
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X		
OTROS:				
FLORA Y FAUNA				
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X			
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X		
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X		
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X		
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X		
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X		
OTROS:				
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES				
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)		X		
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS		X		PENDIENTE DE AUTORIZAR
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X		
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL		X		PENDIENTE DE AUTORIZAR
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X		
OTROS:				
SOCIOECONÓMICO				
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD		X		
ACTAS DE VECINDAD		X		
ACTAS DE RECIBO		X		
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X		
PREDIOS AFECTADOS		X		
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		X		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X		
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	X			
MANO DE OBRA LOCAL	X			
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X		
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		X		
GESTIÓN SOCIO -PRELIAL	X			
OTROS:				

OBSERVACIONES:

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO FEBRERO 01 A 28 DE 2023



FOTOGRAFÍA No.1: Demolición de la caseta del operador Ptap Ginebra, se acopia el material para posteriormente ser enviada a un botadero autorizado, también se inicia a realizar el descapote del área



FOTOGRAFÍA No.2: Demolición de la caseta del operador Ptap Ginebra, se acopia el material para posteriormente ser enviada a un botadero autorizado,



FOTOGRAFÍA No.3: RECORRIDO CONJUNTO CONTRATISTA, INTERVENTORIA, VALLECAUCANA DE AGUAS, ACUAVALLE AL AREA DEL PROYECTO, SECTOR ZONA DE CAPTACION



FOTOGRAFÍA No.4: comisiones de Topografía realizando la localización de las obras de captación en el río Guabas (Bocatoma y Desarenador).



FOTOGRAFÍA No.5: Carga y Retiro de material sobrante a lugar autorizado.



FOTOGRAFÍA No.6: Excavación del área donde se construirá el tanque de Almacenamiento Ptap Ginebra.



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**GINEBRA
FEBRERO DE 2023**

INFORME N° 3

1. INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras que se contemplan construir son:

Bocatoma

Desarenador

Cámara de distribución de caudal

Viaductos

Líneas de aducción y conducción

Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí

Caseta de operador planta Ginebra

Tanque de almacenamiento en la planta de Ginebra

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	Diciembre 1 de 2022
Fecha de Terminación:	Enero 01 de 2024
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero se ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación:

2.1 ACTIVIDADES CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Durante el mes de febrero se realizaron varias reuniones de socialización con la comunidad del Municipio de Ginebra y Guari, Corregimiento Costa Rica, Vereda Puente Rojo, vereda Bello Horizonte y recorrido por los sitios de ubicación de las obras a construir

2.1.1. Reuniones con la comunidad:

Febrero 9: Se realiza reunión con la junta del acueducto de la vereda de Puente rojo, a esta reunión solo asistieron tres personas que hacen parte de esta junta del acueducto. También se hace visita al tanque de agua potable y a la bocatoma para revisar su estado con el fin de dar a conocer las necesidades que tiene esta vereda y poder contribuir a dar solución a una de estas necesidades debido a que ellos manifiestan que con ese proyecto no van a tener ningún benéfico. Se toma nota de todas las necesidades, el contratista cuantificara cuánto vale cada una de las necesidades y para poder tomar la decisión en que se les puede ayudar



Foto 1. Reunión con los integrantes del acueducto de Puente Rojo



Foto 2. Tanque de agua potable Puente Rojo

Febrero 14: Se realiza reunión con la comunidad de la vereda La Floresta corregimiento de Costa Rica



Foto 3. Reunión con parte de la comunidad de la Vereda La Floresta

Febrero 17: Se realiza reunión con Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Bello Horizonte, corregimiento de Costa Rica, en estos espacios se les da a conocer el proyecto y ellos tienen la oportunidad de aclarar las dudas que tenían



Foto 4. JAC e la comunidad de la Vereda Bello Horizonte

Febrero 21: Se cita reunión de socialización a los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) comunidad de Ginebra y Guacarí, donde se les expone el proyecto y ellos hacen sus respectivas preguntas y resuelven dudas. Sólo hubo asistencia del Municipio de Ginebra



Foto 5. Reunión JAC municipio de Ginebra y Guacarí

Febrero 27: Después de realizada las reuniones de socialización con la comunidad de cada una de las veredas, se da inicio a la realización de las actas de vecindad por parte del contratista y la interventoría



Foto 6. Realización actas de vecindad a la comunidad

Durante el mes de febrero se realizaron las reuniones de socialización con las JAC de cada vereda y corregimiento involucrados en el proyecto con el fin de aclarar las dudas y que ellos tuvieran el espacio para aclarar las dudas que se tenían del desarrollo del proyecto.

2.2 REUNIONES COMITÉ DE OBRA

Febrero 3,10,17 y 24: Reunión comite de obra con el contratista Consorcio redes y PTAPS, interventoría Consorcio Interguacari y, Vallecaucana de aguas



Foto 9. Comité de obra febrero 10 de 2023, en las oficinas de Vallecaucana



Foto 10. Comité de obra febrero 17 de 2023. En el sitio de la bocatoma verificado la localización de las estructuras de la bocatoma y desarenador



Foto 11. Comité de obra febrero 17 de 2023. En la oficina del contratista Costarica



Foto 12. Comité de obra febrero 24 de 2023. En la planta de Ginebra

a. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Febrero 3: El contratista continúa con la actividad de localización y replanteo del trazado de la tubería de conducción del agua, termina esta actividad en la Planta de Tratamiento de agua de Potable de Guacarí vereda Guabitas. También realiza verificación de medidas y toma niveles en los tanques de esta planta. Este día visita también la planta el ingeniero Diego Montoya diseñador, con el fin de acompañar al topógrafo del contratista en esta actividad.



Foto 13. Topógrafo del contratista realizando actividades de localización de la tubería de conducción en la vereda Guabitas

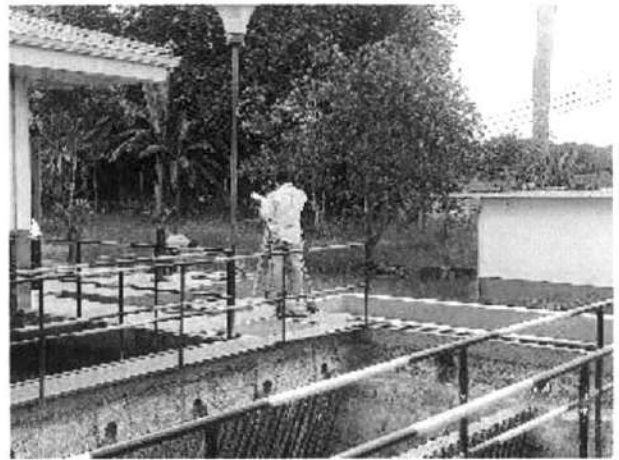


Foto 14. Topógrafo del contratista realizando actividades de nivelación y verificación de medidas con el ingeniero Diego Montoya en la planta de Guacarí

Febrero 7: Se hace recorrido de reconocimiento de los sitios a intervenir desde la bocatoma hasta puente rojo por dónde va el trazado de la tubería, en este recorrido estuvieron presente Vallecaucana de aguas, Acuavalle, Interventora y contratista. Se identifican los problemas encontrados a lo largo de la vía y se buscara solucionar cada uno de los inconvenientes encontrados para que el proyecto pueda avanzar



Foto 15. Sitio de ubicación de la bocatoma – Sector Puente Piedra



Foto 16. Sitio de ubicación del desarenador – Sector Puente Piedra

Febrero 8: Se da inicio a la demolición de la caseta de los operadores existente.



Foto 17. Demolicón caseta operadores

Febrero 14: Localización y replanteo de las estructuras de concreto bocatoma y desarenador .
Encontrando que este último está localizado muy cerca de la vía

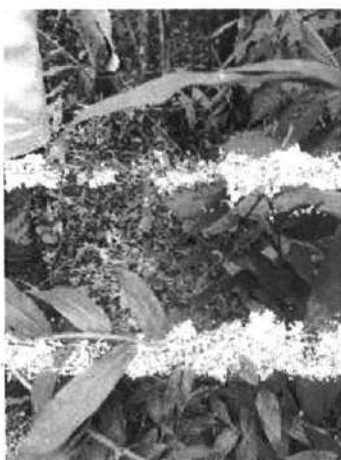


Foto 18. Localización y replanteo bocatoma y desarenador

Dentro de área del tanque se encuentra la caja de inspección de la caseta de operadores en ya demolida, a la cual le llega las aguas de la caseta de operaciones, la cual esta activa. Es necesario reubicarla.



Foto 18. Caja de inspección aguas residuales a reubicar

Febrero 15: Durante el descapote se encuentra la tubería eléctrica que alimentaba a la caseta de operadores, también están ubicadas las luminarias las cuales es necesario reubicar para poder que la planta quede con servicio de iluminación en esta área



Foto 18. Reubicación de luminarias y trazado red eléctrica

Febrero 17: Se da inicio la excavación del tanque de agua potable, teniendo especial cuidado con los árboles que están en la zona de los cuales a un no se tiene el permiso por parte de CVC para su respectiva tala



Foto 19. Inicio excavación tanque de agua y retiro de material sobrante de la excavación

Febrero 18-28: Continúan con las labores de excavación y retiro del material proveniente de la excavación del tanque.





Foto 20. Excavación zona tanque de agua planta Ginebra y retiro de material sobrante

Febrero 21: Por parte de la interventoría se realiza chequeo de GPS 13 y 14 en la PTAP de Ginebra, se realiza localización con el contratista de tanque, se realiza toma de puntos de GPS en bocatoma y en el delta #34

Febrero 22: Se realiza toma de puntos de GPS en los deltas #79, 92 y 94 tramo entre puente rojo y PTAP Guacari





Foto 21. Chequeos de localización de bocatoma y desarenador y en las PTAPS de Ginebra y Guacari

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente periodo no se han presentado incidentes con el personal que labora en obra.
- Durante el presente periodo el contratista ha desarrollado las actividades acordes a los diseños y cumpliendo con las recomendaciones técnicas y de calidad establecidas en cada actividad.
- Aún no se tiene la reprogramación de obra
-

Atentamente,

PAOLA TATIANA ROJAS CRUZ

RESIDENTE DE OBRA

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTRGUACARÍ
DEL 4 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 AL CONTRATO DE
OBRA No. 2000.13.05.003.2022

Neisler Abadía Londoño - profesional social de interventoría asesoró, acompañó, evaluó y aprobó las siguientes actividades sociales del contrato de obra cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”** Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE y su profesional social María Fernanda Martínez.

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

ACCIONES PRELIMINARES DE LA OBRA

✓ **Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto**

Aún no se ha hecho, la profesional social María Fernanda Martínez informó que se realizará cuando se haya conformado el comité de veeduría ciudadana.

✓ **Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto**

Se evidenció que la profesional social María Fernanda Martínez inició con la aplicación de las Actas de Vecindad, se comenzó desde las viviendas cercanas al punto donde se implantará la bocatoma descendiendo hasta el crucero después de Puente Amarillo.

✓ **Recorrido por Área del Proyecto**

Se evidenció que se están realizando los recorridos por la obra todos los viernes de cada semana, en compañía de la supervisión por parte de Vallecaucana de Aguas, contratista e interventoría.

✓ **Programa de Información a la Comunidad**

Se evidenció el trabajo de la profesional social del contratista María Fernanda Martínez quien permite espacios donde la comunidad beneficiaria pueda informarse de la obra, participar y aportar al desarrollo del proyecto, aportando al desarrollo sano y de participación ciudadana. Las estrategias aplicadas han permitido una comunicación asertiva con la comunidad.

✓ Programa de divulgación a la comunidad

La interventoría aprobó las piezas informativas que se entregaron a la comunidad para la convocatoria de las diferentes reuniones de socialización que se realizaron durante el mes de febrero de 2023. Entre las cuales se emplearon las siguientes:

- Volantes de convocatoria a reuniones con lineamientos de la entidad Contratante y las Alcaldías Municipales de Ginebra y Guacaré.
- Cartas de información o convocatoria oficial a entidades e instituciones.

La interventoría aprobó el volante de invitación para la socialización presentado por la trabajadora social María Fernanda Martínez para la reunión con los habitantes de la vereda Bello Horizonte – Ginebra.



REUNION INFORMATIVA A LA COMUNIDAD VEREDA BELLO HORIZONTE

Contrato de obra
2000.13.05.003.2022

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA

Viernes 17 De Febrero
3:30 PM

LUGAR: CASA SEÑORA MARIA ELENA TAFUR VICEPRESIDENTA JUNTA DE ACCION COMunal

COSTA RICA-MUNICIPIO GINEBRA SOCIALIZACION

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Logos: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.S S.P.A., Valle Invencible, GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

La interventoría aprobó el volante de invitación para la socialización presentado por la trabajadora social María Fernanda Martínez para la reunión informativa para los habitantes del municipio de Guacaré y Ginebra.



CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2000.13.05.003.2022

SOCIALIZACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.S S.P.A. ESTUDIO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO EN PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAP VALLE 2022

MARTES 21 DE FEBRERO
2:00 PM

ESCUELA ANTONIA SANTOS MUNICIPIO DE GINEBRA AREA URBANA

REUNION INFORMATIVA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GUACARI Y GINEBRA Y VEREDAS PUENTE ROJO, BELLO HORIZONTE, FLORESTA, COSTA RICA.

Mapa de la zona con puntos de captación y PTAP.

Logos: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.S S.P.A., Valle Invencible, GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

✓ Reunión al Inicio de la Obra

Este componente corresponde a las actividades realizadas en la primera fase, por lo tanto, las actividades realizadas fueron registradas en el informe en su respectivo periodo.

✓ Reuniones con la comunidad

La interventoría evidenció la realización de 7 reuniones informativas de la obra.

- Febrero 4 de 2023

Se evidenció la realización de la reunión de socialización a los comerciantes del turismo del sector de Puente Rojo, esta reunión fue interrumpida por algunas personas que se oponían a la presentación del contrato, manifestando que se debe hacer una consulta previa con la comunidad, estas personas se retiraron voluntariamente de la reunión, sin embargo, se continuó con la presentación a las personas de la comunidad que se quedaron para escuchar en que consiste la obra.



La interventoría aprobó la realización de reuniones sectorizadas para avanzar con los acercamientos a la comunidad para informar sobre la obra.

- Febrero 9 de 2023

En la reunión con los representantes de la asociación del acueducto de Puente Rojo, Presidente- Diego Fernando Osorio, Vicepresidente- Horacio Gutiérrez, Fiscal - Alejandro Soto Osorio. En esta reunión se presentó en que consiste la obra y se aclararon las dudas que tenían acerca de la obra. El señor Diego Fernando Osorio manifestó que la comunidad está muy desinformada a cerca de la obra y que es un buen ejercicio el acercarse a los líderes como el para aclarar las inquietudes, se mostró positivo a cerca de la obra y solicitó estudiar la posibilidad de crear una

compensación que le sirva a la comunidad en general, expresó 6 necesidades que tiene la comunidad.

- a. Adecuación del tanque de almacenamiento que tiene más de 60 años.
- b. Viaducto
- c. Adecuación del muro de la bocatoma que tiene aproximadamente 12 metros de longitud.
- d. Hidrante
- e. Salón comunitario en un terreno que tiene la comunidad
- f. Completar la placa huella ya sea con concreto rígido o flexible hasta el puente.



- Febrero 14 de 2023

Se evidenció la reunión entre la trabajadora social María Fernanda Martínez y el señor Jaime Orozco - presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Costa Rica, para la presentación del contrato de obra cuyo objeto es "Construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca" quien mostró aceptación hacia la obra.



- Febrero 14 de 2023

La interventoría realizó acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al inspector de obra- Jhon Janer Cuero, en la reunión con Millerlandy Sanabria – presidenta de la Junta de Acción comunal del corregimiento de La Floresta y Bryan Rodríguez – representante de Asocomunal, En esta reunión se presentó en que consiste la obra y se aclararon las dudas que tenían acerca de la obra. La señora Millerlandy y el joven Bryan, muestran aceptación hacia la obra, manifiesta que esta obra beneficiará a la comunidad de Ginebra y varios de sus corregimientos y veredas, recomiendan realizar la reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal para presentar el proyecto y ofrecen el apoyo para la convocatoria desde Asocomunal.



- Febrero 14 de 2023

La interventoría realizó acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez en la vista al doctor Carlos Adolfo Tigreros - personero municipal de Ginebra, María Fernanda realiza la presentación de la obra y explica el desarrollo que ha tenido, el doctor Carlos Adolfo manifiesta que se ha enterado de algunas cosas y está interesado en asistir a las reuniones, es invitado a la reunión programada para el martes 21 de febrero y se enviará la invitación oficial.

- Febrero 17 de 2023

La interventoría realizó acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión informativa con los habitantes de la vereda Bello Horizonte – Ginebra, presentaron el contrato de la obra y se aclararon las dudas de la comunidad.



- Febrero 21 de 2023

La interventoría realizó acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con las Juntas de Acción Comunal citadas para la socializarles del contrato 2000.13.05.003.2022, en esta reunión asistieron los presidentes y representantes de la mayoría de las Juntas de Acción comunal de los barrios, corregimientos y veredas del municipio de Ginebra, también asistió el personero de Ginebra - Doctor Carlos Adolfo Tigreños, quien manifestó que le hubiera gustado que a esta reunión hubiera asistido personas de Puente Rojo y el personero de Guacarí, para aclarar las inquietudes que tiene la comunidad a cerca de la obra. En general las personas que asistieron recibieron la información de buena manera y manifestaron que es una obra que necesitaban desde hace tiempo y los beneficiará, aclararon que la población en estos momentos de Ginebra es de 26.000 personas, también preguntaron si estas obras se verán reflejadas en el cobro del servicio del agua que hace Acuavalle y si va a aumentar el cobro.





PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

✓ Programa de atención a la comunidad

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC para que la comunidad acceda al servicio si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. Hasta el mes de febrero no se han recibido ninguna PQRS.



✓ programa de atención al ciudadano

Se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista.

Nombre Profesional social encargado	Teléfono	Correo	Dirección oficina
Maria Fernanda Martinez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Cra 5 #10-46 Centro Corregimiento de Costa Rica - Ginebra

✓ **Actividades a realizar durante la de ejecución de la Obra**

○ **Recorridos por la Obra**

Se evidencia que se realizan los recorridos por la obra todos los viernes de cada semana, en compañía de la supervisión por parte de Vallecaucana de Aguas, contratista e interventoría.

○ **Reunión de Avance de Obra**

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Durante este mes de febrero de 2023, en la ejecución al proyecto se continúa evidenciando que el contratista está cumpliendo con su Plan de Gestión Social teniendo un acercamiento respetuoso a la comunidad beneficiada y/o impactada permitiendo información oportuna y clara. La comunidad que ha participado en las reuniones informativas han aclarado sus dudas y han mostrado aceptación hacia la obra; se continuará informando a la comunidad. Se proyecta la conformación del comité de veeduría ciudadana al culminar con las reuniones informativas y socialización del proyecto para el mes de marzo de 2023.

Neisler Abadia.

**NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARÍ**

**INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA DEL 4 DE FEBRERO AL 11 DE
FEBRERO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN,
CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y
GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”**

En el periodo comprendido desde el sábado 4 de febrero al sábado 11 de febrero de 2023, acompañé, evalué y aprobé las siguientes actividades propuestas por la trabajadora social María Fernanda Martínez del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 2000.13.05.003.2022.

- 1- Realicé acompañamiento en la socialización realizada a los comerciantes del turismo del sector de Puente Rojo, esta reunión fue interrumpida por algunas personas que se oponían a la presentación del contrato, manifestando que se debe hacer una consulta previa con la comunidad, estas personas se retiraron voluntariamente de la reunión, sin embargo, se continuó con la presentación a las personas de la comunidad que se quedaron para escuchar en que consiste la obra. En esta reunión la comunidad se rehusó a firmar la lista de asistencia.



- 2- Realicé visita a las instalaciones de la oficina de atención al usuario del consorcio Redes y Petaps Valle, evidenció que se cuenta con un espacio óptimo para la atención a la comunidad. La oficina se encuentra ubicada en la carrera 5 #10-46, segundo piso, centro – Costa Rica y está instalada desde el 23 de enero de 2023, la trabajadora social María Fernanda Martínez informa que en el balcón se instalará un pendón informativo para que la comunidad identifique la oficina, también informa que se instalará el buzón de sugerencias en un punto medio en el corregimiento de Puente Rojo.



- 3- Aprobé la programación realizada por la trabajadora social María Fernanda Martínez de las reuniones con diferentes líderes comunitarios del corregimiento de Puente Rojo para informar acerca de la obra "Construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca"
- 4- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con los representantes de la asociación del acueducto de Puente Rojo, Presidente- Diego Fernando Osorio, Vicepresidente- Horacio Gutiérrez, Fiscal -Alejandro Soto Osorio. En esta reunión se presentó en que consiste la obra y se aclararon las dudas que tenían acerca de la obra. El señor Diego Fernando Osorio manifestó que la comunidad está muy desinformada a cerca de la obra y que es un buen ejercicio el acercarse a los líderes como el para aclarar las inquietudes, se mostró positivo a cerca de la obra y solicitó estudiar la posibilidad de crear una compensación que le sirva a la comunidad en general, expresó 6 necesidades que tiene la comunidad.
 - a. Adecuación del tanque de almacenamiento que tiene mas de 60 años.
 - b. Viaducto
 - c. Adecuación del muro de la bocatoma que tiene aproximadamente 12 metros de longitud.
 - d. Hidrante
 - e. Salón comunitario en un terreno que tiene la comunidad
 - f. Completar la placa huella ya sea con concreto rígido o flexible hasta el puente.



- 5- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez, al ingeniero residente Darío Florez, y los representantes de la asociación del acueducto de Puente Rojo, Presidente- Diego Fernando Osorio, Vicepresidente- Horacio Gutiérrez, Fiscal -Alejandro Soto Osorio, en a la vista a la bocatoma del acueducto de Puente Rojo.



- 6- Aprobé el volante de invitación para la socialización presentado por la trabajadora social María Fernanda Martínez para la reunión con los habitantes de la vereda Bello Horizonte – Ginebra.



- 7- Participé de la reunión de comité de obra en las oficinas de Vallecaucana de Aguas. La trabajadora social María Fernanda Martínez presentó las propuestas hechas por el señor Diego Fernando Osorio - Presidente de la asociación del acueducto de Puente Rojo, se analizará su viabilidad.



Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

**INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA DEL 12 DE FEBRERO AL 18
DE FEBRERO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No.
2000.13.05.003.2022 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO
Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA
Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"**

Entre la semana del domingo 12 al sábado 18 de febrero de 2023, acompañé, evalué y aprobé las siguientes actividades propuestas por la trabajadora social María Fernanda Martínez del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 2000.13.05.003.2022.

- 1- Aprobé la programación de las reuniones con diferentes líderes comunitarios para realizar en esta semana.
- 2- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con la señora Yuri Liceth presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bello Horizonte – Ginebra, presentaron el proyecto y se acordó realizar una reunión con los habitantes de la vereda para el próximo 17 de febrero de 2023.
- 3- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez, en la reunión con el señor Jaime Orozco - presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Costa Rica, quien mostró aceptación hacia la obra.



- 4- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al inspector de obra- Jhon Janer Cuero, en la reunión con Millerlandy Sanabria – presidenta de la Junta de Acción comunal del corregimiento de La Floresta

y Bryan Rodríguez – representante de Asocomunal, En esta reunión se presentó en que consiste la obra y se aclararon las dudas que tenían acerca de la obra. La señora Millerlandy y el joven Bryan, muestran aceptación hacia la obra, manifiesta que esta obra beneficiará a la comunidad de Ginebra y varios de sus corregimientos y veredas, recomiendan realizar la reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal para presentar el proyecto y ofrecen el apoyo para la convocatoria desde Asocomunal.

- 5- Aprobé el volante de invitación para la socialización presentado por la trabajadora social María Fernanda Martínez para la reunión informativa para los habitantes del municipio de Guacaré y Ginebra.



- 6- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez en la vista al doctor Carlos Adolfo Tigreros - personero municipal de Ginebra, María Fernanda realiza la presentación de la obra y explica el desarrollo que ha tenido, el doctor Carlos Adolfo manifiesta que se ha enterado de algunas cosas y está interesado en asistir a las reuniones, es invitado a la reunión programada para el martes 21 de febrero y se enviará la invitación oficial.
- 7- Participé de la reunión de comité de obra iniciando con el recorrido por la planta de tratamiento de agua potable de Ginebra, el equipo técnico manifiesta que se va a presentar una propuesta de reubicación de entrada y salida para girarlo debido a la pendiente que tiene el terreno. Se continuó con la vista en Regaderos – Rio Guabas en el lugar donde se implantará la bocatoma, el equipo técnico realizó el recorrido y observó el lugar donde se construirá el desarenador. Finalmente se realiza la reunión en la oficina de atención al usuario, se presentó las reuniones realizadas y en la semana y se presentó la programación para la próxima semana.



- 8- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión informativa con los habitantes de la vereda Bello Horizonte – Ginebra, presentaron el contrato de la obra y se aclararon las dudas de la comunidad.



Neisler Abadia.

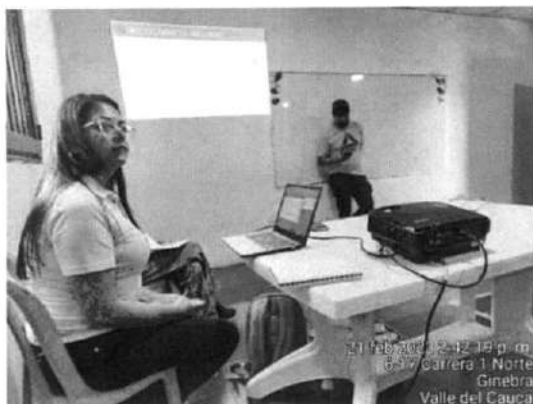
**NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI**

**INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA DEL 19 DE FEBRERO AL 25
DE FEBRERO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No.
2000.13.05.003.2022 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO
Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA
Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"**

Entre la semana del lunes 20 al domingo 26 de febrero de 2023, acompañé, evalué y aprobé las siguientes actividades propuestas por la trabajadora social María Fernanda Martínez del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 2000.13.05.003.2022.

- 1- Aprobé la programación de las reuniones con diferentes líderes comunitarios para realizar en esta semana.
- 2- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con las Juntas de Acción Comunal citadas para la socializarles del contrato 2000.13.05.003.2022, en esta reunión asistieron los presidentes y representantes de la mayoría de las Juntas de Acción comunal de los barrios, corregimientos y veredas del municipio de Ginebra, también asistió el personero de Ginebra - Doctor Carlos Adolfo Tigreros, quien manifestó que le hubiera gustado que a esta reunión hubiera asistido personas de Puente Rojo y el personero de Guacarí, para aclarar las inquietudes que tiene la comunidad a cerca de la obra. En general las personas que asistieron recibieron la información de buena manera y manifestaron que es una obra que necesitaban desde hace tiempo y los beneficiará, aclararon que la población en estos momentos de Ginebra es de 26.000 personas, también preguntaron si estas obras se verán reflejadas en el cobro del servicio del agua que hace Acuavalle y si va a aumentar el cobro.





- 3- Participé de la reunión de comité de obra iniciando con el recorrido por la planta de tratamiento de agua potable de Ginebra. Se continuó con el recorrido de la placa huella hasta la intersección donde se encuentra un tanque o PTAR, se analizará si existe la interferencia de una alcantarilla. Finalmente se realiza la reunión en la oficina de atención al usuario, se presentó la reunión realizada con los representantes de las JAC y se programará la reunión con el cabildo indígena para el próximo jueves 2 de marzo de la próxima semana. Se iniciará con las actas de vecindad el próximo martes 28 de febrero de 2023.





Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

**INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE
MARZO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN,
CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y
GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”**

Entre la semana del domingo 26 al sábado 4 de marzo de 2023, acompañé, evalué y aprobé las siguientes actividades propuestas por la trabajadora social María Fernanda Martínez del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 2000.13.05.003.2022.

- 1- Aprobé la programación de las reuniones con diferentes líderes comunitarios para realizar en esta semana.
- 2- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez en el levantamiento de las actas de vecindad, se inició con la aplicación de la Vereda Regaderos en las viviendas cercanas al punto donde se implantará la bocatoma descendiendo hasta el crucero después de Puente Amarillo, se observó que en varias viviendas no se encontraban sus habitantes, se tomó registro fotográfico de la parte exterior de la vivienda y se diligenció el acta de vecindad. Se recomendó entregar el volante de aviso de la visita para los próximos registros.



- 3- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con el cabildo indígena, los representantes del cabildo manifiestan que reconocen que es n proyecto necesario para mejorar la calidad del servicio pero solicitan que se haga la consulta previa, y que se haga con su ruta metodológica.



- 4- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión visita al señor Danilo vecino del sector de Regaderos, con el fin de presentarle el proyecto, manifiesta que su vivienda es inestable e insuficiente para soportar cargas de inestabilidad por excavación.



- 5- Realicé acompañamiento a la trabajadora social María Fernanda Martínez y al ingeniero residente Darío Florez, en la reunión con la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Rojo, en esta reunión el ingeniero Florez presentó el proyecto y los representantes de la JAC manifestaron que la comunidad no está de acuerdo con el proyecto y necesitan que vallecaucana de aguas y CVC les responda directamente a sus inquietudes porque no están de acuerdo con que se capte el agua en ese punto que está proyectado, quieren que se siga captando donde está actualmente la bocatoma y tampoco quieren que les dañen su placa huella.



- 6- Participé de la reunión de comité de obra iniciando con el recorrido por la planta de tratamiento de agua potable de Ginebra. Se continuó con el recorrido por la placa huella. Posteriormente se realizó la reunión en la oficina de atención al usuario, se presentó las actividades realizadas por el componente de gestión social y se realizaron observaciones. Se continuará con las actas de vecindad.



Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SERVICIO PRESTADO	2
INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVO	2
ALCANCE	2
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3
DESARROLLO DE ACTIVIDADES	3
REGISTRO FOTOGRAFICO	3
INSPECCIÓN	5
INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
REALIZACIÓN DE SIMULACROS	6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6

CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

1. INFORMACIÓN SERVICIO PRESTADO

CLIENTE	PROYECTO / ACTIVIDAD EJECUTADO	CONTRATO No. (Cuando Aplique)
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 2000.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA"	2000.13.12.005-2022

2. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO INTER GUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se aplican las medidas de seguridad en el trabajo.

3. OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE referente a temas de seguridad y salud en el trabajo para el inicio de la obra en el mes de febrero.

4. ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realizará labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las diferentes actividades durante el mes, y así dar inicio a la obra.

CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Socialización del proyecto a la comunidad	Se cuenta con la participación de la comunidad, y se amplía la información del proyecto, en especial el cronograma de ejecución, la priorización de las zonas a intervenir y los cierres viales.
Verificación de condiciones de salud	antes de iniciar la ejecución del proyecto se realiza encuesta de condiciones de salud a los ingenieros y personal de apoyo para identificar y/o controlar cualquier anomalía que pueda afectar o poner en riesgo la salud y las actividades a ejecutar

5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE OBRA	
	

CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

ACTIVIDADES DE OBRA	
	

Las CHARLAS realizadas en el mes se describen a continuación:

CUADRO ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de charlas / Capacitaciones	Dirigido a
Socialización del proyecto	6	Comunidad
Políticas de seguridad y salud en el trabajo y no alcohol, drogas y fumadores del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	2	Personal de obra
Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo.	2	Personal de obra
Definición de accidente y enfermedad laboral	2	Personal de obra
Protocolo de Bioseguridad Covid-19	2	Personal de obra

CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

5.3 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	FRECUENCIA	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LA ZONA	POR ACTIVIDAD	CADA USO	CADA USO

5.4 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR	
• Número de atenciones médicas comunes reportadas	0
• Días perdidos	0
• Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas	0
• Días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0



CONSORCIO INTER GUACARI	INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023
	Elaborado por: JULIANA MARULANDA	

5.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

Para el presente mes no se realizó simulacro.

5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Cumplir con los objetivos propuestos en el sg-sst dando cumplimiento con las actividades programadas.
- Se da cumplimiento con las normas de seguridad

Juliana Marulanda

JULIANA MARULANDA
SST INTERVENTORIA

ACTA No. 08

Fecha:	FEBRERO 03/23	Hora inicio:	14:00	Hora fin:	16:00
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCION SISTEMA CAPTACION, CONDUCCION				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ.				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAP				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	MIGUEL E. ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°:	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	REVISIÓN AVANCE COMPROMISOS ADQUIRIDOS
2	REVISIÓN ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN.
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
SE INICIA LA REUNIÓN POR PARTE DE LA ING. ANGELA MARIA OSORIO, SOLICITANDO INFORMAR POR PARTE DE ACUAVALLE QUIEN ASISTIRÁ A LA SOCIALIZACIÓN DE MAÑANA SÁBADO 04 DE FEB/23 EN PUENTE ROJO. SE INFORMA QUE ASISTIRÁ EL ING. CHACON.	
ASISTIRÁ TAMBIÉN LA CVC Y LLEVARÁ ALGUNAS PROPUESTAS ACERCA DE LOS SITIOS Y CAUDALES.	

DE TOMA. SE LES SOLICITARÁ ACLARACIÓN A ESOS PLANTEAMIENTOS PREVIOS A LA SOCIALIZACIÓN. SE LES HA SOLICITADO LLEVAR A SI MISMO CLARIDAD ACERCA DEL TEMA AMBIENTAL, DE CAUDALES, HIDROLOGÍA, ETC.

ACUAVALLE SOCIALIZARÁ EN DICHA REUNIÓN EL POR QUÉ EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS LAS OPCIONES DE RIO LULOS Y RIO FLAUTAS NO FUERON CONSIDERADAS APTAS Y LAS SOCIALIZACIONES QUE EN SU MOMENTO SE REALIZARON.

SE APOYARÁ LA REUNIÓN CON EL CONCEPTO Y LA EXPERIENCIA DEL ENCARGADO DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS ALREDEDOR DE LA CUENCA DEL RIO PANCE.

SE SOLICITA MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DANDO INICIALMENTE LA PALABRA A CNC Y AL INVITADO DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE PANCE.

POR PARTE DE C.V.C. ASISTIRÁ EL ING SEGUNDO FISCAL QUE EN HARÁ LA CORRESPONDIENTE PRESENTACIÓN VIA POWER POINT.

SE PROPONE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1 - SALUDO DE VALLECAUCANA
- 2 - PRESENTACION ASISTENTES
- 3 - PALABRA ALCALDE
- 4 - PALABRAS ASESOR
- 5 - PALABRA - PRESENTACION C.V.C.
- 6 - INTERVENCIÓN COMUNIDAD - A TRAVÉS REPRESENTANTES

EN LA NUEVA CASETA DE TÉCNICO OPERADOR EN LA PLANTA GINEIRA, SE ENCUENTRA QUE SU LOCALIZACIÓN PLANEADA INTERFIERE CON LA CASETA DE LA PLANTA ELÉCTRICA ACTUAL. SE EVALUARÁN OPCIONES CONSTRUCTIVAS O DE REUBICACIÓN DE LA NUEVA PLANTA CASETA.

SE CONTINÚA EL TRABAJO DE LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA, DEL TRAZADO DE TUBERÍA.

CONTINUAN LOS AJUSTES DEL ÁREA ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA Y APORTARÁ SUS OPCIONES A INCLUIR EN EL INFORME CERD., ACERCA DE VIADUCTOS, Y OTRAS ESTRUCTURAS.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA UN CHEQUEO A LOS CÁLCULOS DE CRECIDA DE CAUDALES QUE PUEDEN AFECTAR LA BOCATOMA.

SE RECALCA LA IMPORTANCIA DE QUE ACUAVALLE AGILICE LA REALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA PLANTA DE GUARDE. IGUALMENTE QUE A TRAVÉS DE ACUAVALLE SE SOLICITE EL ESPACIO PARA LA SOCIALIZACIÓN CON EL MUNICIPIO PICHICHÍ.

SE PROGRAMA PARA EL DÍA MARTES 07-FEB/23 RECORRIDO A LAS OPCIONES DE TRAZADO DE LAS LINEAS DE ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN, A PARTIR DEL REPLANTEO TOPOGRÁFICO REALIZADO.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	SOCIALIZACION	V/CAUCANA - CONTRAM.	04-FEB/23
2	REVISION Y CONCEPTO DISEÑO	CTTISA. - INTERV.	
3	APROB DISEÑOS PTAP CAACARI	ACUAVALLE	APROX. 2 MES.
4	SOCIALIZACION PLANCHI	ACUAVALLE	X DEFINIR
5	INFORME INICIAL (CERO)	CTTISA.	X DEFINIR

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Hora:	Lugar:
--------	-------	--------

FIRMA ACTA




SE ANEXA	LISTADO ASISTENCIA.	
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	03	02	2023	HORA INICIAL: 14:00	HORA FINAL: 16:00	LUGAR: OF. CONINGENIERÍA
	DD	MM	AAAA			

OBJETIVO: REVISIÓN DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISIÓN ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN REUNION DE MAÑANA 04 FEB/23

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	M ^a Valentina Belalcázar P.	Contratista	3163123631	valentinab999@outlook.es	
2	Iván Boshadow Benavides	Ordenador	3188708906	boshadow@va.gov.co	
3	Farid Manteneiro Ch.	ACVAVALLE	3128504764	faridmanteneiro@va.gov.co	
4	Alejandro Estrada R.	INTERVENTORA	3155912130	alestrada@hotmail.com	
5	Lina Marcela Buitrago L.	Contratista	3006204651	linambuitragobondano@gmail.com	
6	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016298199	Ing.darioflorez@outlook.com	
7	Angela María Osorio Ortiz	Vallecaucana	3162413861	ama@eva.gov.co	
8	Dileth Ríos Volencio	Vallecaucana	3106270910	dru@eva.gov.co	
9	Julian ANDRADE +1.	INTERVENTORA	3507682311	Consortio Interaguacari@gmail.com	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACTA No. 10

Fecha:	FEB 10/22	Hora inicio:	14:00	Hora fin:	16:00
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	VALLECAUCANA DE AGUAS				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PAPS				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARI				
Supervisor:	MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	REVISIÓN DOCUMENTOS CONTRATO
2	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
LA ING. ANGELA MARÍA OSORIO, PRESENTA AL DIR. JURIDICO	
LUIS EDUARDO PINEDA QUE EXPLICA LAS RAZONES	
QUE HACEN NECESARIO SUSCRIBIR UN OTRO SI	
ACLARATORIO PARA CORREGIR ERROR DE DIGITACIÓN EN	
EL ACTA DE INICIO Y DE FORMATO.	
SE HACE LECTURA DE UN MODELO DE OTRO SI.	
SE SOLICITA LA TRAMITACIÓN DEL OTRO SI PLANTADO	
UNA VEZ EVALUADO Y SUBIR A SGC-MECI POR LA	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

INTERVENTORIA. (SE CONSULTARÁ ESTE PUNTO DE CARGA AL SECOP 2)
EL COMPONENTE SOCIAL INFORMA LA NUEVA
ESTRATEGIA CON LOS VECINOS, EXPLICANDO LOS
VERDADEROS ALCANCES DEL PROYECTO DE MANERA
PERSONALIZADA Y NO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN
TERGIVERSADA DE PERSONAS DEL SECTOR O INCLUSO
AJENAS A LA ZONA. PARA EL (MIÉRCOLES) ^{MARTES} 14 DE FEB/23
SE REALIZARÁN 4 SOCIALIZACIONES EN LA ZONA
CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. PRESENTARÁN UNA
PROPUESTA DE CONTRAPRESTACIÓN CON 6 POSIBLES OPCIONES:
- MEJORAR TANQUE AGUA (260 USUARIOS)
- MEJORAR MURO EN BOCATOMA.
- VIADUCTO 60-70 MTS. PARA TUBERÍA.
- BY PASS (HIDRANTE) PARA SUMINISTRO EN ÉPOCA SECA
ALA FUTURA RED. (POSIBLE DESCARTE POR MEDICIONES
DE MACROMEDIDOR U OPERACION NO TÉCNICA)
- CONSTRUIR UN SALÓN COMUNITARIO
- 250 ML. APROX. DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA,
CONCRETO, ETC. HASTA LLEGAR A PUENTE AMARILLO.

PARA EL DÍA MARTES 14 SE HA PROGRAMADO
REUNIÓN EN VALLECAUCANA DE AGUAS CON ACUAVALLE
CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA DAR LUZ AL TEMA
DE RESPONSABILIDADES EN LOS PERMISOS AMBIENTALES
NECESARIOS

EL CONTRATISTA DENTRO DE SU PROCESO DE REVISIÓN
DE DISEÑOS PARA EL INFORME CERO ENCUENTRA
INQUIETUDES QUE SOLAMENTE DEBERÍAN SER TRATADAS
CON EL DISEÑADOR. VALLECAUCANA DE AGUAS
DISPONERÁ UNA MEDIDA DE TRABAJO PARA CONTRASTAR
LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN CAMPO.

PENDIENTE LA SOCIALIZACIÓN CON EL INGENIERO
DICHICHÍ, ACTIVIDAD EN QUE ACUAVALLE SERÍA

EL SOLICITANTE.

EL CONTRATISTA ESTA EN LAS AVERIGUACIONES CON LAS ALCALDÍAS PARA LOS PERMISOS DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS RURALES A INTERVENIR. PENDIENTE LA RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE ACERCA DE LA UBICACIÓN DE LAS VALLAS INFORMATIVAS.

LA SUPERVISIÓN SOLICITA LAS HOJAS DE VIDA DE LOS NUEVOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PARA SU VALIDACIÓN. AL IGUAL QUE SOLICITA A CONTRATISTA E INTERVENTORÍA LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DE SEG. SOCIAL.






CONTINUA LA ESPERA PARA LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE ACUAVALLE DE LOS DISEÑOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PLANTA GUACARÍ.

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Acta Inicio - Otro sí	CONTRAT. - INTERV.	
2	SOCIALIZACIONES JAC.	CONTRAT - INTERV.	14-FEB/23
3	PERMISOS AMBIENTALES	ACUAV.-VALLEC.-CTISO	14-FEB/23
4	MESA TRABAJO CON DISEÑADOR	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
5	SOCIALIZACION ING PICHICHÍ	ACUAVALLE	POR DEFINIR
	UBICACIÓN VALLAS	VALLECAUCANA	POR DEFINIR

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha: 17 FEB	Hora: 9:00	Lugar: P.A.C. COSTA RICA-GINEB

FIRMA ACTA		
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	10	02	2023	HORA INICIAL: 14:00	HORA FINAL: 16:00	LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS	
	DD	MM	AAAA				
OBJETIVO: REVISIÓN DOCUMENTOS DEL CONTRATO. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
ASISTENTES							
Nº	Nombre			Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Heister Abadia Londoño			Interventoría	3206569048	heisterad@gmail.com	
2	Ivan Boshda Benavides			Dirección	318220826	ibosha@vallecauca.gov.co	
3	ALEJANDRO ESTRADA			Interventoría	3157912130	alestrada@vallecauca.gov.co	
4	Maric fide m martinez B			Consortio	3162534994	Redes.Par@gmail.com	
5	Lina Marcela Buitica Londoño			Contratista	3006204651	consorciodredesyptps@gmail.com	
6	John Eduar Diaz Obonaga			Contratista	3226256641	amb.coningenieria@gmail.com	
7	Dario Enrique Florez Trujillo			Contratista	3016258199	ing.darioflorez@outlook.com	
8	Dileth Rios Valencia			Vallecaucana	3106270910	dvr@eva.gov.co	
9	Angela Maria Osorio Ortiz			Vallecaucana	3162413861	ama@eva.gov.co	
10	Lina Marcela Buitica Londoño			Interventoría	3213563800	lmbuitica@gmail.com	
11	JULIAN ANDRADE H.			INTERVENTORIA	3507682311	consorciointergobar.gov.co	
12							
13							
14							
15							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-6
			Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 26/09/2013
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Página: 1 de 3

ACTA No. 11

Fecha:	14-FEB-/23	Hora inicio:	14:30	Hora fin:	16:30
Contrato N°.	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN-CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA-GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	⊗ REVISIÓN TEMAS RELACIONADOS CON LOS
2	PERMISOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
-INICIA LA REUNIÓN LA ING. ANGELA OSORIO.	
EL ING. IROLDIO ANDRES GOMEZ DE ACUAVALLE COMIENZA	
RELATANDO EL CRONOGRAMA DEL HISTORIAL DE LAS	
SOLICITUDES DE PERMISOS PARA EL PROYECTO	
SE REALIZA REVISIÓN A LA RESOLUCIÓN CVC	
0740- 0742 0001430 en LA CUAL SE RESOLVIÓ	
OTORGAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	
EL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, CON 17 PUNTOS	

11



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

DE OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y REQUERIMIENTOS
AL PROYECTO.

EN DICIEMBRE PASADO ACUAVALLE SOLICITÓ UNA
RENOVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, LA CUAL YA SE ENCUENTRA
VENCIDA, ANTE LA DAR CENTRO SUR-BOGA C.V.C.

C.V.C. INDICÓ EN SU MOMENTO QUE PARA LA RENOVACIÓN
DE LA LICENCIA ESTABA ELABORANDO UN NUEVO CONCEPTO
DE VISITA A PARTIR DE LA REALIZADA PARA EFECTOS
DE LA RENOVACIÓN, SIN TENER A LA FECHA RESPUESTA
DE LOS ENCARGADOS DE C.V.C.; AUNQUE ES DE SUPONER
QUE INCLUIRA LAS MISMAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN
ORIGINAL. ENTRE LAS CUALES SE INCLUYEN:

- CONSTRUIR VERTEDERO TIPO AZUD
- PRESENTAR UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
- ESTUDIO DE SOCACCIÓN - TR.

LO ANTERIOR SERÍA NECESARIO SEGUN C.V.C., PARA
OTORGAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE.

EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL; SOLICITADO
POR ACUAVALLE SE ENCUENTRA IGUALMENTE VENCIDO Y
ESTARÍA PENDIENTE DE TRAMITAR NUEVAMENTE POR PARTE DE
ACUAVALLE COMO PROPIETARIO DE LAS PLANTAS, A LA ESPERA
DE QUE OBLIGACIONES DEAN ASIGNADAS Y POR CUANTO
TIEMPO SU SEGUIMIENTO.

LA C.V.C. EN CONVERSACIONES PREVIAS CON ACUAVALLE
HA SOLICITADO LA FORMALIZACIÓN DE UN CONVENIO
ENTRE ACUAVALLE Y VALLECAUCANA DE AGUAS, QUE DE
CLARIDAD EN CUANTO A QUIÉN SERÍA EL RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DE LAS RESOLUCIONES QUE SE OTORGUEN
UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS, PARA EFECTOS DE SU
SEGUIMIENTO.

CON EL FIN DE AYUDAR EN LOS TRÁMITES, TANTO
VALLECAUCANA COMO EL CONTRATISTA, CON AUTORIZACIÓN
DE ACUAVALLE, REALIZARÁN GESTIONES ANTE C.V.C. PARA
CONSULTAR EL ESTADO DE LOS TRÁMITES Y

ALLEGAR LO NECESARIO PARA SU PRONTA EXPEDICIÓN.

EL ING. MIGUEL ZULUAGA UNA VEZ INFORMADO DE LAS ACTUACIONES DE LAS PARTES Y DE LO CONSIGNADO PREVIAMENTE EN LA RESOLUCIÓN CVC DE OCUPACIÓN DE CAUCE, SOLICITA COORDINAR UNA REUNIÓN ENTRE CVC, LA CONSULTORÍA DE VALLECAUCANA, VALLECAUCANA DE AGUAS, ACUAVALLE, CONTRATISTA E INTERVENTORA, PARA QUE SE EXPLIQUEN LOS PARÁMETROS Y RESULTADOS DE LOS DISEÑOS Y VALIDAR SI LAS SOLICITUDES DE CVC TIENEN CABIDA.

IGUALMENTE SOLICITA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN, REALIZAR CONSULTAS EN LA DAR-CVC. BUGA Y CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DEL PROCESO.

TAMBIÉN REALIZAR OFICIO AL DISEÑADOR DE VALLECAUCANA PARA INFORMARLE DE LAS CONDICIONES DE LA RESOLUCIÓN CVC. Y VERIFICAR LA PERTINENCIA DE ESAS OBLIGACIONES.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNIÓN C.V.C.-ACUAVALLE - CONSULTORIA	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
2	REUNIÓN C.V.C.-(DAR BUGA) - VALLECAUCANA	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
3	Oficio A LA CONSULTORIA	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
4	TRAMITE) - ESTADO DE LOS MISMOS	ACUAVALLE	POR DEFINIR
5	Apoyo EN LA GESTION PERMISOS	CONTRATISTA	

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Hora:	Lugar:
--------	-------	--------

FIRMA ACTA

SE ANEXA	LISTADO ASISTENCIA.	
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	14	02	2023	HORA INICIAL: 14:30	HORA FINAL: 16:30	LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS
	DD	MM	AAAA			

OBJETIVO: REVISIÓN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PERMISOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES.

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ivan Borda Benavides	Interventor	3121208766	iborda@vallecauca.gov.co	[Firma]
2	Lina Marcela Buitrago L.	Contratista	3006204651	consorcioedezyp@ps@gmail.com	[Firma]
3	John Edgar Diaz Obonaga	Contratista	3226256641	amb.coningenieria@gmail.com	[Firma]
4	Angela Maria Osorio Ortiz	Vallecaucana	3162413861	amo@vallecauca.gov.co	[Firma]
5	JULIAN ANDRADE HENAO	INTERVENTORIA	3507682311	Consorciointerguacari@gmail.com	[Firma]
6	VIRTUALMENTE :				
7	ING. ANDRES GOMEZ	ACUAYALLE	311-7391480		
8	ING. FARID MONTENEGRO	ACUAYALLE			
9					
10	TAMBIÉN PARTICIPA EL ING.				
11	MIGUEL ZULUAGA SUPERVISOR				
12	CONTRATO.				
13					
14					
15					

ACTA No. 12

Fecha:	17-FEB / 23	Hora inicio: 9:00	Hora fin: 13:30
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN		
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS.		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ		
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA		

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE INICIA EL COMITÉ EN LA PTAP. GINEBRA, EN LA QUE SE EJECUTAN LABORES DE EXCAVACIÓN PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SE REALIZARÁ PARA ESTA ACTIVIDAD, UNA LOCALIZACIÓN TRATANDO DE CAMBIAR LA ALINEACIÓN DEL TANQUE DE TAL FORMA QUE NO SE AFECTE POR SU CONSTRUCCIÓN LA CASETA DE LA PLANTA ELÉCTRICA IGUALMENTE SE HACE NECESARIO REUBICAR LAS CAJAS SANITA-

RIAS DE LA ANTERIOR CASETA YA DEMOLIDO PARA REALIZAR LA CONEXION DE LA CASA QUE SIEVE N SERVICIO.; EVALUANDO IGUALMENTE LA POSICION Y ALTURA DE LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y TUBERIA DE CLORO.

INFORMA EL CONTRATISTA QUE EL ACERO FIGURADO PARA EL TANQUE YA FUE SOLICITADO AL PROVEEDOR. MANIFIESTA IGUALMENTE QUE CONTINUA LA REVISION POR PARTE DEL INGENIERO ESTRUCTURAL DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS QUE FORMULARA SUS OBSERVACIONES, AUNQUE ADELANTE QUE EN SU REVISION DE VIADUCTOS PARA TUBERIA NO CHEQUEEN ESTRUCTURALMENTE.

CONTINUA LA MATERIALIZACION TOPOGRAFICA DEL TRAZADO DE LAS TUBERIAS Y SE INFORMA QUE EL RECORRIDO DISENADO YA INCLUIA EL PASO EN DIAGONAL, EVITANDO EL PASO POR LA GLORIETA DE ENTRADA AL INGENIO PICHICHÍ.

EN EL SITIO DE BOCATOMA SE VISUALIZA LA NECESIDAD DE EJECUTAR Y DISEÑAR ANCLAJES Y PROTECCIONES PARA LAS ESTRUCTURAS DE BOCATOMA Y DESARENADOR; SOBRETUDO ACUAVALLE HACE LA RECOMENDACION Y SOLICITUD DE DISEÑAR LOS ANCLAJES DE LA BOCATOMA AL FONDO Y ORILLAS DEL CAUCE, DADA LA NATURALEZA TORRENCIAL DEL RIO GUABAS EN EPOCA INVERNAL. SE ANALIZARA ESTA SOLICITUD. IGUALMENTE SE DEBE TENER EN CUENTA COMO TRABAJAR EN LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA EN FASES, ENCAUSANDO EL RIO PARA PODER EJECUTAR LAS OBRAS. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA PROYECTA DE METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE ESTAS ESTRUCTURAS.

SE EVALUA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL TRAZADO DE LA TUBERIA A LA SALIDA DEL DESARENADOR EN APROX. 250 ML, DE MANERA

QUE SE EVITE SU ALINEAMIENTO EN LOS PATIOS DE TRES VIVIENDAS. EL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PERMITIRÁ DEFINIR ESTE TEMA Y ALGUNA POSIBLE AJUSTE A LA POSICIÓN DEL DESARRENADOR.

CONTINUA EL COMITÉ EN EL PAC. COSTA RICA.

LOS COMPONENTES SOCIALES INFORMAN DE LAS SOCIALIZACIONES REALIZADAS CON LA JAC. BELCHORIZONTE (PUENTE ROJO - COSTA RICA) E INDICA QUE LA COMUNIDAD SE MANIFIESTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, Y COMO POSIBLE ACTIVIDAD DE COMPENSACION DE PARTE DEL PROYECTO SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE SU ACTUAL TANQUE DE TRATAMIENTO DE SU ACUEDUCTO COMUNITARIO.

PARA EL MARTES 21 FEB / 23 SE HA PROGRAMADO SOCIALIZACIÓN CON LOS PERSONEROS DE GINEBRA Y GUACARÍ, LÍDERES DEL SECTOR, JAC; REUNIÓN EN LAS QUE TAMBIÉN ESTÁ EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA CONFORMACION DE LA VEREDURIA CIUDADANA

SE HAN REALIZADO CONTACTOS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS QUE SERÁN INVITADOS POR SEPARADO Y EN RECINTO CERRADO PARA SER INFORMADAS DEL PROYECTO SIN DAR MÁS ALCANCE QUE ESE.

EL COMPONENTE AMBIENTAL ESTÁ PREPARANDO LA INFORMACIÓN PARA COORDINAR CON ACUAVALLE Y TRAMITAR FORMATOS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, ETC ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LO REFERENTE A APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACION DE CAUCE. POR LO PRONTO EL CONTRATISTA SOLICITA PODER REALIZAR EXCAVACIONES EN ÁREAS DONDE NO

HAYA AFECTACIÓN A INDIVIDUOS ARBOREOS

LA INTERVENTORIA SOLICITA ANTE LA PROXIMA LLEGADA A OBRA DE MATERIALES, ACONDICIONAR LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE ACERO, FORMALETAS METÁLICAS ETC., DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS.

VALLECAUCANA DE AGUAS ESTA GESTIONANDO REUNIÓN CON LA CONSULTORIA Y LOS ASESORES PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS Y LOS CAMBIOS POSIBLES QUE PUEDA TENER O LOS CAMBIOS QUE SE SOLICITA POR CVC, PARA OTORGAR LA OCUPACIÓN DE CAUCE.

LAS VALLAS ESTÁN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACUERDO A LAS CORRECCIONES SOLICITADAS.

EL ACTA DE INICIO Y SU CORRECCIÓN ESTA EN EVALUACIÓN POR LOS ASESORES JURÍDICOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARA EL PRÓXIMO MARTES 21 FEB/23 SE PROGRAMARÁ REVISIÓN DE TOPOGRAFÍA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA, VERIFICANDO LOCALIZACIÓN, TRAZADOS, ALTIMETRÍAS.

VALLECAUCANA DE AGUAS INFORMARÁ A LAS ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ ACERCA DE LA EROSIÓN DE ORILLO DEL CAUCE Y DE LOS TALUDES EN LA VÍA EN EL TRAZADO DE LA TUBERÍA EN EL SECTOR PUENTE ROJO, PUENTE PIEDRA (REGADERO), JUNTAS) IGUALMENTE SERÍA INFORMADA LA GOBERNACIÓN.

LA SUPERVISIÓN SOLICITA LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y LA IDENTIFICACIÓN DE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO.

PRÓXIMO COMITÉ 24 FEB/23 9:00 AM, PTAP GINEBRA.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	EVALUACION DATOS TOPOGRAFIA	CTTISTA - INTERV.	24 FEB / 23
2	CONCLUSIONES REVISIÓN DISEÑO	CTTISTA	
3	SOCIALIZACION PERSONERIA	CTTISTA - INTERV.	21 FEB / 23
4	REUNION DISEÑADOR - CUC-AGUAS	VALLECAUCANA	X DEFINIR
5	INFORMAR ALCALDIA EROSIONEN	VALLECAUCANA	X DEFINIR

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 24 FEB / 23

Hora: 9:00

Lugar: PTAP GINEBRA

FIRMA ACTA

SE ADJUNTA LISTADO ASISTENCIA

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:





Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	17	02	2023	HORA INICIAL: 9:00	HORA FINAL: 13:30	LUGAR: PIAP GINEBRA - BOCAITONA PAC. - COSTA RICA.
	DD	MM	AAAA			

OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alvaro Estrada	Interventoría	3155912130	alestrav@uotmail.com	
2	Daleth Rios Valencia	Vallecaucana	3106270910	dsv@ca.gov.co	
3	Angela María Osorio Ortiz	Vallecaucana	3162413861	amo@ca.gov.co	Angela O.
4	Lina Marcela Buitrago	Contratista	3006204651	linambuitragobuitrago@gmail.com	Ju. Y. B.
5	Bola Tatiana Rojas C.	Interventoría	3145126539	tati2520@yahoo.com	
6	Iván Rosaldis Benavides	Interventoría	3111207766	ivan.rosaldis@gmail.com	
7	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016258199	Consorcio Redes y Ptas@gmail.com	
8	Jair Andrés Flechas Pinto	Interventoría	3165798621	jafp728@gmail.com	
9	Juliana Marcelanda	Interventoría	3213563800	jmarcelanda2@gmail.com	Juliana Marcelanda
10	JULIÁN ANDRADE +I.	INTERVENTORIA	3507682311	consorciointerguacari@gmail.com	AP
11					
12					
13					
14					
15					

ACTA No. 13

Fecha:	20 FEB / 23	Hora inicio:	14:00	Hora fin:	16:00
Contrato N°.	2000-13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCION SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN.				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES y PTAPS.				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXO LISTADO ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	SOCIALIZACION INGENIO PICHICHÍ.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
INICIA LA REUNION LA ING. ANGELA MARIA OSORIO, INFORMANDO ACERCA DE LA REUNION MANTENIDA CON LA CVC-BOGA. SE INFORMA QUE LOS TRÁMITES DE PERMISOS AMBIENTALES SERÁN TRAMITADOS COMO UNA RENOVACIÓN DE LOS ANTERIORES, CUYAS RESOLUCIONES MUY PROBABLEMENTE MANTENGAN LAS ANTERIORES OBLIGACIONES PARA SU OTORGAMIENTO. SOLICITA AL CONTRATISTA TENER	

EN CUENTA LA VERIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRA LA BOCATOMA (ALCALDAS O TERCEROS) Y TRAMITAR ANTE LOS PROPIETARIOS LA AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRAS INDICA QUE EL APROVECHAMIENTO FORESTAL QUE ESTÁ EN TRÁMITE ES PARA LA PTAP GINEBRA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE, PERO EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CUANTO ANTES EL TRÁMITE DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LAS OBRAS DE DE BOCATOMA Y DESARENADOR.

SE LE REALIZA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL ING. ALEJANDRO DURÁN DEL INGENIO PICHICHÍ, DE LOS OBJETIVOS QUE SE BUSCAN CON EL PROYECTO Y DE LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TUBERÍAS EN ALGUNOS PREDIOS DEL INGENIO. EL INGENIERO DURÁN SOLICITA LOS PLANOS EN CAD DEL PROYECTO PARA VERIFICAR POSIBLES CRUCES CON DUCTOS DEL INGENIO DE LA NUEVA TUBERÍA.

LA DRA. BEATRIZ HINCAPIE ASESORA JURÍDICA DE VALLECAUCANA DE AGUAS, MANIFIESTA QUE LA FORMALIZACIÓN DE LA SERVIDUMBRE DEBE PARTIR DE UNA VOLUNTAD DEL INGENIO DE CEDER DE MANERA VOLUNTARIA GRATUITA Y A PERPETUIDAD, MANIFIESTA PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN SUS PREDIOS. POR PARTE DE VALLECAUCANA Y QUE CONCLUYE CON LA PROTOCOLIZACIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA.

EL ING. DURÁN INDICA QUE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DEL INGENIO, UNA VEZ TENGA LA INFORMACIÓN Y LA SOLICITUD FORMAL DE LA SERVIDUMBRE, MEDIANTE OFICIO Y ANEXOS.

LA SUPERVISIÓN PREPARARÁ EL OFICIO SOLICITANDO LA SERVIDUMBRE AL INGENIO, FORMALIZANDO LA SOLICITUD.

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	• ENVÍO PRESENTACIÓN, INFORMACIÓN CTTISTA		
2	Y PLANOS DEL TRAZADO ALINGENIO : SUPERVISIÓN, X DEFINIR		
3	1		
4	• OFICIO SOLICITANDO SERVIDUMBRE		
5	AL INGENIO PICHICHÍ : SUPERVISIÓN X DEFINIR		

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA		
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 20 02 2023
DD MM AAAA

HORA INICIAL: 14:00 HORA FINAL: 16:00

LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS.

OBJETIVO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN GINEBRA - GUACARÍ; AL ING. PICHICHÍ.

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Lina Marcela Buitica L.	Contralista.	3006204651	linambuitica@ondunogovci.com	Lina M.B.
2	Gina L. Lopez Paredes	Contratista	3156213559	gina.lopez_ing@gmail.com	Gina Lopez
3	JULIAN ANDRADE +J.	INTERVENTORIA	3507682311	consorciointerguacarí@gmail.com	Julian Andrade
4	Angela Maria Osorio Ortiz	Vallecaucana.	3162413861	amo@eva.gov.co	Angela Osorio
5	Alejandro Durán S.	Ing. Pichichí	3155604871	aduran@ingcniopichichí.com	Alejandro Durán
6	Leonardo Adrian Chacon M.	Acuavalle.	3128342115	lchacon@acuavalle.gov.co	Leonardo Chacon
7					
8	ASISTE LA DRA BENTRIZ				
9	HINCAPIÉ - VALLECAUCANA DE AGUAS.				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: FO-PDA 2.1-6
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 1 de 3

ACTA No. 14

Fecha:	24 FEB/23	Hora inicio:	9:00	Hora fin:	11:45
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZUWAGA				

PARTICIPANTES		
Nº.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE DA INICIO AL COMITÉ EN LA PTAP GINEBRA.
SE CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE EN
ESTE MOMENTO A UNA COTA PROMEDIO DE EXCAVACIÓN
DE 1.80 - 2.00 M DE PROFUNDIDAD (APROX. 45-50%)
DE LA EXCAVACIÓN, CONTINÚA LA VERIFICACIÓN DE
COTAS Y ALINEACIONES DEL TANQUE Y LAS TUBERÍAS
INDICADAS EN LOS PLANOS, CON SU MATERIALIZACIÓN

TOPOGRÁFICA EN SITIO. A PARTIR DEL INICIO DE LA PRÓXIMA SEMANA SE VINCULA MAESTRO Y OFICIAL DE OBRA PERMANENTE QUE REALIZARÁ LAS LABORES DE TRASLADO DE TUBERÍAS Y CAJAS SANITARIAS EXISTENTES EN EL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL TANQUE, REUBICÁNDOLAS PARA QUE SIGAN EN SERVICIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA.

IGUALMENTE HAY TOPOGRAFÍA PERMANENTE PARA EL CONTROL DE COTAS Y ALINEAMIENTOS EN LA PIAP GINEBRA Y VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A GUACARÍ. MEDIANTE OFICIO, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LAS OPCIONES DE REUBICACIÓN DEL TANQUE (PARA NO AFECTAR LA PLANTA ELÉCTRICA) Y DE LA CASSA DE OPERADOR A CONSTRUIR EN LA PIAP GINEBRA.

CON BASE EN LO INFORMADO POR LA COMUNIDAD EN LA PASADA SOCIALIZACIÓN, SE REALIZA VISITA A TANQUE SÉPTICO COMUNITARIO EN PUENTE ROJO SECTOR CHIPICO Y SE OBSERVA CABEZA DE ALCAÑALILLA Y TUBERÍA QUE ABASTECA LA VÍA Y QUE PODRÍA INTERFERIR CON LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA. SE JALFICARÁ TOPOGRÁFICAMENTE. EN ESE MISMO SECTOR, EL CONTRATISTA HA PODIDO EXPLORAR UNA VÍA ALTERNA EN LA QUE PUEDE SER FACTIBLE INSTALAR LA TUBERÍA SIN CAUSAR TANTA AFECTACIÓN A LA PLACA HUELLA Y CONCRETO DE LA VÍA PRINCIPAL DE PUENTE ROJO. SE TOMARÁN DATOS Y SE INFORMARÁ LO OBSERVADO.

CONTINÚA COMITÉ EN OFICINA PAC COSTA RICA.

SE REALIZA CONEXIÓN TELEFÓNICA CON LA ING. ANGELA MARÍA OSORIO QUIEN INFORMA EN EL COMITÉ QUE VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZÓ REUNIÓN ENTRE LA C.V.C. (FUNCIONARIOS QUINTERO Y BEJARANO), EL CONSULTOR DISEÑADOR DE VALLECAUCANA DE AGUAS (FERNANDO MORENO) Y LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO EN DICHA REUNIÓN C.V.C. MANIFESTÓ QUE ANALIZADOS LOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

y GEOLÓGICOS APORTADOS POR EL CONSULTOR, ENCUENTRA DISCREPANCIAS, PARA LO CUAL SUGIERE LA REALIZACIÓN DE UNAS NUEVAS EXPLORACIONES QUE COMPLEMENTEN LAS REALIZADAS EN EL ESTUDIO, QUE CLARIFIQUEN LA ESTRATIGRAFÍA ACTUAL DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN PROYECTADAS Y PERMITAN AL CONSULTOR ELABORAR LOS AJUSTES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS; DE ACUERDO A LO QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROYECTA COMO REQUISITOS EN LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO, LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA CONSIDERAN PERTINENTE ESTA SUGERENCIA Y LA SUPERVISIÓN INFORMA QUE EN LA MENCIONADA REGIÓN EL CONSULTOR DE VALLECAUCANA DE AGUAS SE MANIFIESTA DISPUESTO A ACOMPAÑAR LA SOLUCIÓN A LO SOLICITADO POR CVC EN CUANTO A LA CIMENTACIÓN PROYECTADA PARA LAS ESTRUCTURAS, SOCACACIÓN Y LOS DEMÁS ASUNTOS PLANTEADOS, A PARTIR DE LOS DATOS DE ESTAS EXPLORACIONES ADICIONALES PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS. SE COINCIDE POR LAS PARTES DEL COMITÉ, QUE LOS SITIOS DE EXPLORACIONES DEBEN SER INDICADOS POR EL CONSULTOR, ASÍ COMO SU NÚMERO Y ALCANCE; PARA LO CUAL EL CONTRATISTA TOMARÁ CONTACTO CON EL ING. MORENO PARA PROGRAMAR CON EL Y CON LA GERENCIA ANTELACIÓN LO NECESARIO. A PARTIR DE LO SOLICITADO POR LA CONSULTORA, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UNA PROPUESTA FORMAL DE LAS CONDICIONES Y VALORES DE ESTOS TRABAJOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA SU CONSIDERACIÓN. VALLECAUCANA DE AGUAS MANIFIESTA QUE LA RESOLUCIÓN DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE QUE PROYECTA CVC, ESTARÁ ASERTA A CONSIDERAR LAS OPCIONES TÉCNICAS QUE APOYE ESTE TRABAJO. LOS TRÁMITES DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LA PIAP GINEBRA ESTÁN SIENDO ADELANTADOS EN COORDINACIÓN CON EL ING. IROLDI ANDRÉS GÓMEZ.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: *

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LAS
VALLAS CON EL MODELO YA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.
SE TIENEN COMO POSIBLES UBICACIONES LA PIAP DE GUACARI
Y PARA GINEBRA EL SECTOR DE PELLO HORIZONTE.
DADO QUE EL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN DEL TANQUE
DE GINEBRA SE ESTA DISPONIENDO EN UNA FINCA DEL
SECTOR, SE SOLICITA AL CONTRATISTA POR LA INTERVENCIÓN
CERTIFICAR QUE NO SE ESTÁN AFECTANDO CUERPOS DE
AGUA O INDIVIDUOS ARBOREOS, QUE NO SE ESTÁ AFECTAN-
DO EL MEDIO AMBIENTE Y POR ESCRITO TAMBIEN LA
APROBACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN EL
PREDIO DEL PROPIETARIO.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	CONTACTAR AL DISEÑADOR-CONSULTOR	CONTRATISTA	24-FEB/23
2	OFICIO A PICHICHI - SERVICIOS	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
3	OFICIO A ALCALDÍAS- PROSDUE	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
4	MEMO DE TRABAJO CONSULTOR	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
5	AGUAS VERLINDAD	CONTRATISTA	28-FEB/23
	INSTALACION VALLAS	CONTRATISTA	PRON. SEMANA.

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 03 MAR /23 Hora: 09:00 Lugar: P.R.P. GINEBRA

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 24 02 2023
 DD MM AAAA

HORA INICIAL: 9:00

HORA FINAL: 11:45

LUGAR: PDA COINBBRA - OFIC. COSTA - RICA

OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Lina Marcela Buitrago Londoño	Contratista	3006204651	comprovisorederyptps@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2	Nestor Abadía Londoño	Interventoría	320656998	nestorabadia@gmail.com	<i>[Firma]</i>
3	John Edgar Díaz Obonaga	Contratista	3226256691	amb.coningenieria@gmail.com	<i>[Firma]</i>
4	Lia Fernanda Martínez B	Contratista	3162534951	ledes.pgr@gmail.com	<i>[Firma]</i>
5	José María Martínez	Contratista	3154856507	mtlo.maria223@gmail.com	<i>[Firma]</i>
6	Rola Tatiana Rojas Olt	Interventoría	3145126539	rola2520@yahoo.es	<i>[Firma]</i>
7	Dora Enique Flores Trujillo	Contratista	3046258199	bracciofloresteria@gmail.com	<i>[Firma]</i>
8	JULIAN ANORDE AL	INTERVENTORIA	3507682311	consorciointerquacari@gmail.com	<i>[Firma]</i>
9	VIA VIRTUAL LA ING. ANGELA				
10	MARIA OSORIO-SUPERVISIÓN-				
11	VALLECAUCANA DE AGUAS.				
12					
13					
14					
15					
