

INFORME DE INTERVENTORIA No. 07

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 JUNIO 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: JUNIO 30 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FECHA: JUNIO 30 DE 2023		PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023			
INFORME No.07					
CONTRATO: 2000.13.12.005-2022					
CONTENIDO					
ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S			
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S			
2	CONTROL DE GARANTIAS	S			
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S			
4	CONTROL DE EJECUCION	S			
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s			
5	ANEXOS	S			
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S			
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S			
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S			
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S			
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S			
5.6	RECURSO HUMANO	S			
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S			
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S			
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S			
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S			
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

  PAP-PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSEQUIR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME No. 07		PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023	
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	☐	OBRA	☒
		OTRO	☐
ESPECIFIQUE:			
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502,246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039 - 13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$N/A	
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1.502,246.766		VALOR ACTUAL: \$29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$N/A	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 07	PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:	
DATOS DE LA SUPERVISIÓN		
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDINSON ZULUAGA	
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No.07			PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)		Observaciones (iv)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		SI			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.		SI			
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.		SI			

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mane de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo case, el cinco per ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mane de obra no calificada de la región serán mujeres.			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presen?ación de la oferta.	SI		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	SI		
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	SI		

19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI			
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI			
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.	SI			
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI			
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI			
26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pague de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	SI		
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. I	SI		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:			
1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		

4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI			
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelación al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI			
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI			
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI			
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI			
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo case, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI			
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.	N/A			
Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio FIA para el pago del RETEICA	SI			

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y Anexos aclaratorios. El informe deberá contener los ☐ avances acompañados y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras, sobre e	N/A			
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI			
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, y en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A		

15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	N/A			
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El Interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizarla y validarla, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sine existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A			
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI			
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A			
Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI			

No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honrad^z y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
23. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
24. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
25. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
26. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		

27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI			
29. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI			
PLAN DE TRABAJO DE OBRA				
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE LABORES	SI			
BITÁCORA	N/A			
ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A			
INFORME FINAL	N/A			

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuación se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serialización Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	N/A		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		
36. En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
38. La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	N/A		

39. El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	N/A			
40. Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.	N/A			
41. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	N/A			
42. Elaborar e implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el intervector hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las seriales luminosas deben ser de luz blanca.	SI			

44. Apoyar en el trámite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		
45. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	N/A		
☐ ☐ ☐ El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	N/A		
47. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.	N/A		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración Municipal o a terceros	N/A		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4			
				INFORME DE INTERVENTORIA				Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME No.07				PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023							
2. CONTROL DE GARANTIAS											
2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA					
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Cumplimiento	\$ 5.886.416.198,60	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.049,65	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	Estabilidad	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 300.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					

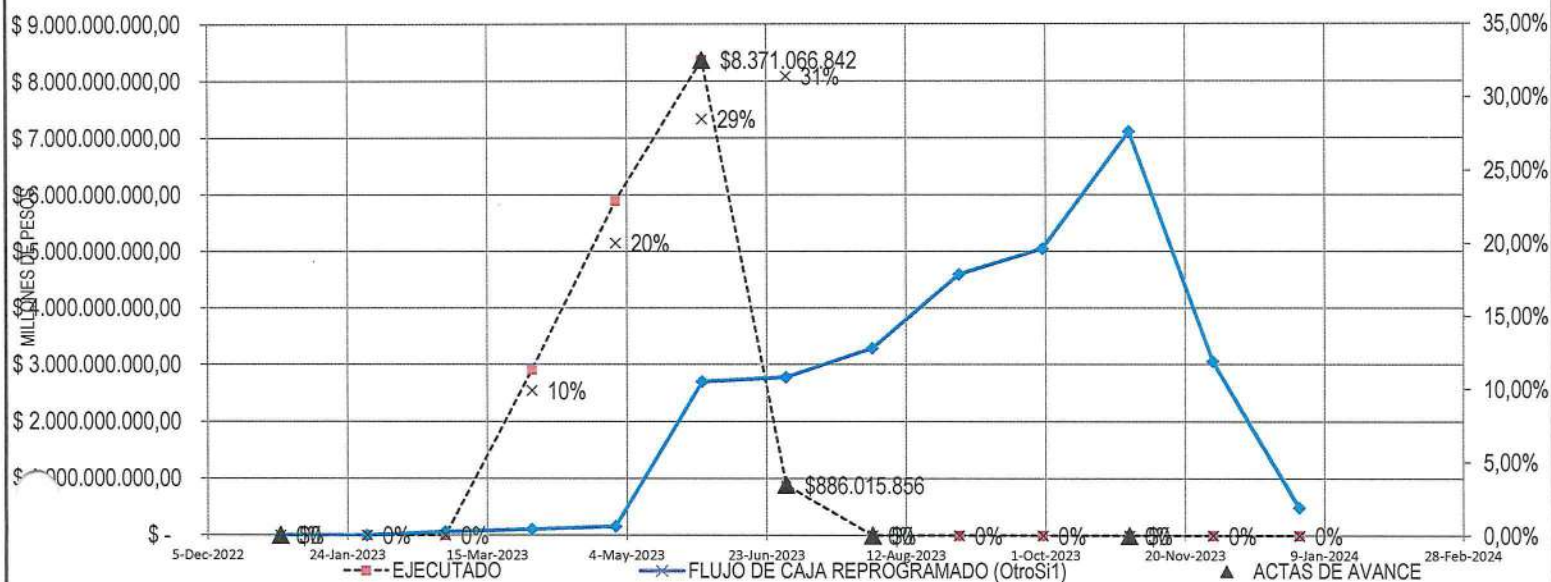
2.1 SANCIONES		
Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI						Código: FO-PDA.2.1-4			
		INFORME DE INTERVENTORIA						Versión: 4			
								Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME No.07				PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023							
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (_ %)	23/12/2022	\$N/A	%		\$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	\$ 384.541.865	28,44%	\$ 115.362.560	\$ 269.179.305	Acta No. 1	31-May-23	\$8.371.066.842	28,44%	\$2.511.320.053	\$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	\$ 45.217.628,00	3,01%	\$13.565.288	\$31.652.340	Acta No. 2	30-Jun-23	\$886.015.856	3,01%	\$265.804.757	\$620.211.099
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
	TOTALES	\$ 429.759.493,00	31,45%	\$128.927.848	\$751.505.675				31,45%	\$2.777.124.810	\$15.309.582.186

INFORME No.7

PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	\$ -			\$ -	0,00%
31-Jan-23	\$ -		\$ -		0,00%
28-Feb-23	\$ 62.322.903,31		\$ -		0,00%
31-Mar-23	\$ 111.845.778,94		\$ 2.912.415.682,00		9,90%
30-Apr-23	\$ 161.373.885,25		\$ 5.897.584.037,00		20,04%
31-May-23	\$ 2.705.571.148,99		\$ 8.371.066.842,00	\$ 8.371.066.842,00	28,50%
30-Jun-23	\$ 2.779.758.170,91		\$ 886.015.856,00	\$ 886.015.856,00	31,45%
31-Jul-23	\$ 3.291.610.390,55		\$ -	\$ -	0,00%
31-Aug-23	\$ 4.602.351.753,97		\$ -		0,00%
30-Sep-23	\$ 5.056.692.137,71		\$ -		0,00%
31-Oct-23	\$ 7.113.749.748,65		\$ -	\$ -	0,00%
30-Nov-23	\$ 3.059.505.211,09		\$ -		0,00%
31-Dec-23	\$ 487.299.803,59		\$ -		0,00%
	\$ 29.432.080.933				

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 31,45 (ACTIVIDADES PRELIMANRES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO, SUMINISTRO DE ACERO TANQUE GINEBRA Y SUMINISTRO TUBERIAS PEAD DIAMETROS 18", 14", 10")

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 7	PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Fernando Acosta V. con número de tarjeta profesional 42.408-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.		
Firma del Interventor Contrato No. 		

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.07	PERIODO: JUNIO 01 A 30 DE 2023	
6. ANEXOS		
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).		
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.		
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.		
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.		
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.		
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional		
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).		
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución		
6.9 Informe del Contratista (si aplica).		
6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO		
CONTINUAR CON LA TOMA DE DATOS EN CAMPO Y VERIFICAR LOS AJUSTES EN LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR BALANCE DE OBRA,		
AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE DISEÑOS, INVOLUCRANDO AL CONSULTOR DE DISEÑO CONTRATADO POR VALLECAUCANA DE AGUAS		
CONTINUAR CON EL TRABAJO DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA SUPERAR OBSTÁCULOS CON ALGUNOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES VECINAS AL PROYECTO QUE SE HAN RADICALIZADO EN SU OPOSICIÓN Y PRETENSIONES AL PUNTO DE LOGRAR DETENER LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VÍA PÚBLICA. REALIZAR CONSULTA ACERCA DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONSULTA PREVIA ANTE EL MINISTERIO.		
URGIR A LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES Y CONCEPTOS EN CUANTO A APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA Y ÁREA DE CAPTACIÓN		
INICIAR CUANTO ANTES LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS AL INTERIOR DE LAS PTAPS DE GINEBRA Y GUACARÍ, EN COORDINACIÓN CON ACUAVALLE		
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES		
SE NECESITA QUE CON EL CONFLUIR DE TODA LA INSTITUCIONALIDAD (ALCALDÍAS MUNICIPALES, MIN INTERIOR, MINISTERIO PÚBLICO, CVC, ACUAVALLE VALLECAUCANA DE AGUAS Y LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA) SE PUEDA SUPERAR LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL SECTOR DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS . HASTA EL MOMENTO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES ESFUERZOS Y OPORTUNIDADES DADAS A LAS COMUNIDADES PARA SU PARTICIPACIÓN , DADAS A TRAVÉS DE LOS COMPONENTES SOCIALES, NO HA SIDO POSIBLE QUE SE ENTIENDA LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO, LOS ANÁLISIS TÉCNICOS SOBRE LOS CUALES SE TOMO LA DECISIÓN Y LA ESCOGENCIA DE LAS OPCIONES DEL DISEÑO y LA PERTINENCIA DEL MISMO PARA LAS COMUNIDADES DE AGUAS ABAJO. LA PRESENCIA DE AGITADORES CON PRESUNTOS OTROS INTERÉS DENTRO DE LA COMUNIDAD, HA AFECTADO EL PROCESO DE ENTENDIMIENTO CON LA MISMA.		

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 7

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	ACTIVIDADES PREMILINARES Y TOPOGRÁFICAS	CONTINUAN ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES DENTRO DE LAS PTAPS. NO ES POSIBLE EN AREAS EXTERIORES.
	RECORRIDO A LOS SITIOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, RECORRIDO DE LAS LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION, BOCATOMA, PTAP GINEBRA, PTAP GUACARI.	EN EL SECTOR DE BOCATOMA, DESARENADOR Y DONDE SE INSTALARÁ LA TUBERÍA DE 18", SE HAN SUSPENDIDO LABORES POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD. SE PRESENTÓ BLOQUEO AL EQUIPO DE TRABAJO EN ESE SECTOR POR PERSONAS QUE INDICAN REPRESENTAR A LA COMUNIDAD Y SU OPOSICION A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. LA ACTIVIDAD SE SUSPENDIÓ TAMBIEN DESDE EL CORREGIMIENTO PUENTE ROJO HACIA AGUAS ABAJO.
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	SE HA INSTALADO CAMPAMENTO Y AREA DE ALAMACENAJE DE MATERIALES. SE ALMACENA TODO EL ACERO DE REFUERZO FIGURADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADA.
	LINEA DE CONDUCCION	SE RECIBE TUBERIA PEAD DE 18" 14" Y 10". EL 19 DE ABRIL SE INICIA INSTALACION TUBERIA 14" EN EL SECTOR LA ESMERALDA, LA EXCAVACION DE ZANJA, LA TERMOFUSION DE TUBERIA Y LA EXTENSION A LO LARGO DEL RECORRIDO DE TUBERIA. EL DIA 20 DE ABRIL LA COMUNIDAD HACE PRESENCIA EN PROTESTA VIOLENTA , EXIGE EL RETIRO DE TUBERIA INSTALADA Y AMENAZA CON DESTRUIRLA SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS (NO CONSTRUIR NUEVAS BOCATOMAS, NO INSTALAR TUBERIA EN EL SECTOR PUENTE ROJO, SER LLAMADOS A CONSULTA PREVIA), CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DE CAMPO ENE STE PERIODO EN VIA PÚBLICA. SOLO SE REALIZAN ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LAS PTAPS.
		SE HA RECIBIDO EL INFORME CERO VER. 2.0 (CON BALANCE DE OBRA). SE ENSCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA,

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA, CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	ACTAS DE COMITÉ	SE ANEXA DOCUMENTO
2	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 4	SE ANEXA DOCUMENTO
3	INFORMES DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Se continúa con la estrategia de acercamiento a los líderes y representantes de las Juntas de Acción Comunal para identificar a las personas que deseen hacer parte de la veeduría ciudadana y posteriormente desarrollar con ellos el ejercicio de cartografía social.
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de junio no se programaron actas de vecindad.
3	Programa de Información a la Comunidad	Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.
4	Programa de divulgación a la comunidad	La interventoría evidenció que se realizó la convocatoria vía WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y divulgación por medio de una pieza gráfica y oficio de invitación que fueron entregadas puerta a puerta en las viviendas y lugares indicados por los líderes representantes de las Juntas de Acción Comunal en los barrios de Guacarí: Barrio Ceibas Azules, El Cairo, la vereda El Placer Pichichi, corregimiento Cananguá, Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado.
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la programación coordinación, planeación y realización de las reuniones con los representantes de las Juntas de Acción Comunal en los barrios de Guacarí: Barrio Ceibas Azules, El Cairo, la vereda El Placer Pichichi y corregimiento Cananguá, estas reuniones se realizaron individuales por locación, los líderes se mostraron en su mayoría de acuerdo con el proyecto y se identificó que la comunidad que ellos representan no tienen conocimiento de lo que está pasando y solicitan que se realice una reunión con mayor participación de personas de la comunidad. Teniendo en cuenta esta solicitud se programó una reunión más amplia convocando a las Juntas de Acción Comunal de la cabecera municipal: Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado, de los cuales sólo asistió los representantes de la JAC del barrio Central, en esta reunión, se mostraron muy interesados en el proyecto y solicitaron que se programe una reunión en horas de la noche para que haya mayor asistencia.
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.
7	Programa de atención al ciudadano	La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Continúa pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.
8	Recorridos por la Obra	Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra debido a los compromisos pactados en la reunión del 3 de mayo de 2023 donde la comunidad solicitó suspender las actividades arriba del Puente Rojo.
9	Reunión de Avance de Obra	En el mes de Junio se programó la reunión en la vereda El Placer - Pichichi por solicitud del señor Carlos Hebert Mora Cerón presidente de la JAC para conocer más sobre la obra.
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	SE ADJUNTAN ACTAS DE REUNION CON LAS COMUNIDADES
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	Lina Marcela Buriticá	ING. CIVIL	Coordinadora de proyectos	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	Gina Leidy López	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.

5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	• Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. • Localización y replanteo de estructuras a construir. • Localización y replanteo de tuberías a instalar. • Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	John Edward Díaz	Ingeniero ambiental	Ingeniero Aux ambiental	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	Flor María Martínez	Profesional-SST	Profesional-SST	• Responsable de la ejecución del plan de gestión SST

10	John Janner Cuero	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	Inspector de obra	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
3	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
4	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
5	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
6	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCION	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

[illegible]

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO PERIODO JUNIO 01-30 DE 2023

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022					
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:	13 MESES					
VALOR ANTICIPO :	30%					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	\$ 1.744.905.661,00	\$ 1.744.905.661,00	\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	\$ 5.112.500.588,00	\$ 5.112.500.588,00	\$ 1.012.799.562,00
5	OTROS	\$ 959.418.469,00	\$ -	\$ 429.709.234,00	\$ 429.709.234,00	\$ 529.709.235,00
	TOTALES	\$ 8.829.624.280,00	-	7.287.115.483,00	7.287.115.483,00	1.542.508.797,00

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	10
	30	6	2023	HORA DE FINALIZACIÓN :	12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)	83%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMBRE PROF. SST INTERVENTORIA:	JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1			
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se esta llevando a cabalidad el plan de trabajo, con las actividades
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Presenta formato de asistencia a la
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			según actividades nuevas o
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			Se presenta plan de emergencia, y se empieza a implementar en el mes de abril
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			Se envía acta de conformacion de
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavacion
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			Se implementa y se deja registro
EXTINTORES	1			Se implementa y se deja registro
BOTIQUIN	1			fotografico
KIT DE DERRAMES		1		No hay uso de sustancias toxicas
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)		1		
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL		1		
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.	1			Aun no adjuntan la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1		
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1			
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	20	4	0	
CUMPLIMIENTO	83%			

OTROS:

OBSERVACIONES:

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO JUNIO 01 A 30 DE 2023



FOTOGRAFÍA No.1: Recepcion y almacenaje de tubería.



FOTOGRAFÍA No.2: Recepcion y almacenaje de tubería



FOTOGRAFÍA No.3: Trabajos de localizacion topografica



FOTOGRAFÍA No.4: Socializaciones con las comunidades



FOTOGRAFÍA No.5. Socializaciones con las comunidades



FOTOGRAFÍA No.6:Comites de seguimiento

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 1 de 8

ACTA No. 28

Fecha:	Junio 01 - 2023	Hora inicio: 9: 00 a.m	Hora fin: 12:15 p.m
Contrato N°.	2000.13.12.003-2022.		
Objeto:	"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAD PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".		
Localización:	MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA"		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARI		
Supervisor:	Ing. Miguel Zuluaga		

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	Ing. Leonardo A. Chacon	Acuavalle S.A E.S.P
2	Ing. Miguel Edison Zuluaga M.	Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P
3	Ing. Angela Maria Osorio Ortiz	Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P
4	Trab. Social Maria Fernanda Martinez	Consortio Redes y Ptaps Valle
5	Trab. Social Neisler Abadia Londoño	Consortio Interguacari
6	Ing. Gina Lopez Paredes	Consortio Redes y Ptaps Valle
7	Ing. Dario Enrique Florez	Consortio Redes y Ptaps Valle
8	Top. Andres Flechas	Consortio Interguacari
9	Ing. Ivan Bastidas	Consortio Interguacari
10		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Estudiar alternativa para nueva bocatoma en el sitio Puente Rojo
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Ing. Zuluaga inicia la reunion manifestando que el objetivo de la reunion es analizar la POSIBILIDAD , en caso de no llegar va un acuerdo con la Comunidad de la parte alta del proyecto , con la construccion de la bocatoma aguas abajo con sus ventajas y desventajas.
El Ing. Zuluaga explica que Vallecaucana de Aguas entrega la obra al Municipio y esta a su vez

lo entrega al operador que es Acuavalle.

El Ing. Zuluaga manifiesta que no se va a descartar la construcción de la bocatoma en el sitio original del proyecto, ya que hay un contrato en desarrollo, que el contratista ya adquirió la tubería PEAD necesaria y con base a lo anterior analizar todas las posibilidades que hay.

El Ing. Zuluaga manifiesta que la Comunidad de la parte alta no tiene ningún argumento técnico ni ambiental para no dejar construir la bocatoma en el sitio inicialmente propuesto en el proyecto, ni se benefician ni se perjudican. La no construcción es más de tipo social y económica además la construcción de la bocatoma aguas arriba de la Quebrada Lulos implica más adelante que no se puede intervenir el Río Guabas con respecto a la explotación minera.

El Ing. Zuluaga manifiesta que la estrategia con la Comunidad es hablar con cada uno de ellos en forma independiente.

El Ing. Zuluaga informa que el señor Wilson Tabares, posee unos títulos mineros que a la fecha han sido negados por la CVC.

El Ing. Zuluaga informa que la misma situación está sucediendo con la Comunidad del Municipio de Zarzal pero con el caudal de río.

El Ing. Zuluaga manifiesta que el río Guabas de acuerdo a estudios que han realizado en conjunto con CVC nunca se ha secado y tiene agua suficiente para los Municipios de Ginebra y Guacarí y reitera que la Comunidad no tiene ningún tipo de orden técnico y ambiental que contradiga los estudios que se han realizado.

El Ing. Zuluaga informa que como una estrategia con la Comunidad fue manifestar que se iba a estudiar la posibilidad de la construcción de la bocatoma en Puente Rojo y fue allí donde la gente se calmó. Además se va a constituir una sola Veeduría Ciudadana con los beneficiarios de la obra es decir con la parte plana de los Municipios de Guacarí y Ginebra, porque es un solo contrato, para que se enteren de la obra y que los únicos beneficiados son Ellos.

El Ing. Zuluaga manifiesta que la Comunidad ante la negativa de que les intervengan las placas huellas ni con excavación dirigida habrá que buscar otras alternativas de instalación de la tubería PEAD.

El Ing. Zuluaga reitera que la bocatoma ya sea aguas arriba o aguas abajo de Puente Rojo siempre debe ser del Río Guabas, de pronto la Comunidad está sorprendida por el diámetro del tubo de 18 pulgadas que de pronto piensan que por ese tubo se va ir todo el caudal del río Guabas. Hay que explicarle a la Comunidad que solo se va a captar una parte del caudal del río y recalca que las Comunidades negras e indígenas no tienen nada que ver con la ejecución del proyecto.

La Dra. Martínez manifiesta que la comunidad indígena dice que es territorio sagrado donde se va a desarrollar el proyecto.

El Ing. Zuluaga informa que con relación a un acta parcial de obra enviada por el contratista donde se cobra el suministro de toda la tubería, se va a reunir con la Interventoría para analizar las actividades que se pueden cancelar, la tubería no se puede pagar hasta que no se solucione este tema con la Comunidad y además hay un concepto de la Contraloría que dice que se pagar el suministro con la instalación según el Decreto 661 de 2018.

El Ing. Zuluaga reitera que lo ideal es hacer la bocatoma donde está proyectada aguas arriba de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 3 de 8
---	--	--

la desembocadura de la Quebrada Los Lulos, por razones técnicas: Tanto Ginebra como Guacari no tiene bocatmas propias actualmente se surten de unas bocatmas construidas por particulares.

Con relacion a los anterior el Ing. Chacon informa que por el momento las tiene a cargo Asoguabas pero es Acuavalle las que hace el mantenimiento cada vez que se presenta un problema de obstruccion en las rejillas. Pero con la Acequia La Chamba que es la que va hacia Guacari es muy vunnerable y en año 2011 se hizo una reubicacion de la acequia alejandola mas del Rio Guabas pero hoy en dia el Rio Guabas se llevo un tramo y despues de Abril del 2022 tiene un tramo de aproximadamente 400 ml que el rio Guabas s elo llevo y no existe la Acequia como tal. La Acequia La Chamba no inicia en Puente Rojo y aclara que Quebrada es algo que se ha formado de manera natural y acequia es cuando hay intervencion humana ya sea para cultivos de riego y otros propositos es algo artificial.

El Ing. Chacon manifiesta lo siguiente: En Puente Rojo existen dos acequias La Chamba que va hacia Guacari y Acequia La Grande que va hacia Ginebra ambas atraviezan el caso urbano en cada una de las poblaciones. De esas acequias Acuavalle es usuario , por la Chamba tiene una bocatoma señalada como Uno Tres la 1 – 1 y 1 – 2 son del Ingenio Pichichi. Es un canal abierto que no esta revestido esta en tierra iniciando esta concreto como 500 ml y como hay cruces con la via se obstruye constantemente . En estos momentos se esta captando aguas abajo y con maquinaria amarilla hay que estarla dragando constantemente. El comportamiento del Rio Guabas es muy dificil y seria muy bueno que existieran los estudios del comportamiento hidrológico de este rio. En el año 2011 la CVC reubico la Chamba de acuerdo a un estudio que se realizo aproxidamente en 1.5 km se alejo del rio y se acerco mas a la via de Puente Rojo a Pichichi y el rio pone en riesgo ahora es la via. La CVC sugiere pasarla al otro lado de la via pero significa que se va intervenir la Hacienda La Esmeralda y los dueños no dejan intervenir su territorio. En ultimas La Chamba ofrece unas vunnerabilidades muy grandes que no garantizan un servicio de prestacion de las 24 horas. La planta de Ginebra a pesar de que esta alta con respecto al Rio Guabas se abastece por gravedad. Informa de seguir con esa captacion con unos niveles altos de material suspendido y si es de captar de puente rojo con una paralela para no depender de otros y seria una posibilidad muy favorable en caso de que no se haga el proyecto original.

El Ing. Zuluaga manifiesta es que se haga un recorrido y un analisis tecnico y se haga un informe donde se analice sus pro y sus contras . En el informe tecnico decir si no se puede con argumentos y justificaciones tecnicas y si se puede realizar decir porque se puede y cuales serian las obras adicionales que se generarian como permisos y otros. Despues de este informe los Alcaldes tendrian que reunirse con la Gobernadora la cual ya esta enterada de este tema.

El Ing. Zuluaga informa que esas bocatmas no se van a tocar ni demoler ni reconstruir.

El Ing. Zuluaga insiste en hay que reunir a la Juntas de Accion Comunal de los Municipios de Guacari y Ginebra e informarles del proyecto.

El Ing. Chacon manifiesta que la CVC es mas conocedor de la problemática que entrega la Quebrada Lulos al Rio Guabas. Es una cuenca que se esta cambiando geomorfologicamente esta deteriorada y ese arrastre de solidos no va a terminar tan pronto y fotos que se tomaron

areas son criticas.

El Ing. Chacon manifiesta que no hay apoyo por parte de la CVC , seria buscar el apoyo del Gestor de Paz.

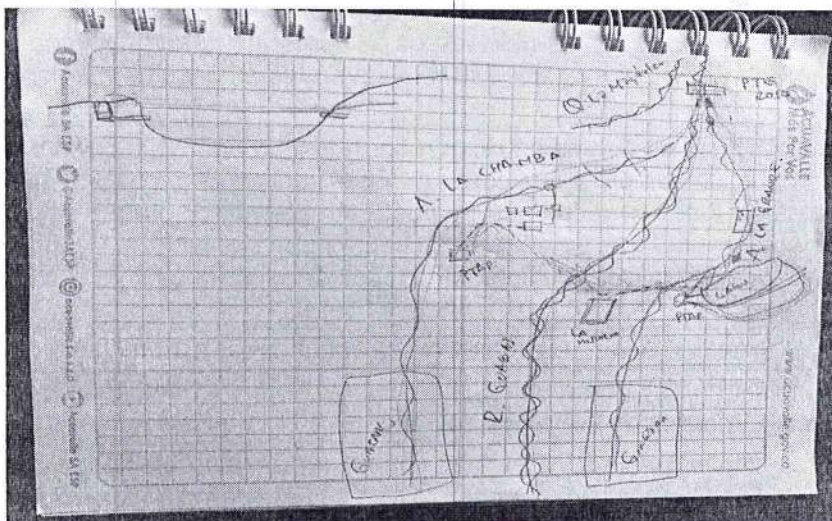
El Ing. Chacon informa que en epoca de verano no hay problema es epoca de invierno pasa a mas de 20000 unidades de turbiedad la Quebrada Lulos. Al ejecutar la bocatoma aguas arriba de la Quebrada Lulos es mas favorable por la reduccion del aporte de solidos.

El Ing. Chacon aclara que los balnearios de Puente Rojo se abastecen de la Quebrada Los Cocuyos.

El Ing. Zuluaga manifiesta que los balnearios estan dentro de la franja de proteccion del Rio Guabas y ademas de acuerdo a la informacion de Acuavalle estos balnerios no los afectan en nada con la construccion de la nueva bocatoma.

El Ing. Zuluaga manifiesta que el hecho de que se va a analizar la posibilidad de otra alternativa de captacion no se va abandonar el proyecto inicial , se va analizar que pasa si se hace una bocatoma abajo y donde se haria, que terrenos habria que comprar, costo , dueños , area a emplear, si topograficamente da a gravedad.

El Ing. Chacon en respeusta a lo anterior manifiesta que se deberia captar inmediatamente en la que existe actualmente en Puente Rojo , si se baja seria mas critico, habria que hablar con el Municipio de Ginebra porque terrenos no hay y como lluvias de ideas es hacer una sola captacion aguas debajo de la Acequia La Grande que traiga un caudal para los acueductos de Ginebra y Guacari que en el recorrido exista una estructura de desarenador bastante robusta y que pueda llevar agua hasta este sector y por problemas de turbiedades realizar un reservorio en area de la familia Saavedra - Blum con suficiente capacidad, despues la construccion de una cadica que distribuya a Guacari y Ginebra. Habria que realizar un viaducto sobre el rio Guabas que llevaria el agua a Guacari. Muestra en planta esquematicamente lo enunciado anteriormente.



El Ing. Zuluaga manifiesta que se va hacer el analisis tecnico respectivo para la nueva posibilidad de la nueva captacion.

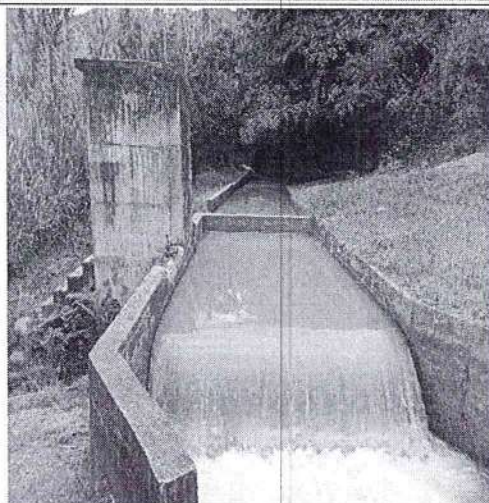
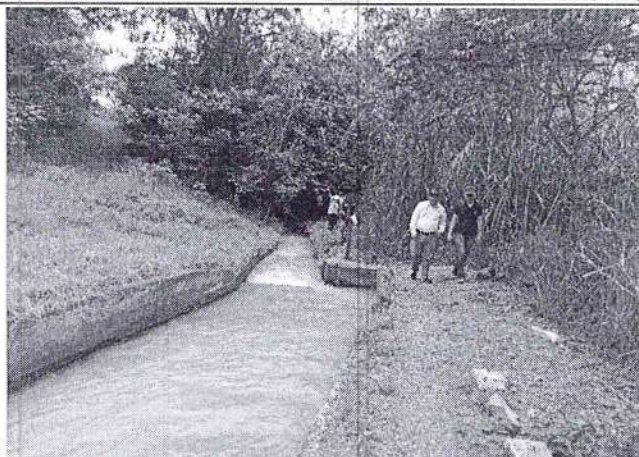
El Ing. Chacon informa que tienen un aforo con canaleta Parshall a la entrada de la planta de Ginebra.

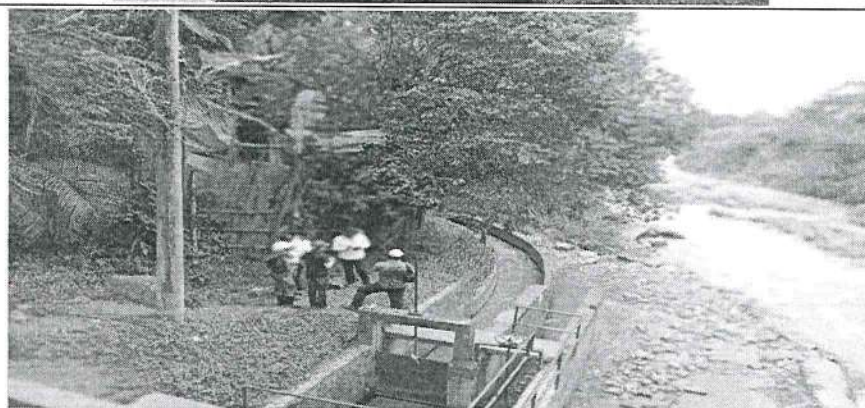
El Ing. Chacon manifiesta que de la Quebrada La Magdalena no se podria captar porque el ingenio Pichichi capta mas de 650 lps. y de acuerdo al estudio en epoca de estiage no da abasto.

El Ing. Chacon informa que la familia Blum solicita, les suministre agua potable para la Hacienda La Victoria en una longitud de 1300 ml en tuberia PVC de 2" desde el tanque de almacenamiento de la PTAP de Ginebra.

Se realiza el recorrido al sitio desde la Planta hasta la Bocatoma en Puente Rojo.







COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Realizar la topografía desde el tanque de almacenamiento hasta la hacienda La Victoria	Contratista	Junio 05 - 2023
2			
3			
4			
5			

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Hora:	Lugar:
--------	-------	--------

FIRMA ACTA

Nombre: Miguel Zuluaga	Nombre: Leonardo Chacon	Nombre: Angela Osorio	
Cargo: Supervisor Interventoria	Cargo: Acuavalle	Cargo: Apoyo a la Supervision	
Entidad: Vallecaucana de Aguas			
Nombre: Dario Florez	Nombre: Maria Fernanda Martinez	Nombre: Neisler Abadia	
Cargo: Residente de obra	Cargo: Trabajadora Social	Cargo: Trabajadora Social	
Entidad: Contratista	Entidad: Contratista	Entidad: Interventoria	
Nombre: Ivan bastidas	Nombre:	Nombre:	
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo:	Cargo:	
Entidad: Interventoria	Entidad:	Entidad:	

ACTA No. 29

Fecha:	JUNIO 02/23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°.	2000. 13. 05. 003 -2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
INICIA LA REUNIÓN LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO	
INFORMANDO HACERCA DE LA REUNIÓN EL DIA DE AYER	
A LAS ESTRUCTURAS DE TOMAS ACTUALES Y RECORRIDO	
CONJUNTO CON CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y ACUAVALLE A	
LA ACEQUIA LA GRANDE Y ACEQUIA LA CHAMBA Y	
LAS POSIBLES NUEVAS ALTERNATIVAS DE NUEVA BOCATOMA	
CERCA A LAS ACTUALES, DESARENADOR DE GRAN	
CAPACIDAD, RESERVOIRIO PARA CONTROL DE TURBIEDAD	

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CON BASE EN ESTE RECORRIDO, VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZARÁ VALORACIONES DE DISEÑO Y TOPOGRAFÍA EN SITIO PARA MEDICIONES DE LONGITUDES DE TUBERIAS, DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN. SE HACE HINCAPIE EN QUE AL PROYECTARSE TRABAJOS EN PREDIOS DE LA FAMILIA BLUM, ACUAVALLE DEBE PROCEDER CON EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE SERVIDUMBRE ANTERIOR DE LA CONEXIÓN DE 2" A LA VIVIENDA PRINCIPAL DE LA HACIENDA. EL COMPONENTE SOCIAL HA CONTINUADO CON SUS ACTIVIDADES, CONVOCANDO A LÍDERES Y ORGANIZACIONES DE LA PARTE PLANA DE LOS MUNICIPIOS (ZONA URBANA) Y EL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL. EL CONTRATISTA EN SUS VERIFICACIONES HA CONSTATADO QUE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PTAP GINEBRA PRESENTA ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN SU PERFIL HIDRAULICO; (COTAS DE ENTRADA Y SALIDA) POSICIONAMIENTO, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN, CABEZA DE PRESIÓN ESPERADA, TIEMPOS DE LLENADO Y VACIADO, NIVELES DE LAS OTRAS ESTRUCTURAS. SE ACUERDA QUE DEBE BUSCARSE ACERCAMIENTO Y MESA TÉCNICA CON LA ENTIDAD OPERADORA DE LA RED - ACUAVALLE - PARA EXPONER LOS RESULTADOS DEL CHEQUEO DE ESTA INFRAESTRUCTURA Y COORDINAR LAS ACCIONES PARA SU SOLUCIÓN Y OPTIMIZACIÓN. LA SUPERVISIÓN BUSCARÁ EL CONTACTO CON LA ENTIDAD LO MAS PRONTO POSIBLE. CONTINUA PENDIENTE REPROGRAMACIÓN DE MESA TÉCNICA CON EL DISEÑADOR PARA VERIFICAR EL RESTO DE INQUIETUDS PLANTADAS. EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO SE REALIZARÁ REUNIÓN - MESA TÉCNICA CON EL MININTERIOR (VIRTUAL) PARA ACLARAR TEMAS DE LA PERTINENCIA O NO DE CONSULTA PREVIO. LA PRÓXIMA SEMANA SE PRESENTARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA LA VERSIÓN 2 DEL INFORME CERO, CON REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, BALANCE, PROGRAMACIÓN POSIBLE, ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ETC.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	TOPOGRAFÍA HACIENDA FLIO BLUM - CONTRATISTA		PROX SEMANA
2	MESA TÉCNICA CON ACUAVALLE - PROX. SEMANA		
3	MESA TÉCNICA MININTERIOR - V. CAUC. - INTERV.		PROX. SEMANA
4	BALANCE OBRA	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
5			

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:

Hora:

Lugar:

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO

ASISTENCIA

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:








Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:

Entidad:

 				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
LISTADO DE ASISTENCIA							
FECHA:	02	06	2023	HORA INICIAL: 10:00	HORA FINAL: 12:00	LUGAR: CONSORCIO REDES Y PTAPS - CONINGENIERIA	
OBJETIVO: COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA							
ASISTENTES							
Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma		
1	John Edward Diaz Obonaga	Contratista	3226256641	amb.coningenieria@gmail.com			
2	Lina Marcela Buitrago	Contratista	3006204651	consorcio redes y ptaps@gmail.com			
3	Hija Femenilde Martinez	Contratista	3162334994	redes y ptaps pso@gmail.com			
4	Diego Bernal Bernal	Interventor	3182200266	diego.bernal@gmail.com			
5	Dilith Pios Valencia	Vallecaucano	3106270910	dn@eva.gov.co			
6	Nestor Abadia	Interventor	3206569048	nestorab@gmail.com			
7	Alexandro Estrada	INTERV.	3155912130	alestrad@hotmail.com			
8	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016258199	consorcio redes y ptaps@gmail.com			
9	Gina Lopez Paredes	Contratista		gina.lopez.ing@gmail.com			
10	Angela Maria Osorio Ortiz	Vallecaucano	3162413861	ama@eva.gov.co			
11	JULIAN ANDRADE H.	INTERVENTOR	3507682311	consorciointerquacari@gmail.com			
12							
13							
14							
15							

ACTA No. 30

Fecha:	15 JUNIO / 23	Hora inicio: 08:00	Hora fin: 10:00
Contrato N°:	2000-13.05-003-2022		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPIACIÓN - CONDUCCIÓN		
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PAPS VALLE		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ		
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA		

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE	
2	ASISTENCIA	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
SE INFORMA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO, QUE LA ENTIDAD CONTINÚA CON LA GESTIÓN A NIVEL GERENCIAL CON LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y LAS ALCALDÍAS, EN CUANTO A LA MEDIACIÓN CON LAS COMUNIDADES Y SOLUCIONAR LA OPPOSICIÓN DE ALGUNOS MIEMBROS DE ESTAS AL PROYECTO.	
EN EL COMPONENTE TÉCNICO, EL CONTRATISTA INFORMO QUE YA REALIZÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL	

PREDIO DE LA FAMILIA BLUM PARA DEFINIR EL TRAZADO DE LA TUBERÍA DE 2" AGUA POTABLE DESDE LA PTAP GINEBRA HASTA LA CASA PRINCIPAL DEL PREDIO, EVITANDO EN LO POSIBLE CRUCE CON CULTIVOS, GAVIONES, VIAS. SE PROPOUSO LA RUTA CON MAYOR VIABILIDAD CON UNA LONGITUD DE 1911 M.L. DE RECORRIDO. A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN SE HARÁ ENTREGA ACUAVALLE DE ESTA INFORMACIÓN (PLANO CAD) PARA SU GESTIÓN EN LA SOLUCIÓN DE ESTE PENDIENTE POR CUMPLIR DE UNA ANTERIOR SERVIDUMBRE, Y SE PERMISO TRAMITAR LAS NECESARIAS PARA EL ACTUAL PROYECTO. IGUALMENTE EL CONTRATISTA, CONTINUANDO CON LOS CHEQUES HIDRÁULICOS Y CIVILES, REALIZÓ TOPOGRAFÍA EN EL PREDIO LA ALBANIA (PROPIEDAD DE ACUAVALLE) EN UN ÁREA DE APROX. 20 x 30 M, SIN LA PRESENCIA DE INDIVIDUOS ARBOREOS, EN CASO DE QUE FUERA NECESARIO EJECUTAR UN TANQUE DE RESERVA PARA LA PTAP GINEBRA EN ESE SITIO. (SE NECESITARÍA ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL) SE SIGUE EN LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS CON PREDIMENSIONAMIENTO Y AJUSTE CON SUS POSIBLES VALORES ECONÓMICOS. LA PRÓXIMA SEMANA PRESENTARÁ PREDISEÑO DE ESTE PUNTO.

EL INFORME CERO VERSIÓN 2, EL BALANCE CONTINÚA EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA SOLICITA QUE ACUAVALLE Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ACLAREN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA PTAP GUACARÍ, A CAMBIO DE LA NO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA PROYECTADO, PARA PODER PROGRAMAR ESTAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN.

VALLECAUCANA DE AGUAS, LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO Y ACUAVALLE, REALIZARÁN EL DÍA DE MAÑANA RECORRIDO AL ÁREA DE CAPTACIÓN ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO Y LAS RUTAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN HACIA CADA PTAP, PARA TOMAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA

EN CASO DE QUE FUERA NECESARIO AJUSTAR EL PROYECTO.

SE SOLICITA COORDINAR MESA TÉCNICA CON EL CONSULTOR - DISEÑADOR, A TRAVÉS DE LA ENTIDAD VALLECAUCANA EL COMPONENTE AMBIENTAL INFORMA QUE LA RESOLUCIÓN DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ESTÁ EN FIRME POR 6 MESES PARA SU EJECUCIÓN Y CONTEMPLA 3 AÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE COMPENSACIÓN.

EL COMPONENTE SOCIAL INDICA QUE CONTINUÁN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DANDO A LA COMUNIDAD INFORMACIÓN TÉCNICA, ACLARANDO DUDAS COMO QUE SE VERÍA AFECTADA LA TARIFA DEL SERVICIO POR EL PROYECTO Y DESVIRTUANDO TODO TIPO DE INFORMACIÓN ERRADA ACERCA DEL MISMO.

EN GUACARÍ, EN ESTE SENTIDO SE HA ACUADO EN LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS CEIBAS AZULES, EL CAIRO, EL PLAZA PICHICHÍ, CANANGUA; Y CONTINUARÁN LA PRÓXIMA SEMANA PARA CONVOCAR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNITARIA RESTANTES.

EL COMPONENTE S.S.T. INDICA QUE NO HA HABIDO INCIDENTES, CON ACTIVIDADES SOLAMENTE DE DESCARGUE DE TUBERÍA EN LOS SITIOS DE ALMACENAJE.

SE INDICA POR LA SUPERVISIÓN QUE LA DISTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN POR CADA MUNICIPIO; SE HARÁ DE ACUERDO AL NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS POR CADA MUNICIPIO, SEGÚN CERTIFICACIÓN QUE EXPIDA ACUAVALLE.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REDISEÑO TANQUES PTAP GINEB. CONTRATISTA		PROX. SEM.
2	VISITA CON TOPOGRAFÍA CAPTACION ACUAL	ACUAVALLE	JUNIO 16/23
3	MESA TÉCNICA CON DISEÑADOR - INTR	VALLEC. INTER.	X DEFINIR
4	CERTIFICACIÓN NÚMERO USUARIOS	ACUAVALLE	X DEFINIR
5			


PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 22 JUNIO/23 Hora: 2:00 PM Lugar:

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

 				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015
LISTADO DE ASISTENCIA						
FECHA:	15	06	2023	HORA INICIAL: 8:00	HORA FINAL: 10:00	LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS
	DD	MM	AAAA			
OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.						
ASISTENTES						
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma	
1	Angela María Ossorio O.	Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co		
2	Nestor Abadía	Interventoría	3205569043	nestorab@gmail.com		
3	Lina Marcela Buitrago Londoño	Contratista	300 6204651	consovioredeyplap@gmail.com		
4	Iván Bertrán Benavides	Interventoría	3188620006	ibm@plap.gov.co		
5	Dario Enrique Florez Trojillo	Contratista	3016258199	consovioredeyplap@gmail.com		
6	JULIAN ANDRADE H	INTERVENTOR	3507682311	consovioredeyplap@gmail.com		
7	Juliana Meléndez	ST Interventoría	3213563800	jmelendez@gmail.com		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-6
			Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 26/09/2013
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Página: 1 de 3

ACTA No. 31

Fecha:	22 JUNIO /23	Hora inicio:	14:00	Hora fin:	16:00
Contrato N°.	2000.13.05.003 - 2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN.				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE REALIZA COMITÉ DE MANERA VIRTUAL.
EL CONTRATISTA REALIZA UNA AMPLIA EXPOSICIÓN DE LAS CONDICIONES DE PREDISEÑO EN COTAS, AREAS, VOLUMENES DE DISEÑO; DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PTAP GINEBRA A CONSTRUIR Y LA PROPUESTA TENTATIVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO, UNO EN EL SITIO ACTUAL PROYECTADO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

por el diseño y otro en el predio en el Callejón Villa Johns. (Propiedad de Acuavalle). Este predio y propuesta técnica será presentada a Acuavalle para su discusión conjunta y aprobación, en reunión técnica que la supervisión al contrato deberá coordinar.

Se buscara adaptar la opción propuesta de tanques a las excavaciones ya realizadas y el acero fibroso.

Se informa que el viernes anterior 16 de junio 2013, se realizó recorrido con Acuavalle, Vallecaucana de Aguas y la interventoría, verificando el estado actual de la acequia la grande y la captación actual. La posible propuesta sería construir una nueva captación en el sector de la actual, conducciones entubadas, construir reservorio antes de la PTAP Ginebra y derivar a la PTAP Guacarí.

La topografía de Vallecaucana está trabajando en localización longitudes, cantidades, planos etc. La posición actual de Vallecaucana no es reformular el proyecto ya diseñado, y la actividad se realizó como una toma de información de acuerdo a las anteriores reuniones con las alcaldías, personerías e institucionalidad.

Se continuara coordinando la reunión pendiente con el consultor diseñador.

Con base en la certificación expedida por Acuavalle, se establecieron los porcentajes de la inversión del contrato para cada municipio: 34.3 % Ginebra, 68,7 Guacarí. (Formalidades ICA).

El componente técnico informa que se está realizando entre hoy y mañana el descargue de 6 tractocamiones con tubería en los sitios de almacenaje autorizados (predio la esmeralda). Se informa que es el total de tubería. No se realizan otras actividades al momento.

El contratista está organizando presupuestos, APO'S, información a partir del diseño entregado por Acuavalle para la PTAP Guacarí.

El contratista solicita a la supervisión consultar la

FORMA JURÍDICA EN QUE SE VALIDARÁN LOS CAMBIOS DE OBRAS Y PRECIOS (POSIBLE OTRO SI) Y LAS CONSULTAS ANTE VENTANILLA ÚNICA.

EL COMPONENTE SOCIAL, INFORMA QUE CONTINUARÁ LAS GESTIONES CON LAS JAC (BARRIOS PORVENIR Y SANTA BÁRBARA) GUACARÍ. SE HA CONVOCADO REUNIÓN CON 7 BARRIOS EL JUEVES 29 DE JUNIO A LAS 4:30 PM EN LA CASA DE LA CULTURA. (CHAPINERO, DORADO, CENTRO SANTA BÁRBARA, EL LIMONAR, PENDIENTES ARANJUEZ Y EL SOL) SE PROGRAMARÁ PARA JULIO 7 BARRIOS Y 18 VEREDAS PENDIENTES DE GINEBRA.

EL MARTES 20 DE JUNIO LA SUPERVISIÓN TUVO REUNIÓN CON 5 CONCEJALES DE GINEBRA Y SOLICITAN SOCIALIZACIÓN, QUE SE REALIZO EN LA MISMA REUNIÓN Y PROPONEN UNA NUEVA SOCIALIZACIÓN GENERAL CON LOS 11 CONCEJALES DEL MUNICIPIO Y TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS JAC, CON APOYO DE LA INSTITUCIONALIDAD NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. EN REUNIÓN ENTRE ENTIDADES, CVC, MANIFESTO QUE HA DETECTADO QUE LOS MISMOS ESCASOS OPOSITORES A ESTE PROYECTO ESTÁN INSPIRANDO QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL IMPLEMENTE EL POMCA DE LA CUENCA GUASABAS. CONTINUÁN LAS GESTIONES INSTITUCIONALES, SE COORDINARÁ INTERAMENTE LA FORMA DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE MININTERIOR.

COMPONENTE AMBIENTAL ESTARÁ PENDIENTE DE LOS TÉRMINOS DE TIEMPO Y PLAZOS PARA IMPLEMENTAR EL P.M.A.

EL COMPONENTE S.S.T. DE INTERVENTORÍA SOLICITA LA IMPLEMENTACIÓN DE A.T.S. DE LA ACTIVIDAD DE DESCARGUE DE TUBERÍA.

SE RECOMIENDA MANTENER AL DÍA LA BRÁJORA DE OBRA.

COMPROMISOS

Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	COORDINAR REUNIÓN CON ACUNVAL	SUPERVISIÓN	PROX. SEMANA
2	PROF. TOPOGRAFIA RECORRIDO OPERIVOS	VALLECAUCANA	PROX. SEMANA
3	ENVIAR OFICIO - COORDINAR REUNIÓN	CONSULTORÍA VALLECAUC.	PROX. SEMANA
4	PRESUP. NUEVAS OBRAS PPAW GUACARÍ	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
5	DISEÑOS OBRAS OPTIMIZACIÓN PTOP CINEB. ACUNVAL		POR-DEFINIR
6.	PROGRAMAR SOCIALIZACIÓN GRAL CINEB		POR-DEFINIR

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 29 JUNIO Hora: 10:00 Lugar: VALLECAUCANA DE AGUAS.

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:

Entidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Entidad:

Entidad:

Entidad:

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	22	06	2023	HORA INICIAL: 14:00	HORA FINAL: 16:00	LUGAR: REUNION VIRTUAL.
	DD	MM	AAAA			

OBJETIVO:

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Iván Bastón, Benid	Dep. M. Com. J	317722266	ivanbaston@vallecaucana.gov.co	[Firma]
2	JULIAN ANDRADE HENAO	Interventor	3507682311	consorciointergeacuri@gmail.com	[Firma]
3	ALEXANDRO ESTRADA R	Interventor	3155912130	alexstrad@vallecaucana.gov.co	[Firma]
4	Melster Abudia.	Interventor	3206369098	consorciointergeacuri@gmail.com	[Firma]
5	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016258199	consorcio redes y ptoas@gmail.com	[Firma]
6	Lina Marcela Buitrago L.	Contratista	3006204651	consorcio redes y ptoas@gmail.com	[Firma]
7	Ma Fernanda Martinez	Consorcio	3162534954	redespegrs@gmail.com	[Firma]
8	Dileth Rios Valencia	Vallecaucana	3106270910	drve@eva.gov.co	[Firma]
9	Angela María Osorio O.	Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co	[Firma]
10					
11					
12					
13					
14					
15					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: FO-PDA.2.1-6
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 1 de 3

ACTA No. 32

Fecha:	JUNIO 29 / 23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003 - 2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE REALIZA REVISIÓN A LOS COMPROMISOS DEL ANTERIOR COMITÉ.
PARA HACER PRESENTACIÓN A ACUAVALLE DE LOS CHEQUES HIDRÁULICOS REALIZADOS AL TANQUE PROYECTADO Y LAS OPCIONES ESTUDIADAS PARA SU REALIZACIÓN EN LA PTAP GINEBRA, LA SUPERVISIÓN HA COORDINADO REUNIÓN CONJUNTA PARA EL PRÓXIMO DÍA MARTES 04 DE JULIO; DONDE SE ABORDARÁ ESTE TEMA Y SE BUSCARÁ

LA APROBACIÓN DE ACUAVALLE A LO PLANTEADO.

- EL ING. BREINER PEÑARANDA HACE PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS REALIZADOS A PARTIR DE LOS DATOS TOPOGRÁFICOS TOMADOS EN CAMPO, PARA LAS POSIBLES OPCIONES DE CAMBIO EN LAS CAPTACIONES, RESERVORIO Y CONDUCCIONES, COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
- EL CONSULTOR SERÁ CONVOCADO MEDIANTE OFICIO PARA UNA MESA TÉCNICA DE SOLUCIÓN A INQUIETUD EN LOS DETALLES DEL PROYECTO. LA CONVOCATORIA LA REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN.
- EL CONTRATISTA INFORMA QUE A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ACUAVALLE, EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PTAP'S DE GINEBRA Y GUACARÍ, REALIZARÁ UN TRABAJO CONJUNTO DE PRESUPUESTACIÓN, ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE LO SOLICITADO, SOLICITANDO UN PLAZO APROXIMADO DE 15 DÍAS PARA SU ELABORACIÓN, TENIENDO EN CUENTA SI SE AJUSTA O NO A LAS ACTIVIDADES ACTUALMENTE CONTRATADAS.

SE INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LA TUBERÍA INCLUIDA EN EL PROYECTO (TUBERÍA PEAD) YA HA SIDO DESCARGADA Y ALMACENADA EN SITIOS RESGUARDADOS.

LA SUPERVISIÓN INFORMA DEL INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GINEBRA Y EL CONCEJO DE EJE MUNICIPIO, POR QUE SES LES SOCIALICE EN PLENARIA EL PROYECTO, INCLUYENDO A LAS J.A.C.

EL COMPONENTE SOCIAL CONTINÚA CON LAS SOCIALIZACIONES EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUACARÍ Y SE SOLICITA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE A LA COMUNIDAD QUE LAS OBRAS PROYECTADAS SON CONTRATADAS POR VALLECAUCANA DE AGUAS, ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE. SE INFORMA QUE AUNQUE HAY CANDIDATOS A LAS VEEDURÍAS



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3




NADIE SE HA DECIDIDO A FORMALIZAR SU NOMBRAMIENTO,
POSIBLEMENTE, PARA EVITAR CONFRONTAMIENTOS CON LOS
VECINOS QUE SE OPONGAN AL PROYECTO.
SE CONTINUARÁ SOCIALIZANDO EN LOS BARRIOS DE GINEBRA
LA SUPERVISIÓN SOLICITA AL CONTRATISTA COTIZAR UN
VIDEO EXPLICATIVO PARA SER PROYECTADO EN LAS SOCIALI-
ZACIONES.

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MEC ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNIÓN ACUAVALLE	SUPERV. - CONTR. - INTER.	JULIO 04/23
2	OFICIO AL CONSULTOR	SUPERVISIÓN.	PROX. SEMANA
3	PRESUPUESTO PTAPS GIN-GUAL	CONTRATISTA	15 DIAS.
4	SOCIALIZACIÓN CONCEPTO GINER.	SUPERVISIÓN	POR DEFINIR.
5			

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA			
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	

  PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS VALLE DEL CAUCA				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI			Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015			
LISTADO DE ASISTENCIA										
FECHA:		29	06	2023	HORA INICIAL: 10:00		HORA FINAL: 12:00		LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS	
		DD	MM	AAAA						
OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA,										
ASISTENTES										
N°	Nombre				Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico		Firma	
1	Liam Bardoza Benavides				Intendencia	311772206	lyam-bardoza@gmail.com			
2	Julian Andrade H.				INTERVENCIÓN	3507682311	consorciointerguacari@gmail.com			
3	ALEXANDRO ESTRADA R				INTERVENCIÓN	3155912130	alexstrada@hotmail.com			
4	Ma Fernanda Martinez R				CONSORCIO	3162534554	Rider Paredes@gmail.com			
5	Lina Marcela Buitrago J				CONSORCIO	3006204651	consorcioedeyphps@gmail.com			
6	Dario Enrique Flores Trojillo				CONSORCIO	3016258199	" " "			
7	Nestor Abadia Londoño				Intendencia	320659048	consorciointerguacari@gmail.com			
8	Angela Maria Osorio Ortiz				Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co			
9	Dileth Rios Valencia				Vallecaucana	3106270910	drv@eva.gov.co			
10	Brenier Paredes Ar				Vallecaucana	3128258607	bpa@eva.gov.co			
11										
12										
13										
14										
15										

CONSORCIO INTERGUACARÍ

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERGUACARÍ DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022

Neisler Abadía Londoño - profesional social de interventoría asesoró, acompañó, evaluó y aprobó las siguientes actividades sociales del contrato de obra cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”**
Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE y su profesional social.

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

- Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
- Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
- Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
- Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad
- Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad
- Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad
- Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano
- Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
- Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra
- Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana
- Aspecto N0. 11: Mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: de acuerdo al plan de gestión social realizar las actividades pertinentes que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptaps Valle.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3

✓ Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con la estrategia de acercamiento a los líderes y representantes de las Juntas de Acción Comunal para identificar a las personas que deseen hacer parte de la veeduría ciudadana y posteriormente desarrollar con ellos el ejercicio de cartografía social.

✓ Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Objetivo: El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de junio no se programaron actas de vecindad.

Hasta la fecha el componente social del contratista presenta que actualmente se han realizado las siguientes actas:

Regaderos Ginebra 15 actas de inicio

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio

Tramo 2 Planta Ginebra 4 actas de inicio

Pendiente Puente Rojo sector turístico y vereda, hasta que se realice reunión nuevamente con toda la comunidad del sector.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	48	22	68,6%

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3

✓ Programa de Información a la Comunidad

Acciones Desarrolladas:

Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.

✓ Programa de divulgación a la comunidad

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidenció que se realizó la convocatoria vía WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y divulgación por medio de una pieza gráfica y oficio de invitación que fueron entregadas puerta a puerta en las viviendas y lugares indicados por los líderes representantes de las Juntas de Acción Comunal en los barrios de Guacarí: Barrio Ceibas Azules, El Cairo, la vereda El Placer Pichichi, corregimiento Cananguá, Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado.



CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



**REUNION INFORMATIVA PARA LOS
HABITANTES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE GUACARI**

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION A JUNTA DE ACCION COMUNAL

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

MARTES 6 DE JUNIO
DEL 2023

4 :00 PM

SITIO :parque
Celsoe Aroles

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA



**REUNION INFORMATIVA PARA LOS
HABITANTES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE GUACARI**

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION A JUNTA DE ACCION COMUNAL

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

MIÉRCOLES 7 DE
JUNIO DEL 2023

3 :30 PM

SITIO :EL PLACER-
FICRICI

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA



**REUNION INFORMATIVA PARA
LOS
HABITANTES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE GUACARI**

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION A JUNTA DE ACCION COMUNAL

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

MARTES 13 DE JUNIO
DEL 2023

330 :00 PM

SITIO :BARRIO EL
CAIRO CALLE 6 A
SUR #18-15 CASA
DE LA SRA MARIELA
ROJAS

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



REUNION INFORMATIVA PARA LOS
HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS
DE GUACARÍ Y GINEBRA -
VEREDAS

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION REUNION INFORMATIVA

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Miércoles 14 de
junio de 2023
4:00 PM

LOGAR :Vivienda del
señor Sergio
Salazar
corregimiento de
Canagua -
municipio de
Guacarí

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA



REUNION INFORMATIVA PARA LOS
HABITANTES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE GUACARÍ LOS
BARRIOS PORVENIR Y SANTA
BARBARA

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION A JUNTA DE ACCION COMUNAL

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Miércoles 21 DE
JUNIO DEL 2023
4:00 PM

SITIO :LOTY CASETA
COMUNAL BARRIO
PORVENIR

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA



REUNION INFORMATIVA PARA LOS
HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
GUACARÍ LOS BARRIOS PORVENIR Y SANTA
BARBARA, CHARINERO, EL CORALDO, EL SOL LA
INDEPENDENCIA, ANANUEZ, CONTINERIO Y EL
LINDERO, CENTRAL

CONTRATO :CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
2000.13.05.003.2022

INVITACION A JUNTAS DE ACCION COMUNAL

ENTIDAD CONTRATANTE :VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

JUEVES 29 DE
JUNIO DEL 2023
4:30 PM

SITIO :CASA DE LA
CULTURA DE GUACARÍ
CALLE 4 97-21

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

PAP-POA

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3



✓ Reuniones con la comunidad

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la programación, coordinación, planeación y realización de las reuniones con los representantes de las Juntas de Acción Comunal en los barrios de Guacarí: Barrio Ceibas Azules, El Cairo, la vereda El Placer Pichichi y corregimiento Cananguá, estas reuniones se realizaron individuales por locación, los líderes se mostraron en su mayoría de acuerdo con el proyecto y se identificó que la comunidad que ellos representan no tienen conocimiento de lo que está pasando y solicitan que se realice una reunión con mayor participación de personas de la comunidad. Teniendo en cuenta esta solicitud se programó una reunión más amplia convocando a las Juntas de Acción Comunal de la cabecera municipal: Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado, de los cuales sólo asistió los representantes de la JAC del barrio Central, en esta reunión, se mostraron muy interesados en el proyecto y solicitaron que se programe una reunión en horas de la noche para que haya mayor asistencia.

1- Junio 6 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del barrio Ceibas Azules- Guacarí

La interventoría social realizó el acompañamiento al componente social del contratista Redes y Ptaps, en esta reunión el señor Oscar Hernán Agudelo - presidente de la JAC nos abrió el espacio para presentar el contrato de obra, el

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3

ingeniero Darío Florez – residente del contratista, informó a la comunidad sobre el objeto y el alcance del contrato, explicó los antecedentes y los estudios que se realizaron para determinar en lugar de ubicación de la bocatoma y sus beneficios. La comunidad se mostró muy interesada en conocer el proyecto y sus beneficios para la comunidad, una de las preguntas de la comunidad fue ¿se tiene proyectado que Guacarí está creciendo y hay que tener en cuenta en un futuro tener unas reservas y hay que incluirlas en este proyecto? El ingeniero Darío Florez respondió que el proyecto tiene una proyección de crecimiento poblacional proyectada a 20 años, con una población beneficiada proyectada de 61.873 habitantes, para el municipio de Guacarí. También preguntaron ¿si se va a hacer toda esa inversión se va a subir el precio del agua o como lo van a cobrar? Respondió el ingeniero Darío Florez explicando que la obra la ejecuta Vallecaucana de Aguas para brindar un óptimo servicio y fortalecer sistema de acueducto para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Guacarí y Ginebra, explica que Acuavalle es el encargado de administrar el servicio y no se va a cobrar a la comunidad por las obras realizadas. Finalmente, la comunidad se mostró muy conforme con el proyecto y manifiestan que les gustaría que se hiciera una reunión masiva para informar a la comunidad, expresan que este proyecto no se puede dejar ir porque es la única oportunidad que tiene de que el servicio del agua mejore en el municipio.



2- Junio 8 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del barrio El Placer Pichichi - Guacarí

La interventoría social realizó el acompañamiento al componente social del contratista Redes y Ptaps, esta reunión se realizó por solicitud del señor Carlos Hebert presidente de la JAC para conocer más sobre la obra; el ingeniero Darío Florez – residente del contratista, informó a la comunidad sobre el objeto y el

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

alcanse del contrato, explicó los antecedentes y los estudios que se realizaron para determinar en lugar de ubicación de la bocatoma y sus beneficios. La comunidad manifiesta que el Placer tiene su propio acueducto y reciben del agua de la acequia La Chamba sin embargo les interesa conocer el proyecto porque hay mucha desinformación y les preocupa que se les acabe el cauce de la acequia La Chamba, el ingeniero Darío Florez explica que el proyecto beneficia principalmente a la población de la cabecera municipal de Ginebra y Guacarí, sin embargo es importante que se enteren en que consiste la obra, explica que la obra tiene contemplado realizar la bocatoma cerca de Puente Piedra y la cantidad de agua que se toma abajo será la misma que se tomará arriba, es decir que la cantidad de agua que les llega por la acequia será la misma que les llegará después de la obra. La comunidad pregunta por donde va a pasar la tubería, el ingeniero Darío Florez explica que la tubería viene por La Esmeralda hasta la glorieta y se pidió una servidumbre a Pichichi que ya fue aprobada para que la tubería llegue hasta la planta de Guacarí. La comunidad se mostró muy interesada en conocer el proyecto y dos personas se ofrecieron para participar de la veeduría ciudadana.



3- Junio 13 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del Barrio El Cairo

El componente social del contratista realizó la reunión informativa en el barrio El Cairo. Los representantes por parte del consorcio Redes y Ptaps, realizaron la presentación e informaron a la comunidad sobre el objeto y el alcance del contrato, explicaron los antecedentes y los estudios que se realizaron para determinar en lugar de ubicación de la bocatoma y sus beneficios. La comunidad se mostró muy interesada en conocer el proyecto y solicitaron realizar una reunión con mayor asistencia de la comunidad en general.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3



4- Junio 14 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del corregimiento de Cananguá Guacarí

La interventoría social realizó el acompañamiento al componente social del contratista Redes y Ptaps, en esta reunión participaron representantes de la JAC y personas de la comunidad en general, el ingeniero Darío Florez – residente del contratista, informó a la comunidad sobre el objeto y el alcance del contrato, explicó los antecedentes y los estudios que se realizaron para determinar en lugar de ubicación de la bocatoma y sus beneficios. La comunidad manifiesta que el corregimiento cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado a cargo de Acuavalle, manifiestan inconformidad e inquietudes sobre el servicio de alcantarillado, el ingeniero les explica que el proyecto es sobre el mejoramiento y optimización de las redes del acueducto de agua potable, sin embargo, se informará a las entidades para que atiendan las solicitudes de la comunidad; en cuanto al agua potable expresan que la tubería del agua está muy antigua y el tubo cada vez que se rompe los funcionarios de Acuavalle lo remiendan, pero no le dan solución definitiva.



CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

5- Junio 21 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del barrio Santa Bárbara y Porvenir

La interventoría social recibió información del componente social del contratista de la cancelación de la reunión informativa que se tenía programada para el miércoles 21 de junio de 2023, debido a que la señora Sandra Pinta presidenta de la JAC del barrio Santa Bárbara, no pudo realizar la convocatoria y solicitó realizar perifoneo, la profesional social del contratista consultó con el área administrativa, los cuales no vieron viable la realización del perifoneo debido a que no se quiere tener inconvenientes con los representantes de la zona alta de Ginebra quienes solicitaron suspensión de obras. Se acordó reprogramar y explicarle el motivo a la señora Sandra Pinta además de convocarla para la próxima reunión.

En reunión del área social se acordó hacer una reunión más amplia con varias juntas de acción comunal de los barrios de la cabecera municipal que hace falta por realizar la reunión informativa, estos barrios son: Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado; los cuales se convocaron para el jueves 29 de junio de 2023.

6- Junio 29 de 2023 Reunión informativa con la JAC y comunidad del corregimiento de Cananguá Guacarí

La interventoría social realizó el acompañamiento al componente social del contratista Redes y Ptaps, en esta reunión se convocó a varias juntas de acción comunal de los barrios de la cabecera municipal: Chapinero, Santa Bárbara, El Limonar, Central, El Sol, Independencia y El Dorado; de los cuales solo asistieron los representantes del barrio Central. Se evidenció que desde el componente social se realizó convocatoria puerta a puerta y se realizó recordatorio el mismo día en horas de la mañana y en su mayoría conformaron asistencia, pero no asistieron.

Los líderes del barrio Central sugirieron que las reuniones se programen en horas de la noche para que haya mayor asistencia. Manifiestan que no tenían conocimiento del proyecto y se muestran muy interesados en conocerlo y que las demás personas lo conozcan, sugieren presentar el proyecto a los candidatos a la alcaldía para que lo conozcan y apoyen. Sugirieron también socializar el proyecto a los estudiantes del colegio Pedro Vicente, porque ellos tienen proyectos ambientales y proyectos de grado para hacer recuperación de La Chamba y el Río Guabas.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3



PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, comprensión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

✓ Programa de atención a la comunidad

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.

✓ Programa de atención al ciudadano

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Continúa pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.

La interventoría evidenció que se encuentra instalado el pendón del SAC en la oficina que está ubicada en la carrera 5 #10-46, segundo piso, Centro – Costa Rica.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Cra 5 #10-46 Centro Corregimiento de Costa Rica - Ginebra



Cartelera informativa

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



Valla informativa del municipio de Guacarí

✓ Recorridos por la Obra

Acciones Desarrolladas:

- ✓ Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra debido a los compromisos pactados en la reunión del 3 de mayo de 2023 donde la comunidad solicitó suspender las actividades arriba del Puente Rojo.

✓ Reunión de Avance de Obra

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de junio se programó la reunión en la vereda El Placer - Pichichí por solicitud del señor Carlos Hebert Mora Cerón presidente de la JAC para conocer más sobre la obra.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ **Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.

✓ **Vinculación de mano de obra calificada y no calificada**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacarí y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista informa que no ha realizado nuevas contrataciones en el mes de Junio. debido a la suspensión de actividades.

OTRAS ACTIVIDADES

✓ 15 de junio de 2023

Se realizó la reunión de comité técnico de obra, la ingeniera Angela Osorio informó que se continúa analizando la otra opción del proyecto, se realizó la revisión técnica de compromisos, desde el componente social se informó el avance de las reuniones realizadas con la comunidad y se informó de la programación que se tienen con las demás Juntas de Acción Comunal.



✓ 29 de junio de 2023.

Se realizó la reunión de comité técnico de obra, la ingeniera Ángela Osorio informó que el concejo de Ginebra está interesado en el proyecto y están programando

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

una plenaria con las JAC, está pendiente definir la fecha. Desde el componente social se informó que se tiene programada la reunión con las JAC de Guacarí.



CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades programadas relacionadas con este componente.
- Se continúa esperando que los acercamientos a la comunidad y las reuniones que se realicen con las Juntas de Acción Comunal aporten avances para informar a la comunidad y sensibilizar sobre la importancia de la obra para las dos poblaciones.
- El Punto de Atención a la comunidad presta la atención en los horarios establecidos, en este mes de junio no se recepcionó PQRS.
- Durante este mes de junio de 2023, se continúa evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social.
- Se identifica que la mayoría de los representantes de las Juntas de Acción Comunal no conocían el proyecto y al conocerlo muchos de ellos se muestran interesados en que se realicen reuniones con más comunidad.
- Se evidencia que el contratista desde el componente social brinda todas sus herramientas para desarrollar las reuniones informativas para que la comunidad tenga mayor acceso a la información y aclarar las dudas que se puedan presentar.

Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

			ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
--	--	--	------------------------	--

Fecha:	Municipio de Guacarí, 6 junio de 2023
Contrato No:	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca"
Localización:	Municipios De Ginebra Y Guacarí
Contratista:	Consorcio Redes y PTAPS Valle
Interventoría:	Consorcio Interguacarí
Supervisión:	Vallecaucana De Aguas S.A E. S. P

OBJETIVO: Realizar socialización a los habitantes de los municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de informar a la comunidad sobre ejecución del proyecto contrato de obra 2000.13.05.003- 2022	INICIO: 4:00 pm
	FIN: 5:30 P.M
	LUGAR: Zona verde Barrio Ceibas Azules -Mpio Guacarí



CONSORCIO
REDES Y PTAPs
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

- En la Fase II de los Estudios y Diseños se plantearon tres (3) alternativas de solución:

- 1) **ALTERNATIVA 1:** Captación #1 en río Guabas, Captación #2 en río Flautas (Complementaria en época de invierno) y Captación #3 en Quebrada La Magdalena (Complementaria en época de invierno).
- 2) **ALTERNATIVA 2:** Captación en río Guabas
- 3) **ALTERNATIVA 3:** Abastecimiento de Agua Subterránea

Todas las alternativas incluyeron la optimización y ampliación de las Plantas de Potabilización y proyección de almacenamiento de agua potable.



ALTERNATIVA SELECCIONADA

1. **ALTERNATIVA 1 - Bocatomas en río Guabas, río Flautas y la Quebrada La Magdalena:** El río Flautas y la Quebrada La Magdalena no garantizan el caudal requerido para el abastecimiento de los municipios de Ginebra y Guacarí, cuando sea necesario suspender la captación del río Guabas. Adicionalmente, un sistema de abastecimiento con tres (3) bocatomas, implica mayores costos de operación y mantenimiento.
2. **ALTERNATIVA 2 - Bocatoma en río Guabas:** conforme con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, el río Guabas cuenta con la capacidad hídrica para abastecer los acueductos de Ginebra y Guacarí.
3. **ALTERNATIVA 3 - Abastecimiento de Agua Subterránea:** - Cerca a la Planta de Potabilización de Ginebra no existen pozos subterráneos cercanos; y, cerca a la Planta de Potabilización de Guacarí se encontraron nueve (9) pozos, de los cuales ocho (8) se localizan en zona de recarga y uno (1) en zona de alta contaminación, condiciones en las que la normatividad vigente no permite su uso para consumo humano.

En consecuencia, se plantea como solución integral del sistema de abastecimiento la **ALTERNATIVA 2**.



ALCANCE DEL PROYECTO

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (CAPTACIÓN-ADUCCIÓN-CONDUCCIÓN-PTAP) DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, PERMITIENDO BRINDAR UN SERVICIO QUE GARANTICE CONDICIONES ÓPTIMAS DE CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.



OBRAS A EJECUTAR

- BOCATOMA
- DESARENADOR
- LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA PEAD DE 18"
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (CADICA)
- LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Ginebra: Tubería PEAD 10"
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Guacarí: Tubería PEAD 14"
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA



COMPONENTE AMBIENTAL E HIDROLÓGICO

LOCALIZACIÓN

La cuenca hidrográfica del río Guabas se ubica sobre el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, hacia el sur-oriental del departamento del Valle del Cauca, enmarcada entre las coordenadas planas 900.000 - 917.500 N y 1.075.000 - 1.111.000 E.

EXTENSION DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUABAS


MUNICIPIO	HA	%
Ginebra	17,067	17,78
Guacarí	6.691,03	28,14
Buga	16	0,06

Q. PROYECTADOS (L/S)

Total = 232.93 L/s



RÍO GUABAS Y EL % A EXTRAER PARA EL PROYECTO



La ubicación de la bocatoma se encuentra a 700 metros aguas abajo de Puente Piedra, allí se hará la captación del agua para los dos municipios. A unos 3500 metros de la bocatoma se construirá cámara que separará las tuberías para cada uno de los municipios de Ginebra y Guacarí.

Esta obra está proyectada a dar solución a los municipios de Ginebra y Guacarí por 25 años cubriendo una población al año 2042 de 90.000 habitantes entre los dos municipios. Permitiendo con ello garantizar el suministro constante del agua a las comunidades del sector urbano

4. INTERVENCIONES, DUDAS E INQUIETUDES

Interviene un líder de la comunidad quien pregunta si se instala la tubería desde la bocatoma que está diseñada en el proyecto el tramo donde la vía presenta erosión (regaderos) la tubería quedaría expuesta a daños.



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

Ingeniero da aclara que la tubería debe ir al costado contrataría de la ladera, que el calibre en ese tramo es de 18 pulgadas y no se cree que ocurra, sin embargo, hay que tener en cuenta ese punto en el momento de la instalación de la tubería.

Interviene el presidente de la junta y dice que no está de acuerdo con la posición frente al proyecto que tiene la comunidad de puente rojo y comunidades aledañas insiste en que se debe seguir con la socialización en los otros barrios del Municipio de Guacarí.

Un representante de la junta pide la palabra y manifiesta que lo que pasa con el proyecto en este momento, al no permitir la construcción de la bocatoma es por intereses económicas de una o dos personas porque no desean que la bocatoma se haga en el lugar definido porque no puede hacerse extracción minera.

Se define seguir socializando a más juntas comunales y hacerlo por dos barrios o más. Al terminar las socializaciones se programará una reunión con todas las juntas, para que definan acciones para permitir que la obra se ejecute y establecer dialogo con el grupo opositor, para que se logren acuerdos.

Se deja video y presentación impresa para que el presidente de la junta haga otras socializaciones en su barrio.

Quedando claro para los asistentes las alternativas y la elección de esta se da por terminada la reunión a las 5:30 pm

Se adjunta la lista de asistencia a la reunión y registros fotográficos

5. ANEXOS

Lista de asistencia

		PAP-POA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGS-MG		Código: FT-SO-01	
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.						Versión: 02	
						Fecha de Vigencia: 2023-06-01	
LISTADO DE ASISTENCIA							
FECHA	DD	MM	AAAA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ASISTENTES	
	01	06	2023	08:00	11:00		
Se socializa el proyecto de construcción de la bocatoma de extracción de agua en el barrio de puente rojo, con la comunidad de puente rojo y comunidades aledañas.							
ASISTENTES							
Número	Nombre	Dependencia	Telefono	Correo Electrónico	Firma		
1	Efraim Fernando Martínez	Consejeros	316 212950				
2	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
3	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
4	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
5	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
6	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
7	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
8	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
9	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
10	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
11	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
12	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
13	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
14	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				
15	Arto. Fabian Afanador	Consejeros	316 212950				



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE






ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

Registro fotográfico



Elaboro MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICENO trabajadora social Consorcio Redes y PTAPS Valle

 PAP-PDA				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015
LISTADO DE ASISTENCIA						
FECHA:	04	09	2020	HORA INICIAL:	HORA FINAL: 4 pm	LUGAR: Barrio Ceibas azules
DD	MM	AAAA				
Socialización del proyecto de construcción de Sistema de captación, conducción, conducción y optimización yalmacero/captación a Comunidad del Barrio Ceibas azules.						
ASISTENTES						
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma	
1	Ysa Fernanda Martinez	Concepsoc	3162534994	---		
2	Flo. Maria Martinez	Concepsoc	3154856507	---		
3	Gina L. Lopez Pineda	Concepsoc	3117356852	---		
4	JAIMIGUARDIA	AFRICOT	---	---		
5	Luis Fernando Delgado Leal	Habitante sector	3206563362	---		
6	Angelica Virent Agudelo Penagos	Habitante sector	3102273965	---		
7	Orin Herman Agudelo Penagos	Presidente Junta	3108766501	penagos033@gmail.com		
8	Gloria Angelica Penagos	Delegada Junta	3219987854	---		
9	Saturia Baureto	OTR de la zona	3165257110	---		
10	Olga Lucia Agudelo Ramirez	Delegada Junta	3157820645	Olga1978@hotmail.com		
11	Neiker Abadía Londoño	Interventor	3206169098	neikerac@gmail.com		
12	Dario Enrique Flores Trojillo	Contratista	3206298190	Contratistas y PPAI Bogota		
13	John Jairo Corno Olave	Contratista	365203570	jjcorno@intertec.com		
14						
15						

	ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
---	------------------------	--

Fecha:	Municipio de Guacarí, 8 junio de 2023
Contrato No:	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para “construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca”
Localización:	Municipios De Ginebra Y Guacarí
Contratista:	Consortio Redes y PTAPS Valle
Interventoría:	Consortio Interguacarí
Supervisión:	Vallecaucana De Aguas S.A E. S. P

OBJETIVO: Realizar socialización a los habitantes de los municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de informar a la comunidad sobre ejecución del proyecto contrato de obra 2000.13.05.003-2022	INICIO: 4:00 pm FIN: 5:30 P.M
	LUGAR: Casa Comunal Corregimiento El Placer Pichichi

	ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
---	------------------------	--

CONTENIDO

1. LISTADO DE PRESENTES /VERIFICACION DE ASISTENCIA

Se toma asistencia por parte del Consorcio Redes y PTAPS Valle, se hacen presentes el personal delegado del consorcio, interventoría y habitantes del corregimiento Placer sector Pichichi.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:00 pm, se da inicio a la reunión por parte de la profesional social del Consorcio Redes y PTAPS Valle María Fernanda Martínez, quien presenta el equipo de trabajo conformado por:

- Ing. Civil residente Darío Enrique Flórez.
- Profesional SST Flor María Martínez.
- Profesional Social Neisler Abadía en representación de la interventoría Interguacari.

Se inicia agradeciendo a todos los asistentes y explica que la convocatoria se realizó a través del señor Carlos Hebert Mora, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento el Placer-Pichichi, quien está interesado en que su comunidad conozca el proyecto y se aclare todo tipo de desinformación que se ha venido generando en la comunidad.

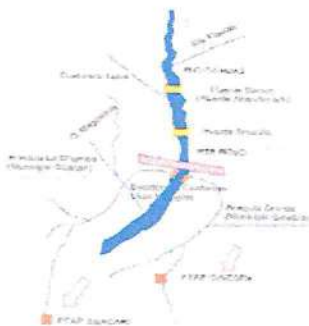
Se explica la problemática que en la actualidad se presenta con la comunidad de Puente Rojo y las comunidades aledañas al cañón del Rio Guabas, quienes no son beneficiarios directos del proyecto, pero se ven afectados durante la ejecución de las obras. En anteriores socializaciones se ha explicado el desarrollo de las obras y las técnicas a utilizar para minimizar el impacto en la placa huella, sin embargo, estas comunidades denominadas pro- territorio, cabildo indígena y negritudes han ejercido resistencia mediante la presencia en el los sitios de inicio de las obras en la Bocatoma y línea de conducción la Esmeralda impidiendo la ejecución del proyecto.

Se continua con la presentación del proyecto explicando que, para la ejecución del mismo, se han realizado previos estudios hidrológicos, geológicos y ambientales que son los soportes técnicos para la toma de decisiones y ubicación de la bocatoma para los dos acueductos, también explica que dentro de los estudios y diseños realizados la mejor opción era captar el agua en la parte de arriba (sector Puente Piedra) para la bocatoma, y a través de unas líneas de conducción se captara el agua para suministrar a los dos municipios.


3. PRESENTACIÓN



ANTECEDENTES



- El río Guabás presenta características físicoquímicas de difícil tratamiento en épocas de invierno (Alta Turbiedad), afectando el funcionamiento de las Plantas de Potabilización de Agua actuales.
- La Quebrada Lulos aporta gran cantidad de sedimentos al río Guabás, afectando la calidad del agua de la actual captación.
- La Acequia Grande y la Acequia La Chamba, son derivaciones que fueron construidas hace más de 60 años para uso agrícola y el abastecimiento para las plantas de potabilización de los acueductos de Ginebra y Guacarí.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba presentan socavaciones. El estudio de Geología realizado por la consultoría califica esta zona como POCO FAVORABLE, para construcción de nuevas estructuras.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba conducen el agua por medio de canales abiertos en tierra y concreto, vulnerables a la contaminación por escorrentía de cultivos adyacentes (pesticidas, agroquímicos) y descargas de aguas residuales.



FUENTES HÍDRICAS DISPONIBLES

Durante la fase de Estudios y Diseños se desarrolló el Estudio Hidrológico, analizando el río Guabás, el río Flautas y la Quebrada La Magdalena como fuentes hídricas disponibles en la zona de influencia del proyecto, concluyendo lo siguiente:

1. **Río Guabás:** cuenta con capacidad hídrica durante todo el año, con un caudal disponible para consumo humano máximo de 7173 L/s y mínimo de 1263 L/s.
2. **Río Flautas:** El caudal disponible es de 108 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.
3. **Quebrada La Magdalena:** El caudal disponible es de 44 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.

Por tanto, las fuentes hídricas como el río Flautas y la Quebrada La Magdalena no podrían suplir la demanda de los acueductos de Ginebra y Guacarí.





ALTERNATIVAS PROPUESTAS

- En la Fase II de los Estudios y Diseños se plantearon tres (3) alternativas de solución:

- 1) **ALTERNATIVA 1:** Captación #1 en río Guabas, Captación #2 en río Flautas (Complementaria en época de invierno) y Captación #3 en Quebrada La Magdalena (Complementaria en época de invierno).
- 2) **ALTERNATIVA 2:** Captación en río Guabas
- 3) **ALTERNATIVA 3:** Abastecimiento de Agua Subterránea

Todas las alternativas incluyeron la optimización y ampliación de las Plantas de Potabilización y proyección de almacenamiento de agua potable.



ALTERNATIVA SELECCIONADA

1. **ALTERNATIVA 1 - Bocatoma en río Guabas, río Flautas y la Quebrada La Magdalena:** El río Flautas y la Quebrada La Magdalena no garantizan el caudal requerido para el abastecimiento de los municipios de Ginebra y Guacarí, cuando sea necesario suspender la captación del río Guabas. Adicionalmente, un sistema de abastecimiento con tres (3) bocatoma, implica mayores costos de operación y mantenimiento.
2. **ALTERNATIVA 2 – Bocatoma en río Guabas:** conforme con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, el río Guabas cuenta con la capacidad hídrica para abastecer los acueductos de Ginebra y Guacarí.
3. **ALTERNATIVA 3 – Abastecimiento de Agua Subterránea:** - Cerca a la Planta de Potabilización de Ginebra no existen pozos subterráneos cercanos; y, cerca a la Planta de Potabilización de Guacarí se encontraron nueve (9) pozos, de los cuales ocho (8) se localizan en zona de recarga y uno (1) en zona de alta contaminación, condiciones en las que la normatividad vigente no permite su uso para consumo humano.

En consecuencia, se plantea como solución integral del sistema de abastecimiento la **ALTERNATIVA 2**.



OBRAS A EJECUTAR

- BOCATOMA
- DESARENADOR
- LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA PEAD DE 18"
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (CADICA)
- LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Ginebra: Tubería PEAD 10"
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Guacarí: Tubería PEAD 14"
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA

ALCANCE DEL PROYECTO

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (CAPTACIÓN-ADUCCIÓN-CONDUCCIÓN-PTAP) DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, PERMITIENDO BRINDAR UN SERVICIO QUE GARANTICE CONDICIONES ÓPTIMAS DE CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.



Esta obra está proyectada para dar solución a los municipios de Ginebra y Guacarí por 25 años cubriendo una población al año 2042 de 90.000 habitantes entre los dos municipios. Permitiendo con ello, garantizar el suministro constante del agua a las comunidades del sector urbano.

Dichas obras están proyectadas para ejecutarlas en el área rural del Municipio de Guacarí y Ginebra.

4. INTERVENCIONES, DUDAS E INQUIETUDES

El señor Carlos Heberth Mora pide la palabra y expresa que ellos se abastecen del acueducto de pichichi que fue construido por el ingenio, e indica que no son beneficiarios de los acueductos de Acuavalle, pero están interesados en saber por dónde pasa la línea de conducción del acueducto de Guacarí, ya que tienen información que va a pasar por el caserío.

El ingeniero Darío Flórez explica cuál es el paso de la línea de conducción de la tubería y aclara la duda del señor Carlos Heberth Mora y demás comunidad.

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH 1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
LISTADO DE ASISTENCIA							
FECHA:	08	06	2015	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR: Confeccionamiento al placer Pichichi	
	DD	MM	AAAA				
Realizar Reunión Informativa a los habitantes del conveccionamiento al Placer - Pichichi sobre ejecución de obra							
ASISTENTES							
	Nombre			Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ja Fernando Martínez			Comunidad	316 253 4550		[Firma]
2	Arnold Cabresca			El Placer	314 758 2727		[Firma]
3	Néstor Abadía			Intendencia	310 556 9040	neilnaco@gmail.com	[Firma]
4	Elvira Ana Botero			El Placer	314 765 7636	boteroprogramacion@gmail.com	[Firma]
5	Flor María Martínez			Comunidad	315 485 6307	FlorMarta2004@hotmail.com	[Firma]
6	Sandra Viviana Culebra			El Placer	310 45 77714	Sandra.Viviana.Culebra@elplacer.gov.co	[Firma]
7	Claudia Marcela Obando			El Placer	315 398 3516	claudia.marela.obando@elplacer.gov.co	[Firma]
8	Edna Quiroz Plata			El Placer	317 223 9146	EdnaQuiroz@elplacer.gov.co	[Firma]
9	Carlos Roberto Mora Ceron			SDC	317 760 0158	Carlos_1370@live.com	[Firma]
10	Luz Davi Culebra			El Placer	310 666 265		[Firma]
11	Aliria Getalia			El Placer	314 514 1077	aliria.getalia@elplacer.gov.co	[Firma]
12							
13							
14							
15							

Registro fotográfico



Elaboro MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO trabajadora social Consorcio Redes y PTAPS Valle

 PAP-PDA				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2019	
LISTADO DE ASISTENCIA							
FECHA:	DD	MM	AAAA	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR: conegimiento al placer pichachi	
Realizar Reunión Informativa a los habitantes del conegimiento al Placer - Pichachi sobre ejecución de obra							
ASISTENTES							
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electronico	Firma		
1	Ma. Fernanda Cortez	Consorcio	316 2534534		<i>[Firma]</i>		
2	Arnul Cejudo Cabreza	El placer	314 7542727		<i>[Firma]</i>		
3	Nadir Abadia	Interventoria	310656048	nadirnab@gmail.com	<i>[Firma]</i>		
4	Olivia Abria Baturo	El Placer	314 7657636	baturoolivia@gmail.com			
5	Flor Lania Martinez	Contratista	315 4856307	FlorLania2200@gmail.com	<i>[Firma]</i>		
6	Sandra Viviana Culcha	el placer	3104879114	Sandra6912006@hotmail.com	<i>[Firma]</i>		
7	Claudia Marcela Obando	El Placer	3155483516	claudiamarcelachanderulvia@gmail.com	<i>[Firma]</i>		
8	Edna Quiroz Plata	El Placer	3192233946	Ednaqui@gmail.com	<i>[Firma]</i>		
9	Carlos Teberth Mora Ceron	Presidente S.D.C	319 7600158	Carlos_1370@live.com	<i>[Firma]</i>		
10	Luz Davi Culcha	El plo cev	32066965		<i>[Firma]</i>		
11	Alina Getial G.	El Placer	3145141077	k.larentabares@unicon.com	<i>[Firma]</i>		
12							
13							
14							
15							

	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
---	--	------------------------	--

Fecha:	Municipio de Guacarí, 13 junio de 2023
Contrato No:	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para “construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca”
Localización:	Municipios De Ginebra Y Guacarí
Contratista:	Consortio Redes y PTAPS Valle
Interventoría:	Consortio Interguacarí
Supervisión:	Vallecaucana De Aguas S.A E. S. P

OBJETIVO: Realizar socialización a los habitantes de los municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de informar a la comunidad sobre ejecución del proyecto contrato de obra 2000.13.05.003- 2022	INICIO 330 pm
	FIN 5:30 P.M
	LUGAR: Barrio el Cairo-Municipio de Guacari

	ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
---	------------------------	--

CONTENIDO

1. LISTADO DE PRESENTES / VERIFICACION DE ASISTENCIA

Se toma asistencia por parte del Consorcio Redes y PTAPS Valle, se hacen presentes el personal delegado del consorcio, directivas de la junta de acción comunal de la urbanización El Cairo y comunidad en general.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:00 pm, se da inicio a la reunión por parte de la profesional social del Consorcio Redes y PTAPS Valle María Fernanda Martínez, quien presenta el equipo de trabajo conformado por:

- Ing. Civil residente Darío Enrique Flórez.
- Profesional SST Flor María Martínez.

Se inicia agradeciendo a todos los asistentes y explica que la convocatoria se realizó a través de la señora María Teresa Torrez, presidente de la junta de acción comunal de la urbanización el Cairo-Municipio de Guacarí, quien expresa que la comunidad desconoce la situación actual del proyecto, por lo tanto, se debe solicita se realice una socialización en este

Se explica brevemente que el proyecto ha sido socializado en los corregimientos, barrios del área urbana y zonas aledañas de los municipios de Ginebra y Guacarí y actualmente, se está ejecutando reuniones en la zona urbana de Ginebra.

Se explica la problemática que se ha venido presentando con la comunidad de puente rojo y comunidades aledañas al cañón del Rio Guabas quienes no son beneficiarios directos del proyecto; pero se ven afectados durante la ejecución de las obras, se les ha explicado en las socializaciones anteriores el desarrollo de las obras y las técnicas para minimizar el impacto de este mismo sin embargo, estas comunidades denominadas pro- territorio, han hecho resistencia mediante presencia en el los sitios de inicio de obras Bocatoma y línea de conducción la Esmeralda impidiendo el desarrollo de las obras.

El Ing. residente procede con la presentación del proyecto explicando que, para la ejecución del mismo, se han realizado previos estudios hidrológicos, geológicos y ambientales que son los soportes técnicos para la toma de decisiones y ubicación de la bocatoma para los dos acueductos, también explica que es una sola bocatoma y posteriormente en una caja distribuidora de caudal se divide las dos líneas de conducción, una para PTAP Ginebra y otra para la PTAP Guacarí.

3. PRESENTACIÓN

ANTECEDENTES



- El río Guabas presenta características físicoquímicas de difícil tratamiento en épocas de invierno (Alta Turbiedad), afectando el funcionamiento de las Plantas de Potabilización de Agua actuales.
- La Quebrada Lulos aporta gran cantidad de sedimentos al río Guabas, afectando la calidad del agua de la actual captación.
- La Acequia Grande y la Acequia La Chamba, son derivaciones que fueron construidas hace más de 50 años para uso agrícola y el abastecimiento para las plantas de potabilización de los acueductos de Ginebra y Guacarí.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba presentan socavaciones. El estudio de Geología realizado por la consultoría califica esta zona como POCO FAVORABLE, para construcción de nuevas estructuras.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba conducen el agua por medio de canales abiertos en tierra y concreto, vulnerables a la contaminación por escorrentía de cultivos adyacentes (pesticidas, agroquímicos) y descargas de aguas residuales.



FUENTES HÍDRICAS DISPONIBLES

Durante la fase de Estudios y Diseños se desarrolló el Estudio Hidrológico, analizando el río Guabas, el río Flautas y la Quebrada La Magdalena como fuentes hídricas disponibles en la zona de influencia del proyecto, concluyendo lo siguiente:

1. **Río Guabas:** cuenta con capacidad hídrica durante todo el año, con un caudal disponible para consumo humano máximo de 7173 L/s y mínimo de 1263 L/s.
2. **Río Flautas:** El caudal disponible es de 108 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.
3. **Quebrada La Magdalena:** El caudal disponible es de 44 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.

Por tanto, las fuentes hídricas como el río Flautas y la Quebrada La Magdalena no podrían suplir la demanda de los acueductos de Ginebra y Guacarí.





ALTERNATIVAS PROPUESTAS

- En la Fase II de los Estudios y Diseños se plantearon tres (3) alternativas de solución:

- 1) **ALTERNATIVA 1:** Captación #1 en río Guabas, Captación #2 en río Flautas (Complementaria en época de invierno) y Captación #3 en Quebrada La Magdalena (Complementaria en época de invierno).
- 2) **ALTERNATIVA 2:** Captación en río Guabas
- 3) **ALTERNATIVA 3:** Abastecimiento de Agua Subterránea


Todas las alternativas incluyeron la optimización y ampliación de las Plantas de Potabilización y proyección de almacenamiento de agua potable.



ALTERNATIVA SELECCIONADA

1. **ALTERNATIVA 1 - Bocatomas en río Guabas, río Flautas y la Quebrada La Magdalena:** El río Flautas y la Quebrada La Magdalena no garantizan el caudal requerido para el abastecimiento de los municipios de Ginebra y Guacarí, cuando sea necesario suspender la captación del río Guabas. Adicionalmente, un sistema de abastecimiento con tres (3) bocatomas, implica mayores costos de operación y mantenimiento.
2. **ALTERNATIVA 2 – Bocatoma en río Guabas:** conforme con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, el río Guabas cuenta con la capacidad hídrica para abastecer los acueductos de Ginebra y Guacarí.
3. **ALTERNATIVA 3 – Abastecimiento de Agua Subterránea:** - Cerca a la Planta de Potabilización de Ginebra no existen pozos subterráneos cercanos; y, cerca a la Planta de Potabilización de Guacarí se encontraron nueve (9) pozos, de los cuales ocho (8) se localizan en zona de recarga y uno (1) en zona de alta contaminación, condiciones en las que la normatividad vigente no permite su uso para consumo humano.

En consecuencia, se plantea como solución integral del sistema de abastecimiento la **ALTERNATIVA 2**.



OBRAS A EJECUTAR

- BOCATOMA
- DESARENADOR
- LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA PEAD DE 18"
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (CADICA)
- LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Ginebra: Tubería PEAD 10"
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Guacarí: Tubería PEAD 14"
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA



ALCANCE DEL PROYECTO

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (CAPTACIÓN-ADUCCIÓN-CONDUCCIÓN-PTAP) DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, PERMITIENDO BRINDAR UN SERVICIO QUE GARANTICE CONDICIONES ÓPTIMAS DE CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.



Esta obra está proyectada para dar solución a los municipios de Ginebra y Guacarí por 25 años cubriendo una población al año 2042 de 90.000 habitantes entre los dos municipios. Permitiendo con ello, garantizar el suministro constante del agua a las comunidades del sector urbano.

Dichas obras están proyectadas para ejecutarlas en el área rural del Municipio de Guacarí y Ginebra.

4. INTERVENCIONES, DUDAS E INQUIETUDES

La profesional social del Consorcio Redes y PTAPS Valle hace la invitación a la comunidad para que hagan parte del comité de veeduría que se conformara en los próximos días.

La comunidad expresa que es una urbanización nueva, y que la prestación del servicio de agua lo cobran a un costo muy alto.



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

El ingeniero Darío explica que el proyecto salió por parte de la gobernación y que el contratante es Vallecaucana de agua que no es para incrementar el servicio, si no para prestar un mejor servicio de calidad.

La comunidad expresar haber entendido la presentación, y consideran importante la socialización ya que la mayoría de la comunidad desconocía del proyecto.

Quedando claro para los asistentes las alternativas y la elección de esta para que se pueda ejecutar el proyecto.

Se da por terminada la reunión a las 5:30 pm, se deja video y presentación impresa para que el presidente y demás participantes amplíen información al resto de comunidad.

5. ANEXOS

Se adjunta la lista de asistencia a la reunión.

Lista de asistencia

		PAP-PDA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH 1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia 12/05/2015	
FECHA: 13 DE 06 DE 2023		HORA INICIAL:		HORA FINAL: 3:40 P.m		LUGAR: Barrio el Cairo	
DD		MM		AAAA		municipio guacari	
socializar contrato de obra construcción sistema de captación, conducción y optimización y pta p x las comunidades de los municipios guacari y queceni							
ASISTENTES							
	Nombre			Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ma. Fernanda Martínez			Consejería	316 353 4554		[Firma]
2	Favian Abadia			clad	3117578198		[Firma]
3	Cecilia C. Guzmán			clad			
4	Ana Jacqueline Vasquez			clad	316 640 5536	Juanita Vasquez	[Firma]
5	María Riza			J.A.C.	31 804 08952	luzmaria1970@gmail.com	[Firma]
6	Roberto Castañeda				4325459	celso	[Firma]
7	Jorge Amparado				314 485 7166		[Firma]
8	Flor María Farfán			archelista	5154555507		[Firma]
9	José Andrés Méndez Ramos				318 505 0640		[Firma]
10	Raúl Rodríguez Arce			correa	311474220		
11	Carmen R. Alvarado			clad	guacari		
12	José Antonio López			clad	6855200	3148269553	[Firma]
13	Victor Manuel DÍ			CC	6324255		[Firma]
14	Dolores Alvarado			clad	14 886 703		[Firma]
15	Esmeralda Leal P.			Habitante el Cairo	291286 658		[Firma]



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE





ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

Registro fotográfico



Elaboro MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO trabajadora social Consorcio Redes y PTAPS Valle

 PAP-PDA GOBIERNO DEL VALLE CAUCA				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015
LISTADO DE ASISTENCIA						
FECHA:	DD	MM	AAAA	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR:
13	06	2013			3:40 P.m	Barrío el Cairo
socializar con los líderes de obra construcción sistema de captación Admisión y conducción y optimización y pta p x las edificaciones de los municipios guacaria y quequen						
ASISTENTES						
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma	
1	Mra Fernanda Martínez	Consejería	3163534556			
2	Favian Abadía	alcalde	3117578198			
3	CRISTINA CR GARCIA	alcalde				
4	Mrs Jacqueline Vasquez	alcalde	3166408536	JacquelineVasquez@guacaria.gov.co		
5	Margela Rivas	J.A.C	3182490853	luzmaria177@gmail.com		
6	Roberto Castañeda		4325859			
7	Alfonso Pineda		3144857166			
8	Florencia Farfán	controlista	515445653			
9	Jose Andres Morales Rivas		3185650640			
10	Rafaela Rodríguez	correa	3117142210			
11	Carmen Rivas	alcalde	guacaria			
12	Jose Antonio Lopez	alcalde	46855200	3148269553		
13	Victor Manuel Vil	CC	6324235			
14	Oliverio Morales	alcalde	14.986 703			
15	Esmeralda Leal P	Habitante el Cairo	291286 655			

	ACTA DE REUNIÓN	FT-SO-01 Versión 02 F.E. Junio 2023
---	------------------------	--

Fecha:	Municipio de Guacarí, 14 junio de 2023
Contrato No:	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para “construcción del sistema de captación, aducción, conducción y optimización del almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca”
Localización:	Municipios De Ginebra Y Guacarí
Contratista:	Consorcio Redes y PTAPS Valle
Interventoría:	Consorcio Interguacarí
Supervisión:	Vallecaucana De Aguas S.A E. S. P

OBJETIVO: Realizar socialización a los habitantes de los municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de informar a la comunidad sobre ejecución del proyecto contrato de obra 2000.13.05.003- 2022	INICIO: 4:00 pm
	FIN: 5:30 P.M LUGAR: Corregimiento Canangua - Mpio de Guacarí



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

CONTENIDO

1. LISTADO DE PRESENTES /VERIFICACION DE ASISTENCIA

Se toma asistencia por parte del Consorcio Redes y PTAPS Valle, se hacen presentes el personal delegado del consorcio, interventoría, directivas de la junta de acción comunal del corregimiento de Canangua y comunidad en general.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:00 pm, se da inicio a la reunión por parte de la profesional social del Consorcio Redes y PTAPS Valle María Fernanda Martínez, quien presenta el equipo de trabajo conformado por:

- Ing. Civil residente Darío Enrique Flórez.
- Profesional SST Flor María Martínez.
- Profesional Social Neisler Abadía en representación de la interventoría Interguacari.

Se inicia agradeciendo a todos los asistentes y explica que la convocatoria se realizó a través del señor Sergio Salazar Saavedra, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Canangua- Municipio de Guacarí, quien expresa que la comunidad desconoce la situación actual del proyecto, por lo tanto, se debe solicita se realice una socialización en este corregimiento.

Se explica brevemente que el proyecto ha sido socializado en los corregimientos, barrios del área urbana y zonas aledañas de los municipios de Ginebra y Guacarí y actualmente, se está ejecutando reuniones en la zona urbana de Guacarí.

Se explica la problemática que en la actualidad se presenta con la comunidad de Puente Rojo y las comunidades aledañas al cañón del Rio Guabas, quienes no son beneficiarios directos del proyecto, pero se ven afectados durante la ejecución de las obras. En anteriores socializaciones se ha explicado el desarrollo de las obras y las técnicas a utilizar para minimizar el impacto en la placa huella, sin embargo, estas comunidades denominadas pro- territorio, cabildo indígena y negritudes han ejercido resistencia mediante la presencia en el los sitios de inicio de las obras en la Bocatoma y línea de conducción la Esmeralda impidiendo la ejecución del proyecto.

El Ing. residente procede con la presentación del proyecto explicando que, para la ejecución del mismo, se han realizado previos estudios hidrológicos, geológicos y ambientales que son los soportes técnicos para la toma de decisiones y ubicación de la bocatoma para los dos acueductos, también explica que es una sola bocatoma

y posteriormente en una caja distribuidora de caudal se divide las dos líneas de conducción, una para PTAP Ginebra y otra para la PTAP Guacarí.

3. PRESENTACIÓN



ANTECEDENTES



- El río Guabas presenta características físicoquímicas de difícil tratamiento en épocas de invierno (Alta Turbiedad), afectando el funcionamiento de las Plantas de Potabilización de Agua actuales.
- La Quebrada Lulos aporta gran cantidad de sedimentos al río Guabas, afectando la calidad del agua de la actual captación.
- La Acequia Grande y la Acequia La Chamba, son derivaciones que fueron construidas hace más de 60 años para uso agrícola y el abastecimiento para las plantas de potabilización de los acueductos de Ginebra y Guacarí.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba presentan socavaciones. El estudio de Geología realizado por la consultoría califica esta zona como POCO FAVORABLE, para construcción de nuevas estructuras.
- Las derivaciones de la Acequia Grande y la Acequia La Chamba conducen el agua por medio de canales abiertos en tierra y concreto, vulnerables a la contaminación por escorrentía de cultivos adyacentes (pesticidas, agroquímicos) y descargas de aguas residuales.



FUENTES HÍDRICAS DISPONIBLES

Durante la fase de Estudios y Diseños se desarrolló el Estudio Hidrológico, analizando el río Guabas, el río Flautas y la Quebrada La Magdalena como fuentes hídricas disponibles en la zona de influencia del proyecto, concluyendo lo siguiente:

1. **Río Guabas:** cuenta con capacidad hídrica durante todo el año, con un caudal disponible para consumo humano máximo de 7173 L/s y mínimo de 1263 L/s.
2. **Río Flautas:** El caudal disponible es de 108 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.
3. **Quebrada La Magdalena:** El caudal disponible es de 44 L/s, muy por debajo de lo requerido para los acueductos de 233 L/s.

Por tanto, las fuentes hídricas como el río Flautas y la Quebrada La Magdalena no podrían suplir la demanda de los acueductos de Ginebra y Guacarí.





CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

- En la Fase II de los Estudios y Diseños se plantearon tres (3) alternativas de solución:

- 1) **ALTERNATIVA 1:** Captación #1 en río Guabas, Captación #2 en río Flautas (Complementaria en época de invierno) y Captación #3 en Quebrada La Magdalena (Complementaria en época de invierno).
- 2) **ALTERNATIVA 2:** Captación en río Guabas
- 3) **ALTERNATIVA 3:** Abastecimiento de Agua Subterránea


Todas las alternativas incluyeron la optimización y ampliación de las Plantas de Potabilización y proyección de almacenamiento de agua potable.



ALTERNATIVA SELECCIONADA

1. **ALTERNATIVA 1 - Bocatoma en río Guabas, río Flautas y la Quebrada La Magdalena:** El río Flautas y la Quebrada La Magdalena no garantizan el caudal requerido para el abastecimiento de los municipios de Ginebra y Guacarí, cuando sea necesario suspender la captación del río Guabas. Adicionalmente, un sistema de abastecimiento con tres (3) bocatoma, implica mayores costos de operación y mantenimiento.
2. **ALTERNATIVA 2 – Bocatoma en río Guabas:** conforme con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, el río Guabas cuenta con la capacidad hídrica para abastecer los acueductos de Ginebra y Guacarí.
3. **ALTERNATIVA 3 – Abastecimiento de Agua Subterránea:** - Cerca a la Planta de Potabilización de Ginebra no existen pozos subterráneos cercanos; y, cerca a la Planta de Potabilización de Guacarí se encontraron nueve (9) pozos, de los cuales ocho (8) se localizan en zona de recarga y uno (1) en zona de alta contaminación, condiciones en las que la normatividad vigente no permite su uso para consumo humano.

En consecuencia, se plantea como solución integral del sistema de abastecimiento la **ALTERNATIVA 2**.




OBRAS A EJECUTAR

- BOCATOMA
- DESARENADOR
- LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA PEAD DE 18"
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (CADICA)
- LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Ginebra: Tubería PEAD 10"
 - ✓ TRAMO CADICA – PTAP Guacarí: Tubería PEAD 14"
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA
- INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA



ALCANCE DEL PROYECTO

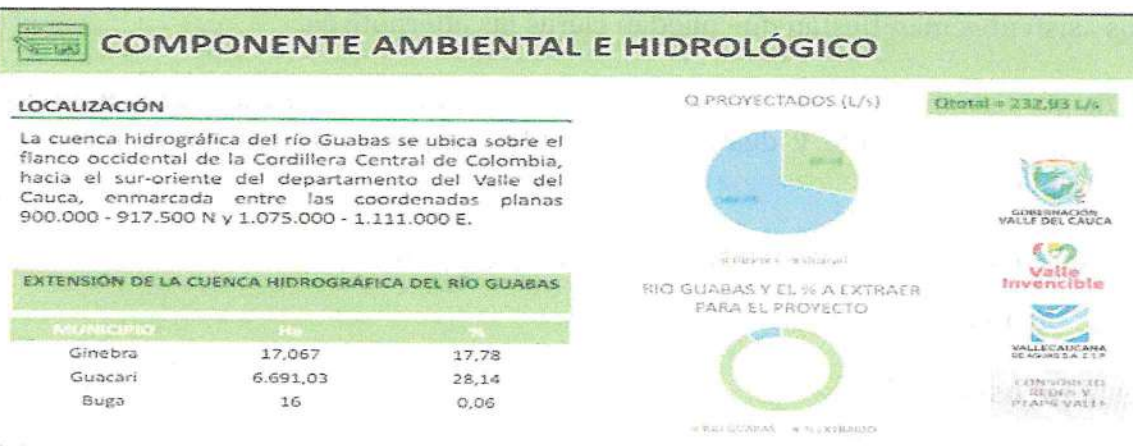OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (CAPTACIÓN-ADUCCIÓN-CONDUCCIÓN-PTAP) DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, PERMITIENDO BRINDAR UN SERVICIO QUE GARANTICE CONDICIONES ÓPTIMAS DE CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.



Esta obra está proyectada para dar solución a los municipios de Ginebra y Guacarí por 25 años cubriendo una población al año 2042 de 90.000 habitantes entre los dos municipios. Permitiendo con ello, garantizar el suministro constante del agua a las comunidades del sector urbano.

Dichas obras están proyectadas para ejecutarlas en el área rural del Municipio de Guacarí y Ginebra.

4. INTERVENCIONES, DUDAS E INQUIETUDES

Intervine un líder de la comunidad quien expresa que un tubo del acueducto actual, está en muy mal estado y solicita que por favor les colaboren, pues el tubo que lleva el agua requiere de su cambio, ya que en varias ocasiones lo han manifestado a Acuavalle y hasta el momento no lo han arreglado.

De igual manera manifiesta, que el alcantarillado presenta deficiencias y en temporadas de lluvia, el agua residual se devuelve e ingresa por los baños y



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

sanitarios inundando las casa, puesto que la capacidad del tubo del alcantarillado no es suficiente para el agua que recibe.

Frente a esta solicitud planteada el Ing. residente explica, que dicha inquietud será llevada a comité técnico, interventoría y Vallecaucana para que sea trasladada a la entidad competente.

La profesional social del Consorcio Redes y PTAPS Valle hace una invitación a la comunidad para que hagan parte del comité de veeduría que se conformara en los próximos días, también informa la importancia que tiene la comunidad en la participación del comité de veeduría.

Los asistentes manifiestan que quedan claras las alternativas.

Se da por terminada la reunión a las 5:30 pm, se deja video y presentación impresa para que el presidente y demás participantes amplíen información al resto de comunidad.

Se adjuntan listado de asistencia y registro fotográfico.

5. ANEXOS

Lista de asistencia

		PAP-PDA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOC - MECI		Código: FT-TH 129	
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.				LISTADO DE ASISTENCIA		Versión: 2	
						Fecha de Vigencia: 11/05/2023	
FECHA:	14 06 2023	NORA INICIAL:	4pm	NORA FINAL:	6:00pm	LUGAR:	Asesoría comunal
DO	MM	AAAA					Compendio granada
20 de mayo de 2023, obra "construcción sistema de captación, conducción y optimización de PTAPS para la reducción de tormentas y aguas y gases"							
ASISTENTES							
	Nombre		Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma	
1	Carmen Elena Trujillo A		Comunidad	320769849		Carmen E. A.	
2	Luz Myriam Saavedra		Comunidad	3126012162		Luz Myriam S.	
3	Bernardo Saavedra		Comunidad			Bernardo S.	
4	Elisa Milena Holguin S		Comunidad	3136760339		Milena Holguin	
5	Ha Tamara Aponte		Comunidad	316053477		Ha T.	
6	Flo. F. de. Aponte		Comunidad	3134776503		Flo. F. de. A.	
7	Martha L. de. S.		Comunidad	3126012162		Martha L. de. S.	
8	Sergio Salazar Saavedra		JAC	3178547511		Sergio Salazar S.	
9	Elizabeth Arce S		Amado Caza	317498846		Elizabeth Arce S.	
10	Eric S.		JAC	3137602776		Eric S.	
11	Dora Enriqueta de. Trujillo		Comunidad	3016258199		Dora E. T.	
12	Enrique Arce		Comunidad	320769849		Enrique A.	
13							
14							
15							



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

ACTA DE REUNIÓN

FT-SO-01
Versión 02
F.E. Junio 2023

Registro fotográfico



Elaboro MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO trabajadora social Consorcio Redes y PTAPS Valle

 PAP-PDA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-TH.1.2.2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
LISTADO DE ASISTENCIA					
FECHA:	14	06	2015	HORA INICIAL: 4pm	HORA FINAL: 6:00 pm
CD	MM	AAAA			LUGAR: Caseta comunal
Socialización contrato de obra "Reconstrucción sistema de captación, aducción y conducción y optimización y Pta ps para las acequias de las municipalidades quebrera y guacón"					
ASISTENTES					
	Nombre		Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico
1	Carmen Eliana Trujillo A		comunidad	3207699648	Carmen E + A
2	Luz Myriam Saavedra		comunidad	3126012162	Luz Myriam S
3	Bernardo Saavedra		comunidad		Bernardo S
4	Elisa Milena Holguin S.		comunidad	3136760339	Milena Holguin
5	Ma Fátima Martínez		comunidad	316253477	Ma F
6	Flor Yareli Martínez		comunidad	3134886603	Flor Yareli M
7	Martha Lilia S.		comunidad	3126012162	Martha Lilia S
8	Sergio Salazar Saavedra		JAC	3178547511	Sergio Salazar
9	Elizabeth Arce S		Amadeo	3117498846	Elizabeth Arce S
10	Zene S		JAC	3137603796	Zene S
11	Dana Enrique Floet Trujillo		Contratista	3016268199	Dana E
12	Nidia Abadía		Interventora	320689240	Nidia
13					
14					
15					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 25/02/2019
		Página: 1 de 7

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO No. 005

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GUACARI

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO REDES PTAPS VALLE

**NOMBRE PROFESIONAL SST INTERVENTORIA:
JULIANA MARULANDA**

SANTIAGO DE CALI

JULIO 05 DE 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 2 de 7
---	---	--

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría deberá realizar una descripción de cada uno de los ítems, así como reportar todo hallazgo que considere pertinente el profesional de SST de la interventoría. Anexar documentación y/o evidencia fotografía para dar soporte al hallazgo.

1. AFILIACIÓN A LOS TRABAJADORES AL SGRL

Guía 1. Mencionar al personal que se encuentre vinculado y aportar evidencia de la vinculación. En este ítem reportar las novedades del mes en Seguridad Social y toda información que como interventoría considere pertinente.

Nombre	Cargo	Cédula No.
ALEJANDRO ESTRADA	Director de obra	16.680.829
JESUS IVAN BASTIDAS	Residente de obra	16.267.590
ANDRES FLECHAS	Topógrafo	80.724.554
JULIAN ANDRADE H.	Apoyo Interventoría	94.456.752
JULIANA MARULANDA	Profesional SST	1.107.071.993
NEISLER ABADIA	Trabajadora social	66.658.922

2. INFORMACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Guía 2. Reportar indicadores de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del mes, así como la evidencia de la investigación y plan de acción dado el caso. Continuar haciendo seguimiento a aquellos casos que no hayan tenido cierre. De igual forma reportar toda información que como interventoría considere pertinente.

En el mes de junio no se presentaron incidentes, accidentes o enfermedades profesionales,
No se reportan incapacidades médicas a causa de enfermedad común.

3. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 3 de 7
---	---	--

Guía 3. Describir las actividades del plan de trabajo ejecutadas en el mes de acuerdo al cronograma, así como el porcentaje de avance del mismo. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, en el mes de junio
Se realizan charlas de seguridad, Políticas, Reglamento de higiene, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Se realiza las inspecciones de elementos de protección personal y maquinaria.

4. POLITICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST

Guía 4. Aportar evidencia de la socialización y/o divulgación de la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al personal, así como los indicadores de cumplimiento de los mismos. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: Se realiza divulgación de las políticas SST, no alcohol, drogas y fumadores del Consorcio REDES Y PTAS VALLE, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación
De residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro se adjunta evidencia fotográfica.

5. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Guía 5. Evidenciar si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de junio, se implementa planos de rutas de evacuación de las
PTAP de Ginebra y Guacari

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 4 de 7
---	---	--

Guía 6. Evidenciar si el contratista cuenta con elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, así como la evidencia de entrega (Listado de entrega de dotación y EPP- Evidencia fotografía del uso de los mismos). Aportar evidencia de que los trabajadores hacen uso adecuado de estos y otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El personal cuenta con los EPP necesarios para realizar su labor, en el informe de obra se adjunta registro de entrega EPP a los colaboradores nuevos.

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Guía 7. Evidenciar si los trabajadores cuentan con sus exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso. De igual forma, asegurarse que el suministro de la información sea pertinente para alimentar los Sistemas de vigilancia Epidemiológica y programas de Prevención y Promoción que tenga implementada la empresa, así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: durante el mes de junio se verifica el cumplimiento del programa de medicina Preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar El estado integral de todos los colaboradores. En este periodo no se hacen vinculaciones de personal.

8. CAPACITACIONES EN EL SG-SST

Guía 8. Evidenciar (Listado de asistencia – Registro Fotográfico) si el contratista de obra garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inducción, re inducción y otros aspectos de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de Junio se realizan las siguientes capacitaciones: Charla se seguridad ATS Desmaleza ATS Descargue y traslado de tubería

9. PROCEDIMIENTO OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 5 de 7
---	---	---

Guía 9. Verificar si el contratista de obra cuenta con POE para las diferentes tareas rutinarias o no rutinarias que realiza durante el desarrollo de la obra, así como tareas de alto riesgo. De igual forma evidenciar el cumplimiento del mismo. Describir otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista presenta un ATS para las tareas de alto riesgo según avance de la Obra (Descargue y traslado de tubería, y ATS Desmalezar).

10. CONTROL CONTRATISTA

Guía 10. Verificar si el contratista de obra incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; así como el control correspondiente. Describir otra información que como interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista hace uso de carnets para la identificación del personal interno visitantes de obra y subcontratistas.

11. OTRAS OBSERVACIONES

Descripción:

12. CONCLUSIONES

Descripción: Se da cumplimiento con las normas de seguridad de acuerdo a las actividades Programadas en el plan de trabajo, durante este periodo hay pocas actividades operativas, se ha enfocado más el trabajo social en cuando a la divulgación del proyecto a las comunidades. Y reuniones para validación en Vallecaucana y Acuavalle.

13. RECOMENDACIONES

Descripción:

14. ANEXOS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: FO-PDA.2.1-6
	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 25/02/2019
		Página: 6 de 7

Planillas de seguridad social.

NOMBRE:	JULIANA MARULANDA
FIRMA PROFESIONAL SST:	<i>Juliana Marulanda</i>
LICENCIA SST:	4557 25/08/2022




EL CONTADOR PÚBLICO TITULADO
EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T

C E R T I F I C A

Que el ingeniero civil **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ** identificado con la cedula de ciudadanía número **16.254.057** expedida en la ciudad de Cali (V), en su calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERGUACARI**, con nit **901.652.925-3**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en consecuencia se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto referente al pago de aportes y de salarios, hasta el mes de Junio de 2023.

La presente certificación va dirigida a la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Dado en Cali a los Treinta (30) días del mes de junio de 2023.


EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T
C.C. 14.963.623 de Cali


EDUARDO CÁRDENAS R.
CC. 16.254.057
REP. LEGAL CONSORCIO INTERGUACARÍ

Mpio de Dagua, cgto. El Carmen Parcelacion Hatochico San Diego casa K-3
Cel. 319-424-1489

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A50560A076120A00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUARDO ALI ALBAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14963623 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 5063-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 14.963.623

ALBAN VARGAS

APELLIDOS
EDUARDO ALI

NOMBRES

IRM



FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1950

CALI (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA 1.75 C.S. RH SEXO

19-MAY-1977 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3100150-00207164-M-0014963623-20100104 0019544391A 2810030629

ADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
