

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º 2305 MINISTERIO – MUNICIPIO DE EL TARRA- NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN JULIO

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA – NORTE DE SANTANDER		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 9 y 8 entre calles 3 y 4 barrio villa esperanza		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL, DEL CONVENIO		\$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		\$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		\$0.00
	OTROS APORTES		\$0
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 27/12/2022		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	27 de diciembre de 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/12/2022 póliza inicial		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	\$ 1.323.645.000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	\$ 147.072.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$0.0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➤ Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Firma del convenio 2. Inicio proceso de contratación 3. desembolso	NO APLICA	29/12/2022	\$588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	4.	NO APLICA	x	\$0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 588.286.800 0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. POLIZA CONVENIO : 3522436-9

Nombre Aseguradora: suramericana

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
	Cumplimiento	\$294.143.400	27-DIC-2022	27-ENE-2024
	Calidad de servicio			

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
NºMT-LP-001-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO1, OPCIÓN 1, EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER		\$1.323.645
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	RN INGENIERIA S.A.S.		R/L CAMILO ANDRES RAMIREZ NUMA
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	27/09/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$1.323.645
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA Nº	49-44-101005079 CUMPLIMIENTO 49-40-101002350 RCE		
FECHA DE LA POLIZA	18/04/2023 ANEXO 0 05/05/2023 ANEXO 2		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N°MT-CM-003-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE (TIPO 1) PARA EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE SANTANDER		\$147.072.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON		Representante legal
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023		

Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	27/09/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$.147.072.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA N°	56-44-101005145		
FECHA DE LA POLIZA	25/04/2023 ANEXO 0 03/05/2023 ANEXO 2		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	31/05/2023	29/06/2023
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	31/05/2023	29/06/2023
INFORME FINANCIERO	NO APLICA PARA ESTE CORTE	NO APLICA PARA ESTE CORTE
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$588.286.800	\$588.286.800
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	100%	Correspondiente a los estudios y diseños
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

.0%

% EJECUTADO DE OBRA

.0%

% AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: JULIO

AVANCE: 100 % ; AVENCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTADO: TERMINACION Y APROBACION D EESTUDIOS Y DISEÑOS

RECURSOS GIRADOS:

Pendiente por recibir: TODAVÍA NO INICIA OBRA

INFORME DE ACTIVIDADES

NOTA:

Se realizó las siguientes actividades

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1

El proyecto debe ser entregado en medio físico, los planos deben presentarse firmados por el diseñador, consultor, interventor y el supervisor del Municipio. Anexar copia de los documentos y planos en medio digital.

2

Copia de la Licencia para la Construcción del Sacúdete al Parque, así como permisos ambientales expedida por la autoridad competente.


3

NOTA: Se debe anexar este documento al Anexo No. 7. Formato Acta de Reunión de Seguimiento a la Ejecución Contractual GC-P3-F7.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/05/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

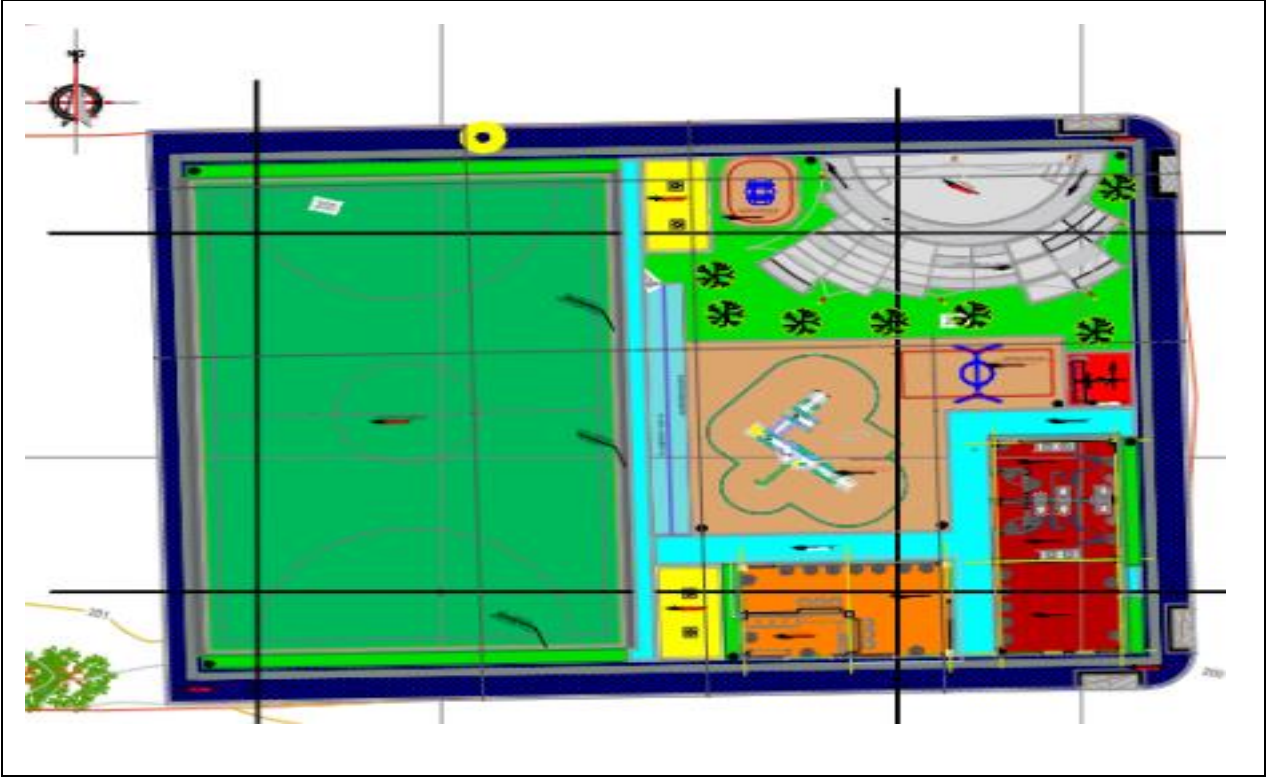

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

Original firmado

YERSON SAMID CHINCHILLA MONGUI
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

OSCAR ARLEY NAVARRO GONZALES
APOYO SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Anexo cronograma de ejecución

