

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 1 de 4

**EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA**

Que el contrato No. 253 de 2023, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista			Número Nit o C.C. y lugar expedición		No. informe		
DC PROJECT S.A.S R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA			NIT. 901.410.401-8 C.C N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca.		1	de	2
Fecha de presentación			Periodo del informe:		Municipio prestación del servicio		
Día	Mes	Año	De	Al			
28	SEPTIEMBRE	2023	07/09/2023	21/09/2023	San Francisco		
Objeto del contrato			ADECUACION A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO.				
Tipo de contrato:			Obra				
Fecha de Inicio			07/09/2023	Fecha de Terminación	06/10/2023		
Plazo			Un mes				
Valor total del contrato			CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$156.496.207) MDA/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS.				
Prorrogas			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Adiciones			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Suspensiones			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Modificatorios			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Interventoría			N/A				
Nueva fecha de terminación			N/A				
Forma de pago			El valor del contrato a suscribir será por la suma CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$156.496.207) MDA/CTE, Incluido IVA y todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir EL CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato que se suscribe.				

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

 <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 2 de 4

	<p>El valor inicial o precio del contrato es estimativo del costo total, y se establecerá para efectos fiscales teniendo en cuenta los servicios a adquirir (alquilar) y los precios unitarios por los cuales se hará la respectiva adjudicación. El valor o precio inicial del contrato no tiene alcance vinculante u obligacional, pues el valor real se establecerá una vez se concluya el objeto contractual.</p> <p>En todo caso, las modificaciones o ajustes a las cantidades, así como el establecimiento de ítems nuevos, requerirá de autorización expresa por parte de la entidad.</p> <p>La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera:</p> <p>Pagará al contratista en dos actas parciales cada una por el 50% valor del contrato, previa verificación del cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación.</p> <p>Para el trámite de pago el contratista debe presentar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Factura de los bienes y/o servicios suministrados o documento que haga sus veces. b) Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 <p>La factura deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
--	--

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 3 de 4

	<p>d) Fecha de su expedición.</p> <p>e) Descripción específica o genérica de los bienes y/o servicios.</p> <p>f) Valor total de la operación</p> <p>Del derecho de turno. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.</p> <p>Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.</p> <p>PARAGRAFO 1. - Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva. Además, deberá presentar la factura electrónica y su respectiva representación gráfica.</p>
--	---

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 4 de 4

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato. Además, anexa certificado expedido por el representante legal de la empresa DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8, ALEJANDRO QUINTANA ANACONA, identificado con cédula 1.061.686.538 de Popayán Cauca

La (s) planilla (s) aportada (s) se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.


PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9455028918	2023/08/18	PENSION AGOSTO- SALUD SEPTIEMBRE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado y aprobado por el supervisor y la factura electrónica de venta No. DC1 27 Ver. UBL 2.1 con fecha 27/09/2023, AUTORIZO el pago PARCIAL por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$78.247.933,33) MDA/CTE.

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)	
ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 156.496.207,00
Valor total de adiciones	\$ 0
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	\$ 156.496.207,00
Valor total pagado	\$ 0
Valor a pagar en la presente certificación	\$ 78.247.933,33
Saldo a favor del Contratante	\$ 78.248.273,67

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.


JUAN CARLOS CALVACHE ALOMÍA
CC 98.384.386 De Pasto (Nariño)
Cargo o Vinculación: PLANEACIÓN SUPERVISOR

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 10

Fecha de Validación: 27/09/2023 04:35 PM
Fecha de Generación: 27/09/2023 04:35 PM
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : DC PROJECT SAS
Razón Social: DC PROJECT S.A.S
NIT: 901410401-8
Teléfono: + (57) 312 2595903
Correo Electrónico: dcprojectsas@gmail.com
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
NIT: 800247940-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: atencionalusuario@itp.edu.co
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	174	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	und	1.00	unidad	46,653,700.00	46,653,700.00	0	0.00	46,653,700.00
2	175	POSTES CONCRETO12MTS* 750	und	2.00	cada	2,575,000.00	5,150,000.00	0	0.00	5,150,000.00
3	176	ESTRUCTURA 711	und	1.00	unidad	2,645,600.00	2,645,600.00	0	0.00	2,645,600.00
4	177	ESTRUCTURA 550	und	1.00	unidad	1,953,468.00	1,953,468.00	0	0.00	1,953,468.00
5	178	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	und	4.00	unidad	5,232.00	20,928.00	0	0.00	20,928.00
6	179	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	und	24.00	unidad	329,760.00	7,914,240.00	0	0.00	7,914,240.00
7	180	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (38	und	1.00	unidad	8,960,054.00	8,960,054.00	0	0.00	8,960,054.00
8	ADM	ADMINISTRACION 17%	ADMI	1.00	cada	3,700,116.30	3,700,116.30	0	0.00	3,700,116.30
9	IMP	IMPREVISTO 2%	IMP	1.00	cada	448,770.93	448,770.93	0	0.00	448,770.93
10	UTL	UTILIDAD 3%	UTI	1.00	cada	673,156.39	673,156.39	19	127,899.71	801,056.10

Detalles:

Son: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

CUFE :

896425e4c69fe0e7f607c4f1e5a5045a561cff849fd3512e56a41baa05473cef1f121b72fd5e8acd6fd2d8b228e3bbce

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 78,120,033.62
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 78,120,033.62
Monto IVA :	COP 127,899.71
Total Venta:	COP 78,247,933.33
Total a pagar :	COP 78,247,933.33
Saldo Restante :	COP 78,247,933.33


Firma Digital:

gQeUkNH9xicV8kDdxA3pn72Ulh+THvLFRQcjsCud9B6TMAq9scNLzMP55VQNHHO4 X/WDR/xlqszl1mxSbnio8vq7U1CAY2XKvhV5j9uYpAMeqr/1U7tlb1V21+8KGPx8 QDAjwoqjyz2LnnSSVM79kDTus+/QTRAF1Y+K7tiVA4xYUJVe5CEvRwb01TyDPXcb t4gRa1Do4liYFgnelKYY+pd89lUs7i+3XajQyLHNgjQWnL3M4+SgLXeFKZLghF6R BFd0MH+k0XtSnWlvGcBwa6Ex5T75Sh0sRwKil9k0Kh8jzyRQyVajGc3NddjAtDxC CGh3YcZFAmXgK41bU+qrOA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043674628 entre los rangos de Facturación del 13 al 200 usando el prefijo DC1 con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por:  <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

		Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas			
Nombre del contratista		DC PROJECT S.A.S.		C.C. o NIT	
Dirección		CR 29 10 16, BARRIO CONDOMINIO NORTE - MOCOÁ, PTYO		Telefono	
Correo electrónico		dc.projectsas@gmail.com		Tipo de contratista	
Número de contrato		253		Vigencia	
Valor del contrato		\$156.496.207,00		Numero de Proceso	
Tipo de contrato		CONTRATOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO (ITP)		Fecha generación	
Objeto		 <p>ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO</p>		Fecha de Contrato	
Estampilla		Valor		Factura	
Instituto Tecnológico del Putumayo		\$4.695.000,00		214387	
				 <p>(415)0000000031548(8020)0000214387(3900)0004695000</p>	
Total		\$4.695.000,00		KELLY TATIANA GARCIA VILLOTA	

BBVA
TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 31548 INP ESTAMP PROITP PUTUM
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200291664

FECHA : 20230927
CONVENIO: 0031548
HORA : 10:03

REFERENCIA NO. 1 0000214387 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION: 000012558

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO 4,695,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO 4,695,000.00
FIRMA CLIENTE

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 896425e4c69fe0e7f607c4f1e5a5045a561cff849fd3512e56a41baa05473ce
f1f121b72fd5e8acd6fd2d8b228e3bbce

Número de Factura: DC1-27
Fecha de Emisión: 27/09/2023
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DC PROJECT SAS
Nombre Comercial: DC PROJECT SAS
Nit del Emisor: 901410401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Teléfono / Móvil:
Correo: dcprojectsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800247940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	174	und	94	1,00	\$ 46.653.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 46.653.700,00
2	175	und	EA	2,00	\$ 2.575.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.150.000,00
3	176	und	94	1,00	\$ 2.645.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.645.600,00
4	177	und	94	1,00	\$ 1.953.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.953.468,00
5	178	und	94	4,00	\$ 5.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.928,00
6	179	und	94	24,00	\$ 329.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.914.240,00
7	180	und	94	1,00	\$ 8.960.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.960.054,00
8	ADM	ADMI	EA	1,00	\$ 3.700.116,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.700.116,30
9	IMP	IMP	EA	1,00	\$ 448.770,93	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 448.770,93
10	UTL	UTI	EA	1,00	\$ 673.156,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.899,71	19.00			\$ 673.156,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-27 16:36:24
Documento generado el: 2023-09-27 21:36:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.120.033,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	78.120.033,62
IVA	127.899,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	127.899,71
Total neto factura (=)	78.247.933,33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 78.247.933,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043674628

Rango desde: 13

Rango hasta: 200

Vigencia: 2024-01-31

Pago de salarios

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido 7/09/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/10/2026 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido 7/09/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/10/2026 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación
CO1.WRT.12419421	Cumplimiento - Cu

Configuración financiera - Pago de anticipos

Condiciones de facturación y pago

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía: CO1.WRT.12419421

Referencia de la garantía: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Estado: Aprobado

Justificación:

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza: 44-44-101274224, 41-40-101050054

Recibidos (10) - planeacion@itp

WhatsApp

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelntentifier=CO1.PCCNTR.5359659&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurement...

Pago de salarios

% del valor del contrato

20.00

Fecha de vigencia (desde)

20 días de tiempo transcurrido (7/09/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

7/10/2026 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato

20.00

Fecha de vigencia (desde)

20 días de tiempo transcurrido (7/09/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

7/10/2026 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías: 1

Garantías del proveedor:

Id de la garantía

Justificación

CO1 WRT12419421

Cumplimiento - Cu

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir P

Condiciones de facturación y pago

Plazo de pag

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

DETALLE DE LA GARANTÍA

Patrimonio autónomo

Garantía bancaria

Entidad aseguradora

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza

44-44-101274224, 41-40-101050054

Tomador

DC PROJECT SAS

Beneficiario

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

Justificación

Valor del amparo

Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

31.299.241.40 COP

7/04/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Cumplimiento - Pago de salarios

31.299.241.40 COP

7/10/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra

31.299.241.40 COP

7/10/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual

232.000.000.00 COP

10 días para terminar (8/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción

Nombre del documento

DLF143664A_POLIZA_41_44_101274224.pdf

DLF143664A_POLIZA_41_44_101274224.pdf

Descargar

Detalle

DLF143664A_POLIZA_41_40_101050054.pdf

DLF143664A_POLIZA_41_40_101050054.pdf

Descargar

Detalle

Creado por:

DC PROJE S.A. SALEJANDRO QUINTANA AMACONA 7/09/2023 3:38 PM (UTC-5 hora)

Cancelar

10:59 a. m.

28/09/2023

INFORME DE OBRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO CONTRATO 253 DE 2023



**Mocoa, Putumayo.
Septiembre de 2023**

INFORME PARCIAL N° 01 DE OBRA

CONTRATO N° 253 DE 2023

OBJETO:

ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO".

CONTRATISTA:

DC PROJECT S.A.S
NIT: 901.410.401-8
R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA

PERIODO DEL INFORME:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE ENTREGA INFORME:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Contenido

1	INTRODUCCION	4
2	LOCALIZACION ESPECIFICA	4
3	INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA	5
4	AVANCE DE OBRA	6
4.1	AVANCE FISICO	6
4.2	AVANCE EN TIEMPO	6
4.3	AVANCE FINANCIERO	6
5	COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO	7
5.1	ITEMS CONTRATADOS	7
5.2	ACTIVIDADES EJECUTADAS	8
6	CONTROLOES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA	8
6.1	GARANTIAS DEL CONTRATO	8
6.2	ACTOS ADMINISTRATIVOS	9
6.3	FORMA DE PAGO	9
6.4	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	10
7	CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA	10
8	INCOVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA	11
9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO	11


1 INTRODUCCION

El presente informe consiste en la ejecución de obra en la planta productiva ASOCIACION NUTRILAC, con respecto a la adecuación y fortalecimiento de los procesos de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de los derivados de la leche que la asociación ejerce como actividad comercial.

Se conoce como adecuación a la revisión de las instalaciones del sistema fotovoltaico e instalaciones internas de la planta con el fin de optimizar el funcionamiento de la instalación de la planta productiva para fortalecer los procesos de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de los productos derivados de la leche.

2 LOCALIZACION ESPECIFICA

El proyecto se encuentra ubicado en las instalaciones de físicas de la ASOCIACIÓN NUTRILAC, en la ciudad de San Francisco, Putumayo.

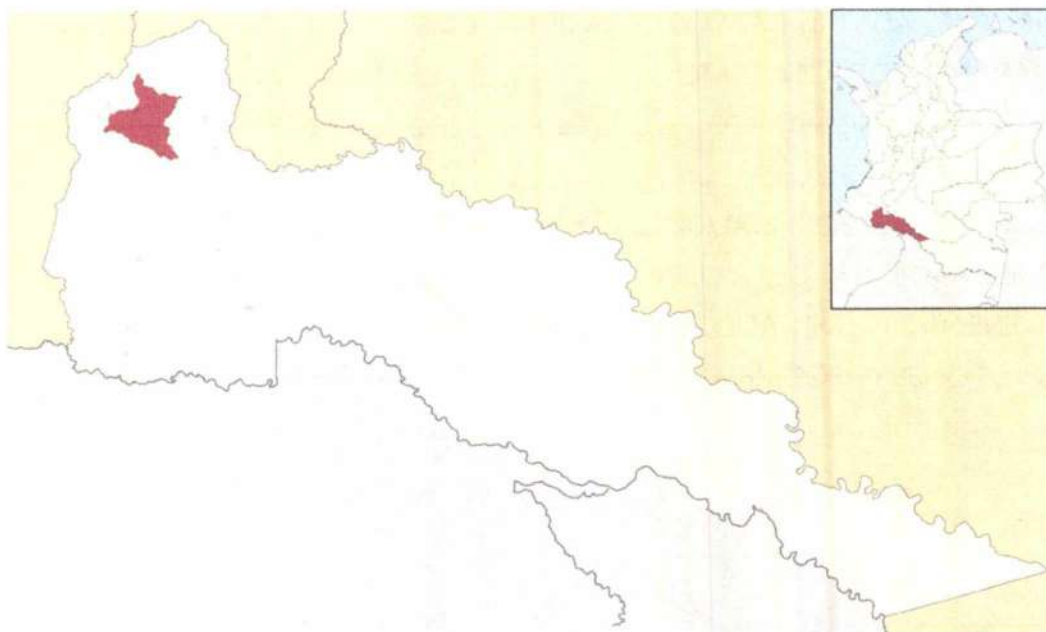

3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	253 DEL 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S. – NIT: 901.410.401-8
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ITP.
OBJETO	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$ 156.496.207.00) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

4 AVANCE DE OBRA

A continuación, se presenta los componentes y la proyección de actividades, de la ejecución de la obra del presente contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, cantidades y demás consideraciones para cada caso.

4.1 AVANCE FISICO

De acuerdo a las actividades ejecutadas y el reporte de avance físico, en el periodo del reporte se ejecutó un 49.99% del objeto contractual y según los tiempos estipulados en el contrato, se debería tener un avance del 50%, por lo tanto, se cuenta con un avance óptimo acorde a los tiempos de ejecución y los establecidos de acuerdo al cronograma de obra presentado.

4.2 AVANCE EN TIEMPO

A la fecha del presente informe del contrato de obra No. 253 del 2023 presenta un avance en tiempo del 50% de acuerdo a la siguiente información.

PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	07 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	06 de octubre de 2023
PERIODO DEL INFORME	07 de septiembre 2023 a 21 de septiembre 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO	QUINCE (15) DIAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	49.99%

4.3 AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe del contrato de obra No. 253 de 2023, presenta un avance financiero del 0% de acuerdo a los siguientes valores.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 156.496.207,00
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	\$ 78.247.933
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	49.99%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 78.248.274
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	\$ 78.247.933

5 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

5.1 ITEMS CONTRATADOS

ITEM	DETALLE	UND
1	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	UND
2	POSTES CONCRETO 12MTS* 750	UND
3	ESTRUCTURA 711	UND
4	ESTRUCTURA 550	UND
5	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	ML
6	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No 3/0	ML
7	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	UND
8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	UND
9	DISEÑO ELECTRICO	UND
10	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND
11	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND
12	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND
13	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND
14	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª	UND
15	Tomacorriente 15A, 125V doble polo a tierra certificado en tubería y accesorios EMT de 1/2", caja tipo Radweld y cable CU No. 12	UND
16	Luminaria LED 18W	UND
17	INTERRUPTOR DOBLE	UND
18	INTERRUPTOR SENCILLO	UND
19	Auto certificación RETIE y trámites de aprobación ante el Operador de Red	GLB
20	TRAMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)	GLB

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas durante el periodo del 07 de septiembre de 2023 al 21 de septiembre de 2023 se describen de acuerdo a los ítems contratados y se llevó a cabo las actividades y registro fotográfico:

Item	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	PRIMER COBRO
1	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	1	\$ 46.653.700	\$ 46.653.700
2	POSTES CONCRETO 12MTS* 750	2	\$ 2.575.000	\$ 5.150.000
3	ESTRUCTURA 711	1	\$ 2.645.600	\$ 2.645.600
4	ESTRUCTURA 550	1	\$ 1.953.468	\$ 1.953.468
5	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	4	\$ 5.232	\$ 20.928
6	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No 3/0	24	\$ 329.760	\$ 7.914.240
7	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	1	\$ 8.960.054	\$ 8.960.054
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 73.297.990
ADMINISTRACION				\$ 3.700.116,30
IMPREVISTOS				\$ 448.770,93
UTILIDAD				\$ 673.156,39
IVA A LA UTILIDAD 19%				\$ 127.899,71
VALOR DE FACTURA				\$ 78.247.933

Las obras ejecutadas en el periodo del informe, corresponden a la construcción de la adecuación a las instalaciones eléctricas y fotovoltaicas de la planta productiva de la asociación NUTRILAC, de acuerdo a los ítems contratados:

Anexo registro fotográfico y descripción de actividades de la obra.

6 CONTROLOES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

6.1 GARANTIAS DEL CONTRATO

El contrato presenta el estado de garantías.

ASEGURADORAS: Seguros del Estado S.A. identificada con Nit: 860.009.578-6

ANEXO 0

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 41-44-101274224

Fecha de expedición 07 de septiembre de 2023 y aprobado mediante acta de aprobación de póliza No. 290-2022

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	07/09/2023	07/04/2024	\$ 31.299.241,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/09/2023	07/10/2026	\$ 31.299.241,40
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años		\$ 31.299.241,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ETRACONTRACTUAL No. 41-40-101050054

Fecha de expedición 07 de septiembre de 2023 y aprobado mediante acta de aprobación de póliza No. 290-2022

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	07/09/2023	08/10/2023	\$ 232.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	07/09/2023	08/10/2023	\$ 232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	07/09/2023	08/10/2023	\$ 232.000.000,00

6.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato, se han suscrito los siguientes actos administrativos

- ACTA DE INICIO con fecha de 07 de septiembre de 2023.

6.3 FORMA DE PAGO

El INSTITUTO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera.

1. Anticipo.

La entidad pagara en dos actas parciales cada una del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, previa verificación del cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en

la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación.

Pagos realizados

Al contratista de obra se le han realizado los siguientes pagos

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 156.496.207,00
Valor parcial pagado	\$ 0,00
Valor presente informe	\$ 78.247.933
Saldo pendiente por pagar	\$ 78.248.274

6.4 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023			
PERSONAL		TOTAL	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	\$ 2.547.500	9455028918
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL SST		
GERMAN SIGIFREDO CHAMORRO	AUXILIAR TECNICO		

Se presenta planillas como soporte de pago de salud pensión, riesgos y parafiscales del mes de septiembre de 2023, anexos al presente informe. (Anexo planillas PILA)

7 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

-) Durante la obra el contratista realizó actividades encaminadas a la protección ambiental de la zona.
-) Se dispuso puntos para el almacenamiento adecuado de residuos naturales del área y residuos sólidos de la obra.
-) Se tuvo especial cuidado con las zonas verdes de las instalaciones del Instituto; para no perjudicar las diferentes especies de árboles que hay en el lugar.

8 INCOVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Hasta la fecha no se ha presentado dificultades significativas o de impacto que modifiquen el rendimiento de la obra.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO

- Hasta la fecha se encuentra ejecutado el 49.99% del objeto contractual
- El valor ejecutado del contrato de obra número 253 de 2023 a la fecha es de \$78.247.933 y el valor a ejecutar es por la suma de \$ 78.248.274 valores que son el producto de multiplicar el valor unitario de cada ítem contratado, por la cantidad requerida en la obra donde el saldo pendiente de ejecución fue calculado por la diferencia entre el valor contractual y el valor ejecutado.



ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
C.C. 1.061.686.538
R/L DC PROJECT SAS

Anexo 1. Registro fotográfico y descripción de actividades ejecutadas.


Ítem 1. Suministro, transporte e instalación de Postes de concreto de 12 metros

Descripción: Se realizó proceso de transporte de carga, maniobras y anclaje de cada uno de los dos postes de concreto de 12 metros en los puntos establecidos según el diseño de la obra.



Ítem 2. Suministro, transporte e instalación de Estructura 712-225-kVA-380V

Descripción: Actividad realizada para la instalación y conexión de un transformador de 225kVA en apoyos tipo H de 712.

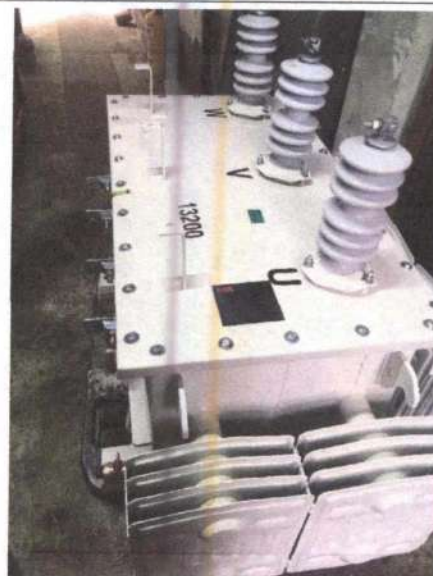


Ítem 3. Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA 711

Descripción: Se instaló estructura de media tensión para conexión de transformador de 225kva.




Ítem 4. Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA 550.

Descripción: Instalado estructura de paso de media tensión sobre el apoyo de 10 metros.

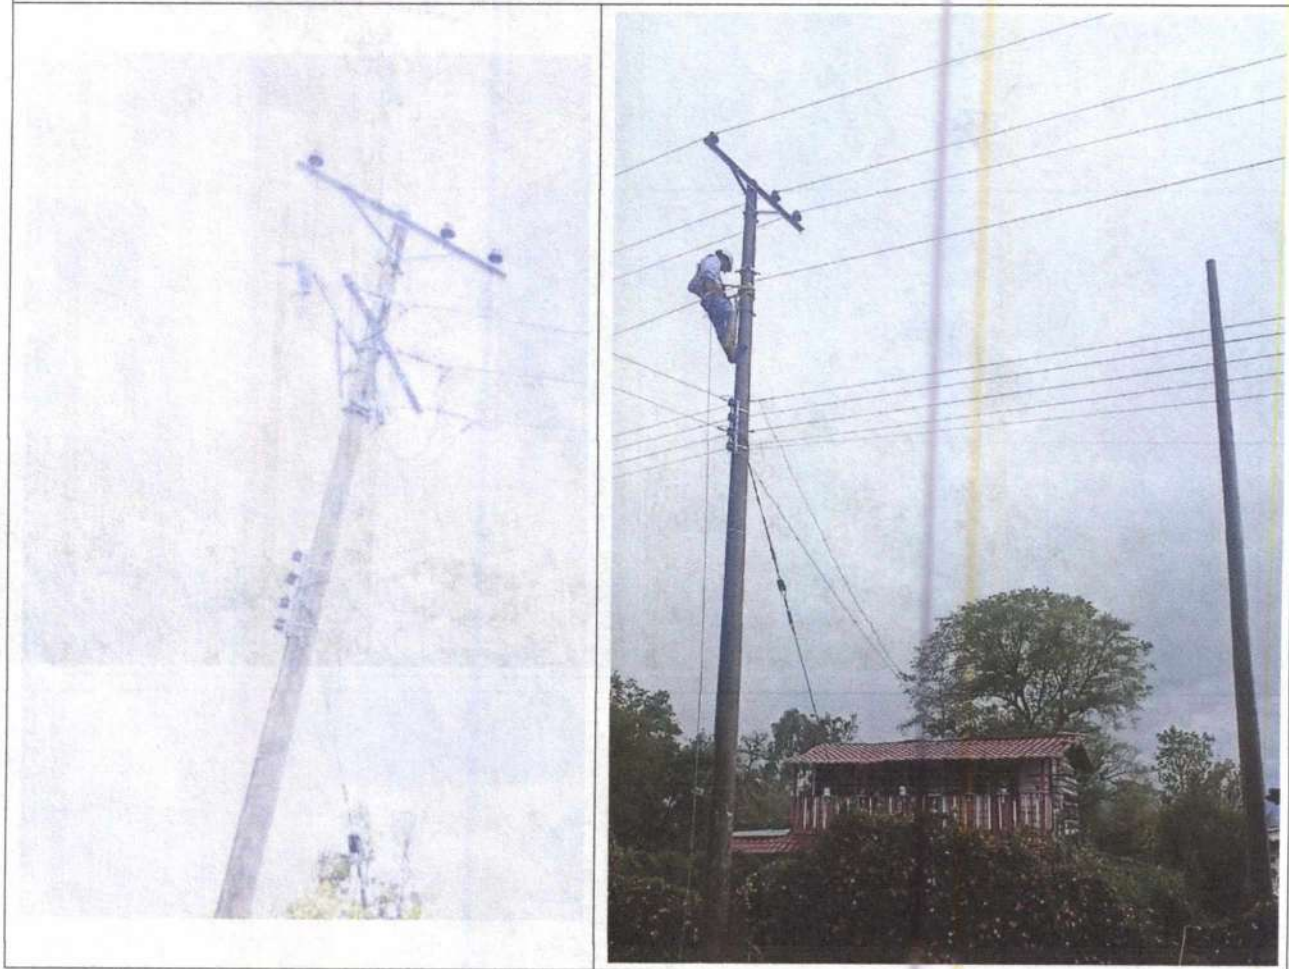


Ítem 5. Suministro, transporte e instalación de LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR



Descripción: se realizó la conexión y tendido del cableado ACSR en media tensión.

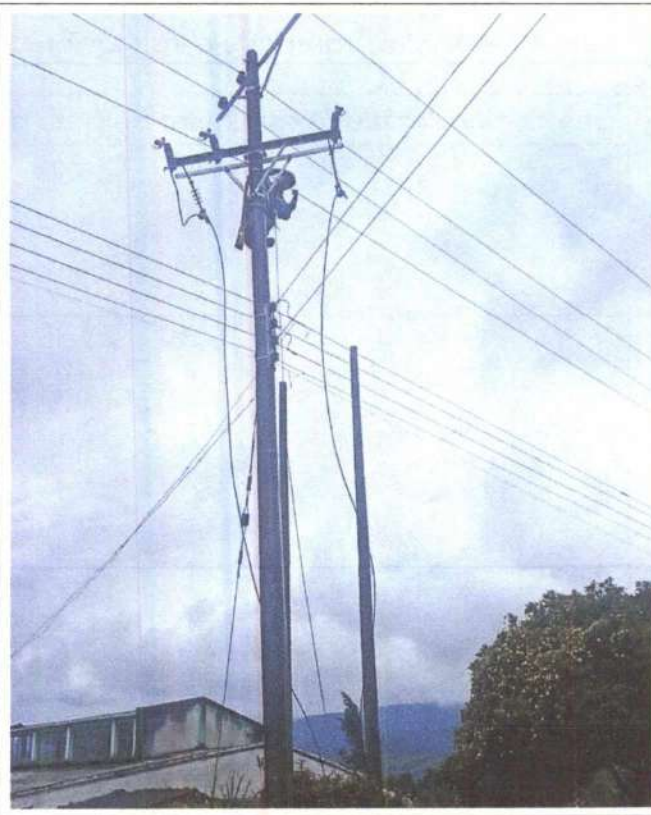

Ítem 6. Suministro, transporte e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL

Descripción: Se realiza instalación y conexión de gabinete de distribución de 220V con barraje trifásico con espacio para 6 totalizadores de 2m*0,80m lamina 14 intemperie (380-110)

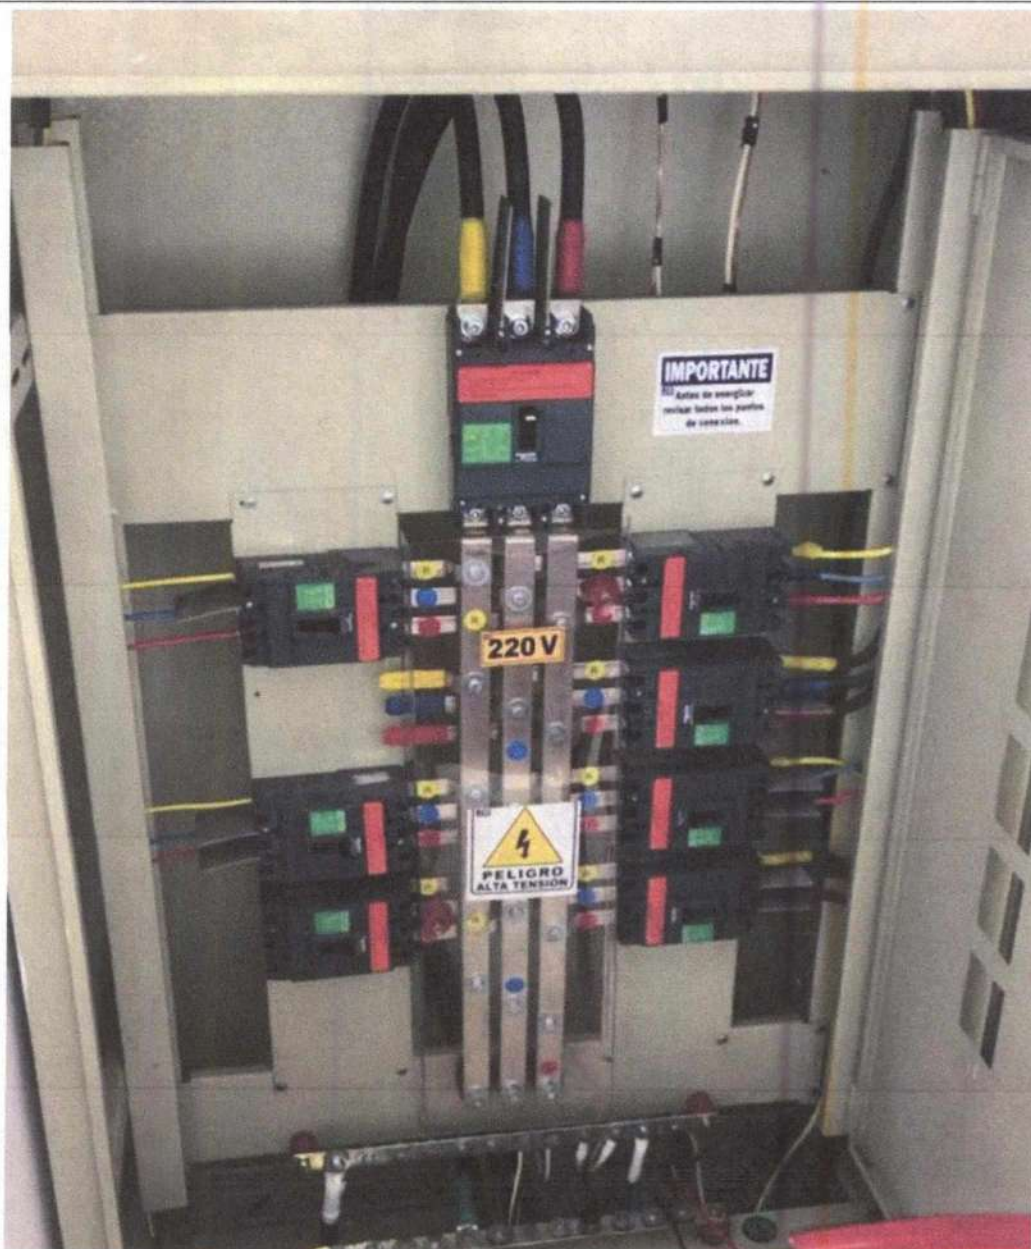

	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO										IES Vigilada por:  La educación es de todos Mineducación				
ACTA DE RECIBO PARCIAL															
ACTA No. 01															
TIPO DE CONTRATO:		OBRA		FECHA ACTA:										22 de septiembre de 2023	
CONTRATISTA:		DC PROJECT SAS													
SUPERVISOR:		INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO													
Mediante la presente acta, DC PROJECT S.A.S, en calidad de contratista y CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA, como director de obra, MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO rector ITP, en calidad de supervisor, JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA, en calidad de profesional universitario area de planeacion ITP, JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS profesional de apoyo en el área de Planeación ITP como apoyo a la supervisión, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha en las condiciones que se detallan a continuación:															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		SALDO			
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1.01	DISEÑO Y REPLANTEO	UND	1,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.800.000,00		
2	TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES														
2.01	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	UND	1,00	\$ 46.653.700	\$ 46.653.700,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 46.653.700,00	1,00	\$ 46.653.700,00	0,00	\$ -		
2.02	POSTES CONCRETO12MTS* 750	UND	2,00	\$ 2.575.000	\$ 5.150.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 5.150.000,00	2,00	\$ 5.150.000,00	0,00	\$ -		
2.03	ESTRUCTURA 711	UND	1,00	\$ 2.645.600	\$ 2.645.600,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.645.600,00	1,00	\$ 2.645.600,00	0,00	\$ -		
2.04	ESTRUCTURA 550	UND	1,00	\$ 1.953.468	\$ 1.953.468,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.953.468,00	1,00	\$ 1.953.468,00	0,00	\$ -		
2.05	LINEA 3no 1/0 AWG-ACSR	UND	5,00	\$ 5.232	\$ 26.160,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 20.928,00	4,00	\$ 20.928,00	1,00	\$ 5.232,00		
2.06	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	ML	48,00	\$ 329.760	\$ 15.828.480,00	0,00	\$ -	24,00	\$ 7.914.240,00	24,00	\$ 7.914.240,00	24,00	\$ 7.914.240,00		
2.07	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	UND	1,00	\$ 8.960.054	\$ 8.960.054,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 8.960.054,00	1,00	\$ 8.960.054,00	0,00	\$ -		
2.08	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	UND	1,00	\$ 12.626.520	\$ 12.626.520,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 12.626.520,00		
3	EQUIPO DE MEDIDA														
3.01	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	\$ 5.460.000	\$ 5.460.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.460.000,00		
3.02	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5*	UND	3,00	\$ 456.700	\$ 1.370.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.370.100,00		
3.03	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	\$ 2.295.700	\$ 2.295.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.295.700,00		
3.04	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	\$ 765.400	\$ 765.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 765.400,00		
3.05	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250*	UND	1,00	\$ 1.654.300	\$ 1.654.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.654.300,00		
3.06	Tomacorriente 15A, 125V doble polo a tierra certificado en tubería y accesorios EMT de 1/2", caja tipo Radweld y cable CU No. 12	UND	10,00	\$ 208.050	\$ 2.080.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.080.500,00		
3.07	Luminaria LED 18W	UND	27,00	\$ 27.850	\$ 751.950,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	27,00	\$ 751.950,00		
3.08	INTERRUPTOR DOBLE	UND	8,00	\$ 17.850	\$ 142.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 142.800,00		
3.09	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10,00	\$ 2.800	\$ 28.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 28.000,00		
TOTAL					\$ 112.192.732,00		\$ -		\$ 73.297.990,00		\$ 51.803.700,00		\$ 38.894.742,00		
ADMINISTRACIÓN (A)					17%	\$ 19.072.764,44	\$ -	\$ -	\$ 3.700.116,30	\$ 8.806.629,00	\$ 15.372.648,14				
IMPREVISTOS (I)					2%	\$ 2.243.854,64	\$ -	\$ -	\$ 448.770,93	\$ 1.036.074,00	\$ 1.795.083,71				
UTILIDAD (U)					3%	\$ 3.365.781,96	\$ -	\$ -	\$ 673.156,39	\$ 1.554.111,00	\$ 2.692.625,57				
IVA A LA UTILIDAD					19%	\$ 639.498,57	\$ -	\$ -	\$ 127.899,71	\$ 11.396.814,00	\$ 511.598,86				
TRÁMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)						\$ 14.731.575,39	\$ -	\$ -			\$ 14.731.575,39				
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)						\$ 4.250.000,00	\$ -	\$ -			\$ 4.250.000,00				
VALORES TOTALES DEL CONTRATO						\$ 156.496.207	\$ -	\$ 78.247.933		\$ 63.200.514	\$ 78.248.274				
BALANCE DEL CONTRATO															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 156.496.207															
VALOR ACUMULADO \$ -															
VALOR ACTA Nº 1 \$ 78.247.933															
SALDO POR EJECUTAR \$ 78.248.274															
SUMAS IGUALES \$ 156.496.207 \$ 156.496.207															
Vo.Bo. CONTRATISTA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		Vo.Bo. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION		PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION							
NOMBRE	DC PROJECT SAS	NOMBRE	MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO	NOMBRE	JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA	NOMBRE	JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS								
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA									

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO**CERTIFICA:**

Que el ingeniero **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**, identificado con C.C 1.061.686.538, en calidad de representante legal, de la empresa DC PROJECT S.A.S. con NIT No. 901.410.401-8 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y el ARTÍCULO 23 de la LEY 1150 de 2007.

Dado en Mocoa, Putumayo a (24) días del mes de Agosto de 2023


ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY
Contador Público Titulado
T.P 167769-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167769-T

ROBINSON FERNANDO
VEGA MAVISOY
C.C. 18130095

RESOLUCION INSCRIPCION 207
UNIVERSIDAD CESMAG



FECHA 19/07/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

174914

95219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
de Contadores



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

84E17273ACDF310F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18130095 de MOCOYA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificacón No:

84E17273ACDF310F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18130095 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de 13 Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO MIRADOR DE LA COLINA	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	110854104	9455028918	E	2023/09/04	2023/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$2,547,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: POSITIVA (4 Afiliados)							\$4,693,334	\$751,000				\$4,693,334	\$586,700				\$4,693,334	\$187,800				\$4,693,334	\$234,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)							\$4,693,334	\$751,000				\$4,693,334	\$586,700				\$4,693,334	\$187,800				\$4,693,334	\$234,800
1	CC	18124275	CHAMORRO NARVAEZ GERMAN SIGIFREDO	25-14	22		\$1,100,000	\$176,000	ESSC18	22		\$1,100,000	\$137,500	CCF63	22		\$1,100,000	\$44,000	14-23	22		\$1,100,000	\$55,000
2	CC	1124862071	PALOMEQUE PALMA JHORDAN WILSON	25-14	22		\$1,100,000	\$176,000	EP5037	22		\$1,100,000	\$137,500	CCF63	22		\$1,100,000	\$44,000	14-23	22		\$1,100,000	\$55,000
3	CC	1123324852	PANTOJA CADENA RUTH ESTELA	25-14	22		\$1,393,334	\$223,000	EP5037	22		\$1,393,334	\$174,200	CCF63	22		\$1,393,334	\$55,800	14-23	22		\$1,393,334	\$69,800
4	CC	17653275	MARGAS GALVIS AVELINO	230301	22		\$1,100,000	\$176,000	EP5037	22		\$1,100,000	\$137,500	CCF63	22		\$1,100,000	\$44,000	14-23	22		\$1,100,000	\$55,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,100,000	\$176,000				\$1,100,000	\$137,500				\$1,100,000	\$44,000				\$1,100,000	\$55,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)							\$1,100,000	\$176,000				\$1,100,000	\$137,500				\$1,100,000	\$44,000				\$1,100,000	\$55,000
5	CC	1124861171	PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GERMAN	25-14	22		\$1,100,000	\$176,000	EP5037	22		\$1,100,000	\$137,500	CCF63	22		\$1,100,000	\$44,000	14-23	22		\$1,100,000	\$55,000
Total Afiliados(5)							\$5,793,334	\$927,000				\$5,793,334	\$724,200				\$5,793,334	\$231,800				\$5,793,334	\$289,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO MIRADOR DE LA COLINA	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	110854104	9455028918	E	2023/09/04	2023/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$2,547,500

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$927,000	\$0	\$927,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$751,000	\$0	\$751,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$176,000	\$0	\$176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$374,700	\$0	\$374,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$374,700	\$0	\$374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$231,800	\$0	\$231,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$231,800	\$0	\$231,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$724,200	\$0	\$724,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$137,500	\$0	\$137,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$586,700	\$0	\$586,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$173,900	\$0	\$173,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$173,900	\$0	\$173,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$115,900	\$0	\$115,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$115,900	\$0	\$115,900

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14938859936



(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 1 0 4 0 1

8

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DC PROJECT S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Mocoa

0 0 1

41. Dirección principal

CARR 29 10 16 BRR CONDOMINIO NORTE

42. Correo electrónico

dcprojectsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 7 7 3 4 1 9

45. Teléfono 2

3 1 9 2 2 2 4 8 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

4 3 2 1

2 0 2 0 0 9 0 9

4 6 6 3

2 0 2 0 0 9 0 9

4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 08 - 17 / 14 : 47 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUINTANA ANACONA ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Formulario del Registro Único Tributario

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14938859936



(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 1 0 4 0 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 0 0 9 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 0 0 9 1 0

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 0 7 7 2 4 0

78. Departamento

8 6

79. Ciudad/Municipio

4 6

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 0 0 9 1 0

81. Hasta

9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 1 0 2 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Formulario del Registro Único Tributario Representación

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14938859936



(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 1 0 4 0 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 0 0 9 1 0

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 0 6 1 6 8 6 5 3 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

QUINTANA

105. Segundo apellido

ANACONA

106. Primer nombre

ALEJANDRO

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14938859936



(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 1 0 4 0 1 8

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 7 3 5 3 5 6 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido SALAS	116. Segundo apellido GOMEZ	117. Primer nombre ALICIA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 9 1 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 2 0 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DC PROJECT S.A.S. DC PROJECT S.A.S.**, identificado(a) con NIT número **901.410.401-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0598427789** aperturada el **22 de septiembre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **18 de septiembre del 2023**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598427789**

Cuenta de 16 dígitos:**0598000200427789**

Cuenta de 20 dígitos:**00130598000200427789**

Firma autorizada
BBVA Colombia
