


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	
0	0	IDU-1446-2020-TRONCAL_AV_CALI_SUBT1-CLB-20230905_v8	965,5 d	mar 26/01/21	sáb 4/05/24			\$110.967.758.979,00		
1	1	Firma del acta de inicio	0 d	mar 26/01/21	mar 26/01/21		3;8FC+151,2 d;9FC+173 d	\$0,00		
2	2	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21			\$746.625.698,00		
3	2.1	Componente Ambiental y SST	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21	1	4CC;147FC-40 d	\$131.027.643,00		
4	2.2	Componente Dialogo ciudadano y comunicación estratégica	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21	3CC	5CC	\$336.681.611,00		
5	2.3	Componente PMT, señalización y desvíos	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21	4CC	6CC	\$232.903.444,00		
6	2.4	Fondo de compensaciones en preconstrucción	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21	5CC	7CC	\$23.179.769,00		
7	2.5	Medidas de bioseguridad en preconstrucción	179 d	mar 26/01/21	vie 3/09/21	6CC	10;761FC+0,7 d	\$22.833.231,00		
8	2.6	Concepto de viabilidad predial	0 d	sáb 31/07/21	sáb 31/07/21	1FC+151,2 d	10	\$0,00		
9	2.7	Solicitud de maniobras red matriz de gas natural - VANTI	0 d	vie 27/08/21	vie 27/08/21	1FC+173 d	204;205	\$0,00		
10	2.8	Acta de finalización de la etapa de preconstrucción	0 d	vie 3/09/21	vie 3/09/21	7;8	12	\$0,00		
11	3	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	826,5 d	vie 16/07/21	sáb 4/05/24			\$110.221.133.281,00		
12	3.1	Acta de inicio etapa de construcción	0 d	vie 3/09/21	vie 3/09/21	10	542CC+5 d;215FC+12 d;193F	\$0,00		
13	3.2	COMPONENTES TRANSVERSALES	825,7 d	vie 16/07/21	vie 3/05/24			\$13.185.996.803,00		
14	3.2.1	AMBIENTAL Y SST	786 d	vie 3/09/21	vie 3/05/24			\$4.337.092.843,00 Vr Contractual \$4,337,092,843		
15	3.2.1.1	Mes 1 (Sep 21)	23 d	vie 3/09/21	jue 30/09/21	12CC-0,3 d	16	\$1.000.000,00		
16	3.2.1.2	Mes 2 (Oct 21)	25 d	jue 30/09/21	mar 2/11/21	15	17	\$10.181.567,00		
17	3.2.1.3	Mes 3 (Nov 21)	24 d	mar 2/11/21	mié 1/12/21	16	18	\$16.727.040,00		
18	3.2.1.4	Mes 4 (Dic 21)	25 d	mié 1/12/21	vie 31/12/21	17	19	\$18.504.328,00		
19	3.2.1.5	Mes 5 (Ene 22)	25 d	vie 31/12/21	mar 1/02/22	18	20	\$61.618.594,00		
20	3.2.1.6	Mes 6 (Feb 22)	24 d	mar 1/02/22	mar 1/03/22	19	21	\$89.270.495,00		
21	3.2.1.7	Mes 7 (Mar 22)	25 d	mar 1/03/22	vie 1/04/22	20	22	\$75.178.671,00		
22	3.2.1.8	Mes 8 (Abr 22)	24 d	vie 1/04/22	lun 2/05/22	21	23	\$59.751.514,00		
23	3.2.1.9	Mes 9 (May 22)	24 d	lun 2/05/22	mar 31/05/22	22	24	\$116.613.300,00		
24	3.2.1.10	Mes 10 (Jun 22)	24 d	mar 31/05/22	jue 30/06/22	23	25	\$200.392.006,00		
25	3.2.1.11	Mes 11 (Jul 22)	25 d	jue 30/06/22	mar 2/08/22	24	26	\$209.360.342,00		
26	3.2.1.12	Mes 12 (Ago 22)	24 d	mar 2/08/22	mié 31/08/22	25	27	\$111.994.559,00		
27	3.2.1.13	Mes 13 (Sep 22)	26 d	mié 31/08/22	vie 30/09/22	26	28	\$101.448.559,00		
28	3.2.1.14	Mes 14 (Oct 22)	25 d	vie 30/09/22	lun 31/10/22	27	29	\$76.052.536,00		
29	3.2.1.15	Mes 15 (Nov 22)	25 d	lun 31/10/22	jue 1/12/22	28	30	\$84.444.184,00		
30	3.2.1.16	Mes 16 (Dic 22)	25 d	jue 1/12/22	lun 2/01/23	29	31	\$167.219.038,00		
31	3.2.1.17	Mes 17 (Ene 23)	25 d	lun 2/01/23	mar 31/01/23	30	32	\$165.413.788,00		
32	3.2.1.18	Mes 18 (Feb 23)	24 d	mar 31/01/23	mar 28/02/23	31	33	\$117.582.071,00		
33	3.2.1.19	Mes 19 (Mar 23)	25 d	mar 28/02/23	jue 30/03/23	32	34	\$203.765.047,00		
34	3.2.1.20	Mes 20 (Abr 23)	23 d	jue 30/03/23	vie 28/04/23	33	35	\$193.431.031,00		
35	3.2.1.21	Mes 21 (May 23)	25 d	vie 28/04/23	mié 31/05/23	34	36	\$101.636.124,00		
36	3.2.1.22	Mes 22 (Jun 23)	24 d	mié 31/05/23	vie 30/06/23	35	37;177CC-7 d	\$97.816.644,00		
37	3.2.1.23	Mes 23 (Jul 23)	24 d	vie 30/06/23	mar 1/08/23	36	38	\$105.136.627,00		
38	3.2.1.24	Mes 24 (Ago 23)	22 d	mar 1/08/23	mar 29/08/23	37	39	\$70.464.014,00		
39	3.2.1.25	Mes 25 (Sep 23)	28 d	mar 29/08/23	vie 29/09/23	38	40	\$162.267.770,00		
40	3.2.1.26	Mes 26 (Oct 23)	25 d	vie 29/09/23	mar 31/10/23	39	41	\$184.294.779,00		
41	3.2.1.27	Mes 27 (Nov 23)	23 d	mar 31/10/23	mié 29/11/23	40	42	\$191.131.164,00		
42	3.2.1.28	Mes 28 (Dic 23)	24 d	mié 29/11/23	vie 29/12/23	41	43	\$249.218.251,00		
43	3.2.1.29	Mes 29 (Ene 24)	25 d	vie 29/12/23	mié 31/01/24	42	44	\$239.502.086,00		
44	3.2.1.30	Mes 30 (Feb 24)	25 d	mié 31/01/24	jue 29/02/24	43	45	\$313.156.082,00		
45	3.2.1.31	Mes 31 (Mar 24)	25 d	jue 29/02/24	mar 2/04/24	44	46	\$242.340.632,00		
46	3.2.1.32	Mes 32 (Abril 24)	26 d	mar 2/04/24	vie 3/05/24	45	47	\$300.000.000,00		
47	3.2.1.33	Fin de la gestion Ambiental y SST en construcción	0 d	vie 3/05/24	vie 3/05/24	46	762	\$0,00		
48	3.2.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	805,7 d	mar 10/08/21	vie 3/05/24			\$885.200.724,00 Vr Contractual \$885,200,724		
49	3.2.2.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	786 d	vie 3/09/21	vie 3/05/24			\$885.200.724,00		
50	3.2.2.1.1	Mes 1 (Sep 21)	23 d	vie 3/09/21	jue 30/09/21	12CC-0,3 d	51	\$1.000.000,00		
51	3.2.2.1.2	Mes 2 (Oct 21)	25 d	jue 30/09/21	mar 2/11/21	15	52	\$1.282.158,00		
52	3.2.2.1.3	Mes 3 (Nov 21)	24 d	mar 2/11/21	mié 1/12/21	16	53	\$3.413.989,00		
53	3.2.2.1.4	Mes 4 (Dic 21)	25 d	mié 1/12/21	vie 31/12/21	17	54	\$3.776.734,00		
54	3.2.2.1.5	Mes 5 (Ene 22)	25 d	vie 31/12/21	mar 1/02/22	18	55	\$12.576.356,00		
55	3.2.2.1.6	Mes 6 (Feb 22)	24 d	mar 1/02/22	mar 1/03/22	19	56	\$18.220.110,00		
56	3.2.2.1.7	Mes 7 (Mar 22)	25 d	mar 1/03/22	vie 1/04/22	20	57	\$15.343.968,00		
57	3.2.2.1.8	Mes 8 (Abr 22)	24 d	vie 1/04/22	lun 2/05/22	21	58	\$12.195.285,00		
58	3.2.2.1.9	Mes 9 (May 22)	24 d	lun 2/05/22	mar 31/05/22	22	59	\$23.800.777,00		
59	3.2.2.1.10	Mes 10 (Jun 22)	24 d	mar 31/05/22	jue 30/06/22	23	60	\$40.900.012,00		
60	3.2.2.1.11	Mes 11 (Jul 22)	25 d	jue 30/06/22	mar 2/08/22	24	61	\$42.730.449,00		
61	3.2.2.1.12	Mes 12 (Ago 22)	24 d	mar 2/08/22	mié 31/08/22	25	62	\$22.858.091,00		
62	3.2.2.1.13	Mes 13 (Sep 22)	26 d	mié 31/08/22	vie 30/09/22	26	63	\$20.705.653,00		
63	3.2.2.1.14	Mes 14 (Oct 22)	25 d	vie 30/09/22	lun 31/10/22	27	64	\$15.522.324,00		
64	3.2.2.1.15	Mes 15 (Nov 22)	25 d	lun 31/10/22	jue 1/12/22	28	65	\$17.235.059,00		
65	3.2.2.1.16	Mes 16 (Dic 22)	25 d	jue 1/12/22	lun 2/01/23	29	66	\$34.129.409,00		
66	3.2.2.1.17	Mes 17 (Ene 23)	25 d	lun 2/01/23	mar 31/01/23	30	67	\$33.760.957,00		
67	3.2.2.1.18	Mes 18 (Feb 23)	24 d	mar 31/01/23	mar 28/02/23	31	68	\$19.101.003,00		
68	3.2.2.1.19	Mes 19 (Mar 23)	25 d	mar 28/02/23	jue 30/03/23	32	69	\$36.690.950,00		
69	3.2.2.1.20	Mes 20 (Abr 23)	23 d	jue 30/03/23	vie 28/04/23	33	70	\$34.581.777,00		
70	3.2.2.1.21	Mes 21 (May 23)	25 d	vie 28/04/23	mié 31/05/23	34	71	\$15.846.435,00		
71	3.2.2.1.22	Mes 22 (Jun 23)	24 d	mié 31/05/23	vie 30/06/23	35	72	\$15.066.879,00		
72	3.2.2.1.23	Mes 23 (Jul 23)	24 d	vie 30/06/23	mar 1/08/23	36	73	\$16.597.626,00		
73	3.2.2.1.24	Mes 24 (Ago 23)	22 d	mar 1/08/23	mar 29/08/23	37	74	\$19.484.207,00		
74	3.2.2.1.25	Mes 25 (Sep 23)	28 d	mar 29/08/23	vie 29/09/23	38	75	\$38.221.355,00		
75	3.2.2.1.26	Mes 26 (Oct 23)	25 d	vie 29/09/23	mar 31/10/23	39	76	\$42.717.068,00		
76	3.2.2.1.27	Mes 27 (Nov 23)	23 d	mar 31/10/23	mié 29/11/23	40	77	\$44.112.374,00		
77	3.2.2.1.28	Mes 28 (Dic 23)	24 d	mié 29/11/23	vie 29/12/23	41	78	\$55.967.950,00		
78	3.2.2.1.29	Mes 29 (Ene 24)	25 d	vie 29/12/23	mié 31/01/24	42	79	\$53.984.880,00		
79	3.2.2.1.30	Mes 30 (Feb 24)	25 d	mié 31/01/24	jue 29/02/24	43	80	\$84.325.163,00		
80	3.2.2.1.31	Mes 30 (Mar 24)	25 d	jue 29/02/24	mar 2/04/24	44	81	\$29.051.726,00		
81	3.2.2.1.32	Mes 32 (Abril 24)	26 d	mar 2/04/24	vie 3/05/24	45	111	\$60.000.000,00		
82	3.2.2.2	VOLANTEO DE PMT'S ESPECIFICOS	718 d	mar 10/08/21	mié 17/01/24			\$0,00		

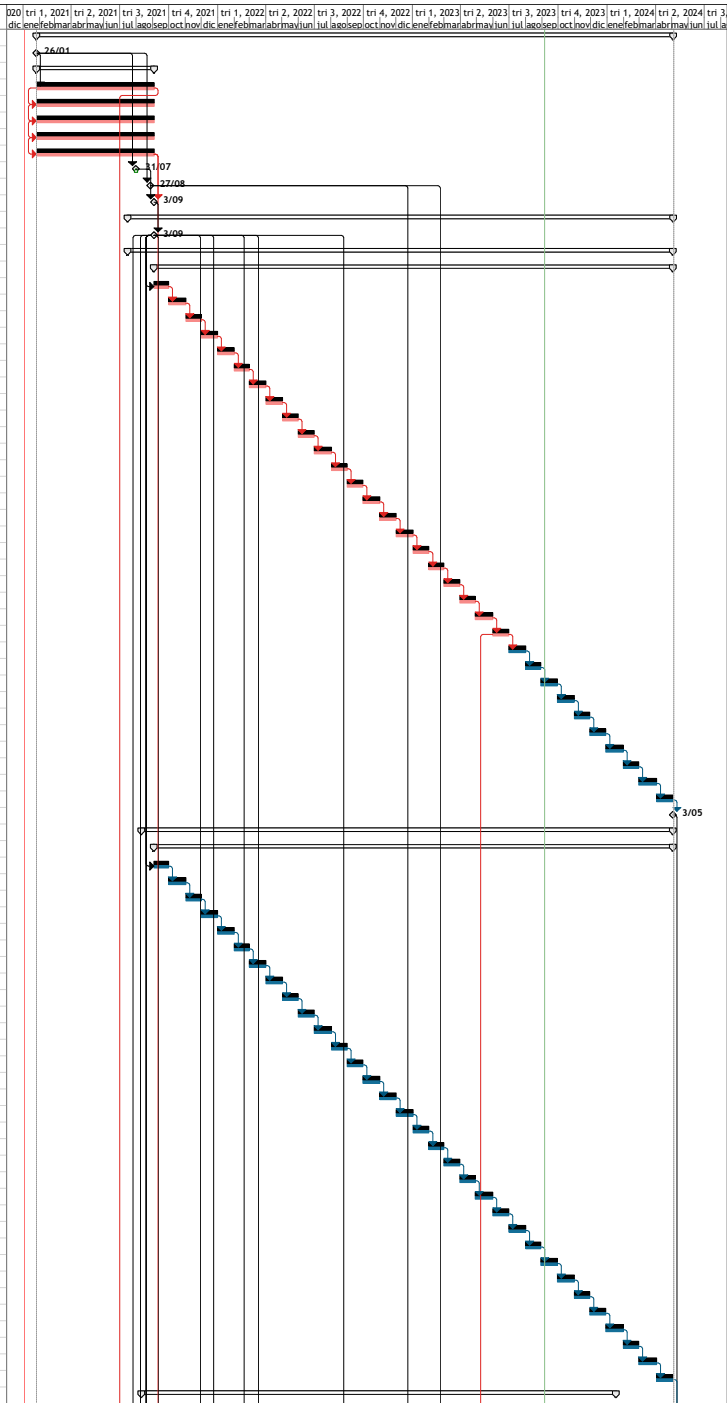

EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	
83	3.2.2.2.1	Traslado inicial de especies arboreas	8 d	mar 10/08/21	vie 20/08/21	147	191	\$0,00		
84	3.2.2.2.2	K0-000 al K0-300	8 d	jue 2/09/21	lun 13/09/21	148	242;423FC+20 d;157C+12 d	\$0,00		
85	3.2.2.2.3	K0-000 al K0-300 (Diagonal 75A sur ETB)	8 d	mié 3/05/23	vie 12/05/23	149	574	\$0,00		
86	3.2.2.2.4	K0-300 al K0-560 (Cerramiento de predio 50119 y adecuación interna p	8 d	vie 2/12/22	mié 14/12/22	150	343FC+3 d;274;714	\$0,00		
87	3.2.2.2.5	38A y B K0-300 al K0-560 (Etapla 1 y 2: Intervención Vía pacificada occidental)	8 d	vie 30/06/23	mié 12/07/23	151	640	\$0,00	Las obras iniciaron el 12 de julio de acuerdo a correo enviado a la Interventoría	
88	3.2.2.2.6	K0-560 al K0-700 (Cerramiento predio 50121 y Cierre carrera 79)	8 d	mié 14/06/23	vie 23/06/23	152	368;309	\$0,00		
89	3.2.2.2.7	38C K0-300 al K0-700 (Etapla 3: Intervención Espacio público faltante occidental - adecuación ciclorruta entre Kra 79 y Kra 80J)	8 d	sáb 9/09/23	mar 19/09/23	153	555FC+3 d;688FC+3 d	\$0,00		
90	3.2.2.2.8	K0-300 al K0-350 (Vía Pacificada Calle 75A sur entre Kra 78C y Kra 78F	8 d	lun 26/06/23	jue 6/07/23	154	320	\$0,00		
91	3.2.2.2.9	Intervención red matriz Intersección San Bernardino	8 d	vie 18/08/23	mar 29/08/23	155	560FC+10 d;718	\$0,00		
92	3.2.2.2.10	Adecuación de BRT	8 d	mié 14/09/22	vie 23/09/22	156	372	\$0,00		
93	3.2.2.2.11	Estación LOS LAURELES	8 d	mar 9/11/21	vie 19/11/21	157	440FC+2 d	\$0,00		
94	3.2.2.2.12	Estación ISLANDIA	8 d	mar 9/11/21	vie 19/11/21	158	457FC+2 d	\$0,00		
95	3.2.2.2.13	Cierre paso peatonal en Calle 69 sur	8 d	lun 22/08/22	mié 31/08/22	159	197FC+1 d;199FC+140 d;713	\$0,00		
96	3.2.2.2.14	Red de acueducto K1+900 al K2-300	8 d	vie 15/12/22	lun 26/12/22	160	697	\$0,00		
97	3.2.2.2.15	Taquillas Los Laureles Occidental	8 d	mié 12/07/23	vie 21/07/23	161	693FC+5 d	\$0,00		
98	3.2.2.2.16	Taquillas Los Laureles Oriental	8 d	vie 24/03/23	lun 3/04/23	162	505	\$0,00		
99	3.2.2.2.17	Taquillas y cicloestación Islandia (Occidental)	8 d	lun 9/10/23	jue 19/10/23	163	514	\$0,00		
100	3.2.2.2.18	Taquillas Islandia (Oriental)	8 d	sáb 6/01/24	mié 17/01/24	164	510	\$0,00		
101	3.2.2.2.19	Red Acueducto Oriental (K0+730 - K1+170)	8 d	jue 3/02/22	lun 14/02/22	165	692	\$0,00		
102	3.2.2.2.20	Carriil de desvío (K2+370 a K2+850)	5 d	vie 13/05/22	jue 19/05/22	166	103;712FC+1 d	\$0,00		
103	3.2.2.2.21	C. Occidental (K2+370-K2+850)	8 d	vie 23/09/22	lun 3/10/22	167;102	651	\$0,00		
104	3.2.2.2.22	C. Oriental (K2+370-K2+850)	8 d	mar 11/04/23	jue 20/04/23	168	655	\$0,00		
105	3.2.2.2.23	Separador central (K1+200 - K1+800)	8 d	mié 20/04/22	vie 29/04/22	169	663	\$0,00		
106	3.2.2.2.24	Ventanas de desvío en K1+100 a K1+800 (incluye trabajos para adecua	8 d	vie 31/03/23	mié 12/04/23	170	715	\$0,00		
107	3.2.2.2.25	C. Occidental (K1+200-K1+800)	8 d	lun 8/05/23	mar 16/05/23	171;715	666	\$0,00		
108	3.2.2.2.26	C. Oriental (K1+200-K1+800)	8 d	mar 8/08/23	jue 17/08/23	172	670	\$0,00		
109	3.2.2.2.27	Alcantarillado C.Oriental (K0+720-K1+200) y C.Occidental (K1+800-K2+	8 d	mié 30/08/23	vie 8/09/23	173	674	\$0,00		
110	3.2.2.2.28	Alcantarillado C.Occidental (K0+720-K1+200) y C.Oriental (K1+800-K2+	8 d	lun 11/09/23	mié 20/09/23	174	678	\$0,00		
111	3.2.3	Fin de la gestion de Dialogo ciudadano y comunicación estratégica en con	0 d	vie 3/05/24	vie 3/05/24	81	762	\$0,00		
112	3.2.3	PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	825,7 d	vie 16/07/21	vie 3/05/24			\$3.254.418.666,00	Vr Contractual \$3,254,418,666	
113	3.2.3.1	IMPLEMENTACIÓN PMT	786 d	vie 3/09/21	vie 3/05/24			\$3.254.418.666,00		
114	3.2.3.1.1	Mes 1 (Sep 21)	23 d	vie 3/09/21	jue 30/09/21	12CC-0,3 d	115	\$1.000.000,00		
115	3.2.3.1.2	Mes 2 (Oct 21)	25 d	jue 30/09/21	mar 2/11/21	114	116	\$7.390.298,00		
116	3.2.3.1.3	Mes 3 (Nov 21)	24 d	mar 2/11/21	mié 1/12/21	115	117	\$12.551.447,00		
117	3.2.3.1.4	Mes 4 (Dic 21)	25 d	mié 1/12/21	vie 31/12/21	116	118	\$13.885.068,00		
118	3.2.3.1.5	Mes 5 (Ene 22)	25 d	vie 31/12/21	mar 1/02/22	117	119	\$46.236.663,00		
119	3.2.3.1.6	Mes 6 (Feb 22)	24 d	mar 1/02/22	mar 1/03/22	118	120	\$66.985.784,00		
120	3.2.3.1.7	Mes 7 (Mar 22)	25 d	mar 1/03/22	vie 1/04/22	119	121	\$56.411.721,00		
121	3.2.3.1.8	Mes 8 (Abr 22)	24 d	vie 1/04/22	lun 2/05/22	120	122	\$44.835.665,00		
122	3.2.3.1.9	Mes 9 (May 22)	24 d	lun 2/05/22	mar 31/05/22	121	123	\$87.502.969,00		
123	3.2.3.1.10	Mes 10 (Jun 22)	24 d	mar 31/05/22	jue 30/06/22	122	124	\$150.367.887,00		
124	3.2.3.1.11	Mes 11 (Jul 22)	25 d	jue 30/06/22	mar 2/08/22	123	125	\$157.097.445,00		
125	3.2.3.1.12	Mes 12 (Ago 22)	24 d	mar 2/08/22	mié 31/08/22	124	126	\$84.037.210,00		
126	3.2.3.1.13	Mes 13 (Sep 22)	26 d	mié 31/08/22	vie 30/09/22	125	127	\$76.123.822,00		
127	3.2.3.1.14	Mes 14 (Oct 22)	25 d	vie 30/09/22	lun 31/10/22	126	128	\$57.067.441,00		
128	3.2.3.1.15	Mes 15 (Nov 22)	25 d	lun 31/10/22	jue 1/12/22	127	129	\$63.364.271,00		
129	3.2.3.1.16	Mes 16 (Dic 22)	25 d	jue 1/12/22	lun 2/01/23	128	130	\$125.475.930,00		
130	3.2.3.1.17	Mes 17 (Ene 23)	25 d	lun 2/01/23	mar 31/01/23	129	131	\$74.121.327,00		
131	3.2.3.1.18	Mes 18 (Feb 23)	24 d	mar 31/01/23	mar 28/02/23	130	132	\$56.989.122,00		
132	3.2.3.1.19	Mes 19 (Mar 23)	25 d	mar 28/02/23	jue 30/03/23	131	133	\$121.658.128,00		
133	3.2.3.1.20	Mes 20 (Abr 23)	23 d	jue 30/03/23	vie 28/04/23	132	134	\$113.903.806,00		
134	3.2.3.1.21	Mes 21 (May 23)	25 d	vie 28/04/23	mié 31/05/23	133	135	\$95.023.782,00		
135	3.2.3.1.22	Mes 22 (Jun 23)	24 d	mié 31/05/23	vie 30/06/23	134	136	\$92.157.764,00		
136	3.2.3.1.23	Mes 23 (Jul 23)	24 d	vie 30/06/23	mar 1/08/23	135	137	\$97.785.516,00		
137	3.2.3.1.24	Mes 24 (Ago 23)	22 d	mar 1/08/23	mar 29/08/23	136	138	\$71.633.207,00		
138	3.2.3.1.25	Mes 25 (Sep 23)	28 d	mar 29/08/23	vie 29/09/23	137	139	\$140.519.871,00		
139	3.2.3.1.26	Mes 26 (Oct 23)	25 d	vie 29/09/23	mar 31/10/23	138	140	\$157.048.249,00		
140	3.2.3.1.27	Mes 27 (Nov 23)	23 d	mar 31/10/23	mié 29/11/23	139	141	\$162.178.058,00		
141	3.2.3.1.28	Mes 28 (Dic 23)	24 d	mié 29/11/23	vie 29/12/23	140	142	\$205.764.789,00		
142	3.2.3.1.29	Mes 29 (Ene 24)	25 d	vie 29/12/23	mié 31/01/24	141	143	\$198.474.083,00		
143	3.2.3.1.30	Mes 30 (Feb 24)	25 d	mié 31/01/24	jue 29/02/24	142	144	\$310.019.387,00		
144	3.2.3.1.31	Mes 31 (Mar 24)	25 d	jue 29/02/24	mar 2/04/24	143	145	\$106.807.956,00		
145	3.2.3.1.32	Mes 32 (Abril 24)	26 d	mar 2/04/24	vie 3/05/24	144	175	\$200.000.000,00		
146	3.2.3.2	ELABORACIÓN, RADICACIÓN Y OBTENCIÓN DE PMT ESPECIFICOS	730 d	vie 16/07/21	vie 5/01/24			\$0,00		
147	3.2.3.2.1	Traslado inicial de especies arboreas	20 d	vie 16/07/21	mar 10/08/21	3FC-40 d	83	\$0,00		
148	3.2.3.2.2	K0-000 al K0-300	20 d	mar 10/08/21	jue 2/09/21	12CC-21 d	84	\$0,00		
149	3.2.3.2.3	K0-000 al K0-300 (Diagonal 75A sur ETB)	20 d	sáb 8/04/23	mié 3/05/23	206FC-10 d	85	\$0,00	Se corrige fecha de acuerdo a observación de Int, sin embargo la definición se dio el 20 de abril, no antes	
150	3.2.3.2.4	K0-300 al K0-560 (Cerramiento de predio 50119 y adecuación interna p	20 d	mar 8/11/22	vie 2/12/22	227FC-18 d;226FC-18 d	86	\$0,00		
151	3.2.3.2.5	38A y B K0-300 al K0-560 (Etapla 1 y 2: Intervención Vía pacificada occi	25 d	mar 30/05/23	vie 30/06/23	207FC-8 d	87;154CC	\$0,00		
152	3.2.3.2.6	K0-560 al K0-700 (Cerramiento predio 50121 y Cierre carrera 79)	25 d	vie 12/05/23	mar 13/06/23	228FC-15 d	88	\$0,00		
153	3.2.3.2.7	38C K0-300 al K0-700 (Etapla 3: Intervención Espacio público faltante occidental - adecuación ciclorruta entre Kra 79 y Kra 80J)	25 d	jue 10/08/23	sáb 9/09/23	302FC-20 d	89	\$0,00		
154	3.2.3.2.8	K0-300 al K0-350 (Vía Pacificada Calle 75A sur entre Kra 78C y Kra 78F	20 d	mar 30/05/23	lun 26/06/23	151CC	90	\$0,00		
155	3.2.3.2.9	Intervención red matriz Intersección San Bernardino	35 d	jue 6/07/23	vie 18/08/23	228FC-27 d	91	\$0,00	Fecha corregida	
156	3.2.3.2.10	Adecuación de BRT	40 d	jue 28/07/22	mié 14/09/22	441FC-40 d	92	\$0,00		
157	3.2.3.2.11	Estación LOS LAURELES	35 d	lun 27/09/21	mar 9/11/21	84FC+12 d	93;158CC	\$0,00		
158	3.2.3.2.12	Estación ISLANDIA	35 d	lun 27/09/21	mar 9/11/21	157CC	94	\$0,00		
159	3.2.3.2.13	Cierre paso peatonal en Calle 69 sur	35 d	sáb 9/07/22	lun 22/08/22	195FC-5 d	95;160FC-60 d	\$0,00		
160	3.2.3.2.14	Red de acueducto K1+900 al K2-300	35 d	mar 1/11/22	jue 15/12/22	159FC-60 d	96	\$0,00		
161	3.2.3.2.15	Taquillas Los Laureles Occidental	20 d	jue 15/06/23	mié 12/07/23	162;492CC	97	\$0,00		
162	3.2.3.2.16	Taquillas Los Laureles Oriental	20 d	mar 28/02/23	vie 24/03/23	230;231;232;233;234;235;238;161		\$0,00		
163	3.2.3.2.17	Taquillas y cicloestación Islandia (Occidental)	20 d	vie 15/09/23	lun 9/10/23	237	99	\$0,00		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	2020	tri 1, 2021	tri 2, 2021	tri 3, 2021	tri 4, 2021	tri 1, 2022	tri 2, 2022	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024
164	3.2.3.2.18	Taquillas Islandia (Oriental)	20 d	mar 12/12/23	vie 5/01/24	238FC-15 d	100	\$0,00																		
165	3.2.3.2.19	Red Acueducto Oriental (K0-730 - K1-170)	25 d	mar 4/01/22	jue 3/02/22	302	101:149FC-25 d	\$0,00																		
166	3.2.3.2.20	Carril de desvío (K2-370 a K2-850)	25 d	mar 12/04/22	vie 13/05/22	203	102:167FC-72 d	\$0,00																		
167	3.2.3.2.21	C. Occidental (K2-370-K2-850)	35 d	jue 11/08/22	vie 23/09/22	166FC-72 d	103	\$0,00																		
168	3.2.3.2.22	C. Oriental (K2-370-K2-850)	35 d	vie 24/02/22	mar 11/04/23	653;199FC-25 d;383CC-10 d	104	\$0,00																		
169	3.2.3.2.23	Separador central (K1-200 - K1-800)	35 d	vie 4/02/22	mié 20/04/22	165FC-25 d	105	\$0,00																		
170	3.2.3.2.24	Ventanas de desvío en K1+100 a K1-800	20 d	mar 7/03/23	vie 31/03/23	78FC-15 d	106;171CC	\$0,00																		
171	3.2.3.2.25	C. Occidental (K1+200-K1-800)	35 d	mar 7/03/23	jue 20/04/23	170CC	107	\$0,00	Fechas corregidas de acuerdo a PDT_v7																	
172	3.2.3.2.26	C. Oriental (K1+200-K1-800)	35 d	vie 23/06/23	mar 8/08/23	466FC-40 d	108	\$0,00	Fechas corregidas de acuerdo a PDT_v7																	
173	3.2.3.2.27	Alcantarillado C.Oriental (K0-720-K1+200) y C.Occidental (K1-800-K2+200)	35 d	lun 17/07/23	mié 30/08/23	468FC-30 d	109;174CC-10 d	\$0,00	Fechas corregidas de acuerdo a PDT_v7																	
174	3.2.3.2.28	Alcantarillado C.Occidental (K0-720-K1+200) y C.Oriental (K1-800-K2+200)	35 d	sáb 29/07/23	lun 11/09/23	173CC-10 d	110	\$0,00	Fechas corregidas de acuerdo a PDT_v7																	
175	3.2.3.3	Fin de la gestión de Plan de Manejo de Tráfico en construcción	0 d	vie 3/05/24	vie 3/05/24	145	762	\$0,00																		
176	3.2.4	PRORROGA (COMPONENTES TRANSVERSALES)	278 d	mar 23/05/23	vie 3/05/24			\$4.709.284.570,00 Vr Contractual \$4.709.284,570																		
177	3.2.4.1	Mes 22 (Jun 23)	22 d	mar 23/05/23	mar 20/06/23	36CC-7 d	178	\$161.614.752,00	240.949.602 Ambiental x mes																	
178	3.2.4.2	Mes 23 (Jul 23)	24 d	mar 20/06/23	mié 19/07/23	177	179	\$381.814.197,00	49.177.818 Dialogo x mes																	
179	3.2.4.3	Mes 24 (Ago 23)	24 d	mié 19/07/23	vie 18/08/23	178	180	\$188.274.317,00	180.801.037 PMT x mes																	
180	3.2.4.4	Mes 25 (Sep 23)	27 d	vie 18/08/23	jue 21/09/23	179	181	\$379.843.446,00																		
181	3.2.4.5	Mes 26 (Oct 23)	25 d	jue 21/09/23	sáb 21/10/23	180	182	\$313.319.729,00																		
182	3.2.4.6	Mes 27 (Nov 23)	23 d	sáb 21/10/23	lun 20/11/23	181	183	\$327.930.338,00																		
183	3.2.4.7	Mes 28 (Dic 23)	24 d	lun 20/11/23	mar 19/12/23	182	184	\$342.238.754,00																		
184	3.2.4.8	Mes 29 (Ene 24)	24 d	mar 19/12/23	vie 19/01/24	183	185	\$685.640.775,00																		
185	3.2.4.9	Mes 30 (Feb 24)	25 d	vie 19/01/24	lun 19/02/24	184	186	\$587.631.313,00																		
186	3.2.4.10	Mes 31 (Mar 24)	25 d	lun 19/02/24	mar 19/03/24	185	187	\$740.976.949,00																		
187	3.2.4.11	Mes 32 (Abr 24)	25 d	mar 19/03/24	sáb 20/04/24	186	188	\$300.000.000,00	Pendiente inclusión de recursos																	
188	3.2.4.12	Mes 33 (Abr 24)	10 d	sáb 20/04/24	vie 3/05/24	187	762	\$300.000.000,00	Pendiente inclusión de recursos																	
189	3.3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN GLOBAL	798,5 d	vie 20/08/21	sáb 4/05/24			\$71.340.389.663,00 Vr Contractual \$67,849,114,215																		
190	3.3.1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCION	657 d	vie 20/08/21	jue 9/11/23			\$0,00																		
191	3.3.1.1	Traslado de arboles (RES 00809-2021)	76 d	vie 20/08/21	lun 22/11/21	83	440;457	\$0,00																		
192	3.3.1.2	Aprobación por parte del ICANH del Programa de Monitoreo Arqueológico elaborado por IDU	0 d	lun 30/08/21	lun 30/08/21	12CC-5 d	242	\$0,00																		
193	3.3.1.3	Traslado de redes aéreas existentes ETB (K0-000 al K0-300)	0 d	jue 30/12/21	jue 30/12/21	12FC-9 d	424;242FC-2 d	\$0,00																		
194	3.3.1.4	Aprobación traslado de cruce semaforico en calle 69 por parte de SDM	0 d	vie 17/06/22	vie 17/06/22	457FC-110 d	195	\$0,00																		
195	3.3.1.5	Traslado de cruce semaforico en calle 69 sur para liberar estación ISLANDIA	20 d	vie 17/06/22	vie 15/07/22	194	460;196FC-70 d;159FC-5 d	\$0,00																		
196	3.3.1.6	Maniobra en red aérea existente CODENSA (Estación TIBANICA)	0 d	vie 7/10/22	vie 7/10/22	199FC-70 d	428FC-3 d;213FC-38 d	\$0,00																		
197	3.3.1.7	Retiro de postes en Espacio Público Occidental MOVISTAR (K0-000 al K0-300)	0 d	jue 1/09/22	jue 1/09/22	95FC-1 d	198FC-4 d	\$0,00																		
198	3.3.1.8	Traslado de red en Espacio Público Occidental VANTI (K0-000 al K0-140)	0 d	mar 6/09/22	mar 6/09/22	197FC-4 d	317FC-12 d	\$0,00																		
199	3.3.1.9	Traslado Camara de Vigilancia de la POLICIA en Calle 62	6 d	vie 17/02/23	jue 23/02/23	95FC-140 d	201FC-180 d;168FC-25 d	\$0,00	Traslado realizado del 17 al 24 de febrero de 2023																	
200	3.3.1.10	Traslado de redes aéreas existentes CODENSA Y ETB (K0-300 al K0-700)	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	227FC-24 d;228FC-20 d	548;640FC-5 d	\$0,00																		
201	3.3.1.11	Aprobación diseño de espacio público y semaforización en acceso norte estación ISLANDIA, por SDM.	0 d	vie 6/10/23	vie 6/10/23	199FC-180 d	564FC-2 d	\$0,00	A la fecha no se tiene aprobación del diseños de semaforización por parte de la SDM. Esta entidad solicitó un requerimiento adicional para la administración Transmisión, acerca de la...																	
202	3.3.1.12	Seguimiento a la no objeción de los estudios y diseños hidrosanitarios por parte de la EAAB	100 d	vie 3/09/21	mar 4/01/22	12CC-0,3 d	242FC-7 d;165;203FC-80 d	\$0,00																		
203	3.3.1.13	Aprobación diseño de estructura para desvíos	0 d	mar 12/04/22	mar 12/04/22	202FC-80 d	166	\$0,00																		
204	3.3.1.14	Maniobra red matriz en ACERO 4° VANTI Los Laureles	0 d	mar 28/02/23	mar 28/02/23	441FC-137 d;9	442FC-5 d;206FC-41 d;207FC	\$0,00																		
205	3.3.1.15	Maniobra red matriz PEAD VANTI Los Laureles	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	441FC-87 d;9	442FC-5 d	\$0,00																		
206	3.3.1.16	Definición de alternativa a red de ETB sobre Diagonal 75A Sur	0 d	jue 20/04/23	jue 20/04/23	204FC-41 d	149FC-10 d;211FC-20 d	\$0,00																		
207	3.3.1.17	Aprobación Intervención red de alcantarillado Calle 75bis entre Carrera 78F y 79	0 d	jue 8/06/23	jue 8/06/23	204FC-81 d	151FC-8 d;208FC-78 d	\$0,00	Se identifica problema con la red de alcantarillado bajo la Calle 75 bis entre la carrera 78F y la carrera 79 que retrasa...																	
208	3.3.1.18	Definición de lineamientos arquitectónicos finales para estaciones de Transmisión, incluyendo firma de modificatorio No 10	0 d	vie 15/09/23	vie 15/09/23	207FC-78 d	209;432;210FC-25 d	\$0,00	A la fecha (01/09/2023) aun no se tienen definidos varios lineamientos arquitectonicos para las estaciones por parte del IDU, para realizar su adquisición, fabricación e instalación.																	
209	3.3.1.19	Periodo de contratación y fabricación de acabados arquitectonicos de estaciones	45 d	vie 15/09/23	jue 9/11/23	208	433FC-6,5 d	\$0,00	A la fecha (01/09/2023) aun no se tienen definidos varios lineamientos arquitectonicos para las estaciones por parte del IDU, para realizar su adquisición, fabricación e instalación.																	
210	3.3.1.20	Definición de lineamientos arquitectónicos finales para taquillas y cicloestaciones de Transmisión, incluyendo firma de modificatorio correspondiente	0 d	sáb 14/10/23	sáb 14/10/23	208FC-25 d	476FC-14 d	\$0,00	A la fecha (01/09/2023) aun no se tienen definidos varios lineamientos arquitectonicos para las taquillas y cicloestaciones por parte del IDU, para realizar su adquisición, fabricación e instalación.																	
211	3.3.1.21	Aprobación e intervención de red de alcantarillado para Taquilla sur oriental Estación Los Laureles	20 d	lun 15/05/23	jue 8/06/23	206FC-20 d	492FC-5 d	\$0,00	Se requiere realizar una intervención en la red de alcantarillado bajo la carrera 80K por afectación en area...																	
212	3.3.1.22	Finalización obras de cerramiento en humedal tibana por parte de contratista de demoliciones	0 d	lun 4/09/23	lun 4/09/23	228FC-75 d	730FC-5 d	\$0,00	Se requiere realizar una intervención en la red de alcantarillado bajo la carrera 80K por afectación en area...																	
213	3.3.1.23	Firma modificatorio No 6 (segmentación de hitos)	0 d	jue 24/11/22	jue 24/11/22	196FC-38 d	268FC-10 d	\$0,00																		
214	3.3.2	ENTREGA DE PREDIOS	673 d	vie 17/09/21	vie 29/12/23			\$0,00																		
215	3.3.2.1	Entrega de predios por parte del IDU No 1	0 d	vie 17/09/21	vie 17/09/21	12FC-12 d	216FC-90 d;242;423	\$0,00																		
216	3.3.2.2	Entrega de predios por parte del IDU No 2	0 d	jue 6/01/22	jue 6/01/22	215FC-90 d	217FC-24 d;424FC-5 d;246	\$0,00																		
217	3.3.2.3	Entrega de predios por parte del IDU No 3	0 d	vie 4/02/22	vie 4/02/22	216FC-24 d	333FC-11 d	\$0,00																		
218	3.3.2.4	Entrega de predio 49901 (Humedal)	0 d	jue 7/07/22	jue 7/07/22	220FC-55 d	249FC-5 d;597FC-20 d;726F	\$0,00																		
219	3.3.2.5	Entrega de predio 49982 (Casa en carrera 78)	0 d	mié 30/03/22	mié 30/03/22	229FC-25 d	220FC-23 d;248;355;292	\$0,00																		
220	3.3.2.6	Entrega de predio 49988 (Casa obstruye Calzada occidental)	0 d	jue 28/04/22	jue 28/04/22	219FC-23 d	355;292;218FC-55 d	\$0,00																		
221	3.3.2.7	Entrega de predio 50028 (Occidental K0-180)	0 d	lun 13/02/23	lun 13/02/23	232FC-27 d	294FC-10 d;707FC-10 d;552	\$0,00																		
222	3.3.2.8	Entrega de predio 50075 (EAAB E.P.oriental)	0 d	mié 31/08/22	mié 31/08/22	223CC	233CC-149 d	\$0,00																		
223	3.3.2.9	Entrega de predio 50076 (EAAB E.P.oriental)	0 d	mié 31/08/22	mié 31/08/22	12FC-292 d	222CC;226CC-37 d	\$0,00																		

Página 4 de 10

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	020	tri 1, 2021	tri 2, 2021	tri 3, 2021	tri 4, 2021	tri 1, 2022	tri 2, 2022	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024
314	3.3.4.6.2	SEÑALIZACIÓN	20 d	mié 22/11/23	lun 18/12/23	975;311	315	\$154.980.947,00																		
315	3.3.4.6.3	MONTAJE SEMAFORIZACIÓN	40 d	lun 18/12/23	mar 6/02/24	314	326	\$1.007.376.152,00																		
316	3.3.4.7	ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES	466 d	mar 23/08/22	mar 19/03/24			\$3.731.701.282,00																		
317	3.3.4.7.1	ESPACIO PÚBLICO (700m2)	28 d	mar 23/08/22	sáb 24/09/22	198FC-12 d	326;551CC-5 d;685CC-5 d;4	\$260.540.599,00	K0-100 al K0-110																	
318	3.3.4.7.2	ESPACIO PÚBLICO (1700m2 de 3300m2)	100 d	lun 26/11/22	mié 26/04/23	227FC-20 d	633CC-7 d;553CC;319;274CC	\$632.816.352,10	K0-110 al K0-140 y K0-180 al K0-360																	
319	3.3.4.7.3	ESPACIO PÚBLICO (500m2 de 3300m2) (50028)	20 d	mié 26/04/23	sáb 20/05/23	296;22FC-4 d;318	686CC-5 d;417CC-10 d;688	\$111.673.474,00	K0-140 al K0-180																	
320	3.3.4.7.4	ESPACIO PÚBLICO (1300m2 de 3300m2)	40 d	lun 10/07/23	mar 29/08/23	318;90;368	325;478CC	\$483.918.386,90	K0-110 al K0-140 y K0-180 al K0-360	Taguilla nor occidental Tbar																
321	3.3.4.7.5	ESPACIO PÚBLICO (1000m2 de 4200m2)	35 d	mié 18/10/23	jue 30/11/23	954FC-15 d	322;533CC	\$372.200.855,00	K0-360 al K0-580 (Anden contra viviendas)																	
322	3.3.4.7.6	ESPACIO PÚBLICO (2200m2 de 4200m2)	50 d	jue 30/11/23	vie 2/02/24	305CC;321;555CC;688CC	419FC;323	\$818.841.882,00	K0-360 al K0-580 (Tramo contra vía mixta occidental y vía pacífica)																	
323	3.3.4.7.7	ESPACIO PÚBLICO (1000m2 de 4200m2)	35 d	vie 2/02/24	jue 14/03/24	322;311CC	324FF+4 d;420FF	\$372.200.855,00	K0-580 al K0-700 y EP taquillas tramo existente																	
324	3.3.4.7.8	ESPACIO PÚBLICO (MOBILIARIO)	25 d	lun 19/02/24	mar 19/03/24	323FF+4 d	325CC	\$340.263.307,00	Se ajusta fecha de finalización para el 19 de marzo de acuerdo a lo solicitado por Interventoría																	
325	3.3.4.7.9	ZONAS VERDES (HITO COMPLETO)	25 d	lun 19/02/24	mar 19/03/24	324CC;320	326	\$339.245.571,00																		
326	3.3.4.8	Fin del corredor mixto occidental	0 d	mar 19/03/24	mar 19/03/24	317;325;289;302;315	540	\$0,00																		
327	3.3.5	CORREDOR BRT (BUS RAPID TRANSIT)	636 d	mié 5/01/22	vie 1/03/24			\$16.623.032.982,00																		
328	3.3.5.1	TRAMO 1 NUEVO ORIENTAL (500m carril)	61 d	mié 5/01/22	vie 18/03/22			\$770.223.145,00	K0+100 al K0-250																	
329	3.3.5.1.1	EXCAVACIONES EN VÍA	25 d	mié 5/01/22	vie 4/02/22	242CC-6 d	330CC-10 d;333FC-2 d	\$110.000.000,00																		
330	3.3.5.1.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	36 d	mar 18/01/22	mar 1/03/22	329CC-10 d	331FC-2 d	\$430.000.000,00																		
331	3.3.5.1.3	PAVIMENTO	13 d	jue 3/03/22	vie 18/03/22	330FC-2 d	335FC-2 d	\$230.223.145,00																		
332	3.3.5.2	TRAMO 2 NUEVO ORIENTAL (100m carril)	194 d	vie 18/02/22	sáb 15/10/22			\$153.898.753,00	K0+250 al K0-300																	
333	3.3.5.2.1	EXCAVACIONES EN VÍA	6 d	vie 18/02/22	vie 25/02/22	329FC-2 d;217FC-11 d	334FC-1 d;355FC-2 d	\$19.000.000,00																		
334	3.3.5.2.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	10 d	sáb 26/02/22	jue 10/03/22	333FC-1 d	335FC-3 d	\$75.000.000,00																		
335	3.3.5.2.3	PAVIMENTO	3 d	mié 23/03/22	sáb 26/03/22	334FC-3 d;331FC-2 d	414;409FC-10 d	\$38.898.753,00																		
336	3.3.5.2.4	TRAMO RESTANTE PENDIENTE POR EJECUTAR POR PREDIOS (14ML CARRIL)	10 d	mar 4/10/22	sáb 15/10/22	249	540	\$21.000.000,00																		
337	3.3.5.3	TRAMO 3 NUEVO ORIENTAL (800m carril)	226 d	vie 16/12/22	vie 22/09/23			\$1.231.190.027,00	K0+300 al K0-700																	
338	3.3.5.3.1	TRAMO 3.1 NUEVO ORIENTAL (160m carril)	43 d	sáb 1/04/23	vie 26/05/23			\$246.238.005,00	K0+300 al K0-380																	
339	3.3.5.3.1.1	EXCAVACIONES EN VÍA	12 d	sáb 1/04/23	mar 18/04/23	255	340	\$30.000.000,00																		
340	3.3.5.3.1.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	25 d	mar 18/04/23	jue 18/05/23	339	341	\$141.800.000,00																		
341	3.3.5.3.1.3	PAVIMENTO	6 d	jue 18/05/23	vie 26/05/23	340	347	\$74.438.005,00																		
342	3.3.5.3.2	TRAMO 3.2 NUEVO ORIENTAL (300m carril) 50119	60 d	vie 16/12/22	lun 27/02/23			\$461.696.260,00	K0+425 al K0+575																	
343	3.3.5.3.2.1	EXCAVACIONES EN VÍA	16 d	vie 16/12/22	mié 4/01/23	86FC-3 d;714CC	344CC-15 d;251CC-2 d	\$56.250.000,00																		
344	3.3.5.3.2.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	35 d	mié 4/01/23	mié 15/02/23	343CC-15 d	345FC-2 d	\$265.875.000,00																		
345	3.3.5.3.2.3	PAVIMENTO	8 d	vie 17/02/23	lun 27/02/23	344FC-2 d	253FC-6 d	\$139.571.260,00																		
346	3.3.5.3.3	TRAMO 3.3 NUEVO ORIENTAL (250m carril)	61 d	lun 10/07/23	vie 22/09/23			\$384.746.883,00	K0+575 al K0+700																	
347	3.3.5.3.3.1	EXCAVACIONES EN VÍA	14 d	lun 10/07/23	jue 27/07/23	368;341	348CC-15 d;351CC-3 d	\$46.875.000,00																		
348	3.3.5.3.3.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	32 d	vie 28/07/23	mié 6/09/23	347CC-15 d	349FC-7 d	\$321.562.500,00																		
349	3.3.5.3.3.3	PAVIMENTO	7 d	jue 14/09/23	vie 22/09/23	348FC-7 d	396;266FC-7 d;401	\$116.309.383,00																		
350	3.3.5.3.4	TRAMO 3.4 NUEVO ORIENTAL (90m carril)	36 d	jue 13/07/23	lun 28/08/23			\$138.508.879,00	K0+380 al K0+425																	
351	3.3.5.3.4.1	EXCAVACIONES EN VÍA	8 d	jue 13/07/23	lun 24/07/23	347CC-3 d	352CC-5 d	\$16.875.000,00																		
352	3.3.5.3.4.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	20 d	mié 19/07/23	lun 14/08/23	351CC-5 d	353FC-7 d	\$79.762.500,00																		
353	3.3.5.3.4.3	PAVIMENTO	4 d	mié 23/08/23	lun 28/08/23	352FC-7 d	307FC-7 d	\$41.871.379,00																		
354	3.3.5.4	TRAMO 1 y 2 NUEVO OCCIDENTAL (600m carril)	73 d	jue 28/04/22	vie 29/07/22			\$923.392.520,00	K0+000 al K0-300																	
355	3.3.5.4.1	EXCAVACIONES EN VÍA	35 d	jue 28/04/22	jue 9/06/22	333FC-2 d;220;219	356CC-10 d;283	\$150.000.000,00																		
356	3.3.5.4.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	48 d	mar 10/05/22	lun 11/07/22	355CC-10 d	357	\$499.000.000,00																		
357	3.3.5.4.3	PAVIMENTO	15 d	lun 11/07/22	vie 29/07/22	356	726	\$274.392.520,00																		
358	3.3.5.5	TRAMO 3 NUEVO OCCIDENTAL (500m carril)	121 d	vie 17/03/23	vie 18/08/23			\$769.493.767,00	K0+300 al K0-700 769.493.767																	
359	3.3.5.5.1	TRAMO 3.1 NUEVO OCCIDENTAL (140m carril)	44 d	vie 17/03/23	vie 12/05/23			\$215.458.255,00	K0+300 al K0-370 (x2)																	
360	3.3.5.5.1.1	EXCAVACIONES EN VÍA	12 d	vie 17/03/23	vie 31/03/23	253	361FC-4 d;368FC-2 d;305FC	\$25.760.000,00																		
361	3.3.5.5.1.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	25 d	mar 28/03/23	vie 28/04/23	360FC-4 d	362FC-5 d;364FC-10 d	\$122.640.000,00																		
362	3.3.5.5.1.3	PAVIMENTO	6 d	vie 5/05/23	vie 12/05/23	361FC-5 d	366	\$67.058.255,00																		
363	3.3.5.5.2	TRAMO 3.2 NUEVO OCCIDENTAL (220m carril) 50119	55 d	lun 17/04/23	lun 26/06/23			\$338.577.257,00	K0+420 al K0-515 (x2) y K0-515 al K0-545 (x1)																	
364	3.3.5.5.2.1	EXCAVACIONES EN VÍA	15 d	lun 17/04/23	vie 5/05/23	255FC-5 d;361FC-10 d	365;300CC-5 d	\$40.480.000,00																		
365	3.3.5.5.2.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	30 d	vie 5/05/23	mar 13/06/23	364	366FC-2 d	\$192.720.000,00																		
366	3.3.5.5.2.3	PAVIMENTO	8 d	mié 14/06/23	lun 26/06/23	365FC-2 d;362	302FC-6 d	\$105.377.257,00																		
367	3.3.5.5.3	TRAMO 3.3 NUEVO OCCIDENTAL (140m carril)	44 d	vie 23/06/23	vie 18/08/23			\$215.458.255,00	K0+545 al K0+690 (x1)																	
368	3.3.5.5.3.1	EXCAVACIONES EN VÍA	12 d	vie 23/06/23	lun 10/07/23	360FC-2 d;88	369CC-6 d;320;347	\$25.760.000,00																		
369	3.3.5.5.3.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	25 d	vie 30/06/23	mié 2/08/23	368CC-6 d	370FC-7 d	\$122.640.000,00																		
370	3.3.5.5.3.3	PAVIMENTO	6 d	vie 11/08/23	vie 18/08/23	369FC-7 d	414;401;407;311FC-7 d	\$67.058.255,00																		
371	3.3.5.6	TRAMO 1 ADECUACIÓN 1000ml	37 d	jue 1/12/22	mar 17/01/23			\$1.539.107.103,00																		
372	3.3.5.6.1	EXCAVACIONES EN VÍA	12 d	jue 1/12/22	vie 16/12/22	444;92;651CC	373FC-2 d	\$180.327.869,00																		
373	3.3.5.6.2	MEJORAMIENTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	15 d	jue 15/12/22	lun 2/01/23	372																				


Página 6 de 10

The diagram is a detailed electrical schematic. It features a dense grid of vertical red and blue lines, likely representing different phases or circuits. A horizontal line with a label '9/mg' and a switch symbol runs across the middle. On the right side, there are several vertical lines with labels '4/05' and '4/05' at the top and bottom. The diagram includes various symbols for electrical components, such as switches, outlets, and a central control unit. The overall layout is complex and technical, typical of a professional electrical drawing.

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	020	tri 1, 2021	tri 2, 2021	tri 3, 2021	tri 4, 2021	tri 1, 2022	tri 2, 2022	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024	tri 1, 2025	tri 2, 2025	tri 3, 2025	tri 4, 2025	
548	3.4.2.1.4	K0-300 - K0-370 y K0+430 - K0-570 COSTADO ORIENTAL	30 d	vie 17/03/23	mar 25/04/23	253;200	571CC;275CC+15 d	\$171.037.519,00																							
549	3.4.2.1.5	K0-370 - K0+430 COSTADO ORIENTAL (CRA 78F)	25 d	sáb 19/08/23	mar 19/09/23	261	277CC;614	\$45.000.000,00																							
550	3.4.2.1.6	K0-570 - K0-700 COSTADO ORIENTAL	30 d	mié 19/07/23	sáb 26/08/23	265CC	278;277CC+15 d	\$137.358.346,00																							
551	3.4.2.1.7	K0+000 - K0-140 COSTADO OCCIDENTAL	28 d	lun 29/08/22	vie 30/09/22	317CC+5 d	553;569CC	\$148.973.966,00																							
552	3.4.2.1.8	K0+140 - K0+220 COSTADO OCCIDENTAL	30 d	vie 24/02/23	vie 31/03/23	221FC+10 d	570CC	\$50.000.000,00																							
553	3.4.2.1.9	K0+220 - K0+400 COSTADO OCCIDENTAL	100 d	lun 26/12/22	mié 26/04/23	318CC;551	555	\$150.447.933,00																							
554	3.4.2.1.10	K0+400 - K0-570 COSTADO OCCIDENTAL (ANDEN CONTRA VIVIENDAS)	45 d	mar 12/09/23	sáb 4/11/23	640FC+10 d	555;321FC+15 d;572CC	\$146.037.519,00																							
555	3.4.2.1.11	K0+400 - K0-570 COSTADO OCCIDENTAL (ANDEN CONTRA VIA MIXTA)	25 d	mar 7/11/23	mié 6/12/23	354;89FC+3 d;553	322CC	\$72.000.000,00																							
556	3.4.2.1.12	K0-570 - K0-700 COSTADO OCCIDENTAL	35 d	mar 7/11/23	mié 20/12/23	3101CC	573CC	\$45.358.346,00																							
557	3.4.2.1.13	K0+400 - K0-570 SEPARADOR CENTRAL	20 d	sáb 19/08/23	mié 13/09/23	306;261	589CC	\$24.000.000,00																							
558	3.4.2.1.14	K0-570 - K0-700 SEPARADOR CENTRAL	15 d	mar 7/11/23	lun 27/11/23	311;266FC+20 d	413	\$16.000.000,00																							
559	3.4.2.2	TRAMO EXISTENTE	199 d	mar 25/04/23	vie 29/12/23			\$102.952.568,00																							
560	3.4.2.2.1	INTERSECCIÓN SAN BERNARDINO (COSTADO SUR)	60 d	sáb 9/09/23	mié 22/11/23	91FC+10 d	575CC;561	\$47.952.568,00																							
561	3.4.2.2.2	ACCESO NORTE SAN BERNARDINO	30 d	mié 22/11/23	vie 29/12/23	360	576CC	\$15.000.000,00																							
562	3.4.2.2.3	CAJA SEPARADOR CALLE 71A SUR (COSTADO SUR)	15 d	mar 25/04/23	sáb 13/05/23	386	565	\$2.000.000,00																							
563	3.4.2.2.4	CRUCE ACCESO SUR CALLE 70 SUR	30 d	jue 16/11/23	vie 22/12/23	364	578CC	\$10.000.000,00																							
564	3.4.2.2.5	ACCESO NORTE CALLE 70 SUR	30 d	lun 9/10/23	jue 16/11/23	201FC+2 d	580CC;563	\$18.000.000,00																							
565	3.4.2.2.6	CRUCE CALLE 62 SUR	30 d	vie 17/11/23	mar 26/12/23	362;659CC	709	\$10.000.000,00																							
566	3.4.3	REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	492 d	vie 29/04/22	vie 29/12/23			\$530.921.671,00 Vr Contractual \$280.921.671																							
567	3.4.3.1	REDES DE TELECOMUNICACIONES ETB	492 d	vie 29/04/22	vie 29/12/23			\$345.000.000,00																							
568	3.4.3.1.1	CRUCE ACCESO SUR TIBANICA	30 d	vie 29/04/22	lun 6/06/22	347CC	582CC	\$20.000.000,00																							
569	3.4.3.1.2	K0+000 al K0+140 COSTADO OCCIDENTAL	30 d	lun 29/08/22	lun 3/10/22	351CC	570	\$70.000.000,00																							
570	3.4.3.1.3	K0+140 al K0+220 COSTADO OCCIDENTAL	30 d	vie 24/02/23	vie 31/03/23	352CC;569	583CC	\$60.000.000,00																							
571	3.4.3.1.4	CRUCE ACCESO NORTE TIBANICA	30 d	vie 17/03/23	mar 25/04/23	348CC	257	\$20.000.000,00																							
572	3.4.3.1.5	K0+425 al K0-570 COSTADO OCCIDENTAL (ANDEN CONTRA VIVIENDAS)	55 d	mar 12/09/23	lun 20/11/23	354CC	584CC	\$25.000.000,00																							
573	3.4.3.1.6	K0-570 al K0-700 COSTADO OCCIDENTAL	35 d	mar 7/11/23	mié 20/12/23	356CC	689CC;647CC	\$25.000.000,00																							
574	3.4.3.1.7	K0+000 al K0+300 COSTADO ORIENTAL (FUERA DE LIMITE DE INTERVENC	40 d	vie 12/05/23	mar 4/07/23	385	709	\$30.000.000,00																							
575	3.4.3.1.8	INTERSECCIÓN LOS LAURELES (COSTADO SUR)	60 d	sáb 9/09/23	mié 22/11/23	360CC	314	\$15.000.000,00																							
576	3.4.3.1.9	ACCESO NORTE LOS LAURELES	30 d	mié 22/11/23	vie 29/12/23	361CC	709	\$15.000.000,00																							
577	3.4.3.1.10	K0+900 al K1+000 COSTADO OCCIDENTAL	30 d	lun 31/07/23	mié 6/09/23	493CC+2 d	496CC+10 d	\$20.000.000,00																							
578	3.4.3.1.11	CRUCE ACCESO SUR ISLANDIA	30 d	jue 16/11/23	vie 22/12/23	363CC	709	\$15.000.000,00																							
579	3.4.3.1.12	K1+900 al K2+100 COSTADO ORIENTAL	45 d	lun 26/12/22	jue 16/02/23	497CC	709	\$15.000.000,00																							
580	3.4.3.1.13	ACCESO NORTE ISLANDIA	30 d	lun 9/10/23	jue 16/11/23	364CC	709	\$15.000.000,00																							
581	3.4.3.2	REDES DE TELECOMUNICACIONES MOVISTAR	454 d	vie 29/04/22	mar 14/11/23			\$50.921.671,00																							
582	3.4.3.2.1	CRUCE ACCESO SUR TIBANICA	30 d	vie 29/04/22	lun 6/06/22	368CC	583	\$20.000.000,00																							
583	3.4.3.2.2	K0+140 al K0+220 COSTADO OCCIDENTAL	30 d	vie 24/02/23	vie 31/03/23	370CC;582	709	\$15.000.000,00																							
584	3.4.3.2.3	K0+400 al K0+600 COSTADO OCCIDENTAL	50 d	mar 12/09/23	mar 14/11/23	372CC	709	\$15.921.671,00																							
585	3.4.3.3	REDES DE TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	394 d	mar 24/05/22	lun 25/09/23			\$135.000.000,00																							
586	3.4.3.3.1	VOZ Y DATOS TIBANICA	30 d	mié 16/11/22	mié 21/12/22	425	587	\$15.000.000,00																							
587	3.4.3.3.2	VOZ Y DATOS LOS LAURELES	105 d	jue 22/12/22	vie 28/04/23	386;441	590	\$20.000.000,00	Depende de finalizar la cimentación de la estación																						
588	3.4.3.3.3	VOZ Y DATOS ISLANDIA	30 d	mar 24/05/22	vie 1/07/22	458	591	\$20.000.000,00																							
589	3.4.3.3.4	K0+300 al K0+720	30 d	sáb 19/08/23	lun 25/09/23	357CC;591	709	\$18.000.000,00																							
590	3.4.3.3.5	K1+100 al K1+900	40 d	vie 28/04/23	mar 20/06/23	387	591;411	\$36.000.000,00																							
591	3.4.3.3.6	K2+200 al K2+850	30 d	mar 20/06/23	jue 27/07/23	390;588	589;412	\$26.000.000,00																							
592	3.4.4	RED DE ALCANTARILLADO	637,5 d	vie 4/03/22	sáb 4/05/24			\$6.967.249.623,00 Vr Contractual \$7.355.249.623 (70MM a Electricas, 250MM Telecom y 68MM Gas, por mayores cantidades) \$6.967.249.623																							
593	3.4.4.1	RED DE ALCANTARILLADO TRAMO NUEVO	513 d	vie 4/03/22	jue 30/11/23			\$999.750.000,00																							
594	3.4.4.1.1	RETORNO OPERACIONAL K0+000	26 d	mié 17/08/22	vie 16/09/22			\$29.000.000,00																							
595	3.4.4.1.1.1	Tuberías (40mL)	15 d	lun 22/08/22	jue 8/09/22	397CC+4 d	596CC+10 d	\$8.000.000,00																							
596	3.4.4.1.1.2	Pozos (2un)	12 d	vie 2/09/22	vie 16/09/22	395CC+10 d	727FC+5 d	\$7.000.000,00																							
597	3.4.4.1.1.3	Sumideros (2un)	14 d	mié 17/08/22	vie 2/09/22	218FC+20 d;726	595CC+4 d	\$14.000.000,00																							
598	3.4.4.1.2	MIXTO ORIENTAL (K0+000 - K0+230)	30 d	vie 4/03/22	lun 11/04/22			\$167.500.000,00																							
599	3.4.4.1.2.1	Tuberías (400mL)	18 d	vie 4/03/22	lun 28/03/22	246	600CC+10 d	\$80.000.000,00																							
600	3.4.4.1.2.2	Pozos (11un)	15 d	mié 16/03/22	mar 5/04/22	399CC+10 d	601CC+3 d	\$38.500.000,00																							
601	3.4.4.1.2.3	Sumideros (7un)	17 d	sáb 19/03/22	lun 11/04/22	400CC+3 d	603	\$49.000.000,00																							
602	3.4.4.1.3	MIXTO ORIENTAL (K0+230 - K0+310)	24 d	lun 11/04/22	mié 11/05/22			\$44.000.000,00																							
603	3.4.4.1.3.1	Tuberías (80mL)	12 d	lun 11/04/22	mié 27/04/22	401	604CC+10 d;610CC	\$16.000.000,00		</																					

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	tri 1, 2021	tri 2, 2021	tri 3, 2021	tri 4, 2021	tri 1, 2022	tri 2, 2022	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024
629	3.4.4.1.10	MIXTO OCCIDENTAL (K0+200 - K0+310)	52 d	vie 22/07/22	jue 22/09/22			\$72.000.000,00																
630	3.4.4.1.10.1	Tuberías (220ml)	25 d	vie 22/07/22	lun 22/08/22	421CC;293CC-3 d	630CC-10 d;636CC	\$44.000.000,00																
631	3.4.4.1.10.2	Pozos (4un)	19 d	mié 3/08/22	vie 26/08/22	629CC-10 d	631CC-3 d	\$14.000.000,00																
632	3.4.4.1.10.3	Sumideros (2un)	22 d	sáb 27/08/22	jue 22/09/22	630CC-3 d;623	638	\$14.000.000,00																
633	3.4.4.1.11	MIXTO OCCIDENTAL (K0+200 - K0+310) EN E.P.	60 d	mar 3/01/23	mié 15/03/23			\$37.000.000,00																
634	3.4.4.1.11.1	Tuberías (80ml)	60 d	mar 3/01/23	mié 15/03/23	318CC-7 d	634CC-10 d	\$12.000.000,00																
635	3.4.4.1.11.2	Accesorios y otras estructuras	50 d	lun 16/01/23	mié 15/03/23	633CC-10 d	681FF	\$25.000.000,00																
636	3.4.4.1.12	MIXTO OCCIDENTAL (K0+310 - K0+570)	53 d	mié 17/05/23	mar 25/07/23			\$110.000.000,00																
637	3.4.4.1.12.1	Tuberías (250ml)	45 d	mié 17/05/23	jue 13/07/23	429CC;301CC-10 d	709;637CC-5 d;643FC-15 d	\$50.000.000,00																
638	3.4.4.1.12.2	Pozos (8un)	42 d	mié 24/05/23	lun 17/07/23	643CC-5 d	638CC-3 d	\$28.000.000,00																
639	3.4.4.1.12.3	Sumideros (6un)	45 d	lun 29/05/23	mar 25/07/23	637CC-3 d;631	709	\$32.000.000,00																
640	3.4.4.1.13	MIXTO OCCIDENTAL (K0+310 - K0+570) EN E.P.	100 d	mié 12/07/23	mar 14/11/23			\$59.000.000,00																
641	3.4.4.1.13.1	Tuberías (140ml)	60 d	mié 12/07/23	sáb 23/09/23	87;200FC-5 d	641;554FC-10 d	\$21.000.000,00	Incluye la tubería de alcantarillado nueva a instalar D=8"															
642	3.4.4.1.13.2	Accesorios y otras estructuras	40 d	sáb 23/09/23	mar 14/11/23	640	681FF	\$38.000.000,00																
643	3.4.4.1.14	MIXTO OCCIDENTAL (K0+570 - K0+720)	33 d	lun 26/06/23	vie 4/08/23			\$53.500.000,00																
644	3.4.4.1.14.1	Tuberías (110ml)	25 d	lun 26/06/23	jue 27/07/23	638FC-15 d;306CC-30 d	644CC-5 d	\$22.000.000,00																
645	3.4.4.1.14.2	Pozos (3un)	20 d	vie 30/06/23	jue 27/07/23	643CC-5 d	645CC-3 d	\$10.500.000,00																
646	3.4.4.1.14.3	Sumideros (3un)	25 d	jue 6/07/23	vie 4/08/23	644CC-3 d	709;617	\$21.000.000,00																
647	3.4.4.1.15	MIXTO OCCIDENTAL (K0+570 - K0+720) EN E.P.	20 d	mar 7/11/23	jue 30/11/23			\$27.000.000,00																
648	3.4.4.1.15.1	Tuberías (60ml)	20 d	mar 7/11/23	jue 30/11/23	573CC	648CC	\$9.000.000,00																
649	3.4.4.1.15.2	Accesorios y otras estructuras	20 d	mar 7/11/23	jue 30/11/23	647CC	709	\$18.000.000,00																
650	3.4.4.2	RED DE ALCANTARILLADO TRAMO EXISTENTE	516,3 d	vie 29/04/22	mar 30/01/24			\$1.466.650.908,00																
651	3.4.4.2.1	C. Occidental (K2+370-K2+850)	83 d	lun 3/10/22	vie 13/01/23			\$110.000.000,00																
652	3.4.4.2.1.1	Tuberías (60ml)	80 d	lun 3/10/22	mar 10/01/23	103;712	652CC-10 d;372CC	\$48.000.000,00	800mm															
653	3.4.4.2.1.2	Pozos (6un)	65 d	vie 14/10/22	mar 3/01/23	651CC-10 d	653CC-3 d	\$42.000.000,00	7mm															
654	3.4.4.2.1.3	Sumideros (4un)	70 d	mié 19/10/22	vie 13/01/23	652CC-3 d	168	\$20.000.000,00	5mm															
655	3.4.4.2.2	C. Oriental (K2+370-K2+850)	83 d	jue 20/04/23	jue 3/08/23			\$151.000.000,00																
656	3.4.4.2.2.1	Tuberías (120ml)	80 d	jue 20/04/23	lun 31/07/23	104	656CC-10 d	\$96.000.000,00																
657	3.4.4.2.2.2	Pozos (5un)	45 d	mié 3/05/23	mar 25/07/23	655CC-10 d	657CC-3 d	\$35.000.000,00																
658	3.4.4.2.2.3	Sumideros (4un)	70 d	lun 8/05/23	jue 3/08/23	656CC-3 d	709	\$20.000.000,00																
659	3.4.4.2.3	Intersección Calle 62 Sur	39 d	vie 17/11/23	vie 5/01/24			\$109.000.000,00																
660	3.4.4.2.3.1	Tuberías (80ml)	30 d	vie 17/11/23	mar 26/12/23	701CC	660CC-10 d;565CC	\$64.000.000,00																
661	3.4.4.2.3.2	Pozos (5un)	24 d	mié 29/11/23	vie 29/12/23	659CC-10 d	661CC-3 d	\$30.000.000,00																
662	3.4.4.2.3.3	Sumideros (3un)	26 d	lun 4/12/23	vie 5/01/24	660CC-3 d	681	\$15.000.000,00																
663	3.4.4.2.4	Separador central (K1+150-K1+250)	80 d	vie 29/04/22	lun 8/08/22			\$112.650.908,00																
664	3.4.4.2.4.1	Tuberías (115ml)	80 d	vie 29/04/22	lun 8/08/22	105	664CC-10 d	\$92.650.908,00																
665	3.4.4.2.4.2	Pozos (4un)	65 d	mié 11/05/22	mar 2/08/22	663CC-10 d	666	\$20.000.000,00																
666	3.4.4.2.5	C. Occidental (K1+250-K1+800)	78 d	mar 16/05/23	jue 24/08/23			\$243.000.000,00																
667	3.4.4.2.5.1	Tuberías (180ml)	70 d	mar 16/05/23	lun 14/08/23	107;864	172FC-40 d;667CC-10 d	\$144.000.000,00																
668	3.4.4.2.5.2	Pozos (8un)	62 d	mar 30/05/23	mié 16/08/23	666CC-10 d	668CC-3 d	\$64.000.000,00																
669	3.4.4.2.5.3	Sumideros (7un)	65 d	jue 1/06/23	jue 24/08/23	667CC-3 d	670FC-2 d;173FC-30 d	\$35.000.000,00																
670	3.4.4.2.6	C. Oriental (K1+250-K1+800)	78 d	sáb 26/08/23	mié 29/11/23			\$163.000.000,00																
671	3.4.4.2.6.1	Tuberías (120ml)	70 d	sáb 26/08/23	mar 21/11/23	108;668FC-2 d	671CC-10 d	\$96.000.000,00																
672	3.4.4.2.6.2	Pozos (6un)	62 d	jue 7/09/23	mié 22/11/23	670CC-10 d	672CC-3 d	\$42.000.000,00																
673	3.4.4.2.6.3	Sumideros (5un)	65 d	lun 11/09/23	mié 29/11/23	671CC-3 d	681	\$25.000.000,00																
674	3.4.4.2.7	Alcantarillado C.Occidental (K0+720-K1+250) y C.Occidental (K1+800-K2+200)	113 d	vie 8/09/23	sáb 27/01/24			\$295.000.000,00																
675	3.4.4.2.7.1	Tuberías (270ml)	110 d	vie 8/09/23	mié 24/01/24	109	675CC-10 d	\$216.000.000,00	Se elimina el tramo de red sanitaria entre el K1+900 Y K2+200 de acuerdo a comites con EAAB, no es requerido															
676	3.4.4.2.7.2	Pozos (7un)	95 d	mié 20/09/23	jue 18/01/24	674CC-10 d	676CC-3 d	\$49.000.000,00																
677	3.4.4.2.7.3	Sumideros (6un)	100 d	sáb 23/09/23	sáb 27/01/24	675CC-3 d	678CC-2 d	\$30.000.000,00																
678	3.4.4.2.8	Alcantarillado C.Occidental (K0+720-K1+250) y C.Occidental (K1+800-K2+200)	100 d	mar 26/09/23	mar 30/01/24			\$283.000.000,00																
679	3.4.4.2.8.1	Tuberías (250ml)	90 d	mar 26/09/23	jue 18/01/24	110;674CC-2 d	679CC-10 d	\$200.000.000,00	Se elimina el tramo de red sanitaria entre el K1+900 Y K2+200 de acuerdo a comites con EAAB, no es requerido															
680	3.4.4.2.8.2	Pozos (6un)	90 d	sáb 7/10/23	mar 30/01/24	678CC-10 d	680CC	\$48.000.000,00																
681	3.4.4.2.8.3	Sumideros (7un)	90 d	sáb 7/10/23	mar 30/01/24	679CC	681FF	\$35.000.000,00																
682	3.4.5	SALDO REDES DE ALCANTARILLADO	1 d	vie 3/05/24	sáb 4/05/24	641FF;680FF;634FF;720FF;6;709		\$4.500.848.715,00																
683	3.4.5.1	RED DE ACUEDUCTO	653,8 d	lun 14/02/22	sáb 4/05/24			\$1.431.792.248,00	Vr Contractual \$1.431.792.248															
684	3.4.5.1.1	RED DE ACUEDUCTO TRAMO NUEVO	549 d	lun 7/03/22	lun 12/02/24			\$651.449.230,00																
685	3.4.5.1.2	ORIENTAL (K0+000 - K0+300) (320ml)	180 d	lun 7/03/22	sáb 15/10/22	272CC-5 d;542	685CC;700CC-20 d	\$86.664.094,00																
686	3.4.5.1.3	OCCIDENTAL (K0+070 - K0+160 y K0+200 - K0+300) (540ml)	170 d	lun 29/08/22	jue 23/03/23	317CC-5 d;684CC	686CC	\$141.216.220,00																
687	3.4.5.1.4	OCCIDENTAL (K0+160 - K0+200) (Predios) (36ml)	30 d	mié 3/05/23	jue 8/06/23	685CC;319CC-5 d	687CC	\$6.000.000,00																
688	3.4.5.1.5	OCCIDENTAL (K0+300 - K0+570) (420ml) (Anden contra via mixta)	25 d	vie 22/09/23	lun 23/10/23	687CC;89FC-3 d;319	702FF;322CC	\$114.784.458,00	Despues de la K0-570 no hay red de acueducto por costado oriental															
689	3.4.5.1.6	OCCIDENTAL (K0+570 - K0+700) (120ml)	15 d	mar 7/11/23	vie 24/11/23	573CC	709	\$40.000.000,00																
690	3.4.5.1.7	INTERSECCIÓN SAN BERNARDINO	105 d	mar 3/10/23	lun 12/02/24	718	396CC-48 d;402	\$160.000.000,00	De acuerdo a informacion de la EAAB y puesta en actas, se deben															
691	3.4.5.2	RED DE ACUEDUCTO TRAMO EXISTENTE	578,3 d	lun 14/02/22	jue 1/02/24			\$379.628.728,00																
692	3.4.5.2.1	ORIENTAL (K0+770 - K1+170) (250ml)	110 d	lun 14/02/22	jue 30/06/22	101	694FC-5 d	\$67.328.450,00																

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	OBSERVACIONES	020	tri 1, 2021	tri 2, 2021	tri 3, 2021	tri 4, 2021	tri 1, 2022	tri 2, 2022	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024
706	3.4.6.1.2	TRASLADO RED EXISTENTE E.P. OCCIDENTAL (K0-030 al K0-180)	10 d	jue 25/08/22	mar 6/09/22	705FC-71 d	707	\$20.831.385,00																		
707	3.4.6.1.3	TRASLADO RED EXISTENTE E.P. OCCIDENTAL (K0-180 al K0-250)	10 d	vie 24/02/23	mié 8/03/23	706;7221FC-10 d	708	\$9.398.225,00																		
708	3.4.6.1.4	TRASLADO RED EXISTENTE CARRERA 79 (K0-570)	10 d	jue 7/09/23	mar 19/09/23	301FC-10 d;707;265	709	\$2.834.000,00	Se plantea que finalice 20 días antes de la finalización del mixto occidental tramo 4																	
709	3.4.7	Fin intervención de redes públicas	0 d	sáb 4/05/24	sáb 4/05/24	610;636;702;681;696;657;63762		\$0,00																		
710	3.5	ADECUACIÓN DE DESVÍOS	595,5 d	mié 27/04/22	sáb 4/05/24			\$2.590.082.210,00 Vr	Contractual \$2.590.082.210																	
711	3.5.1	Adecuación paso peatonal en Calle 69 sur	2 d	mié 27/04/22	vie 29/04/22	458CC-57 d	713	\$3.000.000,00																		
712	3.5.2	Carril de desvío entre el K2+400 al K2+850	32 d	vie 20/05/22	jue 30/06/22	102FC-1 d	651	\$166.000.000,00																		
713	3.5.3	Adecuación paso peatonal en Calle 71 sur	2 d	sáb 27/08/22	mar 30/08/22	95FC-3 d;711	715	\$3.000.000,00																		
714	3.5.4	Adecuación paso peatonal y ciclorruta Carrera 78F	10 d	mié 14/12/22	lun 26/12/22	86	343CC	\$54.000.000,00																		
715	3.5.5	Carril de desvío en Calle 71A sur	20 d	mié 12/04/23	sáb 6/05/23	713;106	107;716CC	\$50.000.000,00																		
716	3.5.6	Carril de desvío en Carrera 78F	20 d	mié 12/04/23	sáb 6/05/23	715CC	721	\$54.000.000,00																		
717	3.5.7	Adecuación desvío en retorno K1+200	30 d	mar 30/05/23	vie 7/07/23	390	721;392	\$50.000.000,00																		
718	3.5.8	Adecuación desvío para Carrera 80J San Bernardino	30 d	mar 29/08/23	mar 3/10/23	91	690	\$80.000.000,00																		
719	3.5.9	Adecuación de desvíos restante (1)	3 d	sáb 27/04/24	jue 2/05/24	742CC	720	\$100.000.000,00																		
720	3.5.10	Adecuación de desvíos restante (2)	2 d	jue 2/05/24	sáb 4/05/24	719	721;702FF;681FF	\$2.030.082.210,00																		
721	3.5.11	Fin de adecuación de desvíos	0 d	sáb 4/05/24	sáb 4/05/24	720;716;717	762	\$0,00																		
722	3.6	OBRAS ESPECIALES	521,5 d	vie 29/07/22	sáb 4/05/24			\$1.125.422.290,00 Vr	Contractual \$833.554.458																	
723	3.6.1	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS	5 d	sáb 27/04/24	sáb 4/05/24			\$120.422.290,00																		
724	3.6.1.1	Hallazgos arqueológicos	5 d	sáb 27/04/24	sáb 4/05/24	470FF	732;734FC-3 d;719CC	\$120.422.290,00																		
725	3.6.2	EMPALME PUENTE TIBANICA	398 d	vie 29/07/22	vie 1/12/23			\$1.005.000.000,00																		
726	3.6.2.1	Movimiento de tierras y demoliciones	15 d	vie 29/07/22	mié 17/08/22	357;218FC-5 d	727FC-15 d;597	\$183.000.000,00																		
727	3.6.2.2	Reellenos y pavimentos	15 d	sáb 10/09/22	mié 28/09/22	724FC-15 d;594FC-5 d	728;249CC	\$455.000.000,00																		
728	3.6.2.3	Urbanismo	25 d	mié 28/09/22	vie 28/10/22	727	545CC-5 d;729FC-160 d	\$156.000.000,00																		
729	3.6.2.4	Paisajismo	15 d	lun 15/05/23	jue 1/06/23	728FC-160 d	730	\$98.000.000,00																		
730	3.6.2.5	Paisajismo (contiguo al cerramiento del humedal)	15 d	sáb 9/09/23	mié 27/09/23	729;212FC-5 d;229	731;410	\$33.000.000,00																		
731	3.6.2.6	Señalización	10 d	mar 21/11/23	vie 1/12/23	269;730	732	\$80.000.000,00																		
732	3.6.3	Fin de Obras Especiales	0 d	sáb 4/05/24	sáb 4/05/24	731;724	762	\$0,00																		
733	3.7	COMPENSACIONES AMBIENTALES Y ENSAYOS DE LABORATORIO	3 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24			\$424.975.508,00																		
734	3.7.1	ENSAYOS DE LABORATORIO	3 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24	742FC-3 d	735CC	\$383.611.543,00																		
735	3.7.2	COMPENSACIONES SDA	3 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24	742CC	762	\$41.363.965,00																		
736	3.8	FONDO DE COMPENSACIONES EN CONSTRUCCIÓN	716,5 d	lun 29/11/21	sáb 4/05/24			\$10.837.324.860,00																		
737	3.8.1	Ajustes por obras en 2021	22 d	lun 29/11/21	lun 27/12/21	12FC-70 d	762;738FC-226 d	\$18.139.035,00																		
738	3.8.2	Ajustes por obras de Ene/2022 a Jul/2022	24 d	vie 30/09/22	sáb 29/10/22	737FC-226 d	762;739	\$1.323.302.943,00																		
739	3.8.3	Ajustes por obras de Ago/2022	24 d	lun 31/10/22	mar 29/11/22	738	740	\$357.008.604,00																		
740	3.8.4	Ajustes por obras de Sep/2022	24 d	mié 30/11/22	mié 28/12/22	739	741	\$124.447.647,00																		
741	3.8.5	Ajustes por obras de Oct/2022	25 d	jue 29/12/22	vie 27/01/23	740	742	\$400.063.971,00																		
742	3.8.6	Ajustes por obras de Nov/2022	25 d	vie 27/01/23	lun 27/02/23	741	743	\$694.175.904,00																		
743	3.8.7	Ajustes por obras de Dic/2022	27 d	lun 27/02/23	vie 31/03/23	742	744	\$52.956.109,20																		
744	3.8.8	Ajustes por obras de Ene/2023	22 d	vie 31/03/23	vie 28/04/23	743	745	\$78.709.976,10																		
745	3.8.9	Ajustes por obras de Feb/2023	24 d	vie 28/04/23	lun 29/05/23	744	746	\$461.850.059,00																		
746	3.8.10	Ajustes por obras de Mar/2023	25 d	mar 30/05/23	jue 29/06/23	745	747	\$814.014.209,00																		
747	3.8.11	Ajustes por obras de Abr/2023	24 d	jue 29/06/23	lun 31/07/23	746	748	\$466.032.446,00																		
748	3.8.12	Ajustes por obras de May/2023	24 d	lun 31/07/23	mié 30/08/23	747	749	\$590.641.792,00																		
749	3.8.13	Ajustes por obras de Jun/2023	26 d	mié 30/08/23	vie 29/09/23	748	750	\$860.236.754,00																		
750	3.8.14	Ajustes por obras de Jul/2023	25 d	vie 29/09/23	lun 30/10/23	749	751	\$1.001.393.567,00																		
751	3.8.15	Ajustes por obras de Ago/2023	25 d	lun 30/10/23	jue 30/11/23	750	752	\$326.437.344,00																		
752	3.8.16	Ajustes por obras de Sep/2023	23 d	jue 30/11/23	vie 29/12/23	751	753	\$550.139.496,00																		
753	3.8.17	Ajustes por obras de Oct/2023	25 d	vie 29/12/23	mié 31/01/24	752	754	\$471.112.284,00																		
754	3.8.18	Ajustes por obras de Nov/2023	25 d	mié 31/01/24	jue 29/02/24	753	755	\$965.022.732,00																		
755	3.8.19	Ajustes por obras de Dic/2023	23 d	jue 29/02/24	lun 1/04/24	754	756	\$543.636.085,00																		
756	3.8.20	Ajustes por obras de Ene/2024	25 d	lun 1/04/24	lun 29/04/24	755	757	\$300.923.250,56																		
757	3.8.21	Ajustes por obras de Feb/2024	3,5 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24	756	758CC	\$92.795.987,14																		
758	3.8.22	Ajustes por obras de Mar/2024	3,5 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24	757CC	759CC	\$344.284.665,00																		
759	3.8.23	Ajustes por obras de Abr/2024	3,5 d	mar 30/04/24	sáb 4/05/24	758CC	762	\$0,00																		
760	3.9	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN	242 d	sáb 4/09/21	jue 30/06/22			\$179.449.297,00																		
761	3.9.1	Medias de Bioseguridad en construcción	242 d	sáb 4/09/21	jue 30/06/22	77FC-0,7 d	762	\$179.449.297,00																		
762	3.10	Acta de finalización de la etapa de construcción	0 d	sáb 4/05/24	sáb 4/05/24	737;761;735;732;721;47;1		\$0,00																		

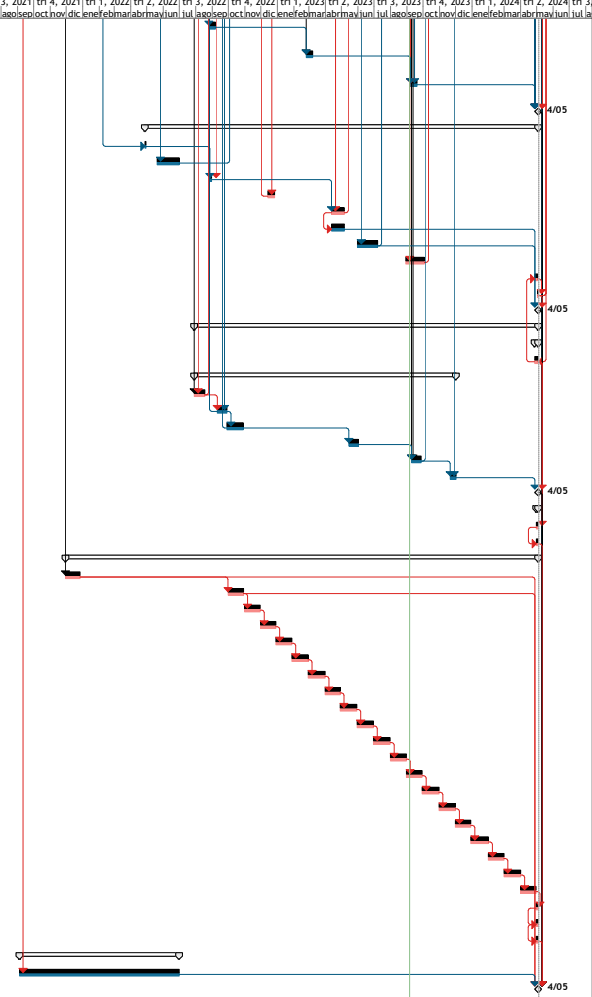

Leticia Sánchez
