



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	18 de julio de 2023	Y EL	17 de agosto de 2023
OBJETO	"MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA AVENIDA "FRANCISCO EL HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"				
LOCALIZACIÓN	DISTRITO DE RIOHACHA ENTRE CALLE 15 Y LA CALLE 33 SOBRE LA CARRERA 7H "AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE"				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE CONSULTORIA		
CONTRATO No.:	587 DE 2022	CONTRATO No.:	240 DE 2023		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA	CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE		
PLAZO INICIAL:	13 MESES	PLAZO INICIAL:	10 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de Febrero 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A		
VALOR INICIAL :	\$ 14.961.100.754,54	VALOR INICIAL :	\$ 1.084.668.634,00		
ANTICIPO PACTADO :	N/A	ANTICIPO PACTADO :	N/A		
VALOR ADICION(ES):	N/A	VALOR ADICION(ES):	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	VALOR ACTUALIZADO:	N/A		
VALOR PAGADO:	\$ 4.864.706.050,53	VALOR PAGADO:	N/A		
VALOR POR PAGAR:	\$ 10.096.394.704,01	VALOR POR PAGAR:	N/A		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	VALOR
CUMPLIMIENTO	18/04/2023 16/09/2024	\$ 1.496.110.075,45	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/04/2023 18/06/2024	\$ 108.466.863,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	18/04/2023 18/05/2024	\$ 2.244.165.113,18	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/04/2023 18/02/2027	\$ 54.233.431,70
PRESTACIONES SOCIALES	18/04/2023 19/05/2027	\$ 748.055.037,73	* CALIDAD DE SERVICIO	18/02/2024 18/02/2029	\$ 108.466.863,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/05/2024 19/05/2029	\$ 1.496.110.075,45			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/04/2023 18/05/2024	\$ 1.496.110.075,40			

3. RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo Pactado (15%)	17/05/2023	\$ 2.244.165.113,18			
Acta Parcial No 1	19/07/2023	\$ 2.620.540.937,35			

AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA	AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA
---	--

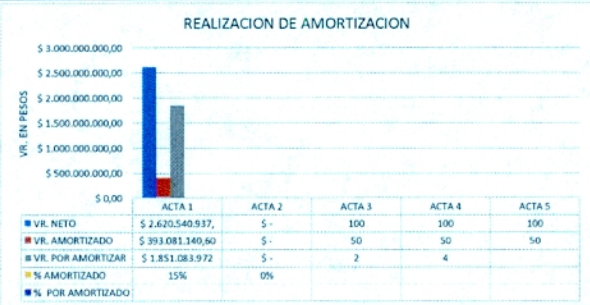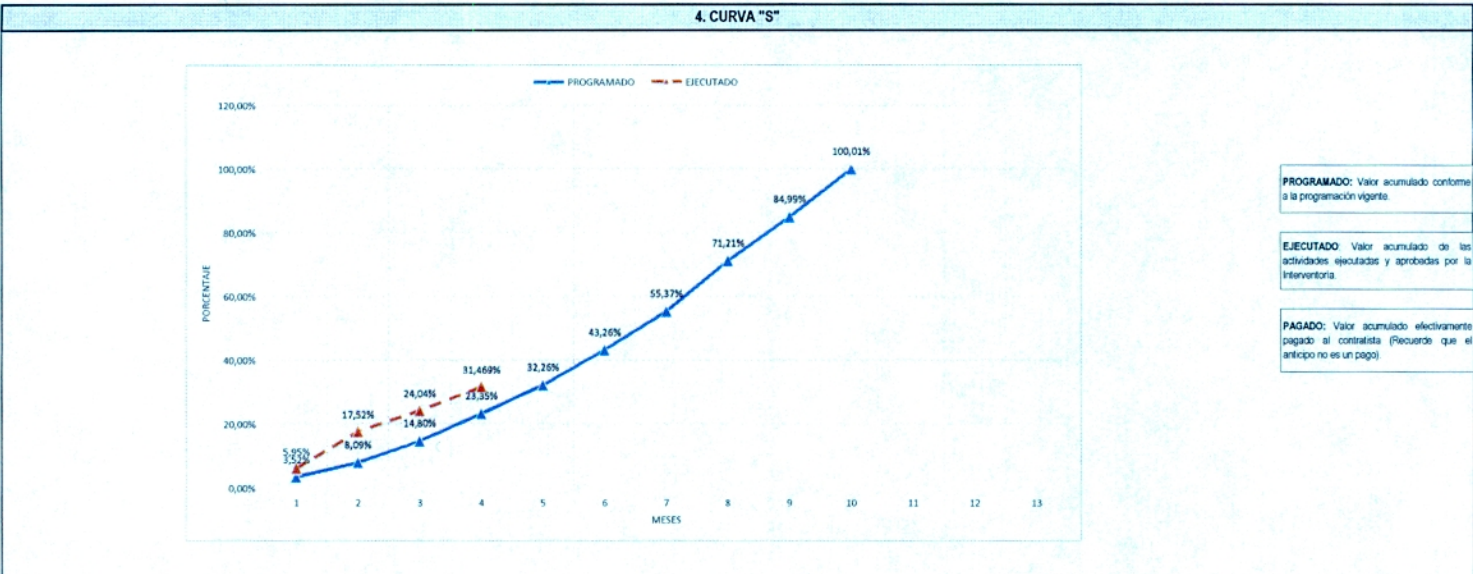




Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

5. RELACION DE HITOS (AVANCE)

4. GESTION AMBIENTAL

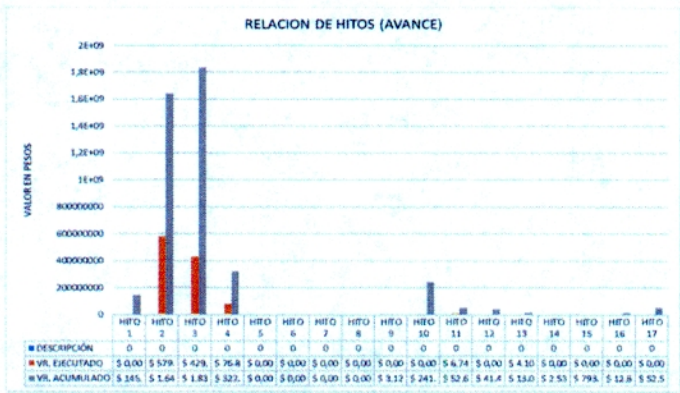

FUENTE MATERIALES

UBICACIÓN

SITIO LLAMADO "LAGUNETAS"

BOTADEROS: SI NO X NA
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X NA
PERMISO TALA: SI NO X NA
ESCOBRIERAS: SI NO X NA
VERTIENTOS: SI NO X NA
EMISIONES: SI NO X NA

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANEJO INFORMADO AL SUPERVISOR SOBRE LOS MATERIALES SOBREPASOS Y SUS DISPOSICION FINAL Y ENVIAR LA DIRECCION DEL SITIO.

DESCRIPCION	
HITO 1	COMPONENTE PAVIMENTOS
HITO 2	ADECUACION DE TERRENO
HITO 3	PAVIMENTO
HITO 4	ACERO DE REFUERZO
HITO 5	ANDENES Y SARDINEL
HITO 6	ACTIVIDADES ELECTRICAS Y LUMINARIAS
HITO 7	MOBILIARIO URBANO
HITO 8	SEÑALIZACION
HITO 9	COMPONENTE ALCANTARILLADO
HITO 10	MOVIMIENTOS
HITO 11	INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
HITO 12	OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA
HITO 13	MOVIMIENTO DE TIERRAS
HITO 14	INSTALACION DE TUBERIA RED DE ACUEDUCTO
HITO 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
HITO 16	SUMINISTRO REDES DE ALCANTARILLADO
HITO 17	SUMINISTRO REDES DE ACUEDUCTO

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha se presentó el acta modificativa No 1 donde se han identificado mayores o menores cantidades de obras

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial	Actividades Realizadas
1. Diariamente se realizan pausas activas de los trabajadores y durante ese lapso de tiempo se hidrata el personal de obra, ya que las temperaturas están haciendo muy altas. 2. Se realiza aprobación por parte de la interventoría de 45 trabajadores a obra. 3. Contratista realiza envío de formatos de entrega de EPP al personal a la interventoría. 4. Se realiza recorrido en obra en compañía de la interventoría y se evidencia el uso de EPP. 5. En el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes en obra.	De medida Preventiva Las Charlas y otros: 1. Cerramiento como protección a la comunidad y al tráfico vehicular. 2. Se realizaron encuesta de sintomatología al personal que labora en obra. 3. Se envían por parte del Coordinador HSEQ del contratista UT VIAS GEO PAZ RIOHACHA, reporte de las actividades implementadas en obra del PAPSO y reporte de novedades del día. Actividades de Higiene y Seguridad Industrial La limpieza de baños y oficinas se continúa ejecutando al menos dos veces por semana La interventoría se acoge a las medidas establecidas en el PAPSO del contratista en obra, e implementa medidas de bioseguridad propias del consorcio CID, como son: encuesta digital de sintomatología y bitácora de recorridos. Sin novedad hasta la fecha. Se observa lavado de Baños con frecuencia diaria
*Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal	Ingreso Personal 07:00a.m Salida Personal 05:00p.m
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N/A (No aplica)	

6. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 52	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9	OBSERVACIONES
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 32	No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 5	- Se debe reforzar la comunicación con la comunidad.
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 20	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2	- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron PQRS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.
	SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1	
	VISITAS- ACTAS DE VECINDAD: 49	

6.1 PERSONAL EN OBRA

CONTRATO DE OBRA		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
MIGUEL GARCIA ROMANI	8779865	DIRECTOR DE OBRA
YERALDITH RAMOS BONILLA	1063961596	RESIDENTE DE OBRA
DAVID MESA CALVO	1118826361	TOPOGRAFO
DEISEL PATRICIA HERNANDEZ M.	1118826362	REP LEGAL
ROSMIRA BRITO BLANCO	40941758	TRABAJADORA SOCIAL
SHEIRYL ARANZA COTES	1118871844	TRABAJADORA SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
JORGE MARIO DURAN ROMERO	7572339	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CARLOS CRISTIAN CAMARO IGUARAN	1118818038	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SNEIDER JAVIER REDONDO BRUGES	84084937	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2
MARCOS DAZA JULIO	7574355	ING CIVIL ESP EN VIAS
ALEJANDRO NEL PACHECO	9086932	ING CIVIL ESP EN SUELOS
SAMUEL RAMIREZ DE LA HOZ	7573021	ING CIVIL ESP EN HIDRAULICA
CINDY BAQUERO MONTAÑO	1124404844	PROFESIONAL SISO
ELDA GOMEZ PEÑALVER	40847426	CONTADOR PUBLICO
ANGEL HERNANDEZ FONSECA	1124514835	ASESOR JURIDICO
JOSE EDUARDO TORO CALVO	17830592	TOPOGRAFO 1
JHON CARLOS FLOREZ FONSECA	1143357398	TOPOGRAFO 2
JOSE GABRIEL MEZA CALVO	1118815544	CADENERO 1
ROBERTO ANDRES VARELA DUARTE	1075847469	CADENERO 2
JORGE ISAAC GAMEZ MOREU	1124532267	CADENERO 3
LAUREANO COTES ARISTIZABAL	72345439	CADENERO 4
EIDY LINE VIZCAINO CAMPO	36466646	SECRETARIA
FRANKLIN LUIS BONIVENTO GOMEZ	1124505067	INSPECTOR

6. REGISTRO FOTOGRAFICO




DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: RETROEXCAVADORA 320




RETIRO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA 320 Y VOLQUETA



EXCAVACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO RETROEXCAVADORA 320 Y ENTIBADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8" Y DE 6"

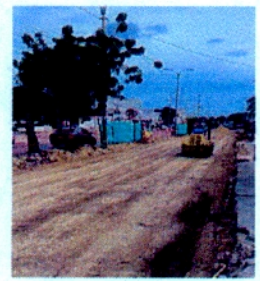

LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON EQUIPO MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR



EXTENSIÓN Y HUMECTACIÓN DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS CON MOTONIVELADORA Y CARROTANQUE



COMPACTACIÓN DE SUB BASE CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR Y TOMA DE DENSIDADES



MEZCLA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN PLANTA PARA COLOCACIÓN EN SITIO CON EQUIPO TIPO MIXER, VIBRADO ALLANADO, TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL, PAVIMENTO EN CONCRETO E=0.25 MT Y MR=4.2 MPA.



CORTE Y DILATACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO Y SELLO DE JUNTAS EN CORDÓN DE POLIURETANO CON SELLO DE SILICONA.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

1. SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT. PRESENTA DEFICIENCIA EN TEMAS DE SEÑALIZACIONES.
2. SE SOLICITA VERIFICAR DIARIAMENTE QUE EL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO TENGA LOS PPE COMPLETOS.
3. IMPLEMENTAR EL PAGA YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO AL 100%.
4. SE RECOMIENDA ABRIR MAS FRENTES DE TRABAJO.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

APoyo A LA SUPERVISION



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 3

FECHA DE ELABORACION: 18 7 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	18 de junio de 2023 Y EL 17 de julio de 2023
OBJETO	"MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA AVENIDA "FRANCISCO EL HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIONACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"		
LOCALIZACIÓN	DISTRITO DE RIONACHA ENTRE CALLE 15 Y LA CALLE 33 SOBRE LA CARRERA 7H "AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE"		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	587 DE 2022	CONTRATO No.:	240 DE 2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIONACHA	CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE
PLAZO INICIAL:	13 MESES	PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de Febrero 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 14.961.100.754.54	VALOR INICIAL:	\$ 1.084.668.634,00
ANTICIPO PACTADO:	N/A	ANTICIPO PACTADO:	N/A
VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR ADICIONALES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	VALOR ACTUALIZADO:	N/A
VALOR PAGADO:	\$ 4.864.706.050.53	VALOR PAGADO:	N/A
VALOR POR PAGAR:	\$ 10.096.394.704.01	VALOR POR PAGAR:	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
CUMPLIMIENTO	18/04/2023	18/09/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/04/2023	18/06/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	18/04/2023	18/05/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/04/2023	18/02/2027
PRESTACIONES SOCIALES	18/04/2023	19/05/2027	CALIDAD DE SERVICIO	18/03/2024	18/02/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/05/2024	19/05/2029			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/04/2023	18/05/2024			

3. RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo Pactado (15%)	17/05/2023	\$ 2.244.165.113,18			
Acta Parcial No 1	19/07/2023	\$ 2.620.540.937,35			

AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA	AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA
---	--



4. CURVA "S"

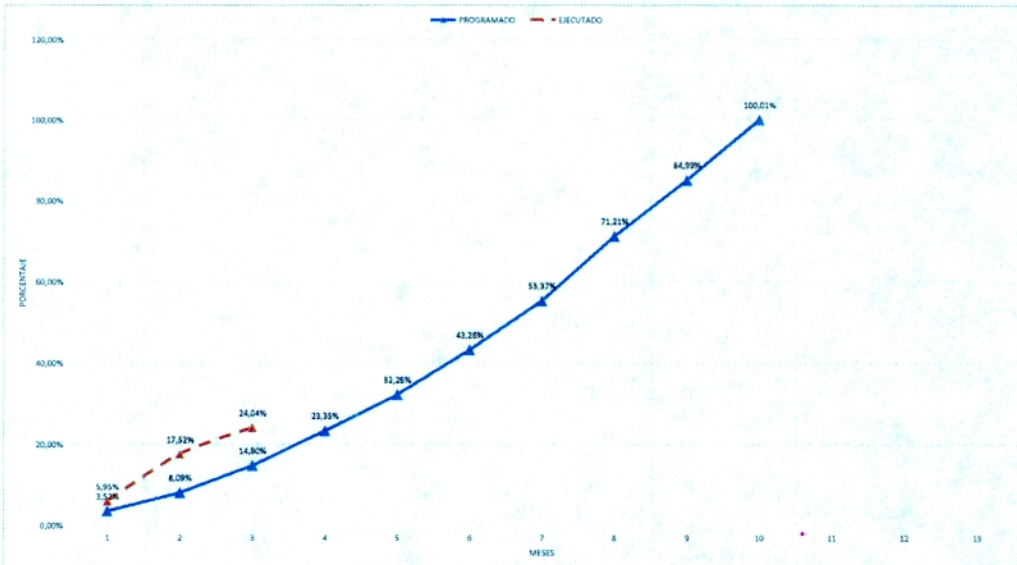

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.


EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

5. RELACION DE HITOS (AVANCE)

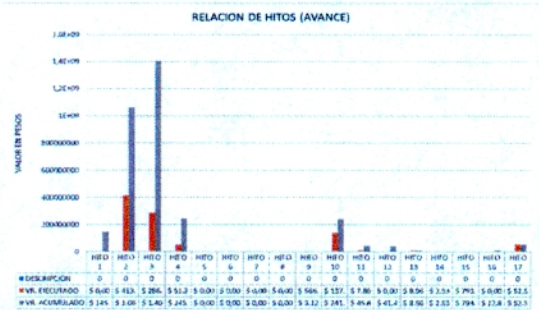

	DESCRIPCION
HITO 1	COMPONENTE PAVIMENTOS
HITO 2	ADECUACION DE TERRENO
HITO 3	PAVIMENTO
HITO 4	ACERO DE REFUERZO
HITO 5	ANENES Y SARDINEL
HITO 6	ACTIVIDADES ELECTRICAS Y LUMINARIAS
HITO 7	MOBILIARIO URBANO
HITO 8	SEÑALIZACION
HITO 9	COMPONENTE ALCANTARILLADO
HITO 10	MOVIMIENTOS
HITO 11	INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
HITO 12	OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA
HITO 13	MOVIMIENTO DE TIERRAS
HITO 14	INSTALACION DE TUBERIA RED DE ACUEDUCTO
HITO 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
HITO 16	SUMINISTRO REDES DE ALCANTARILLADO
HITO 17	SUMINISTRO REDES DE ACUEDUCTO

4. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES

UBICACION

SITIO LLAMADO "LAGUNETA"

BOYADEROS: SI NO X N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X N/A
PERMISO TALA: SI NO X N/A
ESCOBRERAS: SI X NO N/A
VERTIENTOS: SI NO X N/A
EMISIONES: SI NO X N/A

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANETER INFORMADO AL SUPERVISOR SOBRE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SUS DISPOSICION FINAL Y ENVIAR LA DIRECCION DEL SITIO.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha se presentó el acta modificativa No 1 donde se han identificado mayores o menores cantidades de obras

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial

1. Diariamente se realizan pausas activas de los trabajadores y durante ese lapso de tiempo se hidrata el personal de obra, ya que las temperaturas están haciendo muy altas.
2. Se realiza aprobación por parte de la interventoría de 45 trabajadores a obra entrega de EPP al personal a la interventoría.
3. Contratista realiza envío de formatos de
4. Se realiza recorrido en obra en compañía de la interventoría y se evidencia el uso de EPP
5. En el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes en obra

De medida Preventiva

- Les Charlas y otros
1. Cerramiento como protección a la comunidad y al tráfico vehicular.
 2. Se realizaron encuesta de sintomatología al personal que labora en obra.
 4. Se envían por parte del Coordinador HSEQ del contratista UT VIAS GEO PAZ RIOHACHA, reporte de las actividades implementadas en obra del PAPSO y reporte de novedades del día

La limpieza de baños y oficinas se continúa ejecutando al menos dos veces por semana

Actividades de Higiene y Seguridad Industrial

La interventoría se acoge a las medidas establecidas en el PAPSO del contratista en obra, e implementa medidas de bioseguridad propias del consorcio CIO, como son, encuesta digital de sintomatología y bitácora de recorridos. Sin novedad hasta la fecha. Se observa lavado de Baños con frecuencia diaria

*Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal

Ingreso Personal

07:00a.m

Salida Personal

05:00p.m

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N/A (No aplica)

6. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	56
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	8
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:	9
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
SEDES SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	1
SEDES SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	1
VISITAS- ACTAS DE VECINDAD	58

OBSERVACIONES

- Se debe reforzar la comunicación con la comunidad.

- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron FORS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.

CONTRATO DE OBRA

NOMBRE	CEDELA	CARGO
MIGUEL GARCIA ROMANI	8779895	DIRECTOR DE OBRA
YERALDITH RAMOS BONILLA	1063961596	RESIDENTE DE OBRA
DAVID MESA CALVO	1118826361	TOPOGRAFO
LIESEL PATRICIA HERNANDEZ M.	1118826362	REP LEGAL
ROSMIRA BRITO BLANCO	40941758	TRABAJADORA SOCIAL
SHEIRYL ARANZA COTES	1118871844	TRABAJADORA SOCIAL

6.1 PERSONAL EN OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE	CEDELA	CARGO
JORGE MARIO DURAN ROMERO	7572338	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CARLOS CRISTIAN CAMARO IGUARAN	1118818038	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SNEIDER JAVIER REDONDO BRUGES	84084937	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2
MARCOS DAZA JULIO	7574356	ING CIVIL ESP EN VIAS
ALEJANDRO NEL PACHECO	9086922	ING CIVIL ESP EN SUELOS
SAMUEL RAMIREZ DE LA HOZ	7573021	ING CIVIL ESP EN HIDRAULICA
CINDY BAQUERO MONTAÑO	1124604844	PROFESIONAL SISO
ELDA GOMEZ PEÑALVER	40947428	CONTADOR PUBLICO
ANGEL HERNANDEZ FONSECA	1124514835	ASESOR JURIDICO
JOSE EDUARDO TORO CALVO	17930592	TOPOGRAFO 1
JHON CARLOS FLOREZ FONSECA	1143367398	TOPOGRAFO 2
JOSE GABRIEL MEZA CALVO	1118815544	CADENERO 1
ROBERTO ANDRES VARELA DUARTE	1075647469	CADENERO 2
JORGE ISAAC GAMEZ MOREU	1124532267	CADENERO 3
LAUREANO COTES ARISTIZABAL	72345439	CADENERO 4
BIDY LINE VIZCAINO CAMPO	36469646	SECRETARIA
FRANKLIN LUIS BONIVENTO GOMEZ	1124605067	INSPECTOR



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: RETROEXCAVADORA 320




DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: RETROEXCAVADORA 320



RETIRO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA 320 Y VOLQUETA



LIMPIEZA DE SUBRASANTE CON EQUIPO MOTONIVELADORA



EXTENSIÓN DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS CON MOTONIVELADORA



HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR



MEZCLA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN PLANTA PARA COLOCACIÓN EN SITIO CON EQUIPO TIPO MIXER, VIBRADO ALLANADO, TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL, PAVIMENTO EN CONCRETO E=0.25 MT Y MR=4.2 MPA.



CORTE Y DILATACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO Y SELLO DE JUNTAS EN CORDÓN DE POLIURETANO CON SELLO DE SILICONA.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT, PRESENTA DEFICIENCIA EN TEMA DE SEÑALIZACIONES.
2. SE SOLICITO VERIFICAR DIARIAMENTE QUE EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TENGAN LOS EPP COMPLETOS.
3. IMPLEMENTAR EL PAGA YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO AL 100%.
4. SE RECOMIENDA ABRIR MAS FRENTES DE TRABAJO.
