

Bogotá, 29 de Septiembre de 2023

Señores

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
Representante Legal.
Centro Comercial Bolivar OF. A10
Cucuta – Norte de Santander

ASUNTO: GCS-MAD-CO-543-045, INFORME MENSUAL No. 9 – MARZO, INFORME MENSUAL No. 10 – ABRIL, INFORME MENSUAL No. 11 – MAYO


REFERENCIA: CONTRATO No 543 de 2022, "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el informe de obra mensual No.9,10 y 11 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo para su respectiva revisión y aval, el cual contiene el informe de obra, SST con sus respectivos anexos

Agradezco la atención prestada, quedo atento a su respuesta.

Atentamente,


GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C. C. No. 1.126.001.358 de Londres (ING)
Tarjeta Profesional No.25202-252504 CND
NIT: 900.653.937-2

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Recibí
JUANVA E

INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS:
LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE
MADRID – CUNDINAMARCA".**

INFORME TECNICO No. 10

01 – 30 ABRIL 2023

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

MADRID – CUNDINAMARCA

INFORME TECNICO No. 10

PERIODO: ABRIL 01 DE 2023 – ABRIL 30 DE 2023

**"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA
MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE
MADRID – CUNDINAMARCA"**

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	Revisó: DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	Revisó y aprobó: JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Representante Legal
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 12/05/23	Fecha: 19/05/23	Fecha: 24/05/23

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. LOCALIZACIÓN	4
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA.....	5
5. INFORME TECNICO.....	6
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	6
5.2. RESUMEN DE OBRA.....	7
5.2.1. Valor de Actividades por Frentes	7
5.2.2. Porcentaje por Frentes.....	8
5.3. REGISTRO PERSONAL	9
5.3.1. PERSONAL	10
5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO	12
5.5. DISEÑOS	12
5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS.....	13
5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA.....	13
5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES	13
5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA	13
5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO.....	14
5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.....	14
5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA.....	14
5.13. AFECTACIONES	15
5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS	15
5.13.2. VANDALISMO.....	15
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS.....	15
7. REGISTRO FOTOGRAFICO	16
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN.....	16
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS.....	19
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA.....	25
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	25
8. CONCLUSIÓN	29

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**


El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

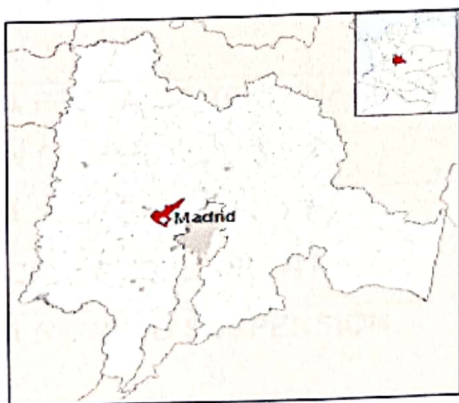

Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

**GCS**

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S**NIT 900.653.937-2****4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.contrucciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.1	30 DICIEMBRE 2022
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.1	30 ENERO 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1	02 MARZO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.2	21 FEBRERO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.2	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.2	21 MARZO 2023

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.2	30 MARZO 2023
PLAZO PRORROGA No.1	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1	30 MAYO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

5. INFORME TECNICO

5.1.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso del mes de ABRIL se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a los diferentes frentes de trabajo:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Subbase granular
- Placa base en concreto
- Refuerzo malla electrosoldada
- Celosía tubular para polideportivo
- Adoquín en concreto

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- Excavación
- Demolición placa y viga
- Relleno con Recebo común



- Subbase granular
- Placa base en concreto
- Refuerzo malla electrosoldada
- Concreto estriado rampas
- Celosía tubular para polideportivo
- Tubería drenaje PVC 200

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de abril 2023

D. Frente polideportivo barrio San Carlos

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- Viga de amarre en concreto
- Malla electrosoldada
- Placa base en concreto
- Adoquín en concreto
- Andén en concreto
- Sardinell en concreto
- Subbase granular
- Celosía tubular para polideportivo

5.2.RESUMEN DE OBRA

5.2.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	\$ 806.875.792,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	\$ 1.428.004.293,00
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	\$ 1.398.078.270,00
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	\$ 771.963.787,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.404.922.142,00

5.2.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	\$ 476.253.847,51
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	\$ 234.075.810,54
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	\$ 244.713.221,88
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	\$ 0

5.2.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	\$ 908.012.028,03
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	\$ 1.072.319.108,31
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	\$ 969.007.253,58
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	\$ 330.005.269,74

5.2.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	\$ 955.042.879,93
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	\$ 3.279.343.659,67

5.2.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	18,32%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	32,42%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,74%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	17,53%
	% TOTAL DEL PROYECTO	100%

5.2.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	59,02%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	16,39%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	17,50%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	0%

5.2.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	112,53%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	75,09%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	69,31%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	42,75%

5.2.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	21,68%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	74,45%

5.3. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

**GCS**

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S**NIT 900.653.937-2****5.3.1. PERSONAL**

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	21/03/2023		

MAESTROS DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	21/03/2023		
Maestro	Raul Ortega Ortega	91.043.486	21/03/2023	4/04/2023	Retirado

OFICIALES DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Oficial	Jose Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	1/04/2023		
Oficial	Eduar Alberto García Cosme	1.051.737.892	21/03/2023		
Oficial	Carlos Santana Obregon	1.051.737.892	21/03/2023		
Oficial	Dagoberto Mora Tellez	9.167.984	21/03/2023		
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	21/03/2023		

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

Oficial	Rugero Segundo Sotelo Vides	92.555.775	21/03/2023		
AYUDANTES DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ayudante	Pablo Emiro Bermon Rojas	5.414.671	21/03/2023	24/04/2023	Retirado
Ayudante	Samuel Rocha Villalba	1.002.423.265	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Jose de la Cruz Gil Macias	1.051.738.647	21/03/2023	29/04/2023	Retirado
Ayudante	Clemente Rocha Villalba	1.051.738.090	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	21/03/2023	29/04/2023	Retirado
Ayudante	Donis David Carbone Bastidas	7.572.127	21/03/2023		
Ayudante	Kevin David Rodriguez Gil	1.002.426.542	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Ricardo Rodriguez Tellez	1.002.423.643	21/03/2023		
Ayudante	Jhon Jairo Chavez Rodriguez	1.075.629.705	21/03/2023	4/04/2023	Retirado
Ayudante	Gabriel de Jesús Schmalbach Quezada	1.192.771.091	21/03/2023	4/04/2023	Retirado
SOLDADORES					
Soldador	Jorge Alberto Espejo Beleño	8.055.676	21/03/2023		
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	21/03/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	21/03/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	21/03/2023		
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	21/03/2023		
Soldador	Omar Fernando Rueda Herrera	1.102.723.680	21/03/2023		

Nota: En el transcurso del periodo de tiempo relacionado en el presente informe, se presentó la incorporación de personal, así como el retiro de varios empleados. En la tabla anterior se relaciona el estado actual del personal.

5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
1	Retroexcavadora
1	Minicargador – Bobcat
3	Volqueta capacidad mayor 6 m3
10	Pulidora
4	Barra
4	Picas
8	Pala
1	Demoledor manual
10	Andamio (sección)
1	Vibro compactador (canguro)
1	Vibro compactador (rana)
1	Vibrador concreto

5.5. DISEÑOS

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoría y supervisión:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta
- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta
- Acceso al polideportivo: dos (2) entradas
 - Entrada principal
 - Entrada de mayor dimensión al respaldo del arco de la parte frontal





GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.
- Diseño de la cubierta del polideportivo

Frente polideportivo La Magnolia:

- Accesos al polideportivo
 - Calle 8°: puerta principal para ingresar al polideportivo
 - Cruce entre calle 8° y 9°: ingreso parque infantil
 - Acceso polideportivo por la carrera 4
- Diseño cimentación muro de cerramiento
- Baños al costado de las graderías

Frente polideportivo San Carlos:

- Dimensiones cerramiento: Lateral colindante con el predio de la iglesia

5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en las cuentas de cobro 1 y 2 (11/11/2022 y 20/02/2023). Los ensayos realizados después de esta fecha, serán anexadas en la siguiente cuenta de cobro.

5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com





GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo del barrio San Luis se cuenta con el alquiler del salón comunal del barrio San Luis, donde se guarda material y herramientas de la obra.
- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de dos (2) bodegas ubicadas en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas.

5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Todo el material generado por las actividades como excavación o demolición en los diferentes frentes de trabajo es apilado en puntos estratégicos dentro de las obras para posteriormente ser retirado implementando volquetas, retroexcavadora y bodcat hacia botaderos certificados. Estos certificados se anexan trimestralmente en el informe ambiental.

5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del polideportivo por la parte posterior y a la medianía con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, en el periodo del presente informe, no causo inconvenientes en la obra.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún cuerpo de agua.

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com





GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.13. AFECTACIONES

5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el mes de abril no se presentaron afectaciones por las condiciones climáticas en el desarrollo de las actividades del proyecto (Anexo No. 2)

5.13.2. VANDALISMO

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas en los diferentes frentes de trabajo.

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



15



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1.FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

- Subbase granular



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

- Placa base en concreto



- Refuerzo malla electrosoldada



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA


Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

- Celosía tubular para polideportivo



- Adoquín en concreto

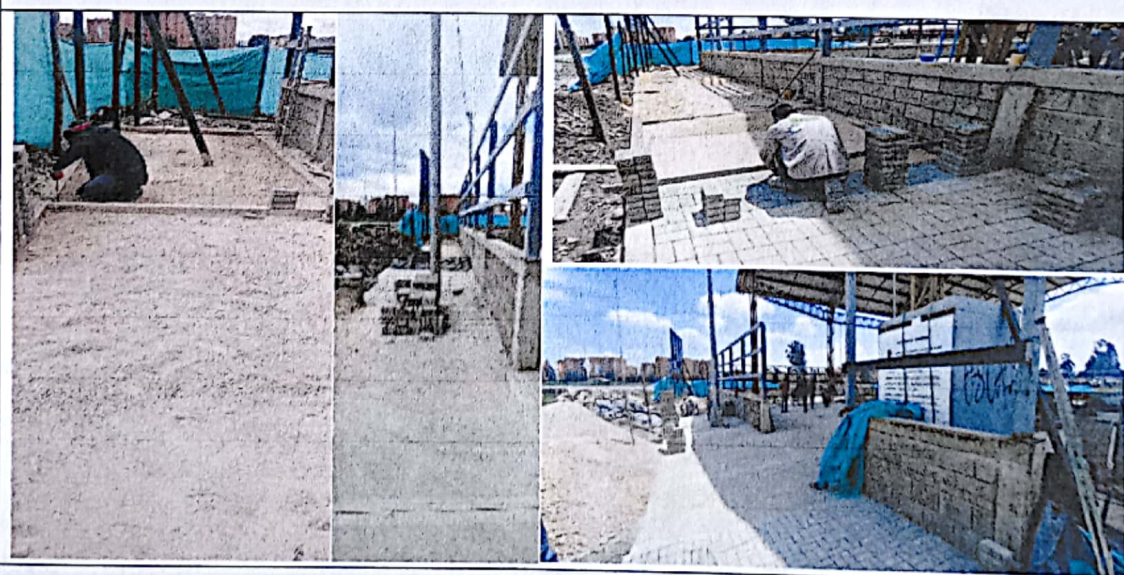



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS

- Retiro de sobrantes



- Excavación




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

- Demolición placa y viga

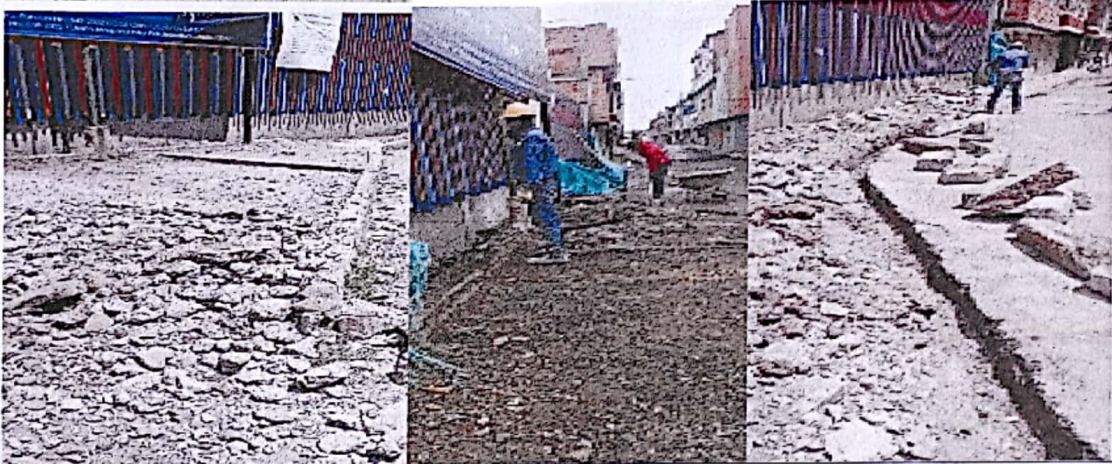

- Subbase granular





GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Placa base en concreto



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Refuerzo malla electrosoldada



- Concreto estriado rampas



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Celosía tubular para polideportivo



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com




GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Tubería drenaje PVC 200

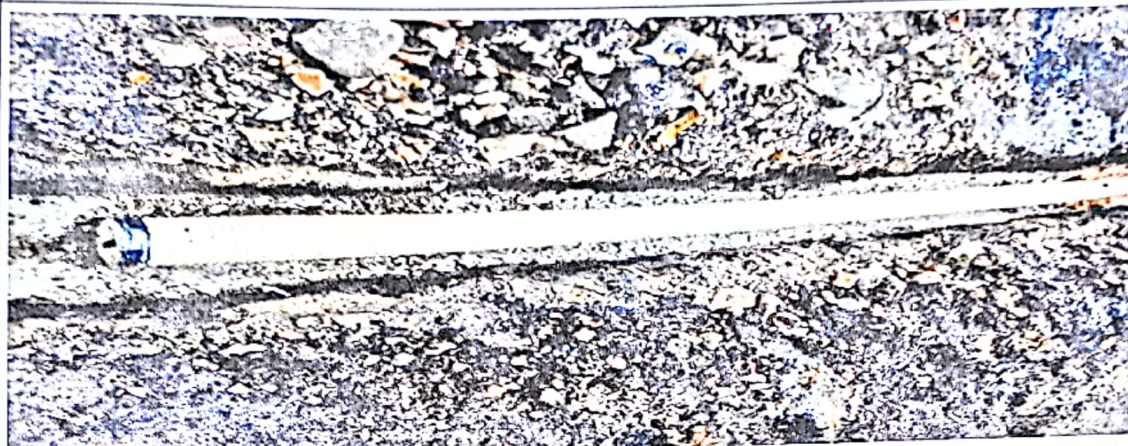

7.3.FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de abril 2023

7.4.FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

- Viga de amarre en concreto



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2



- Adoquín en concreto



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Andén en concreto



- Sardinell en concreto



- Subbase granular



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

- Celosía tubular para polideportivo



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



- Placa base en concreto

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **“MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA”**. suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes de abril y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio.

GCS CONSTRUCCIONES SAS viene gestionando desde el mes de enero 2023 un modificadorio con el objetivo de adicionar presupuestalmente al contrato 543-2022 y con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato; tramite por el cual, hasta la fecha aún no se tiene viabilidad por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

ANEXO 1. BITACORA

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com



30

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE
LOS BARRIOS: CA MAGNOLIA, ESCALLÓN,
SAN CÉS y SAN CARLOS DEL
MUNICIPIO DE MADRID COND. NARIÑO

OBRA:

CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA -
ADECUACIÓN - MEJORAMIENTO.

UBICACIÓN:

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLÓN

FECHA INICIO:

16 JUN 2022

31 Marzo 2013

Estado del clima
Soleado

Personal en obra:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Oficial de obra (2)

Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:

Herramienta menor.

Actividades de obra:

1. Retiro de sobrantes.
2. Subbase granular debidamente compactada.
3. Malla electrosoldada y Muro en bloque N°4
4. Pañete liso Muros.

Dmf

/

01 Abril 2013

Estado del clima
Soleado

Personal en obra:

Residente de obra.

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo:

Herramienta menor compactador

Actividades de obra:

1. Subbase granular
2. Pañete liso Muros.

Dmf

/

03 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra (1)

Soldadores (3)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Equipo Soldadura

Compactador

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada.

3. Corte y Soldadura perfiles cerramiento.

Dmf

04 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra (1)

Soldadores (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Compactador

Equipo Soldadura.

Actividades de obra

1. Sub base granular.

2. Malla electrosoldada.

3. Placa base en concreto.

4. Corte e instalacion platinas cerramiento

Dmf

08 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Tarde Poco Nublado

Residente de intercomunicación

Maestro de obra (1)

Estructuras (3)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo

Cerramiento mure y Metaceras compactadas E. S. S. S. S.

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto

4. Corte e instalación de platinas cerramiento

5. Corte e instalación de fertilizantes principales

Cerramiento

Dmy

08 de Abril 2023

Estado del clima

Para este día no se reportan

Soleado

actividades, ya que el personal

Tarde Poco Nublado

se toma este día para descansar.

con relación a Semana Santa; el

próximo sábado se repone trabajando

todo el día.

Dmy

fr

10 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Muestro de obra (1)

Soldadores (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Máquina y Equipo

Herramienta menor

compactador Mezcladora E. Soldadora

Actividades de obra

1. Sub base granular

2. Placa base en concreto

3. Corte, Soldadura, Pintura e instalación de:
Platinos, Perfiles principales y transversales del
cercamiento del polideportivo fs

Dm

11 abril 2023

Estado del
clima:
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Muestro de obra (1)

Soldadores (3)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Máquina y Equipo

Herramienta menor

Mezcladora Compactador E. Soldadora

Actividades de obra

1. Sub base granular

2. Malla electrosoldada

y placa base en concreto

3. Corte y Soldadura

Perfiles cercamiento
fs

Dm

12 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Soldadores (3)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Mecedora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto.

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y Pintura
para los elementos del cerramiento (platinus)

Dm

13 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Soldadores (3)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Mecedora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular.

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto.

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y Pintura para
los elementos del cerramiento del polideportivo
(Perfil Principal)

Dm

14 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoría

Muestrero de obra (1)

Soldadores (3)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (1)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra:

1. Sub base granular.

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto

4. Corte, soldadura, anticorrosivo para elementos del
Cerramiento (Perfil Principal)

D m

15 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoría

Muestrero de obra (1)

Soldadores (3)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (1)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra

1. Malla electrosoldada

2. Fundición Placa base en concreto

3. Corte, soldadura, anticorrosivo y pintura para
los elementos del cerramiento del polideportivo.
(Perfiles principales y transversales)

D m

17 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Nublado

Residente de obra

Tarde lluviosa

Residente de interventoria

Muestrero de obra (1)

Soldadores (2)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Compactador E Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular.

2. Excavación para Sardinel entrada

3. Corte, ligadura y amarre de acero para Sardinel

4. Corte, Soldadura anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo

Dmy

18 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra:

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoria

Muestrero de obra (1)

Soldadores (2)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Excavación

3. Fundición concreto Sardinel

4. Corte, Soldadura anticorrosivo, esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo

Dmy

19

Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Soldadores (4)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Compactador Mezcladora E. Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Fundición concreto para Sardinell

3. Armaz de acero para Sardinell

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo

Dm

20

Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Soldadores (4)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Compactador Mezcladora E. Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Fundición Placa base entrada polideportivo

3. Malla electrosoldada

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo

Dm

21 Abril 2023

Personal en obra.

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Compactador E soldadura

Actividades de obra.

1. Sub base granular.

2. Poner de acero para vigas de confinamiento adoquin

3. Encofrar vigas de confinamiento adoquin.

4. Corte, soldadura, esmalte y anticorrosivo para los elementos del cerramiento del polideportivo.

D. M.

Estado del clima.
Soleado con presencia
de lluvia

Soldadores (4)

22 Abril 2023

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de interventoría.

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (1)

Materiales y Equipo.

Herramienta menor Mezcladora Equipos Soldadura

Actividades de obra.

1. Sub base granular.

2. Mena para base de adoquin.

3. Fundición vigas de confinamiento adoquin.

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento.

D. M.

Estado del clima.
Soleado

Soldadores (4)

24 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Tarde poco lluvia

Residente de interventoria

Maestro de obra (1)

Soldadores (4)

Oficial de obra (1)

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipos

Herramienta menor E. Soldadura Compactador Motoladora.

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Arena para base adoquin

3. Amarrar acero

4. Fundir vigas continuamente adoquin y sardinel.

5. Corte y soldadura elementos cerramiento

Dm

25 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Nublado

Residente de obra

Tarde poco lluvia

Residente de interventoria

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Soldadores (4)

Materiales y Equipos

Herramienta menor

Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Instalación Adoquin en concreto.

2. Corte, Soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo

Dm

26 Abril 2013

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de interventoria.

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Soldadores (4)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Actividades de obra.

1. Pórguin en concreto.

2. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento del polideportivo.

Dm

Estado del clima.

Soleado

Frecuencia de lluvia

Equipos Soldadura

27 Abril 2013

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de interventoria.

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Soldadores (4)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Actividades de obra

1. instalación Pórguin en concreto en la entrada del polideportivo.

2. Corte y soldadura de los elementos del cerramiento del polideportivo.

Dm

Estado del clima.

Soleado

Tardo Nublado poco

lluvioso.

Equipos Soldadura

28 Abril 2023

estado del clima.

Personal en obra

Nublado

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Soldadores (4)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Equipos soldadura

Actividades de obra.

1. instalación adogan en concreto.

2. Corte, soldadura y anticorrosivo para los elementos del cerramiento del polideportivo

D.M.J

/

29 Abril 2023.

estado de l clima.

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Tarde Nublado

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (1)

Soldadores (4)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Equipos Soldadura.

Actividades de obra.

1. instalación adogan en concreto

2. Corte, soldadura y Esmalte para los elementos del cerramiento.

D.M.J

/

CONTENIDO DE CUP RESUM

543 - 2022

OBJETO:

MESORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE
LOS BARRIOS: LA MAGUELLA, ESCALLÓN,
SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL
MUNICIPIO DE MADRID, CORDOBA MARCA.

OBRA:

CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA -
ADECUACION - CERRAMIENTO

FRONTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO
LA MAGUELLA

FECHA INICIO:

20 JUL 2022

01 Abril 2013 - 30 Abril 2013

Se repartieron actividades de clase para este
bimestre en el transcurso del mes de abril

Dmy

CONTRATO DE OBLA PUBLICA

512 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS FOLIOPORTIVOS
DE LOS CARRETES: LA MAGUCLIA, ESCALON,
SAN CARLOS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO
DE MADRID, CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCION CORA NAVA-
ADECUACION- REFORMA

TRENTE:

FOLIOPORTIVO BARRIO

SAN CARLOS

FECHA INICIO

12 AGO 2022

01 Pínd. 2003

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Oficial de obra

Ayudantes de obra (8)

Materiales y Equipos

Instrumentos para

Actuantes de obra

1. Sub base granular debidamente compactada.

2. Perforar de acero para Alrajio.

3. Malla electrosoldada y fundición placa en concreto

4. Instalación Pláticas cerramiento

Nota: Se evidencia la presencia de personas residiendo en el interior del polideportivo.

D. M. J.

Estado del Chirio

Soleado

Maestro

Soldadores (2)

Equipo soldadura

Mezcladora

03 Pínd. 2003

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Oficial de obra

Ayudantes de obra (6)

Materiales y Equipos

Instrumentos para

Actuantes de obra

1. Subbase granular debidamente compactada.

2. Malla electrosoldada y fundición placa en concreto

3. Corte, Soldadura, anticorrosivo y revestir para elementos del cerramiento.

Nota: Se evidencia la presencia de personas residiendo en el interior del polideportivo.

Se evidencia la presencia de personas residiendo en el interior del polideportivo.

Se evidencia la presencia de personas residiendo en el interior del polideportivo.

D. M. J.

Estado del Chirio

Soleado

Maestro de obra

Soldadores (4)

Equipo soldadura

Mezcladora

04 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Almuerzo de obra

Mudantes de obra (6)

Maestro de obra
Soldadores (6)

Máquina y Equipo

Herramienta menor compactador Metcladova Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto laterales cancha

4. Corte, soldadura anti corrosivo y esmalte para elementos del cerramiento

DM

f

05 Abril 2023

Estado del clima:
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra

Mudantes de obra (6)

Tarde lluviosa

Soldadores (6)

Máquina y Equipo

Herramienta menor Equipos Soldadura Metcladova Compactador

Actividades de obra:

1. Sub base granular debidamente compactada

2. Malla electrosoldada

3. Placa base en concreto

4. Anillo en concreto

5. Instalación perfiles principales cerramiento

6. Corte, soldadura anticorrosivo y esmalte elementos

Cerramiento polidepositive

1

08 Abril 2023

Estado del clima

Se reparten actividades

soleado

y a que el personal se tome este día para descansar con relación a Semana Santa. El trabajo correspondiente al 08 de abril se repartirá en la tarde del próximo sábado

Dm

js

10 Abril 2023

Estado del clima

soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:

- Herramienta mena - Mezcladora - Equipos Soldadura - Compresor.

Actividades de obra:

1. Excavación para sarcamo

2. Subbase granular.

3. Amarre de acero para Sardincl

4. Encaprar Sardincl

5. Instalación perfiles principales y transversales del cerramiento.

6. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento.

7. Malla electrosoldada.

8. Fundición concreto para orden.

no se observa la presencia y residencia de personal y en la obra en el interior del polideportivo

Dm

js

Estado del clima
soleado

11 Abril 2023

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (7)

Máquina y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Equipos Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular debidamente compactada

2. Malla electrosoldada y fundición andén en concreto

3. Fundición Sardinel en concreto.

4. Instalación perfiles principales y transversales del Cerramiento.

Dmp

Estado del clima
soleado

12 Abril 2023

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (7)

Máquina y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Equipos Soldadura

Actividades de obra:

1. Amarre de acero para vigas continuamiento de apoyo y fundición de las mismas.

2. Pdogin en concreto

3. Malla electrosoldada y fundición concreto para andén

4. Corte, Soldadura, anticorrosivo, esmalte e instalación de elementos del cerramiento de polideportivo

Nota se evidencia que los personas que están residiendo en el polideportivo han generado ya desaseo en el mismo.

13 Abril 2023

03

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Muestrero de obra
Ayudantes de obra (7)

Estado del clima
Soleado
Tarde poco lluviosa

Soldadores (9)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Mezcladora compactadora Equipo Soldador
Actividades de obra.

1. Subbase yigaku debidamente compactada.
2. Malla electrosoldada y fundación concreto para andén.
3. Armaz de acero para Sardinat y vigas continuamente
4. Instalación peritilena principal, transversal e inicio
instalación peritilena de cobres para cerramiento

Dm

js

14 Abril 2023

Estado del clima.

Personal en obra.

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoría

Muestrero de obra.

Soldadores (9)

Ayudantes de obra. (7)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Equipos de soldadura

Actividades de obra:

1. Fundación concreto para Sardinat y vigas continuamente
2. Pdogun en concreto
3. Armaz de acero
4. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los
elementos del cerramiento.
5. Instalación elementos del cerramiento: Peritil principal,
transversales y peritilena de cobres.

Dm

js

15 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra:

Residente de obra.

Residente de interventoría.

Maestro de obra

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (8)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor. 1

Equipos Soldadura

Actividades de obra:

1. Adoquin en concreto.
2. Corte, soldadura, esmalte, anticorrosivo e instalación de perfiles principales, transversales y perfiles de colores del cerramiento.

Dm

17 Abril 2023

Estado del clima:
Nublado
Tarde lluviosa.

Personal en obra:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Ayudantes de obra (3)

Soldadores (8)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor. Equipos Soldadura.

Actividades de obra:

1. Adoquin en concreto.
2. Corte, fijación y amarre de acero para vigas confinamiento y soldadura.
3. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para elementos del cerramiento.

Dm

18 Abril 2023

Estado clima
soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (3)

Soldadores (8)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor. Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Corte, fijación y amarrado de acero para viga de confinamiento y Sardineta.

2. Vado en concreto

3. Corte, soldadura, anticorrosivo, esmalte e instalación de los elementos del cerramiento del polideportivo.

Dmy

19 Abril 2023

Estado clima
soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (3)

Soldadores (8)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor. Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Vado en concreto

2. Acople de acero y enroscado de Sardineta

3. Fundición concreto Sardineta y viga de confinamiento

4. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para elementos del cerramiento.

5. Instalación perfiles transversales faltantes del cerramiento.

No se observa la presencia de personas ajenas a la obra en el interior del polideportivo.

Dmy

20 Abril 2023

Estado clima
soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor

Equipos Soldadura

Meceladores

Actividades de obra

1. Pdoquin en concreto.

2. Punteo de acero y fundición Sardinell y vigas.
de continuamiento.

3. instalación perfilera para el cerramiento.

4. Corte, soldadura anticorrosivo y esmalte para los
elementos del cerramiento. p

Dmp

21 Abril 2023

Estado clima.

lublado con presencia
de lluvia.

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equip.

Herramienta menor

Equipos Soldadura

Mecelobra.

Actividades de obra

1. Pdoquin en concreto.

2. Punteo de acero y fundición de Sardinell.

3. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los
elementos del cerramiento.

4. instalación perfilera de l cerramiento. p

Dmp

22 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Soldadores (3)

Ayudantes de obra (3)

Máquina y Equipo

Herramienta menor

compactador

Equipos Soldadura

Actividades de obra:

1. Adoquin en concreto.

2. Subbase granular para placa porque infantil.

3. Corte, Soldadura, anticorrosivo y esmalte para elementos del cerramiento e instalación de los mismos.

no se sigue evidenciando la presencia de personas ajenas a la obra residiendo en el interior del polideportivo. p

DM

24 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Tarde lluviosa.

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Soldadores (2)

Ayudantes de obra (2)

Máquina y Equipo

Herramienta menor

compactador

Equipos Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular debidamente compactada.

2. Adoquin en concreto.

3. Corte, Soldadura, anticorrosivo y esmalte para elementos del polideportivo (cerramiento) e instalación de los mismos.

no se evidencia la presencia de abundantes desechos reciclaje, bolsas, ropa, etc) debido a la presencia de personas residiendo en el polideportivo. p

DM

25 Abril 2013

Personal en obra:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Ayudantes de obra. (2)

Materiales y Equipo:

- Herramienta menor. - Compactador

- Equipo Soldador-Mezclador.

Actividades de obra:

1. Subbase granular, debidamente compactada.
2. Malla electrosoldada y fundición de placa para parque infantil.
3. Corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte para los elementos del cerramiento e instalación de los mismos.

Dmf

Estado Clima:

Nublado

Tarde lluviosa

Soldadores (2)

26 Abril 2013

Personal en obra:

Residente de obra.

- Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Ayudantes de obra. (2)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor. Mezclador Compactador Equipo Soldador.

Actividades de obra:

1. Malla electrosoldada y fundición placa base para parque infantil.
2. Adoquin en concreto.
3. Corte, anticorrosivo, soldadura, esmalte e instalación de los elementos del cerramiento.

Dmf

Estado del Clima

Nublado / Presencia de lluvia.

Soldadores (2)

27 Abril 2023

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (2)

Materiales y Equipos

Herramienta menor. Mercadería Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada.

3. Placa base en concreto

4. Adoquin en concreto

5. Vigas continuamiento

6. Instalación periferia cenamiento

DM

Estado del clima

soleado

Trabaja habilitado con lluvia

Soldadores (2)

28 Abril 2023

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Ayudantes de obra (1)

Materiales y Equipos

Herramienta menor. Equipos Soldadura Mercadería

Actividades de obra

1. Adoquin en concreto y Vigas cinta de continuamiento

2. Corte, soldadura, galvanizado y esmalte para los elementos del cenamiento del subestructura

3. Instalación periferia cenamiento.

DM

Estado del clima

nublado

Soldadores (2)

20. Ab. 1. 171

Incendio en día

Rendimiento de día

Rendimiento de intervención

Recepción de día

Rendimiento de día

Recepción de día

Recepción de día

Recepción de día

Recepción de día

Recepción de día

Recepción de día

Estado del clima

Estado

Estado de la obra

1
CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE
LOS BARRIOS: LA MAGÜELA, ESCALÓN, SAN
LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE
MADRID COMUNIDAD

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA -
ADECUACION - CERRAMIENTO

FRONTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS

FECHA INICIO:

22 JUN 2022

31 Marzo 2023

Personal en obra:

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo

Plomero, albañil, electricista, etc.

Actividades de obra

1. Instalación elementos del cerramiento

2. Subbase granular

J. M. /

Estado del clima

Soleado

01 Abril 2023.

Personal en obra:

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo

Equipo Soldadura Mezcladora Compactador H. menor

Actividades de obra

1. Instalación red aguas lluvia

2. Relleno con relleno debidamente compactado

3. Subbase granular debidamente compactada

4. Malla electrosoldada y placa base en concreto

5. Corte, soldadura para cerchas de la estructura de la cubierta del polideportivo

Nota: la actividad de corte, soldadura, anticorrosivo y esmalte de los elementos de la estructura de la cubierta se adelantará en el mes de abril.

Escullán.

J. M. /

N

Estado del clima

Soleado

Soldadores (3)

03 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Soldadores (3)

Ayudantes de obra (4)

Máquinaria y Equipo

Herramienta Menor Compactador Equipo Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular

2. Relleno con recebo común

3. Concreto para zapata y columna

4. Excavación y retiro de sobrantes

5. Celosía tubular para estructura cubierta

Dmy

04. Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Soldadores (3)

Ayudantes de obra (4)

Máquinaria y Equipo

Herramienta menor Mezcladora compactador E. Soldador

Actividades de obra:

1. Excavación

2. Malla electrosoldada y concreto estriado rampas

3. Subbase granular debidamente compactada

4. Celosía tubular para estructura cubierta

Dmy

P

05 Abril 2023

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Máquinaria y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular.

2. Excavación

3. Malla electrosoldada.

4. Concreto estriado rampas

5. Celosía tubular para peldaeoativo → estructura.

Cubierta (corte y soldadura)

DM

Estado del clima

Soleado

Pardo, Nuboso

Soldadores (3)

10 Abril 2023.

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra. (4)

Máquinaria y Equipo.

Herramienta menor.

Actividades de obra.

1. Subbase granular.

2. Malla electrosoldada.

3. Concreto estriado rampas.

4. Celosía tubular para estructura cubierta (corte y soldadura)

DM

Estado del clima

Soleado

Soldadores (3)

Compactador Equipo Soldadura

11 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra

Soldadores (3)

Materiales y Equipo

Herramienta menor

Materiales Computador Equipo Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular.

2. Malla electrosoldada y Placa base en concreto.

3. Corte, figuración y amarrado de acero para Bordinillo

4. Celosía tubular para estructura cubierta

polideportivo (corte y soldadura)

DM

12 Abril 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (3)

Materiales y Equipo

Herramienta menor

Demolidor Equipo Soldadura

Actividades de obra:

1. Demolicion andén y Sardinell entrada
polideportivo2. Celosía tubular para cubierta polideportivo
(corte y soldadura)

DM

N

13 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Truque lluviosa

Residente de interventoria

Muestrero de obra

Oficial de obra

Soldadores (3)

Ayudantes de obra (4)

Materiales y Equipo

Herramienta menor demolidor Manual Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Demolicion andén y Sardinell entinda

2. Celosia tubular para estructura cubierta del polideportivo

3. Retiro de sobrantes

4. Subbase granular

Dmy

14 Abril 2023

Estado del clima

Personal en obra

Soleado

Residente de obra

Residente de interventoria

Soldadores (3)

Muestrero de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Materiales y Equipo

Herramienta menor Demolidor Compactador E. Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular para polideportivo

2. Excavacion manual y demolicion andén y Sardinell

3. Corte, ligadura y amarre de acero para bodega

4. Celosia tubular para estructura de la cubierta

(corte y soldadura)

Dmy

15 Abril 2023

Estado del clima.
Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de intervención

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (3)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor Compactador

Equipo Soldadores

Actividades de obra:

1. Subbase granular debidamente compactada

2. Celosía tubular para estructura cubierta corte y soldadura

Nota: la actividad de corte y soldadura se lleva a cabo en el frente Escalera

Dmy

17 Abril 2023

Estado del clima.

Personal en obra

Nublado

Residente de obra

Tarde lluviosa

Residente de intervención

Maestro de obra

Oficial de obra

Soldadores (5)

Ayudantes de obra (4)

Materiales y Equipo:

Herramienta menor Compactador Equipo Soldadores

Actividades de obra:

1. Excavación manual

2. Subbase granular

3. Celosía tubular corte, soldadura, antir corrosivo y esmalte

Dmy

18 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (5)

Materiales y Equipo.

Herramienta menor Mezcladora E. Soldadura Compactador

Actividades de obra.

1. Excavación manual

2. Armado de acero y fundición concreto bordillo

3. Subbase granular.

4. Celosía tubular para estructura cubierta.

Dmy

f

19 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Personal en obra.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra. (4)

Soldadores (5)

Materiales y Equipo.

Herramienta menor Mezcladora E. Soldadura Compactador.

Actividades de obra.

1. Armado de acero y fundición sardinel.

2. Subbase granular debidamente compactada

3. Relleno con relleno común

4. Retiro de sobrantes.

5. Celosía tubular para estructura cubierta.

Dmy

f

20 Abril 2023

Estado del clima
soleado

Personal en obra:

Residente de obra:

Residente de interventoría:

Maestro de obra:

Oficial de obra:

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (5)

Máquina y Equipo:

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura.

Actividades de obra:

1. Montaje de acero y tendido de Breda.

2. Relleno con relleno común.

3. Subbase granular.

4. Celosía tubular estructura cubierta cerchas

D.M.

21 Abril 2023

Estado del clima
nublado con
lluvia.

Personal en obra:

Residente de obra:

Residente de interventoría:

Maestro de obra:

Oficial de obra:

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (5)

Máquina y Equipo:

Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadura

Actividades de obra:

1. Subbase granular debidamente compactada

2. Malla electrosoldada y tendido para base en concreto

3. Celosía tubular para cubierta Polideportivo (cerchas)

Corte, soldadura, anticorrosivo, Esmalte y traslado

de cerchas desde el polideportivo Escallon hacia el

Polideportivo San Luis.

D.M.

22 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (4)

Soldadores (5)

Materiales y Equipo

Herramienta man, Compactador, Moladora, Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. amarrado de acero y fundición de Berdillo

3. Retiro de solantes

4. Celosía tubular para estructura cubierta. Cerchas

(corte, soldadura, anticoncreto, esmalte y traslado de cerchas)

DM

24 Abril 2023

Estado del clima

Soleado

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudantes de obra (3)

Tarde lluviosa

Soldadores (6)

Materiales y Equipo

Herramienta man, Moladora, Compactador, Equipos Soldadura

Actividades de obra

1. Subbase granular

2. Malla electrosoldada

3. Fundición placa base en concreto

3. Celosía tubular para estructura cubierta. Cerchas

(anticorrosivo, esmalte y traslado de cerchas)

DM

25 Abril 2023

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de Interventoría

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo.

Herramienta menor, Mezcladora Compactador E. Soldadura.

Actividades de obra:

1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada y Placa base en concreto.
3. Celosía tubular para estructura cubierta: Cerchas anticorrosivo, esmalte y traslado de cerchas

Dmy

Estado del clima.

Nublado

Tarde lluviosa

Soldadores (6)

26 Abril 2023

Personal en obra.

Residente de obra.

Residente de Interventoría.

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo.

Herramienta menor, Mezcladora Compactador E. Soldadura.

Actividades de obra:

1. Subbase granular debidamente compactada
2. Malla electrosoldada y fundición concreto para placa base del parque infantil
3. Celosía tubular para estructuras de la cubierta (cerchas anticorrosivo, esmalte, traslado de cerchas)

Dmy

Estado del clima.

Nublado con lluvia.

Soldadores (6)

27 Abril 2023

Personal en obra
 Residente de obra
 Residente de interventoría
 Maestro de obra
 Ayudantes de obra (3)
 Oficial de obra

Estado del clima
 Soleado
 Tarde nublada con lluvia.

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo
 • Herramienta menor • Equipos Soldadura
 Actividades de obra

1. Traslado Secciones faltantes de Cerchas para estructura de la cubierta.
2. inicio unión entre secciones de cerchas de la estructura (soldar las 2 secciones de cada cercha)

Dmf

28 Abril 2023

Personal en obra
 Residente de obra
 Residente de interventoría
 Maestro de obra
 Oficial de obra

Estado del clima
 Nublado

Soldadores (6)

Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo

• Herramienta menor

Actividades de obra

- Maquinaria • Carpintero • Soldadores
1. Subbase granular debidamente compactada
 2. Celosía tubular para estructura de la cubierta del polideportivo (unión entre secciones de cercha).

Dmf

29 Abril 2023.

Estado del clima.

Personal en obra.

Soleado

Tarde nublada.

Residente de obra.

Residente de interventoria

Maestro de obra.

Oficial de obra.

Soldadores (6)

Ayudantes de obra. (3)

Materiales y Equipos.

Mantenimiento menor

Materiales compactados E. Solchachero

Actividades de obra.

1. Subbase debidamente compactada.

2. Malla electrosoldada y fundición placa base concreto

Secciones aledañas rotonda pargue infantil.

3. Celdas fibulas para estructura cubierta: Unión entre Secciones.

Cercas. Dmp


cal 1 del 1...

ANEXO 2.

REPORTE DE LLUVIAS



Tiempo observado en abril de 2023 en Madrid

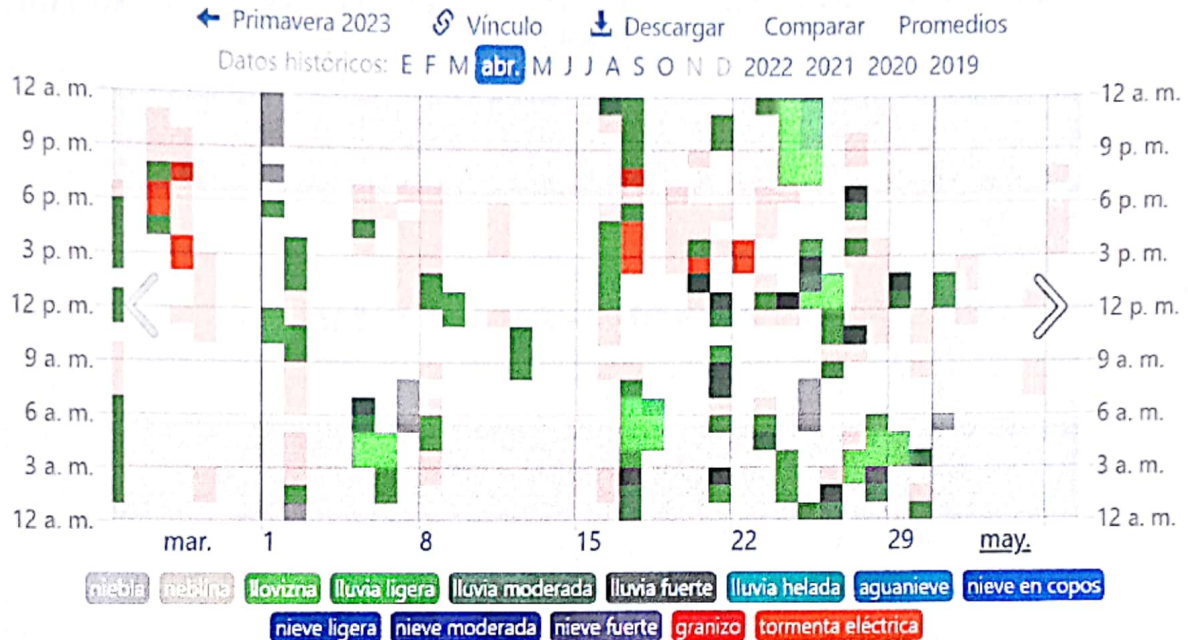

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

© [WeatherSpark.com](https://www.weatherSpark.com)

**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE**

PERIODO 01 DE ABRIL – 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS:
LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE
MADRID – CUNDINAMARCA".**

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRATO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

CONTENIDO

ALCANCE	2
OBJETIVOS	2
1. DEFINICIONES	4
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS	5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	5
3.1. Protección de la cabeza	5
3.2. Protección de los pies	5
3.3. Protección de las manos y piel.....	6
3.4. Protección de la vista	6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA	7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL	9
6. INDUCCIÓN	9
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD	9
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP.....	13
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES.....	14
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES	14
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES.....	14
6. CONCLUSIONES	16





GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID	CARGO	NOMBRE	CC
DR 1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING 1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL 1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS 1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP 1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO 1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES	AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	21/03/2023		
MAESTROS DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	21/03/2023		
Maestro	Raul Ortega Ortega	91.043.486	21/03/2023	4/04/2023	Retirado
OFICIALES DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Oficial	Jose Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	1/04/2023		
Oficial	Eduar Alberto García Cosme	1.051.737.892	21/03/2023		
Oficial	Carlos Santana Obregon	1.051.737.892	21/03/2023		
Oficial	Dagoberto Mora Tellez	9.167.984	21/03/2023		
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	21/03/2023		

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

**GCS**

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S**NIT 900.653.937-2**

Oficial	Rugero Segundo Sotelo Vides	92.555.775	21/03/2023		
AYUDANTES DE OBRA					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ayudante	Pablo Emiro Bermón Rojas	5.414.671	21/03/2023	24/04/2023	Retirado
Ayudante	Samuel Rocha Villalba	1.002.423.265	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Jose de la Cruz Gil Macias	1.051.738.647	21/03/2023	29/04/2023	Retirado
Ayudante	Clemente Rocha Villalba	1.051.738.090	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	21/03/2023	29/04/2023	Retirado
Ayudante	Donis David Carbón Bastidas	7.572.127	21/03/2023		
Ayudante	Kevin David Rodríguez Gil	1.002.426.542	21/03/2023	30/04/2023	Retirado
Ayudante	Ricardo Rodríguez Tellez	1.002.423.643	21/03/2023		
Ayudante	Jhon Jairo Chavez Rodriguez	1.075.629.705	21/03/2023	4/04/2023	Retirado
Ayudante	Gabriel de Jesús Schmalbach Quezada	1.192.771.091	21/03/2023	4/04/2023	Retirado
SOLDADORES					
Soldador	Jorge Alberto Espejo Beleño	8.055.676	21/03/2023		
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	21/03/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	21/03/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	21/03/2023		

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2

Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	21/03/2023		
Soldador	Omar Fernando Rueda Herrera	1.102.723.680	21/03/2023		

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de abril; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Planillas de seguridad social.

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de demoledor manual
- Manejo Tronzadora
- Manejo Mezcladoras
- Manejo de sierra circular
- Manejo de pistón compactador

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Manejo manual de cargas
- Lesiones pequeñas

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA

Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574

E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



GCS

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S

NIT 900.653.937-2


- La seguridad responsabilidad de todos
- Manejo de extintores
- Uso de EPP
- Peligro mecánico
- Peligro locativo

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co



REGISTRO FOTOGRÁFICO



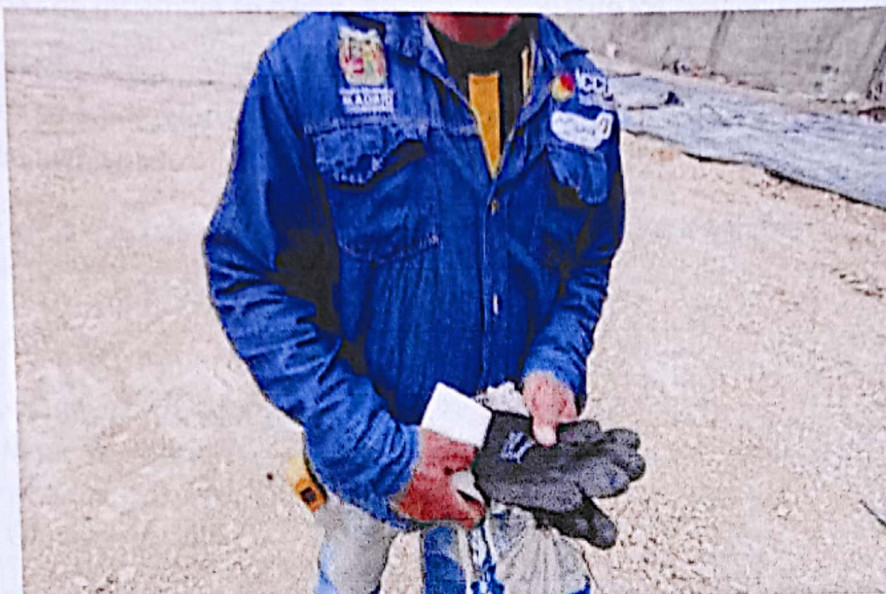

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad
- Gafas de seguridad

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Kevin Rodriguez - Ayudante
- Faber Morales - Oficial
- Rugero Sotelo - Oficial
- Eduar García - Oficial

Sierra

- Pablo Bermon - Ayudante

Mezcladora

- Pablo Bermon – Ayudante
- Donis Carbono - Ayudante
- Daniel Arias – Ayudante

Equipo de soldadura

- Jorge Espejo - Soldador
- Anderson Silva - Soldador
- Jhoan Sarmiento - Soldador
- Elkin Cortés - Soldador
- Mario Bautista - Soldador
- Omar Rueda - Soldador
- Cristian Romero - Soldador

Demoledor y tronzadora

No se emplearon.

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE DICIEMBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Derlen Fabian Becerra	0	0	0	0	0	0
Raul Ortega Ortega	0	0	0	0	0	0
Eduar Alberto García Cosme	0	0	0	0	0	0
Carlos Santana Obregon	0	0	0	0	0	0
Dagoberto Mora Tellez	0	0	0	0	0	0
Faber Augusto Morales Chica	0	0	0	0	0	0

**GCS**

Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S**NIT 900.653.937-2**

Rugero Segundo Sotelo Vides	0	0	0	0	8	8
Pablo Emiro Bermon Rojas	0	0	0	0	0	0
Samuel Rocha Villalba	0	0	0	0	0	0
Jose de la Cruz Gil Macias	0	0	0	0	0	0
Clemente Rocha Villalba	0	0	0	0	0	0
Daniel Enrique Arias Figueroa	0	0	0	0	0	0
Donis David Carbono Bastidas	0	0	0	0	0	0
Kevin David Rodriguez Gil	0	0	0	0	0	0
Ricardo Rodriguez Tellez	0	0	0	0	0	0
Jhon Jairo Chavez Rodriguez	0	0	0	0	0	0
Gabriel de Jesús Schmalbach Quezada	0	0	0	0	0	0

Trabajadores que solicitaron permiso para atender diligencias personales:

➤ Rugero Segundo Sotelo Vides


Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel: (+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.



DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPL. EJEC.	UPOS
				178	0
				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	18/05/2023	67904492	\$48 095 '100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900553937-2	GCS CONSTRUCCIONES S A S	CALLE 20A # 13 - 97 OFIC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B = menos de 200 c		SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCLURI		SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													No. Afiliados	
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
CCF033	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	46 400	0		0		0	8	500	0	46 900	1	
CCF055	EPS-S Calipuy	901543211-6	1 500	0		0		0	8	100	0	1 700	1	
EPS001	ALIANZA EPS S.A.	830113331-0	128 000	0		0		0	8	1 300	0	129 300	2	
EPS002	Salud Total EPS	800130007-4	496 000	0		0		0	8	4 100	0	500 100	10	
EPS005	Sanitas EPS	890251440-6	380 200	0		0		0	8	3 700	0	383 900	11	
EPS008	Compensar EPS	850055942-7	417 600	0		0		0	8	4 000	0	421 600	7	
EPS010	EPS Sura	800887002-2	1 800	0		0		0	8	100	0	1 700	1	
EPS012	Compañía Valle EPS	890030093-5	46 400	0		0		0	8	500	0	46 900	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1 024 000	0		0		0	8	9 800	0	1 033 800	29	
EPS020	Nueva EPS	900106204-2	1 368 900	0		0		0	8	13 000	0	1 381 900	38	
EPS024	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900004360-0	139 200	0		0		0	8	1 400	0	140 600	3	
EPS041	NUOVA EPS S.A. NOV	900156264-2	558 800	0		0		0	8	6 000	0	564 800	20	
EPS048	EPS-S Mújar Ser	860000394-7	46 400	0		0		0	8	500	0	46 900	1	
EPS051	DUSAKAWI EPS	824001358-1	92 800	0		0		0	8	900	0	93 700	2	
EPS055	Entidad Promotora de Salud Marías	837000084-5	49 600	0		0		0	8	500	0	50 100	3	
EPS057	EPS-S Mújar Ser	806001394-7	51 200	0		0		0	8	500	0	51 700	4	
EPS058	EPS-S Emissar	901021966-8	348 300	0		0		0	8	3 400	0	352 700	16	
EPS064	EPS-S Coosolid	900226716-3	1 059 900	0		0		0	8	10 200	0	1 070 200	25	
EPS062	ASVET SALUD EPS SAS	900935126-7	20 200	0		0		0	8	200	0	20 400	1	

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25222-1	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	2 940 100	0	0	0	0	8	27 800	0	2 968 900	23
25030-1	Pensioner	800224808-8	15 544 600	0	0	0	0	8	144 800	0	15 689 400	115
23102-1	Colaborador	802227340-6	1 033 300	0	0	0	0	8	9 900	0	1 043 200	8
95-16	Colaboradores	900392004-7	5 616 300	0	0	0	0	8	56 100	0	5 672 400	30

TOTAL ES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	MIT	Colización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora		Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización				Valor	Colización						
14-11	APL SURA	850003790-5	9 937 500			9 937 500	8	94 300		10 032 200		99 379	10 032 200	178	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL.EADOS
					178
					0
					TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	18-05-2023	67904492	\$48 096 100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	500533937-2	GCS CONSTRUCCIONES S A S		CALLE 26A # 13 - 87 DFC 903	7988319	gas.construcciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 €			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	
						SI

CÓDIGO		TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	3 432 100	8	33 100	3 515 200	97
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	1 281 200	8	12 200	1 293 400	44
		890200106-1	1 510 000	8	14 400	1 524 400	37

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes del ICE, LMA, IPF y Mora	Total a Pagar
Salud	19	6 237 200	6 347 500
Pensión	4	25 134 300	25 373 000
Reservas Laborales	1	9 937 900	10 032 200
CGF	3	6 273 300	6 333 000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	27	47 532 700	48 085 700

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
		SENA			
0	0	0	0	0	0
		ICBF			
0	0	0	0	0	0
		ESAP			
		MEV			

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	URS
				178	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	18/05/2023	TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04			\$48 058 100	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	500653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 25A # 13 - 97 OFIC 503	7968319	gcs.construcciones@chuluri.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICAJA	B - menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHULURI	
						SI

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD					
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7668319	gcs.construcciones@hotmail.com									EMPL-EA-003	178	0			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	18/05/2023	67904492	548 096 120				
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUJURI	SI				2023-05	2023-04								

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																	
No. Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres										CONTRIBUCIÓN															
42	CC	10425427	MIRANDA MELO JUAN DIEGO																								
41	CC	10485277	ARTEAGA AYALA EDWIN JAVIER																								
42	CC	10351251	LARA CHANDRO LUIS ALFONSO																								
43	CC	100544951	PINCHAO CARRERA DIANA ANDREA																								
44	CC	104872602	BASTIDAS DIAZ VICTOR ALFONSO																								
45	CC	103872782	VILLOTA DIAZ JHONATAN EDWIN																								
46	CC	100737780	BASTIDAS ENRIQUE JOHN ALEXANDER																								
47	CC	87461851	PANTOJA PORTILLO SEGUNDO ENRIQUE																								
48	CC	101001028	VIDAL ALVAREZ ELIANA YANILYER																								
49	CC	102075420	ARIZA ACOSTA YULIANA EDUARDO																								
50	CC	130504138	DORADO TERAN DIEGO ESTEBAN																								
51	CC	103018719	PATINO TORRES ELMER YOVANY																								
52	CC	103018719	PATINO TORRES VICTOR ALFONSO																								
53	CC	103104138	PISABO MUÑOZ JOSE MEDARDO																								
54	CC	112371710	MORALES BARRIENTO JOHAN FERNY																								
55	CC	81647237	VASQUEZ PIMENTA LUIS CARREL																								
56	CC	103555878	CARBONERO ORTIZ FACER ENRIQUE																								
57	CC	71664413	OLIVER RESTREPO DANIEL MARCO																								
58	CC	100419047	MARTINEZ PENA JACIER ALEXANDER																								
59	CC	100467504	MORALES HERNANDEZ JHON ALEXANDER																								
60	CC	2645417	GUERRERO DIAZ JOSE JOAQUIN																								
61	CC	103465458	FLORES GUEVIA LUIS ANGEL																								
62	CC	80312721	ANAYA MONGA EDWIN ANDRES																								
63	CC	100782558	ALVAREZ SANTANDER DANIELA ROCIO																								
64	CC	103442333	TELA JURADO YENNY FRANCIA																								
65	CC	103673536	DIAZ VARGAS JOSE LUIS																								
66	CC	112426256	RAMIREZ JUANA YOLY ESTEBAN																								
67	CC	114433671	RIEDEL BARRIOS ANIBAL RAFAEL																								
68	CC	12621868	ORTEGA ORTEGA SAUL																								
69	CC	81433360	HERNANDEZ FELIX ROBINSON																								
70	CC	102446291	CABALLA CHAPARRO EDNA GUILLERMO																								
71	CC	112122223	VILLACOROS SALVEDORA IVAN																								
72	CC	110271658	PEREZ LOPEZ SERGIO ANDRES																								
73	CC	110272228	MONTAÑEZ LOPEZ ALEXANDER																								
74	CC	81045878	NOVA JORGE																								
75	CC	9038877	RONCOSA CELIA JHON MANUEL																								
76	CC	101611161	RESCONDO VANGELIS ALGERMO																								
77	CC	107327218	GARCIA COCCE EUGENIO ALBERTO																								
78	CC	101511139	MORA TORRES ELIAN ANDRES																								
79	CC	100246442	RODRIGUEZ GIL FERNAN DAVID																								
80	CC	100246274	SOPHIA BACH GUILLERMO GABRIEL DE JESUS																								

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Ni	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 CFC 903	7969319	gcs.construcciones@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - Menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUQUI	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL/DOCS	URS
					17%	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	18052023	67604452	548 298 120	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCIALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES-AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
NI	900533937-2	GCS CONSTRUCCIONES S A S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7960319	gcs.construcciones@hotmail.com											EMPLADOS	178	0	TOTAL A PAGAR
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	2023-04	E	18/05/2023	67904452	\$49.586.100				
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUQUIRI	SI													

DETALLE POR COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN COTIZANTE										PENSIÓN									
No.	Tip	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Grupo	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
14	CC	91045850	DOMINGUEZ AGUILAR ROBINSON	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	91045848	CARRERO GOMEZ WILSON	1	0	5	25-14	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1123717223	HERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1123718754	NOVA JUVENIZ JOSE ANGEL	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1123718448	ARENZ ARENZ ALBERTO	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1123718712	NOVA JUVENIZ MIGUEL ANGEL	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1055651997	PRADA MILLAN DANIEL CAMILO	1	0	5	230301	1800000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	19401123	PEÑA AMADOR CARLOS JESUS	1	0	5	25-14	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	2221110	GOMEZ RIVCON WILSON	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1944813	RODRIGUEZ PORRAS JOSE BERNARDO	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1055652650	GUINTERO ZAPACON PAULA STEFANNY	1	0	5	25-14	2000000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	105565122	GUINTERO LOPEZ BUJONISER DAVAN	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	105565122	GUINTERO LOPEZ BUJONISER DAVAN	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	105565122	GUINTERO LOPEZ BUJONISER DAVAN	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1123716443	PRADA BECERRA OSCAR IVAN	1	0	5	230301	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	91545642	SANCHEZ PLATA NILSON	1	0	5	25-14	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	91545680	LUQUE DUJAN CESAR ENRIQUE	1	0	5	25-14	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	91545628	MARMOLEJO GERALDO RICARDO	1	0	5	25-14	1180000	185600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797	CHIRROS COLINA OSCAR RAMON	1	0	5	230301	773334	173300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PF	5022797																	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (04 MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	PERIODO PENSIONES			
2023-05	2023-04	E	579/4492	\$48 286 '00
				TOTAL A PAGAR
				178 0
			EMPL-EA-05	UMC

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NUMERO	NOVRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO		
NI	900653937-2	CCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFIC 903	7966319	gsc.construcciones@hotmail.co m		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOVRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - mensual de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		
							SI

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
						1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2023.04	2023.04		1	15/04/2023	67817345	\$348.350	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759460	JAGA_81_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I = Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS05	Santas EPS	80025140-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
42.11	ARL SURA	89003790-5	6,300				6,300	0	0	6,300			63	6,300	1

TOTALES CAJAS

Cedulas CCF		TOTALES CAJAS					
Nombre		HIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		IMEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipó Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150 300	150 300
Pension	1	192 300	192 300
Riesgos Latencia es	1	6 300	6 300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348 300	348 300

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
CC	112001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	2023-04	2023-04
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
						FECHA PAGO PLANILLA	5/8/2023
						TIPO PLANILLA	I
						FECHA PAGO PLANILLA	15/06/2023
						EMPLEADOS	1
						IMPORTE	0
						TOTAL A PAGAR	\$348.750

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	CC	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Carácter	Estado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado					
1	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
2	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
3	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
4	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
5	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
6	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
7	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
8	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
9	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
10	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
11	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
12	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
13	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
14	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
15	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
16	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
17	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
18	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
19	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
20	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
21	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
22	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
23	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
24	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
25	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
26	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
27	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
28	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
29	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
30	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
31	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
32	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
33	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
34	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
35	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
36	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
37	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
38	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
39	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
40	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
41	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
42	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
43	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
44	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
45	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
46	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
47	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
48	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
49	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
50	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
51	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
52	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
53	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
54	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
55	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
56	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
57	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
58	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
59	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
60	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
61	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
62	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
63	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
64	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
65	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
66	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
67	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
68	CC	112001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	BO	0																																		
69	CC	112001358																																					

PAAGAD

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	9009.0439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES S.A.S	CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electric@construcciones@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI
					SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD
	(DIAMES/AÑO)			
				EMPREGADA
				3
				0
				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	10/05/2023	\$ 077.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

[illegible]**TOTALES PENSIÓN**[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-11	ARL SURA	890903780-5	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	3

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	MIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF-40	Comercial Santander	890201576-7	139.200	0	0	139.200	3

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAMORALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, L.M.A., IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139,200	139,200
Pensión	3	556,400	556,400
Riesgos Laborales	1	242,400	242,400
CCF	1	139,200	139,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1,077,600	1,077,600

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					3
TOTAL A PAGAR					\$1.077.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
Ni	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5-08	3132857941	electricconstrucciones@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					SI

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
No	Tip	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Estado	Religión	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero
1	CC	1102047987	QUINTERO GUALDRON OSCAR GIOVANY	1	0	0	0	0	0
2	CC	110272325	CARRERO ACEVEDO FABIAN ANDRES	1	0	0	0	0	0
3	CC	91043003	ACEVEDO FERRERA CARLOS JULIO	1	0	0	0	0	0

INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
INFORMACIÓN NOVEDADES									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1102721349		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CDA 48 AT41-59	BOGOTÁ D.C -BOGOTÁ D.C	7152055	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-04	2023-04	2073538136	9450795369	2023/05/11	2023/05/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$348,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Secundario PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			
Ciudad: BOGOTÁ D.C Digno: BOGOTÁ D.C (1 Afiliados)																													
1	CC 1102721349	LOPEZ LEONEL	210521	30	\$1,200,000	\$192,000	EP9237	30	\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$150,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C	7352055	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2073539136	9450795369	1	2023/05/11	2023/05/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$348,300
RESUMEN DE PAGO									
NIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA EPS		EPS037	900,156,264	2	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL					1	\$348,300	\$0	\$0	\$348,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900702893	8	CONTECOR S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	7024783	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2093145494		9452711657	2023/05/09	2023/05/09	BANCO DE OCCIDENTE		\$284.500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2023-04	2023-05	2093145494	9452711657	E		2023/05/09	2023/05/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO				PENSION						SALUD						CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBCF	Aporte				
Suscriptor: CONTECOR (1 Afiliados)						\$185,600				\$1,160,000	\$46,400				\$1,160,000	\$46,400						\$1,160,000	\$6,100					
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Milliardos)						\$185,600				\$1,160,000	\$46,400				\$1,160,000	\$46,400						\$1,160,000	\$6,100					
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$185,600				\$1,160,000	\$46,400				\$1,160,000	\$46,400						\$1,160,000	\$6,100					
1	CC	1023774692	230301	30		\$1,160,000				\$185,600	\$46,400	EP9005	30		\$1,160,000				14-11	30		\$1,160,000	\$6,100					
Total Afiliados (1)						\$185,600				\$1,160,000	\$46,400				\$1,160,000	\$46,400						\$1,160,000	\$6,100					



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		CONTECOR		Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		7024783		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora	
Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
2023-24		2023-25		9452711657		E		2023/05/09		2023/05/09		BANCO DE OCCIDENTE	
RESUMEN DE PAGO													
RESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230301		800,224,808		B		1		\$185,600		\$0	
PORVENIR								1		\$185,600		\$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		890,903,790		5		1		\$6,100		\$0	
ARL SURA								1		\$6,100		\$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF24		860,066,942		7		1		\$46,400		\$0	
COMPENSAR								1		\$46,400		\$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS005		800,251,440		6		1		\$46,400		\$0	
SANTAS								1		\$46,400		\$0	
TOTAL								1		\$284,500		\$0	

Se certifica que en la fecha 2023-05-05 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-901043519		INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
26369879	E	2023-05-05	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30
