



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O
SERVICIOS CONTRATADOS PARA PAGO**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN:	24/03/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JAIME ALONSO RODRIGUEZ SALDARRIAGA

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE: 20 de septiembre de 2023 HASTA: 20 de octubre de 2023 FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE: N° DS 592

FECHA DE RECEPCIÓN Y/O EVALUACIÓN	CONTRATO O SOLICITUD		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (CALIFICACIÓN)		
	CI- CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Cumplimiento del Objeto del Contrato	Calidad del Bien o Servicio	Cumplimiento de Aspectos Contractuales
	N° 0001		SATISFACTORIO (90-100 puntos): El contrato se ejecutó de manera superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): El contrato presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió el contrato. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): La calidad del bien o servicio es superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad, antes del tiempo estipulado. MODERADO (50-89 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad en tiempos posteriores a lo estipulado. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): No cumple oportunamente con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad.
	Fecha del Contrato	15/09/2023			
	Registro Presupuestal N°	822			
	Orden de alta N°	N/A			
	Cuota N°	1			
24/10/2023	OBJETO O PRODUCTO (SERVICIO O SUMINISTROS)		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN
	Realizar la interventoría, técnica, contractual, jurídica, administrativa, legal, económica, ambiental y financiera, a los contratos de obra cuyo objetos son "Realizar las actividades y obras complementarias para el proceso de apertura de la etapa dos (2) de la celda 3 del relleno sanitario del municipio de El Carmen de		100	100	100
OBSERVACIONES					



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CONTRATADOS**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría N° 0001-2020" y "Realizar las obras de mitigación y clausura parcial de las celdas 1 y 2 de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría N° 0001-2020 teniendo en cuenta la minimización de los impactos adversos a la comunidad aledaña y al medio ambiente".

Se deja constancia de la forma como se han recibido los productos o se han prestado los servicios durante el período mencionado, en cumplimiento de la orden, solicitud o contrato.
Se anexan los informes o registros solicitados al contratista requeridos para el pago.

SUPERVISOR: NOMBRE: Diego Alejandro Cuervo Garcia

CARGO: Coordinador de Aseo

FIRMA: Diego A Cuervo

REVISÓ: NOMBRE: Jose Antonio Osorio Sanchez

CARGO: DIRECTOR DE ÁREA OPERATIVA

FIRMA: Jose Antonio Osorio Sanchez

V.B. GERENCIA _____



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CONTRATADOS

CÓDIGO

GRF-FR-10

VERSIÓN

13

FECHA
EDICIÓN

24/03/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

1

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	PRORROGAS	PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato, Corresponde a la descrita en el Acta de Inicio o fecha de suscripción del contrato en caso de no tener acta de inicio.</i>	<i>Fecha pactada para la terminación del contrato.</i>	<i>Si el contrato sufre prórrogas, indique el plazo de ellas. Si existen varias prórrogas indique la suma de estas, es decir el Plazo total prorrogado.</i>	<i>Fecha real de terminación del contrato. De tener prórrogas la fecha se determina con el Plazo inicial + las Prórrogas.</i>
20 de septiembre de 2023	20 de diciembre de 2023	_____	20 de diciembre de 2023

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$ 46.693.517).

(En letras y números)

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$ 46.693.517).

(En letras y números)

4. OTROSÍ (PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)

ADICIONES: (Se da en dinero, de presentarse se debe especificar el valor de la Adición en dinero)

Adición 1:

PRÓRROGAS: (Se da en tiempo, de presentarse se debe especificar el plazo a adicionar.)

Prórroga 1: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

MODIFICACIONES: (Se da para realizar ajustes a las cláusulas y/o características del contrato, de presentarse se debe dar una descripción breve de la modificación.)

Modificación 1:

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

INFORME DE INTERVENTORIA No.1 CI No. 0001-2023

A continuación se presenta el Informe Mensual de Interventoría No.01, en lo concerniente a la parte técnica, administrativa, aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo, en desarrollo del servicio de Interventoría para *"Realizar las actividades y obras complementarias para el proceso de apertura de la etapa dos (2) de la celda 3 del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría No. 0001-2020"* y *"Realizar las obras de mitigación y clausura parcial de las celdas 1 y 2 de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría No. 0001-2020 teniendo en cuenta la minimización de los impactos adversos a la comunidad aledaña y al medio ambiente"*.



Clausura parcial Celda 1 y 2.

Durante el período de tiempo comprendido se adelantaron actividades de trazado, localización y replanteo con una comisión de topografía durante 2 días.



Se realizó el perfilamiento y compactación de taludes y estos se da por terminado de acuerdo con los lineamientos definidos por diseñador.

El Contratista dispuso en obra la totalidad de la geomembrana en polietileno de alta densidad calibre 20 mils, requeridos para la construcción de cunetas flexibles. Pendiente del suministro en obra de la tubería perforada para la construcción de los drenes.

**AVANCE DE OBRA
CLAUSURA CELDAS 1 Y 2**

	1000- LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	1001- CLASIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE LIMO	1002- REPALEO Y CARGUE DE LIMO INCLUIDO MAQUINARIA	2001- CONSTRUCCIÓN DE META EN GEOMETRÍA POLIÉTFILÉN	2002- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJOS SUBHORIZONTALES	3001- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA MACANA	CONTRATO BIOEXPLORACIÓN No.005
Avance	0.4%	0.0%	0%	1%	0%		2%
Por ejecutar	2%	32%	20%	8.1%	30%		98%
Valor Total	\$ 5,266,259	\$ 84,091,59	\$ 54,263,88	\$ 24,672,91	\$ 80,655,29	\$ 16,417,88	\$ 265,307,7
Ejecutado	\$ 1,053,252	\$ -	\$ -	\$ 3,168,000	\$ -	\$ -	\$ 4,221,252

Actas de vecindad Desde interventoría se hace acompañamiento para la realización de actas de vecindad, donde se pudieron evidenciar alrededor de 7 predios, entre ellos un colegio y un lote donde no se encontraban viviendas. Se hace su respectiva visita, se revisan las viviendas y se toma fotografía de cada detalle.

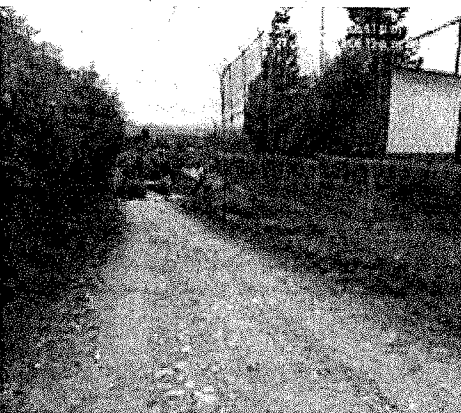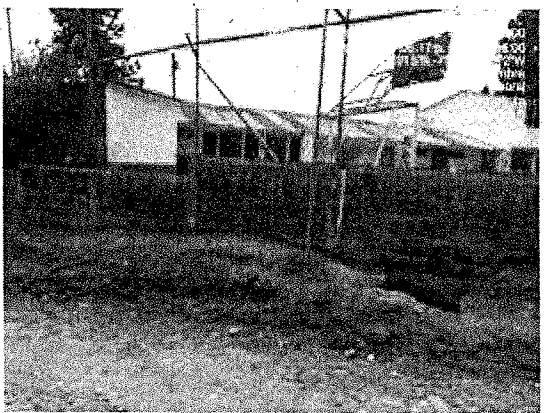



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CONTRATADOS**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

NOTA: Este informe de ser consultado en la carpeta del Contrato de Interventoría CI N° 0001-2023

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (A)	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME (B)	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (C)	SALDO POR CANCELAR (D)
<i>Valor total del Contrato De presentarse el caso Incluir la adición</i>	<i>Valor que se paga en este periodo</i>	<i>Valor de las cuotas canceladas al contratista, sin tener en cuenta la presente.</i>	A-C-B
\$ 46.693.517	\$ 15.564.506	\$0.00	\$ 31.129.011

7. DETALLE DE RECURSOS A PAGAR

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ADMINISTRATIVO	OTROS (DISCRIMINAR)
<i>Valor total que se paga con fondos de acueducto</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de alcantarillado</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de aseo</i>	<i>Valor total que se paga con fondos administrativos</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de</i>
\$0.00	\$0.00	\$ 15.564.506	\$0.00	\$0.00

8. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Diligenciar si el contratista adjunta planilla			
OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO EVALUADO <i>(debe coincidir con los meses que se están revisando)</i>		
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N° DE PLANILLA O REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE PAGO	PERIODO
	65788623, 66493114	18/09/2023, 23/10/2023	Septiembre, octubre

Diligenciar si el contratista adjunta certificado
FECHA DE CERTIFICACIÓN N/A La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, Solicitud de Servicios y Obras y convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o elementos adquiridos fueron entregados por parte del contratista en medio



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CONTRATADOS**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y/o cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales reposan en el expediente contractual.

OBSERVACIÓN: Deberá anexar junto con este formato los demás documentos según corresponda en el anexo del proceso de tesorería: Relación de documentos para pagos en tesorería.

Por lo anterior se firma el martes, 24 de octubre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Diego Alejandro Cuervo García

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinador de Aseo

FIRMA DEL SUPERVISOR: *Diego A Cuervo*

El Carmen de Viboral, 20 de octubre de 2023.

CUENTA DE COBRO No. 1

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CARMEN DE VIBORAL -LA CIMARRONA ESP- debe a JAIME ALONSO RORIGUEZ SALDARRIAGA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71600569, La suma de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS (\$15.564.506)**, correspondiente a una tercera parte del total del contrato, por concepto de los servicios prestados con ocasión del Contrato No. 0001-2023, que tiene por objeto: *“Realizar las actividades y obras complementarias para el proceso de apertura de la etapa dos (2) de la celda 3 del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría No. 0001-2020” y “Realizar las obras de mitigación y clausura parcial de las celdas 1 y 2 de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría No. 0001-2020 teniendo en cuenta la minimización de los impactos adversos a la comunidad aledaña y al medio ambiente”.*

Nota: Favor consignar en la **cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 00900816090** a nombre de JAIME ALONSO RODRIGUEZ SALDARRIAGA.

Cordialmente,



JAIME A. RODRIGUEZ S.
INTERVENTORIA
CONTRATO No. 0001-2023

Medellín, 18 de septiembre de 2023

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de SuAporte.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: JAIME A RODRIGUEZ S

Documento de Identidad: CC 71600569

Usuario: JAIME RODRIGUEZ

Teléfono: 3002493

Número de Planilla: 65788623

Fecha de Recepción: 18 de septiembre de 2023

Periodo de Cotización: 2023-09

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS010 - EPS SURA

Número de empleados: 1

Valor: \$337.300

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA

Número de empleados: 1

Valor: \$65.800

Total Pagado: \$403.100

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77, servicioalcliente@enlace.com.co

Cordialmente,

SERVICIO AL CLIENTE



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-23, 12:23:19 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

65788623

Periodo Cotización:

septiembre de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 18/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME A RODRIGUEZ S	Dirección	CIRCULAR 75 #39 - 24 AP1202 ORIONPLAZA
Documento	CC71600569	Teléfono	3002493
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apeñidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RE	RET	TALE	TAD	TAP	USP	CDR	VST	SE	SA	VA	AV	VCT	IRP	DIR AF	DIR EP	DIR AFP	DIR COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71600569	JAIME ALONSO RODRIGUEZ SALDARRIAGA	59	02	X														0	0	13	0		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.697.848	\$ 337.300	2.436	\$ 2.697.848	\$ 65.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacitados, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 2.697.848	\$ 2.697.848	\$ 0	\$ 0	\$ 337.300	\$ 65.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.100	\$ 0	\$ 403.100





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-23, 07:18:36 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	JAIME A RODRIGUEZ S
CEPULA CIUDADANIA	CC 71600569
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66493114
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	235022814
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 967.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 778.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 151.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 37.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 967.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 967.400



LA CIMARRONA ESP

**INFORME DE INTERVENTORIA No.001
CONTRATO No. 001-2023**

**PERÍODO DE AVANCE SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 20
2023**

**CONTRATO DE OBRAS No. 0005
CLAUSURA PARCIAL DE LA CELDAS 1 y 2 SEGUNDA ETAPA
CONTRATISTA BIOEXPLORA SAS**

EL CARMEN DE VIBORAL

2023

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral cuenta con tres celdas de disposición final de residuos sólidos de las cuales, la celda 3 está destinada para el proceso de disposición final de residuos y las celdas 1 y 2 se les va a realizar el proceso de clausura parcial acorde a los recursos existentes por parte de la E.S.P.

A continuación se presenta el Informe Mensual de Interventoría No.01, en el cual se describen las actividades realizadas durante el período comprendido entre los días 20 de septiembre al 20 de octubre de 2023, en lo concerniente a la parte técnica, administrativa, aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo, en desarrollo del servicio de Interventoría para *“Realizar las obras de mitigación y clausura parcial de las celdas 1 y 2 de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral, acorde a los estudios y diseños realizados a través del Contrato de Consultoría No. 0001-2020 teniendo en cuenta la minimización de los impactos adversos a la comunidad aledaña y al medio ambiente”*.

2. LOCALIZACIÓN

El relleno sanitario del municipio de El Carmen de Viboral se encuentra ubicado en la vereda de Alto Grande a una distancia de 3.2 kilómetros desde la zona urbana del municipio.



Clausura parcial Celda 1 y 2

Imagen tomada de Google earth

El presente informe tiene como finalidad proporcionar una revisión detallada de las actividades que tuvieron lugar durante el mes de septiembre y parte de octubre de 2023.

A lo largo de este informe, se abordarán temas como los aspectos sociales, bióticos y físicos que se han venido presentado durante las actividades realizadas durante este primer mes.

3. SEGUIMIENTO AL CONTRATOS DE OBRA No. 0005

3.1. ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS

3.1.1. Clausura parcial Celda 1 y 2.

Durante el período de tiempo comprendido se adelantaron actividades de trazado, localización y replanteo con una comisión de topografía durante 2 días.

Se realizó el perfilamiento y compactación de taludes y estos se da por terminado de acuerdo con los lineamientos definidos por diseñador.

El Contratista dispuso en obra la totalidad de la geomembrana en polietileno de alta densidad calibre 20 mils, requeridos para la construcción de cunetas flexibles. Pendiente del suministro en obra de la tubería perforada para la construcción de los drenes.









3.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS

3.2.1. Aspecto social.

3.2.1.1. Actas de vecindad

Desde interventoría se hace acompañamiento para la realización de actas de vecindad, donde se pudieron evidenciar alrededor de 7 predios, entre ellos un colegio y un lote donde no se



encontraban viviendas. Se hace su respectiva visita, se revisan las viviendas y se toma fotografía de cada detalle.

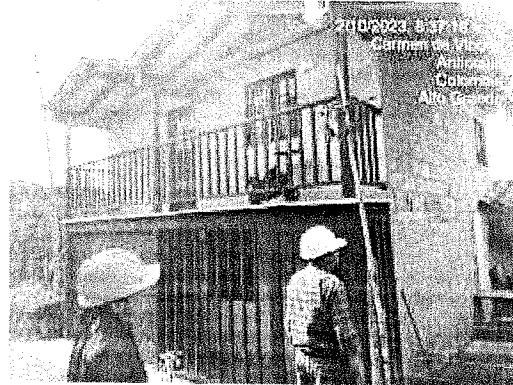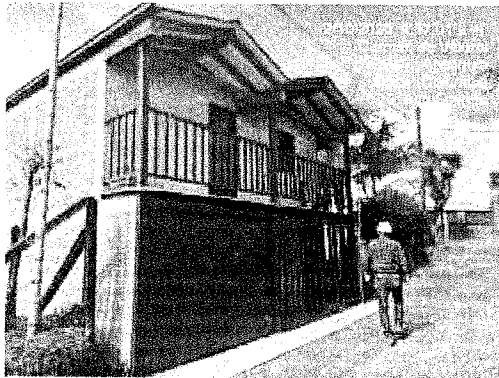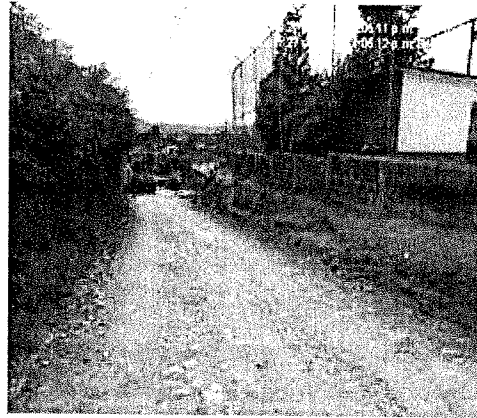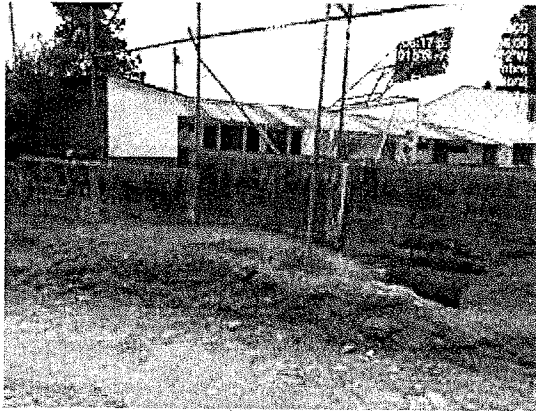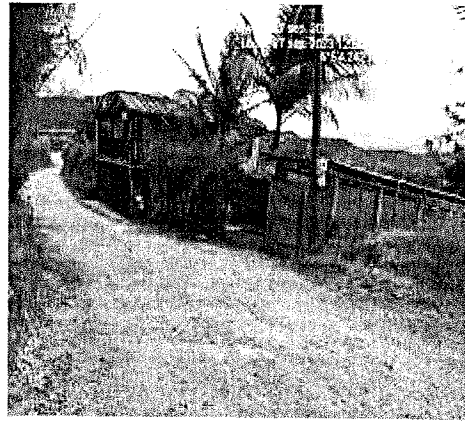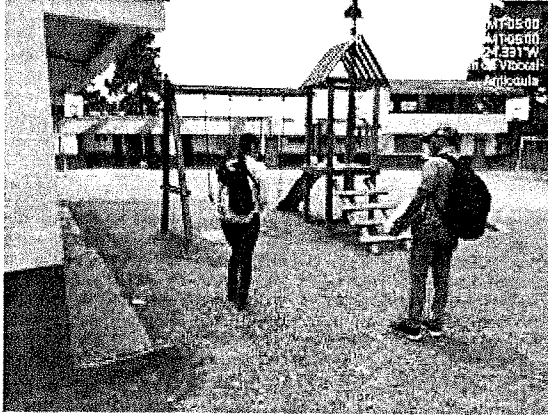

3.2.1.2. Acta de entorno



También se realiza acompañamiento al Contratista para la realización de acta de entorno, con el fin de verificar el estado del carreteable en material granular, las luminarias y cables trenzados de

energía que atraviesan el corredor, el estado de cunetas y alcantarillas, y se deja el registro fotográfico.

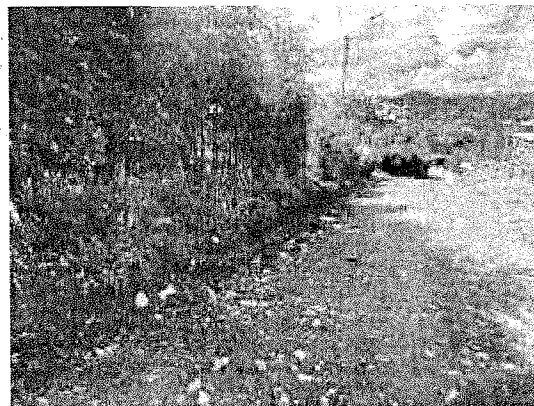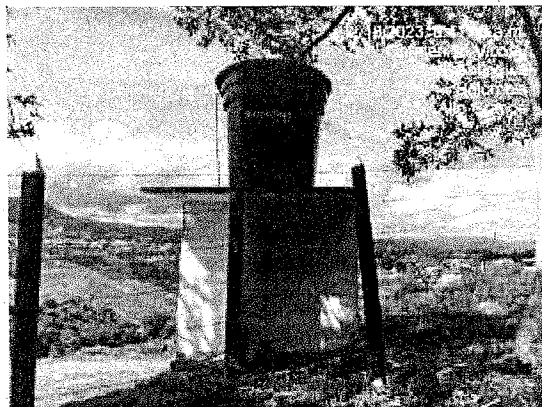



3.2.1.3. Aspecto Biótico



Las aves necrófagas han aumentado en un 10% debido al movimiento de residuos solidos el último mes. No se han presentado novedades extraordinarias.

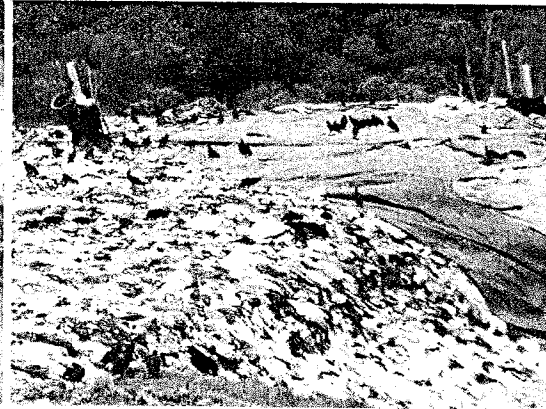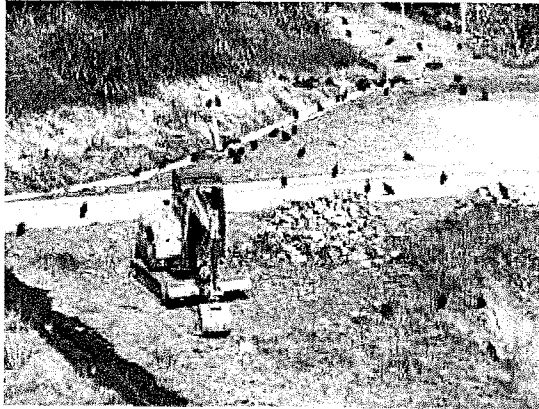





3.2.1.4. Aspecto Físico

El contratista instala de manera provisional el campamento donde tendrá oficina, vestier y cuarto para las herramientas. El Contratista utilizará los mismos servicios sanitarios dispuestos en las oficinas de La Cimarrona en el mismo relleno sanitario.

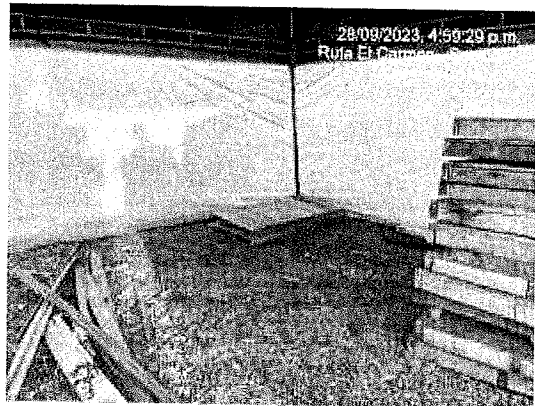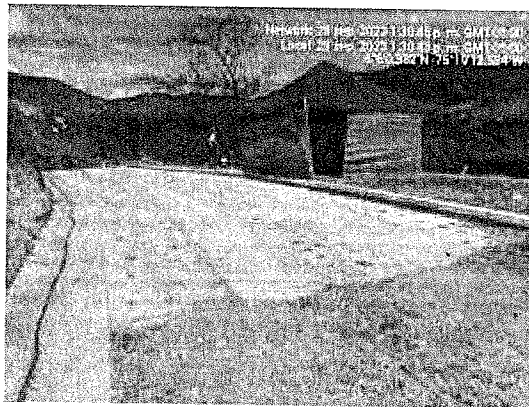

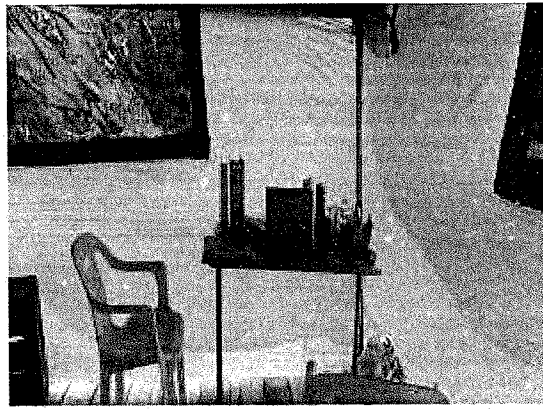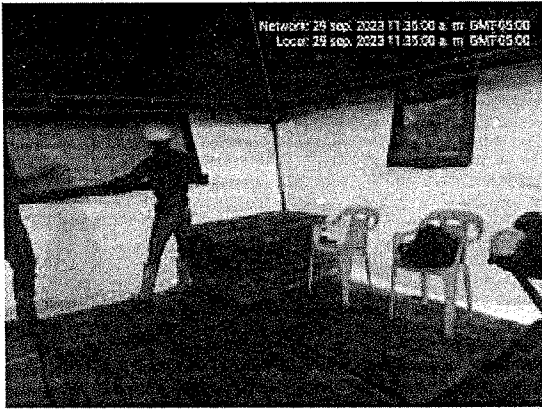



Adecuan lugar para almacenar el combustible de la retroexcavadora LOVOL60E.

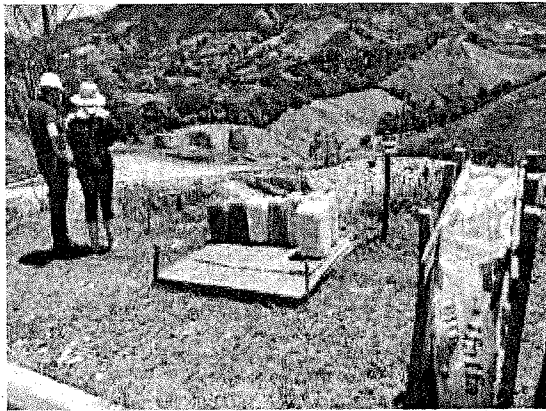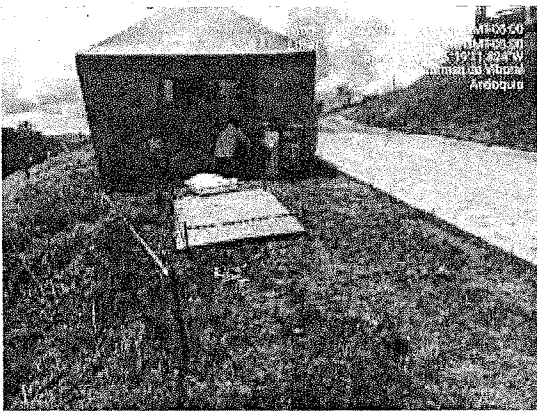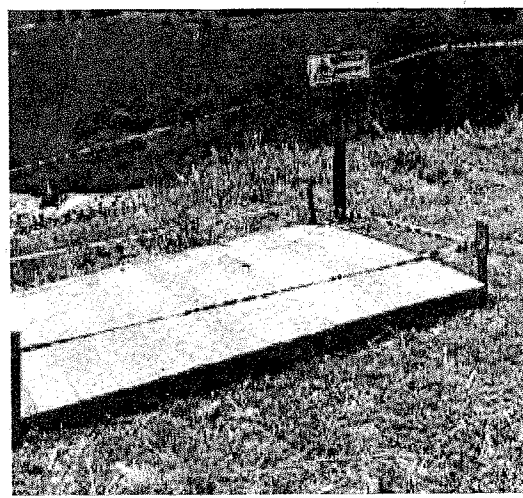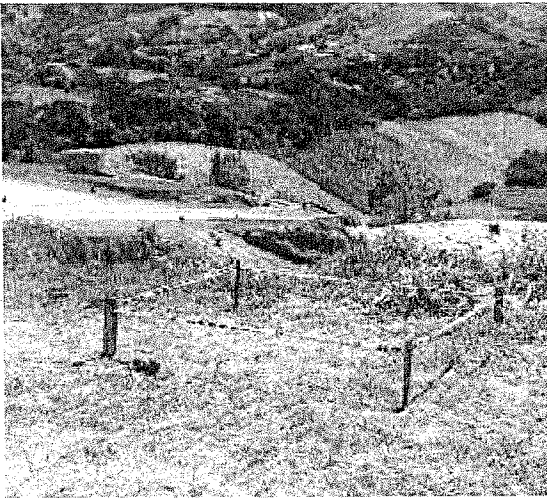




Lugar donde la maquinaria amarilla hace uso del combustible.



Hacen una adecuada señalización y traen todos los elementos para prestar los primeros auxilios en algún evento.

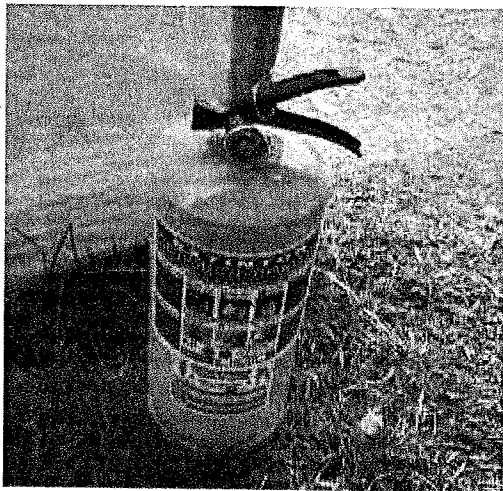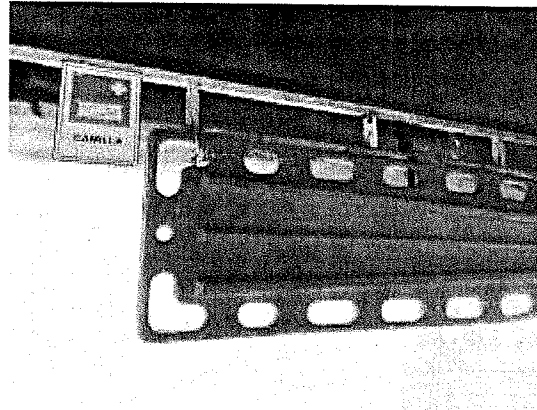

Se cuenta con maquinaria amarilla, al estar cerca de esta se usa protección auditiva, de igual manera los operarios de cada maquina usa su debida protección dentro de está.

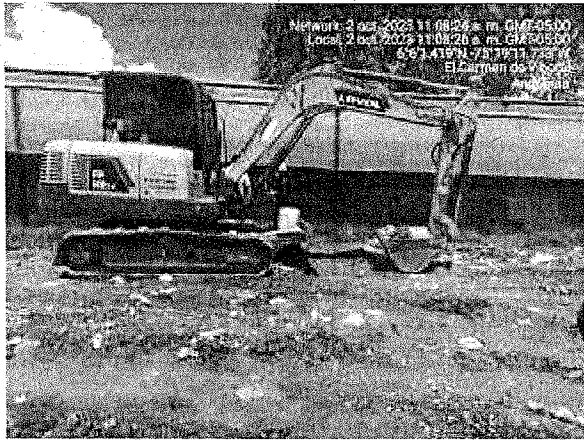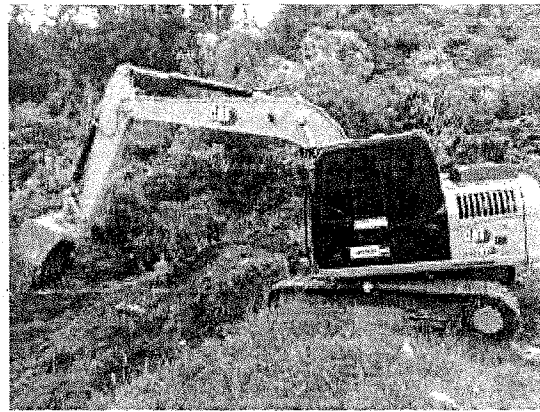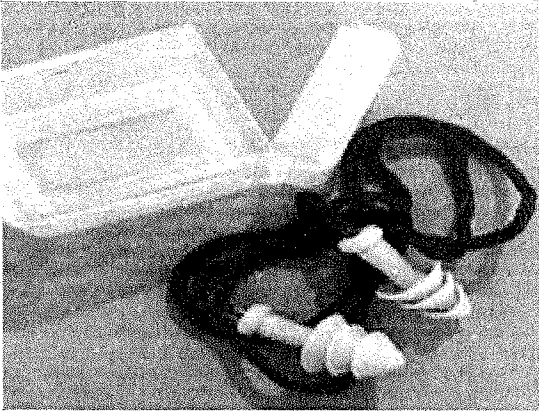

Cordialmente,

Jaime R.

JAIME A. RODRIGUEZ S.
INTERVENTORIA

LA CIMARRONA E.S.P

Usuario Ordenó
KGIRALDO

NIT 811011532-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1206

Fecha/Estado

Comprobante: 5 : COMPROBANTE DE CAUSACION DE GASTOS

25/10/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: 739

PAGADO A: RODRIGUEZ SALDARRIAGA JAIME ALONSO ,Id: 71600569

DESCRIPCIÓN: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, CONTRACTUAL, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETOS SON "REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE APERTURA DE LA ETAPA DOS (2) DE LA CELDA 3 DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ACORDE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0001-2020" Y "REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y CLAUSURA PARCIAL DE LAS CELDAS 1 Y 2

Doc. Ref. : 822

Vir Bruto: 15,564,506.00 Vir Deducc.: 2,474,756.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,089,750.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva, CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
739	822	201	04	2.3.2.02.02.005.02.04.01:	CLAUSURA Y POST CLAUSURA VIGENCIA ACTUAL	\$15,564,506.00
TOTAL:						\$15,564,506.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$15,564,506	\$155,645	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIC	0.2	\$15,564,506	\$31,129
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	3	\$15,564,506	\$466,935	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RUR	0.2	\$15,564,506	\$31,129
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$15,564,506	\$389,113	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$15,564,506	\$311,290
ICA CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION	1	\$15,564,506	\$155,645	CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGEN	6	\$15,564,506	\$933,870
TOTAL Deducibles:			\$2,474,756.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Katherine Giraldo Arbelaez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA

BENEFICIARIO

Aura María Gómez González

AURA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Yoliana Idarraga Arboleda

YOLIANA IDARRAGA ARBOLEDA

CONTADORA

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"

LA CIMARRONA E.S.P

NIT 811011532-6

Usuario Pago:
KGIRALDO
1206

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01203

Fecha de Pago: 26-10-2023

Estado: PAGADO

PAGADO A:

RODRIGUEZ SALDARRIAGA JAIME ALONSO ,Id: 71600569

DESCRIPCIÓN:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, CONTRACTUAL, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETOS SON "REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE APERTURA DE LA ETAPA DOS (2) DE LA CELDA 3 DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ACORDE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0001-2020" Y "REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y CLAUSURA PARCIAL DE LAS CELDAS 1 Y 2

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 822

PGNOR

Vir Bruto: 15,564,506.00 Vir Deducc.: 2,474,756.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,089,750.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55663258272	2023102620	RODRIGUEZ SALDARRIAGA JAIME ALI	\$13,089,750.00
Total:				\$13,089,750.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$15,564,506	\$155,645	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$15,564,506	\$31,129
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$15,564,506	\$466,935	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$15,564,506	\$31,129
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$15,564,506	\$389,113	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$15,564,506	\$311,290
ICA CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION	1	\$15,564,506	\$155,645	CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA	6	\$15,564,506	\$933,870
TOTAL Deducibles:			\$2,474,756.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Katerine Giraldo Arbelaez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA

Leonardo de Jesús Aristizabal Zuluaga

GERENTE

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 811011532
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2023102619
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 55663258272

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 10:43:50
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 26-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-10-2023

Impreso por: Leonardo23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,089,750.00	Valor Registros Procesados: \$13,089,750.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00900816090	Ahorros	71600569	JAIME ALONSO RODRI	13,089,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-10-2023

LA CIMARRONA E.S.P

NIT 811011532-6
Carrera 30 29 90 P 2
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
PBX: 5432127
Email: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DS 592

Fecha Generación: 2023-10-27 11:45:00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DOCUMENTO SOPORTE No. 18764053510381
FECHA INICIAL: 2023/08/10 FECHA FINAL: 2024/08/10 PREFIJO: DS DEL No. 188 AL 1000

Página 1 de 1

Proveedor: JAIME ALONSO RODRIGUEZ SALDARIAGA
Dirección: CL 22 A 27 A A 69
Ciudad: LA CEJA - ANTIOQUIA
Email: jaimerodriguez06@gmail.com

NIT: 71600569-1
Teléfono: 3218123166
Moneda: COP

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, CONTRACTUAL, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETOS SON "REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE APERTURA DE LA ETAPA DOS (2) DE LA CELDA 3 DEL RELLENO SANITARIO.	1,00	15.564.506,00	0,00	15.564.506,00

TOTAL ÍTEMS: 1

CUENTA DE COBRO N° 01 PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023.

Sub Total COP	15.564.506,00
Base Gravable	0,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
ReteFuente	933.870,36
ReteIVA	0,00
ReteICA	0,00
Total a Pagar COP	14.630.635,64

Código Único de Documento Soporte

(CUDS):4b7dca4fb88090ff9a579a2b1fa4d39a34b676f7d30b1df96ebe86da3ab2060e77426394bb0479fc7bce46ec2481463f

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación
