

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código:
			Versión:
			Página: 1 de 19

FECHA DE ELABORACIÓN	30/OCTUBRE/2023	INFORME No.	07
TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO DE OBRA No.	2223-2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	0176-2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2023	FECHA ACTA DE INICIO	24/02/2023
OBJETO	“EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL BUENOS AIRES 2023	NIT. No.	901.612.242-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO MARÍN MORALES	C.C. No.	5´577.128
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	NIT. No.	901.666.013-2
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	C.C. No.	80´037.941
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
VALOR	INICIAL		\$ 2.320´220.350,0
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
		N/A	N/A
	MODIFICATORIO No. 01		N/A
PLAZO	INICIAL		TRECE (13) MESES
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO
		N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA DE SUSPENSION
		N/A	N/A
			FECHA DE REANUDACIÓN

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código:
		Versión:
		Página: 2 de 19

PÓLIZAS CONTRATO INICIAL				
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL No. 3872 DE 2022				
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 28 de diciembre de 2022. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3872 de 2022.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	23-12-2022	23-05-2024	\$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		23-12-2022	23-01-2029	\$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		23-12-2022	23-01-2027	\$ 116´011.018,00
PÓLIZAS OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0176-2023				
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 16 de enero de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	10-01-2023	10-06-2024	\$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		10-02-2024	10-02-2029	\$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		10-01-2023	10-02-2027	\$ 116´011.018,00
Nota: El contrato suscrito se perfeccionó con la firma electrónica de la parte contratante el día 10 de enero de 2023, pero el clausulado complementario contenía el número 3872-2022 que correspondía a la vigencia pasada (2022), por tal motivo se hace necesario aclarar que, para todos los efectos, el número de contrato asignado corresponde al 0176-2023.				
PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 2 de marzo de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	24-02-2023	25-07-2024	\$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		26-03-2024	27-03-2029	\$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		24-02-2023	27-03-2027	\$ 116´011.018,00

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código:

Versión:

Página: 3 de 19

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	FECHA	VALOR	VALOR EJECUTADO
	41523	22/02/2023	\$2.320'220.350	\$ 223'580.003

De conformidad con el inciso 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.

Según las labores desarrolladas por el suscrito Supervisor y los documentos y actas entregados por el apoyo a la supervisión de la Gobernación del Cauca se presenta la siguiente información:

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (Reuniones, socializaciones, comités y/o visitas realizadas)

FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
09 AGOSTO A 23 DE SEPTIEMBR E DE 2023	<p>El avance del proyecto es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - explanación de la vía desde la abscisa K14+230 al K14+600, del K15+120 al K16+610, del K16+680 al K18+570, del K19+000 al K19+200, del K19+350 al K21+520 y del K21+710 al K23+580 para una longitud ejecutada de 8,0 km de los 10.3 km programados correspondiente a un avance del 78.1% de la longitud total del proyecto - instalación de material seleccionado para la construcción de terraplenes desde la abscisa K14+230 al K14+600, del K15+120 al K16+610, del K16+680 al K18+570, del K19+000 al K19+200, del K19+350 al K21+520, del K22+130 al K23+580 para una longitud ejecutada de 7,6 km de los 10.3 km programados correspondiente a un avance del 74.0% de la longitud total del proyecto; - instalación de subbase granular desde la abscisa K15+120 al K16+200, del K19+730 al K21+520 y del K22+130 al K23+350 para una longitud ejecutada de 4,1 km de los 10.3 km programados correspondiente a un avance del 40.0% de la longitud total del proyecto; - instalación de base granular desde la abscisa K19+730 al K21+520 y del K22+200 al K23+350 para una longitud ejecutada de 2,9 km de los 10.3 km programados correspondiente a un avance del 28.8% de la longitud total del proyecto; instalación de mezcla asfáltica desde la abscisa K19+850 al K21+555 y del K22+222 al K23+333 para una longitud ejecutada de 2,8 km de los 10.3 km programados correspondiente a un avance del 27.5% de la longitud total del proyecto; - construcción de veinte (27) alcantarillas de las 	<p>Para el octavo mes de ejecución, que va hasta el 23 de octubre de 2023, se tiene un plazo transcurrido total del 66,6%, para lo cual el Contratista presenta un avance de ejecución físico-financiera acumulado del 44.64% que corresponde \$ 17.365'7 millones contra un porcentaje de obra programada acumulada del 49,53% que corresponde a un valor de \$ 19.213'5 millones, de acuerdo con el Programa de Inversiones Vigente; este avance está representado en las siguientes actividades: localización y replanteo, remoción de derrumbes, corte de taludes y explanación para la ampliación de la vía, obras de drenaje representado en construcción de alcantarillas, y subdrenes longitudinales, conformación de subrasante y de terraplenes, así como la construcción de la estructura de pavimento: capas de subbase granular, base granular así como la extensión de carpeta asfáltica, construcción de muros de contención y cunetas, además se avanza en la construcción del puente vehicular sobre quebrada grande, obras de mitigación ambientales y sociales, implementación del plan de manejo de tránsito.</p> <p>Es importante tener en cuenta que, por la situación geomorfológica de la zona, sumado a la intensa ola invernal presentada en la región, se han acelerado los procesos erosivos en el corredor</p>

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código:

Versión:

Página: 4 de 19

	<p>cincuenta y seis (56) proyectadas para un avance del 48%; construcción de 6,830.0 ml de subdrén longitudinal desde la abscisa K15+120 al K16+671, del K17+031 al K18+376, del K18+940 al K19+100, del K20+005 al K21+120 y del K22+135 al K23+455</p> <p>- construcción de muros de contención desde la abscisa K15+533 al K15+580, del K17+322 al K17+329, del K17+588 al K17+623, del K18+400 al K18+467, del K19+465 al K19+483, del K19+525 al K19+536, del K19+607 al K19+620, del K19+632 al K19+645, del K19+705 al K19+730, del K20+244 al K20+285, del K20+438 al K20+454, del K20+491 al K20+503, del K20+588 al K20+619, del K20+575 al K20+650, del K20+657 al K20+667, del K20+770 al K20+790, del K20+798 al K20+810, del K20+833 al K20+845, del K20+865 al K20+925, del K20+968 al K20+993, del K21+040 al K21+090, del K21+230 al K21+244, del K21+260 al K21+275, del K21+351 al K21+358, del K21+420 al K21+500 primer nivel, del K21+420 al K21+451 segundo nivel, del K21+830 al K21+850, del K21+885 al K21+900, del K21+897 al K21+950, del K21+957 al K22+010, del K22+095 al K22+161, del K22+161 al K22+167, del K22+167 al K22+182, del K22+398 al K22+405, del K22+445 al K22+465, del K22+528 al K22+552, del K22+884 al K22+908, del K22+942 al K22+954, del K23+105 al K23+125 y del K23+133 al K23+139.</p> <p>- Se realiza la construcción de mejoramiento de suelo de cimentación, gradas de nivelación, zapatas, muro espaldar, muros aletas del espaldar, topes sísmicos en los estribos 1 y 2, vigas y riostras del puente sobre la quebrada Grande en el K23+460 alcanzando un porcentaje de ejecución del 69%.</p>	<p>intervenido desde el K16+600 al K21+800, evidenciando situaciones particulares de inestabilidad de la banca existente y grandes movimientos en masa que deben ser atendidos en aras de velar por la estabilidad del proyecto y como medida provisional se ha evitado la intervención en estos sitios críticos, situación que ha afectado el cronograma de obra porcentaje estimado en 5.0%; de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar obras de estabilización definitivas con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y la funcionalidad de la vía así como el riesgo de perder la comunicación vial con el área de influencia del proyecto, por lo que esta interventoría presenta a continuación las obras adicionales que no están contempladas en las condiciones originales del proyecto, por lo que se radicó ante la Entidad Contratante con oficio No. C01762023-CIP-072 del 23 de octubre de los corrientes la "SOLICITUD DE ADICIÓN Y AJUSTE A L CONTRATO DE OBRA NO. 2223-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0176-2023" justificando técnicamente lo evidenciado en obra.</p>
--	--	--

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

2.2.1. RECURSOS COMPROMETIDOS

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Recursos iniciales	\$2.320 ' 220.350				\$2.320 ' 220.350
Recursos adicionales					

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código:
			Versión:
			Página: 5 de 19

Total recursos comprometidos					\$2.320 ' 220.350
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

2.2.2. MANEJO DEL ANTICIPO

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Anticipo entregado	N/A				
Anticipo amortizado	N/A				
Anticipo sin amortizar	N/A				

2.2.3. BALANCE DE PAGOS

ACTA DE PAGO No.	FECHA	VALOR ACTA / DESEMBOLSO
1	23/03/2023	\$ 108 ' 100.851
2	23/04/2023	\$ 115 ' 479.152
3	23/05/2023	\$ 103 ' 367.602
4	23/06/2023	\$ 115 ' 618.364
5	08/08/2023	\$ 192 ' 221.333
6	23/09/2023	\$ 201 ' 966.257
7	23/10/2023	\$ 141.929.664
TOTALES		\$ 978 ' 683.223
VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.320 ' 220.350,00

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código:
		Versión:
		Página: 6 de 19

3. ANEXOS Y OBSERVACIONES

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 24 de septiembre al 23 de octubre de 2023, se presentan lluvias aisladas ayudando para el avance de la obra.

Para el octavo mes de ejecución, que va hasta el 23 de octubre de 2023, se tiene un plazo transcurrido total del 66,6%, para lo cual el Contratista presenta un avance de ejecución físico-financiera acumulado del 44.64% que corresponde \$ 17.365'7 millones contra un porcentaje de obra programada acumulada del 49,53% que corresponde a un valor de \$ 19.213'5 millones, de acuerdo con el Programa de Inversiones Vigente; este avance está representado en las siguientes actividades: localización y replanteo, remoción de derrumbes, corte de taludes y explanación para la ampliación de la vía, obras de drenaje representado en construcción de alcantarillas, y subdrenes longitudinales, conformación de subrasante y de terraplenes, así como la construcción de la estructura de pavimento: capas de subbase granular, base granular así como la extensión de carpeta asfáltica, construcción de muros de contención y cunetas, además se avanza en la construcción del puente vehicular sobre quebrada grande, obras de mitigación ambientales y sociales, implementación del plan de manejo de tránsito.

Es importante tener en cuenta que, por la situación geomorfológica de la zona, sumado a la intensa ola invernal presentada en la región, se han acelerado los procesos erosivos en el corredor intervenido desde el K16+600 al K21+800, evidenciando situaciones particulares de inestabilidad de la banca existente y grandes movimientos en masa que deben ser atendidos en aras de velar por la estabilidad del proyecto y como medida provisional se ha evitado la intervención en estos sitios críticos, situación que ha afectado el cronograma de obra porcentaje estimado en 5.0%; de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar obras de estabilización definitivas con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y la funcionalidad de la vía así como el riesgo de perder la comunicación vial con el área de influencia del proyecto, por lo que esta interventoría presenta a continuación las obras adicionales que no están contempladas en las condiciones originales del proyecto, por lo que se radicó ante la Entidad Contratante con oficio No. C01762023-CIP-072 del 23 de octubre de los corrientes la "SOLICITUD DE ADICIÓN Y AJUSTE A L CONTRATO DE OBRA NO. 2223-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0176-2023" justificando técnicamente lo evidenciado en obra.

A la fecha el contratista cuenta con el suficiente equipo y logística para el desarrollo del proyecto, avanzando en varios frentes de obra, pero ante el limitado plazo establecido, esta interventoría viene requiriendo al contratista para que aumente los rendimientos en cada una de las actividades en desarrollo.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).



EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.






TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.



TERRAPLENES, MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO



SUBBASE GRANULAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADO)

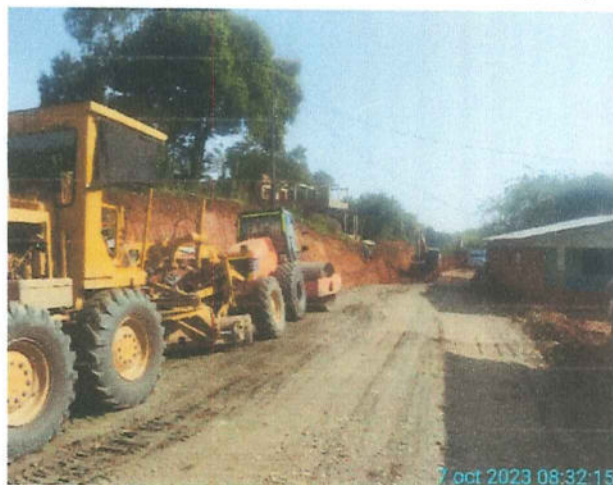

BASE GRANULAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADO)



TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR.



RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19



TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA



EXCAVACIONES VARIAS PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO.




CONCRETO CLASE C (28 MPa) (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).



CONCRETO CLASE D (21 MPA), CLASE F (14 MPA)- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



SUMINISTRO, FIGURADO ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA ALCANTARILLA

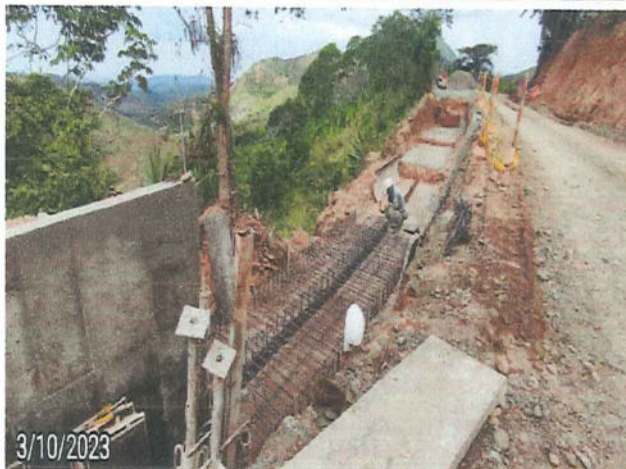

TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).



RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HEMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN).





CUNETA DE CONCRETO CLASE D (21 MPa) VACIADA IN SITU.



SUBDREN PARA VÍA CON GEOTEXTIL – MATERIAL GRANULAR – TUBERÍA REFORZADA.




ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO
Supervisor

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATO N° 0176-2023

CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA INTERVENTOR

CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - R/L RAFAEL VILLAR OSPINA

SUPERVISOR

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.

OBJETO

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$2.320.220.350 Includido el IVA (19%)

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$2.320.220.350 Includido el IVA (19%)

PLAZO TOTAL

13 MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los VEINTICINCO (25) días del mes de OCTUBRE de 2023, se reunieron los Ingenieros: ANDRÉS ARTURO MEJIA M. en su calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca y RAFAEL VILLAR OSPINA en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS, en su calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO N° 07 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL

10 DE ENERO DE 2023

PLAZO CONTRACTUAL

13 MESES

INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL

24 DE FEBRERO DE 2023

VENCIMIENTO DEL CONTRATO

24 DE MARZO DE 2024

4. VALOR CONSULTORIA CONTRATADA

VALOR CONTRATO N° 0176-2023

\$2.320.220.350,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA

\$2.320.220.350,00

5. VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

CANT	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	POR CUOTA FIJA 25% VR. CTO INTERVE. (13 CUOTAS MENSUALES)	# CUOTA.	# CUOTAS ACUMULADA
			1,0	8,0
		POR PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 60% VR. CONTRATO INTERV,	% AVANCE OBRA MES	% AVANCE OBRA ACUMULADO
			6,99%	44,66%
		PROVISION LIQUIDACIÓN 15% VR. CONTRATO INTERV,	PAGO ACTA. LIQ	PAGO ACTA. LIQ
			0,000%	0,000%

Para constancia se firma por los que intervienen.

ING. RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
Contratista de Interventoria

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DPTO DEL CAUCA
Supervisor del Contrato

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	PLAZO INICIAL	13 MESES	VR CONTRATO	\$ 2.320.220.350	CONTRATO N° 0176-2023 ACTA DE PAGO No. 7 FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023 PERIODO DE PAGO: 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023	
		INICIO	24-feb-2023				
		TERMINACIÓN	24-mar-2024				
		PLAZO TOTAL	13 MESES	VALOR TOTAL	\$ 2.320.220.350		
SUPERVISOR: ING. ANDRES ARTURO MEJIA M. CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS - REPRESENTANTE LEGAL: Ing. RAFAEL VILLAR OSPINA							
CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA							
ITEM	DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1.0	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GLOBAL	1,00	\$ 2.320.220.350	\$ 2.320.220.350		
INTERVENTORIA EJECUTADA							
FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL		PORCENTAJE	VALOR TOTAL	VALOR POR MES o POR ACTA	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
					MESES	% AVANCE OBRA	VALOR
MEDIANTE PAGOS FIJOS MENSUALES		25,0%	\$ 487.441.249,0	\$ 37.495.481,0	1,00		\$ 37.495.481,0
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA		60,0%	\$ 1.169.859.000,0			6,99%	\$ 81.773.144,0
AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACION		15,0%	\$ 292.464.751,0				
SUBTOTAL COSTO BÁSICO:		100,0%	\$ 1.949.765.000,0		Vr. Básico Acta de Costos		\$ 119.268.625,0
VALOR IVA:		19,0%	\$ 370.455.350,0		Vr. IVA 19%		\$ 22.681.039,0
VALOR TOTAL:			\$ 2.320.220.350,0		Vr. Presente Acta		\$ 141.929.664,0
					Vr. Total Básico Costos		\$ 822.422.877,0
					Vr. Total IVA 19%		\$ 156.260.346,0
					Vr. Total Ejecutado		\$ 978.683.223,0
RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA							
ESTADO DE ANTICIPO:				ESTADO DEL CONTRATO:			
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL		N.A.		VALOR CONTRATO PRINCIPAL		\$ 2.320.220.350,00	
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR		N.A.		VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ -	
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		N.A.		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$ 141.929.664,00	
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA		N.A.		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA		\$ 978.683.223,00	
SALDO POR AMORTIZAR		N.A.		SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.341.537.127,00	
NOTAS: EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: *CUOTA FIJA: 1 MES (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023) * PCR AVANCE DE OBRA: 6,99% (AVANCE DE OBRA REPORTADO MES DE OCTUBRE DE 2023)							
La presente acta no exime al contratista e interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.							
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE PAGO \$141.929.664,00				CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE			
REGIMEN: COMUN CONSIGNAR: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.19200003551 A NOMBRE DE: CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS NIT. 901.666.013-2 Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al acta de recibo correspondiente. La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento.							
Aprobado para pago:  ING. RAFAEL VILLAR OSPINA R.L. CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS INTERVENTOR		 ING. ANDRES ARTURO MEJIA M. SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Vo./Bo.  ING. JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DEL CAUCA			

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **RAFAEL VILLAR OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.037.941, actuando como Representante Legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS identificado con NIT. 901.666.013-2 (Integrantes IAR PROYECTOS SAS NIT. 900.709.306-8 y PROYECTOS IAR SAS NIT. 900.974.559-9), certifico de acuerdo con las planillas correspondientes, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente al mes de octubre de 2023, exigidos por la ley, y que el Consorcio y sus integrantes se encuentran al día por todo concepto relacionado con dichos aportes cuando a ello haya lugar en desarrollo del contrato de Interventoría No. 0176-2023 suscrito con la Gobernación del Cauca.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los Veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.



RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal

C.C. Archivo

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	90166013-2	CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS	ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	BUENOS AIRES	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					10 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71026105	\$7.976.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	6
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.176.000	0	0	0	0	0	0		2.176.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.848.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.893.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	1.782.100				1.782.100	0	0	1.782.100			17.821	1.782.100	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacaucá	891500182-0	1.024.000	0	0	1.024.000	10

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.024.000	1.024.000
Pensión	3	4.146.000	4.146.000
Riesgos Laborales	1	1.782.100	1.782.100
CCF	1	1.024.000	1.024.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.976.100	7.976.100

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS		ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	larproyectos.servicios@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			CAUCA	BUENOS AIRES		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					10 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71026105	\$7.976.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Salud	Seguro	Exonerado	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	94360644	GÁLINDO LOPEZ JAR AUGUSTO	1	0		S														25-14	5.600.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EP5037	9.600.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF14	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
2	CC	10294226	SOLARTE ASTAIZA EDGAR ALBERTO	1	0		S														230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EP5018	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1051650163	FLOREZ TOBAR CRISTIAN CAMILO	1	0		S														230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EP5005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.500	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
4	CC	1050265100	OSPINA CHAVEZ LAURA MARGARITA	1	0		S														230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EP5005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	11224916	VARGAS PEREZ OSCAR ALFONSO	1	0		S														231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EP5005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	76320960	ORDÓÑEZ GRIJALBA JUAN CARLOS	1	0		S														230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP5005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	76322879	PERDOMO BEHAVIDES GUSTAVO ADOLFO	1	0		S														230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.600	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	93389742	SOSA CHISCO JUAN MIGUEL	1	0		S														25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EP5005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.500	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
9	CC	76316526	SANDOVAL LOPEZ JENNY	1	0		S														230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	E55CR2	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	91103520	MURCIA CARREÑO JISTO PASTOR	1	0		S														25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.600	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0



IAR PROYECTOS SAS

Certificación - 007

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.914, actuando como Representante Legal de IAR PROYECTOS S.A.S y ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO identificado con C.C. No. 79.314.459. de Bogotá y T.P. No. 18011-T, certificamos que la empresa IAR PROYECTOS SAS identificado con NIT. No. 900.709.306-8 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante el mes de octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,


ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. No. 18011-T


CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA
C.C. No. 52.713.914 de Bogotá
Representante Legal

C.C. Archivo

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
PARA IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79314459**

JARAMILLO BUITRAGO

APELLIDOS

JESUS ESTEBAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1963**
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500103-42098135-M-0079314459-20020226

0681102056A 02 111066340

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
18011-T
JESUS ESTEBAN
JARAMILLO BUITRAGO
C.E. 79314459
RESOLUCION INSCRIPCION 1331 **FECHA 04/06/87**
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



PRESIDENTE

EL GUINES SANCHEZ CORTES

25545



IDEQS
 FIRMA DEL TITULAR
 000517
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

COPIA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 E 5 1 1 F 4 9 3 7 8 8 2 7 A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79314459 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 18011-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS	CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 5 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71024781	\$6.298.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	840.000	0		0		0	0	0	0	840.000	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.212.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.680.000	0	0	42.500	42.500	0	0		1.765.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	1.545.200				1.545.200	0	0	1.545.200			15.452	1.545.200	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fiar Cajas	890806490-5	48.000	0	0	48.000	1
CCF21	CaJam	860013570-3	840.000	0	0	840.000	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	888.000	888.000
Pensión	2	2.977.000	2.977.000
Riesgos Laborales	1	1.545.200	1.545.200
CCF	2	888.000	888.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.298.200	6.298.200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709305-8	IAR PROYECTOS SAS		CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71024781	TOTAL A PAGAR	
					\$6.298.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	35164388	OSPINA DE ALVAREZ BERTHA	1	3	S																EP5001	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0		
2	CC	60037941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	1	0	S																EP5001	8.500.000	340.000	14-4	8.500.000	5	691.600	CCF21	8.500.000	340.000	0	0	0	0	0		
3	CC	5976554	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	1	0	S																EP5002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0		
4	CC	52713914	ALVAREZ OSPINA CAROLINA	1	0	S																EP5001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF21	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0		
5	CC	60360952	ALVAREZ OSPINA DIANA MARCELA	1	0	S																EP5001	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0		



PROYECTOS IAR SAS

Certificación – 007

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, RAFAEL VILLAR OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.037.941 expedida en Bogotá D.C., actuando como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa PROYECTOS IAR SAS identificada con NIT. No. 900.974.559-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante el mes de octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,


RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal Suplente

C.C. Archivo

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS	CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					8 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71205369	\$4.477.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	497.900	0		0		0	0	0	0	497.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.600	0		0		0	0	0	0	4.600	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	1.225.700	0	0	0	0	0	0		1.225.700	5
25-14	Colpensiones	900335004-7	1.088.000	0	0	0	0	0	0		1.088.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	1.006.700				1.006.700	0	0	1.006.700			10.067	1.006.700	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confacauca	891500182-0	578.500	0	0	578.500	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	578.500	578.500
Pensión	2	2.313.700	2.313.700
Riesgos Laborales	1	1.006.700	1.006.700
CCF	1	578.500	578.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.477.400	4.477.400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS		CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvilatorospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71205369	\$4.477.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Calendario	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
1	CC	1014235559	HERRERA GACHA NATALIA	1	0																															
2	CC	1661748224	CHAVEZ FLOREZ CARLOS ALFREDO	1	0																															
3	CC	1113311188	SEGURA LONDOÑO VALENTINA	1	0																															
4	CC	1051005221	RINCON RUIZ FRANCISCO JAVIER	1	0																															
5	CC	1061710362	VALDES CHECA CLAUDIA MERCEDES	1	0																															
6	CC	1061721010	DIÁZ ZUÑIGA JAIR ANTONIO	1	0																															
7	CC	34317622	GARCIA LOPEZ ANA MARIA	1	0																															
8	CC	76306523	ORTEGA BARRA LUIS FERNANDO	1	0																															
