

ANEXO 7
INFORME EJECUTIVO CORTE 3

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 1 de 13

ASSA ABLOY ENTRANCE SISTEMAS US.INC

INFORME EJECUTIVO POR CORTE N°3

CONTRATO N° 1285- 21

Cuyo objeto es:

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTES 2 y 3.”

Periodo de corte:

1 septiembre al 9 noviembre de 2023

Bogotá D, C, 16 noviembre de 2023

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 2 de 13

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
NIT	901.575.859-5
CONTRATO No	CTO 1285-21
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3
VALOR DEL CONTRATO LOTE 2	\$ 16.698.570.919
VALOR DEL CONTRATO LOTE 3	\$ 14.308.672.636
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 31.007.243.555
PLAZO DE EJECUCIÓN	35 meses
LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21	Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses)
	Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete (17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los lotes 2 y 3.
	Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará condicionado a la instalación del componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará Transmilenio.
	Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro (24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a satisfacción por el Interventor.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	01 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 de agosto de 202

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 3 de 13

2. OBJETO

Conforme con los compromisos contractuales fijados dentro del compilado de anexos del Contrato 1285 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTES 2 y 3, dentro de los cuales en el Anexo # 2 - ANEXO TECNICO PRINCIPAL, en su página 40 donde se indica que: “Cada pago se efectuará en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la factura junto con los siguientes documentos:

- Informe de actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del supervisor y/o Interventor del Contrato.
- Certificación de cumplimiento de las actividades contratadas, suscrito por el supervisor y/o Interventor del Contrato.
- Factura expedida con el cumplimiento de los requisitos legales.
- Certificación de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes “

Por lo cual nos permitimos complementar y dar cumplimiento a esta solicitud mediante el presente informe

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN

El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional de la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional - Modificadorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobación de una prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razón a los atrasos presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificación de especificaciones técnicas.

Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a cargo, contando con un total de 188 puertas telescópicas y 142 puertas automáticas sencillas instaladas, para un total global de 330 puertas automáticas instaladas de las 428 del alcance contractual, quedando un saldo de 98 puertas sencillas por instalar.

En la instalación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas para las nueve estaciones adicionadas por la Entidad Contratante mediante otro si #1 a ASSA ABLOY, quedo

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 4 de 13

estipulado que ASSA ABLOY **NO** es el responsable de instalaciones eléctricas, y sistemas ITS. Y que el tiempo previsto para su entrega va hasta el 30 de abril de 2024.

En concordancia con lo descrito anteriormente se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones y en el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, donde se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto.

A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscripción de actas de finalización de Fase I y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance Systems US INC:

- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-449-23 con número de radicado 2023-ER-36886.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del Oro fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 5 de 13

agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-467-23 con número de radicado 2023-ER-38995.

- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad Jardín fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Universidades fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-508-23 con número de radicado 2023-ER-46664.
- El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-509-23 con número de radicado 2023-ER-46144.

En el caso de las 98 puertas reubicadas en estaciones adicionadas en otro si #1 se informa que:

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 6 de 13

•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Pepe Sierra fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER-46144.

•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación calle 127 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-562-23 con número de radicado 2023-ER-46144

4. UNIDADES ENTREGADAS.

Cabe resaltar que ASSA Abloy NO es responsable de las conexiones ITS en las estaciones adicionadas en Otro sí #1, por lo cual se solicita la cancelación del saldo correspondiente a las puertas instaladas en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127.

En la siguiente tabla se relacionan y resaltan en negrilla las unidades de puertas instaladas automáticas de 2 hojas, en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127 y que se presentan en el corte (3) para pago del saldo de 50% pendiente según otro si#1

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 7 de 13

		CONSOLIDADO INSTALACIÓN DE PUERTAS POR ESTACIONES CONTRATO 1285		
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC		Martes 14 de noviembre de 2023		
Puerta tipo	Dos hojas	Cuatro hojas	Estado	Actas final e Inicio
parcial CONTRACTUAL	142	188		
calle 22	16	14	En operación	1-ago-23
San facón	8	12	En operación	1-ago-23
Estación Aguas	4	3	En operación	1-ago-23
Museo del Oro	4	6	En operación	1-ago-23
De la Sabana	8	8	En operación	1-ago-23
Santa Lucia	8	12	En operación	1-ago-23
Bicentenario	12	18	En operación	19-ago-23
San Bernardo	8	12	En operación	19-ago-23
Polcarpa	8	12	En operación	19-ago-23
Ciudad Jardin	8	12	En operación	19-ago-23
Universidades	8	12	En operación	19-ago-23
Jimenez caracas	10	13	En operación	15-sep-23
Jimenez calle 13	12	12	En operación	15-sep-23
Las Nieves	8	12	En operación	15-sep-23
San Victorino	12	18	En operación	15-sep-23
Biblioteca	4	6	En operación	15-sep-23
Parque	4	6	En operación	15-sep-23
ESTACIONES ADICIONADAS EN OTRO SI #1				
parcial OTRO SÍ #1	16			
PEPE SIERRA	8		ENTREGADA	9-nov-23
CALLE 127	8		ENTREGADA	9-nov-23
TOTALES	158	188		
		346		

Como consecuencia se lo anterior se obtiene un total de 16 estaciones entregadas y un total de 346 puertas instaladas.

CONCEPTO MANTENIMIENTO

La facturación por concepto de mantenimiento de las puertas e ITS para las estaciones que fueron entregadas durante el mes de agosto (Grupo de entrega 1 y 2) se les realizo mantenimiento durante el mes de septiembre.

Aunado a lo anterior se presenta el grupo (3) de entrega que conto con cinco estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino; Parque y Biblioteca), el cual tiene firmadas las actas de cambio de fase desde el 15 de septiembre de 2023 por el cual se calculan los mantenimientos a prorrata de los 16 días de mantenimiento correspondientes.

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 8 de 13

MANTENIMIENTO DE PUERTAS E ITS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023									
GRUPO DE ENTREGA	ESTACIÓN	PUERTA 2 HOJAS	PUERTA 4 HOJAS	SOLUCIÓN ITS	FECHA INICIO FASE II	PORCIÓN DÍAS DE MANTENIMIENTO	COSTOS MES SEPTIEMBRE		
							MTTO DÍA PUERTA 2H	MTTO DÍA PUERTA 4H	MTTO DÍA SOLUCIÓN ITS POR ESTACIÓN
							\$ 46.687,6667	\$ 53.351,6667	\$ 20.031,6667
1	SANTA LUCIA	8	12	1	1/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	LAS AGUAS	4	3	1	1/08/2023	30	\$ 5.602,520	\$ 4.801,650	\$ 600,950
	MUSEO DEL ORO	4	6	1	1/08/2023	30	\$ 5.602,520	\$ 9.603,300	\$ 600,950
	CALLE 22	16	14	1	1/08/2023	30	\$ 22.410,080	\$ 22.407,700	\$ 600,950
	SAN FASON	8	12	1	1/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	DE LA SABANA	8	8	1	1/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 12.804,400	\$ 600,950
2	UNIVERSIDADES	8	12	1	19/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	BICENTENARIO	12	18	1	19/08/2023	30	\$ 16.807,560	\$ 28.809,900	\$ 600,950
	SAN BERNARDO	8	12	1	19/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	POLICARPA	8	12	1	19/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	CIUDAD JARDIN	8	12	1	19/08/2023	30	\$ 11.205,040	\$ 19.206,600	\$ 600,950
	PARCIALES A	92	121	11			\$ 128.857,960	\$ 193.666,550	\$ 6.610,450
							\$ 1.400,630	\$ 1.600,550	\$ 600,950
							92,00	121,00	11,00
3	JIMÉNEZ	22	24	1	15/09/2023	16	\$ 16.434,058,7	\$ 20.487,040,0	\$ 320,506,7
	NIÉVES	8	12	1	15/09/2023	16	\$ 5.976,021,3	\$ 10.243,520,0	\$ 320,506,7
	SAN VICTORINO	12	18	1	15/09/2023	16	\$ 8.964,032,0	\$ 15.365,280,0	\$ 320,506,7
	PARQUE	4	6	1	15/09/2023	16	\$ 2.988,010,7	\$ 5.121,760,0	\$ 320,506,7
	BIBLIOTECA	4	6	1	15/09/2023	16	\$ 2.988,010,7	\$ 5.121,760,0	\$ 320,506,7
	PARCIALES B	50	66	5			\$ 37.350,133,4	\$ 56.339,360	\$ 1.602,533,5
	TOTALES	142	187	16			\$ 1.400,630	\$ 1.600,550	\$ 600,950
							26,66670	35,20000	2,66670
NUMERO DE MESES DE SERVICIO							118,66670	156,20000	13,66670
Valores a facturar (PARCIALES A+B)							\$ 166.208.140,00	\$ 250.005.910,00	\$ 8.213.003,00
COSTO TOTAL POR MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE							\$ 424.427.053,00000		

Es así como se obtienen las cantidades y por ende los valores del corte (3) Tres para el periodo los cuales se resumen así:

5. BALANCE GENERAL A LA FECHA

Por facturación después de recibido el presente corte (3) tres se puede resumir que:

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 9 de 13

CLIENTE : TRANSMILENIO S.A	CONTRATISTA:  ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC	CONTRATO 1285 de 2021 PREACTA No: 3 PERIODO DE LA PREACTA: 1 de septiembre al 9 de noviembre 2023
-----------------------------------	---	--


		CONTRATO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	PRESENTE ACTA/ PERIODO 1 SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2023 (CORTE 3)	
ITEM	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	UNIT PRICE / PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	Avance / Progress	Vr Parcial (COP) / Value
1.1B	SALDO PAGO 50% DE 16 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI No.1 clausula 5) Instaladas en las estaciones (Pepe Sierra y Calle 127)	COP 32.130.000	8	257.040.000
2,1	Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 92 puertas con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)	COP 1.400.630	92,000	128.857.960
2,1	Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 50 puertas con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque).	COP 1.400.630	26,6667	37.350.180
2,2	Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas - para 121 puertas con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)	COP 1.600.550	121,000	193.666.550
2,2	Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas - para 66 puertas con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque)	COP 1.600.550	35,200	56.339.360
2,3	Tarifa mes Mantenimiento ITS, para (11) ITS, con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones(Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)	COP 600.950	11,000	6.610.450
2,3	Tarifa mes Mantenimiento ITS - para (5) ITS, con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque)	COP 600.950	2,6667	1.602.553
COSTOS DIRECTOS				COP 681.467.053

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 10 de 13


		CONTRATO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN			ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA / CUMULATIVE TO PRESENT PROGRESS RECORD	
ITEM	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTS / CANTIDADES	UNIT PRICE / PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL VALUE / VALOR TOTAL	Avance / Progress	Vr Parcial (COP) / Value
1	FABRICACIÓN:					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA DE DOS HOJAS	142	COP 32.130.000	COP 4.562.460.000	142,0	COP 4.562.460.000
1.1A	PAGO 50% DE 98 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI No.1 clausula 5)	49	COP 32.130.000	COP 1.574.370.000	49,0	COP 1.574.370.000
1.1B	SALDO PAGO 50% DE 16 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI No.1 clausula 5) Instaladas en las estaciones (Pepe Sierra y Calle 127)	49	COP 32.130.000	COP 1.574.370.000	8,0	COP 257.040.000
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA DE CUATRO HOJAS	187	COP 35.003.850	COP 6.545.719.950	187,0	COP 6.545.719.950
1.3	SUMINISTRO DE SOLUCIÓN ITS Y BOTÓN DE EMERGENCIA POR ESTACIÓN	16	COP 5.995.220	COP 95.923.520	16,0	COP 95.923.520
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:				-	COP 0
2.1	Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 92 puertas con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)		COP 1.400.630	COP 8.067.628.800	140,0	COP 196.088.200
2.1	Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 50 puertas con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque).		COP 1.400.630		44,3	COP 62.001.268
2.2	Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas - para 121 puertas con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)		COP 1.600.550	COP 7.183.268.400	176,0	COP 281.696.800
2.2	Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas - para 66 puertas con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque)		COP 1.600.550		61,6	COP 98.593.880
2.3	Tarifa mes Mantenimiento ITS, para (11) ITS, con mantenimiento de 30 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones(Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa y Ciudad Jardín)		COP 600.950	COP 230.764.800	17,0	COP 10.216.150
2.3	Tarifa mes Mantenimiento ITS - para (5) ITS, con mantenimiento de 16 días (SEPTIEMBRE) en las estaciones (Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque)		COP 600.950		4,7	COP 2.804.453
3	Ajuste por vandalismo				-	COP 0
3.1	Vandalismo	1	COP 1.172.738.085	COP 1.172.738.085	-	COP 0
COSTOS DIRECTOS				COP 31.007.243.555		COP 13.686.914.221

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 11 de 13


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NIEVES		
		
AY. JIMENEZ (CARACAS)		
		
		


AV. JIMENEZ (CALLE 13)

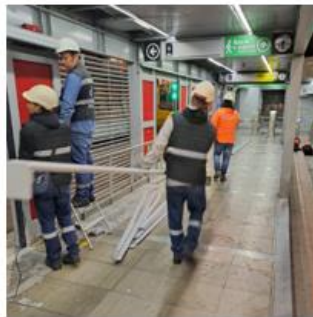


BIBLIOTECA

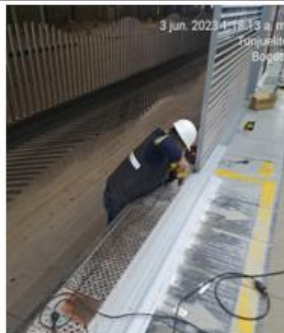

	TRANSMILENIO S.A. CONTRATO 1285 DE 2021 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. Informe de Ejecutivo Corte #3, 16/11/23		Código No. AA-TM01-P-01
	Proceso: FACTURACIÓN		Versión No. 1
			Página 13 de 13

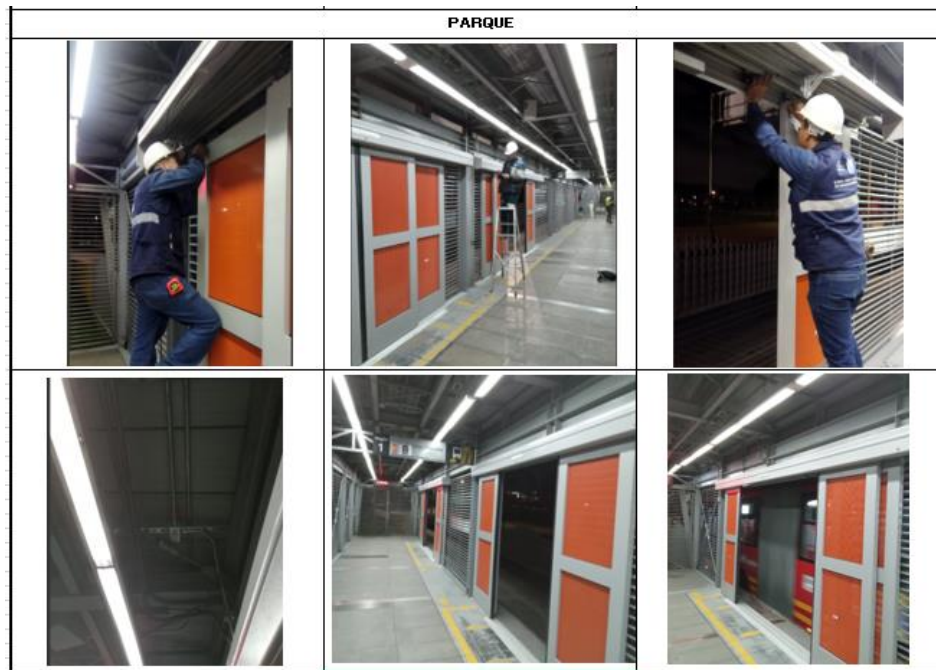

Atentamente,



Ing. HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA
 Director de Proyecto Contrato TMSA-AAES-1285-2021

Anexos:

Copia:

NCT, HVS.
