

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	


Contrato de Obra No.MCS-P-SLP-005-2022 Contrato de Obra No.SAAMC-009-2022 Contrato de Obra No.1050-15-103-2022-073 Contrato de Obra No.ML-SJ-LPN-009-2022 Contrato de Obra No.154 DEL 2022	Contratista: MARTA YENNY MENA Contratista: SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS Contratista: INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S. Contratista: UNION TEMPORAL LITORAL Contratista: CONSTRUOBRAS F.D.C.S.A.S.
Contrato de Interventoria No.1101 DE 2022	Interventoria: CONSORCIO INCOL - URBA

Objeto Contrato de Obra:
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15.

INFORME MENSUAL No.10	MES O PERIODO: OCTUBRE DE 2023
----------------------------	--------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		8
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		13
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento Items no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria		22
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		23
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	29-50
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	46-62
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43-64
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	68
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	46-63
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	60
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		NA
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	38
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	37-58
	• Seguimiento Programa de Inversiones		37-58
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	37-58
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	59
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	59
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		65
5.1	Información general del contrato		65
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		66
5.3	Informes especialistas y profesionales		67
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		NA
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		NA
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	74
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	76
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	76
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	77
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		NA
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	NA
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	NA
7	Conclusiones y recomendaciones		77
8	Anexos		79
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		100
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		80
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		NA

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensu



Firma: _____
 Nombre: Jannier Salas Quejada
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación No. 3388 de fecha 12/09/2022

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																												
					VERSION	1																																																																												
					PÁGINA																																																																													
					FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: 10																																																																																		
CONTRATO DE OBRA No.: 1050-15-103-2022- 073					PLAZO INICIAL: 4 MESES																																																																													
OBJETO: “EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”					FECHA DE INICIO: 22/12/2022		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 938.878.144,00																																																																										
					FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/04/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):		\$ 157.534.995,00																																																																									
					FECHA DE REANUDACIÓN: 10/05/2023		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):		\$ 1.096.413.139,00																																																																									
					FECHA DE VENCIMIENTO: 5/11/2023		ANTICIPO CONCEDIDO:		\$ 281.663.443,20																																																																									
CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.					PLAZO ACUMULADO: 10 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO:		\$ 123.177.642,60																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1110 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA																																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><td></td><td>ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td><td>298</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UNIDAD</td><td>1</td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ML	298	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes	UNIDAD	1	Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><td></td><td>ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD MES</td><td>CANTIDAD ACUMULADA</td></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td><td>0</td><td>246</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UNIDAD</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ML	0	246	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes	UNIDAD	0	0	Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																															
Pavimentación	Construcción	ML	298																																																																															
	Mejoramiento																																																																																	
	Rehabilitación																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																	
	Puentes	UNIDAD	1																																																																															
	Pontones																																																																																	
Mantenimiento																																																																																		
Otros (Especificar cuales)																																																																																		
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																														
Pavimentación	Construcción	ML	0	246																																																																														
	Mejoramiento																																																																																	
	Rehabilitación																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																	
	Puentes	UNIDAD	0	0																																																																														
	Pontones																																																																																	
Mantenimiento																																																																																		
Otros (Especificar cuales)																																																																																		
AVANCE FINANCIERO																																																																																		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES					VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																													
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																										
OBRAS	\$ 1.093.233.131,00	3.180.008,00	1.096.413.139,00	OBRAS	70.231.160,12	0,00	70.231.160,12	584.614.142,47																																																																										
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				AJUSTES																																																																														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.096.413.139,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																														
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																														
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																														
				VALOR EJECUTADO				584.614.142,47																																																																										

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 535.946.836,60	MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 584.614.142,47	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	53,32%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
zapata lado norte del puente		estado de la obra	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div><div>Firma</div><div>Nombre: MIGUEL ANGELO MIGUEZ MANTILLA</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 2520278504 CND</div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

					FECHA	31/10/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
--	--	--	--	--	-------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	INVÍAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCÓ	PERIODO MES:	10	
-------------------	--------	------------------------	-------	--------------	----	--

CONTRATO DE OBRA No.:	005 DE 2022	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$	3.345.499.000,00
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.		FECHA DE INICIO:	16/01/2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$	-
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	3.345.499.000,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$	-
		FECHA DE VENCIMIENTO:	16/05/2023	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$	-
		PLAZO ACUMULADO:	4 MESES			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1101 DE 2022	INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL - URABA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JANNIER SALAS QUEJADA	
----------------------------	--------------	--------------	-------------------------	---	-----------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)																																																																																	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)																																																																																	

AVANCE FINANCIERO								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	3.306.106.905,00	39.392.095,00	3.345.499.000,00	OBRAS	197.484.800,00	0,00	197.484.800,00	197.484.800,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				AJUSTES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				ESTUDIOS Y DISEÑOS				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
				VALOR EJECUTADO				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

		FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	---------------------------------

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

\$

3 345 499.000,00

\$

1.725 057.426,78

51,56%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

5

11

4

20

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavaciones varias sin clasificar, extracción de material de cantera lleno con material seleccionado y compactado del mismo, pavimentos en concreto hidráulico MR -42 y Construcción de Alcantarilla K1+270 y K1+475.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Miguel rodriguez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUB DIRECCIÓN RED TERCIARIA



Vía la Yesita - Managrú, MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ.

INFORME MENSUAL N°10

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por CONSORCIO INCOL-URBA. contiene el **Informe Mensual No 10** de la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15"**.

El presente informe contiene una descripción general de las actividades realizadas durante el período comprendido del 1 al 31 de octubre de 2023 correspondiente a la etapa de Construcción del proyecto por parte de los Contratistas que han sido seleccionados a la fecha por cada uno de los municipios, los cuales son: MARTHA YENNY MENA MONRROY para el Municipios de El Cantón de San Pablo (vía La Yesita-Managrú), INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S. para el Municipio de Unguía (vía Tanela- Titumate), INTEGRALES CONTEMPORANEOS S.A.S. para el Municipios de Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), CAMPO ELIAS PALOMEQUE para el Municipio de El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) y UNION TEMPORAL LITORAL para el Municipio Litoral de San Juan (Vía Cementerio), así como por el Interventor CONSORCIO INCOL – URBA a través de actividades de control de la programación de obra, control de calidad, personal y equipo, puesto a disposición a cada uno de los frentes del proyecto, aspectos financieros y avance de las obras.

El Contrato de Interventoría considera la ejecución de las actividades enmarcadas en el objeto contractual y prevé la realización de seguimiento y control de las actividades previas y la ejecución de las obras a ejecutar por parte de los Contratista seleccionados, el recibo parcial y final de las obras por parte de la interventoría y la liquidación. Lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones exigidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de acuerdo con los alcances propuestos en el pliego de condiciones, y demás normas vigentes en una forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recurso humano y demás apoyo propuesto y en concordancia con lo requerido en el pliego de condiciones de la licitación pública.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del programa Colombia Rural “lote 15” del Gobierno Nacional que busca mantener y mejorar la transitabilidad de la red vial terciaria del país, buscando una movilidad más segura y eficiente, impulsando la reactivación de las economías locales al facilitar la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos, la promoción de los destinos turísticos y el acceso a bienes y servicios.

Para el Departamento del Chocó fueron elegidos seis (06) dentro de este mismo programa, los cuales corresponden a los municipios de Cantón de San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato, San José del Palmar y Litoral del San Juan que se muestran en el siguiente cuadro y en el que se definen los tramos de vías y longitudes a intervenir:


DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (KM)
CHOCÓ	CANTÓN DE SAN PABLO	LA YESITA - MANAGRÚ	1,90
	ATRATO	YUTO – RAMAL SAMURINDÓ	0.152
	UNGUÍA	TANELA- TITUMATE	0.298
	EL CARMEN DE ATRATO	VEREDA LA ARBOLEDA – VÍA RELLENO SANITARIO	0.167
	LITORAL DEL SAN JUAN	VÍA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.350

Es importante mencionar que en lo que respecta al Municipio de San José del Palmar el Gestor Técnico del contrato nos ha informado que NO se ejecutara proyecto a cargo de esta interventoría, ya que las intervenciones proyectadas se realizaron mediante la ejecución de otro contrato.

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
 Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
 Informe Mensual de Interventoría No 10.

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Tal como se informó en el punto anterior, las obras a construir se encuentran ubicadas en los municipios de El Cantón del San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato, Litoral del San Juan y San José del Palmar en el Departamento del Chocó. A continuación, se presenta el mapa de localización de las obras:

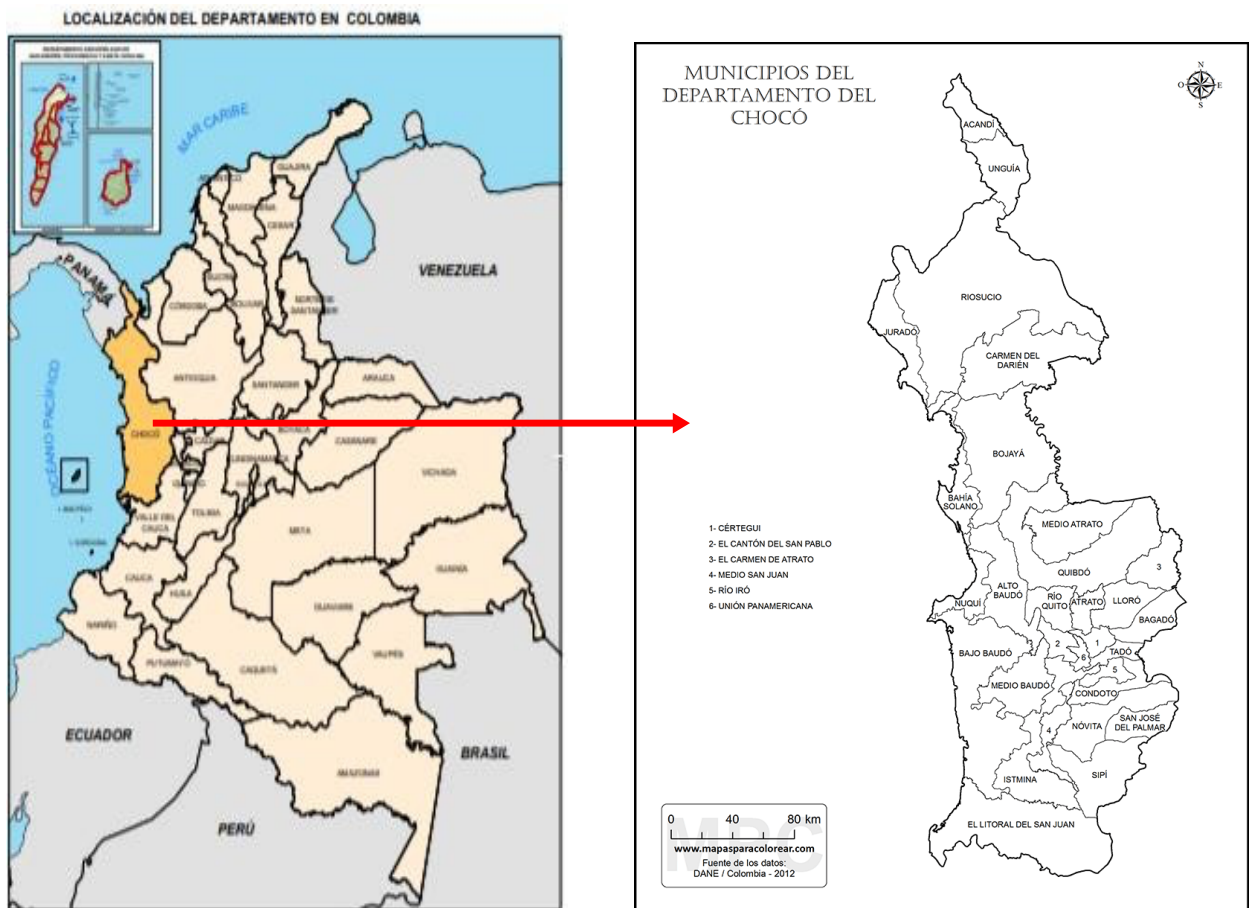

Fuente: Anexo Técnico Contrato de Interventoría.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS.

A la fecha del presente informe se ha adelantado la contratación de las obras por parte de los municipios de El Cantón de San pablo (vía La Yesita-Managrú), Unguía (vía Tanela- Titumate) y Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), quedando pendiente aún por definir por parte de los respectivos municipios los contratistas para la ejecución de obras en los municipios de El Carmen de Atrato (vereda la Arboleda – vía relleno sanitario), Litoral del San Juan (vía al cementerio).

2.2.1 Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo)

El tramo de vía a intervenir corresponde al camino vehicular que inicia desde la vía principal que conduce de Quibdó a Istmina con la cabecera municipal de Lloró, en una longitud total de 11.3 km, de los cuales 7.8 km ya se encuentran pavimentados en concreto hidráulico. De los 11.3 km hace falta por pavimentar una longitud de 3.5 km contados desde la intersección con la vía principal donde se ubica la abscisa K0+000 hacia la cabecera del municipio de Lloró.

El Tramo de vía a mejorar presenta problemas de drenaje superficial de aguas e inestabilidad de algunos sitios de la banca, para lo cual se prevé realizar obras de construcción de Cinco (05) alcantarillas de Ø36", la construcción de dos (02) box Culvert, construcción de dos (02) muros de contención, conformación de la calzada existente en sitios críticos y el mantenimiento rutinario mediante la actividad de limpieza de las alcantarillas existentes en todo el tramo de la vía. Así mismo, el proyecto considera para el mejoramiento del tramo de vía faltante la construcción de pavimento rígido en una longitud estimada en 450 ml.

2.2.2 Vía Yuto – Ramal Samurindó (Municipio de Atrato)

El tramo de vía a intervenir corresponde al camino vehicular que inicia desde la vía principal que conduce de Quibdó a Istmina con el centro poblado de Samurindó, en una

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

longitud de 2.9 km, de los cuales aproximadamente 50 metros lineales ya se encuentran pavimentados con placa huella. En el resto del tramo predomina la capa de rodadura en material de afirmado.

El Tramo de vía a mejorar presenta problemas de hundimientos y deformaciones en la capa de rodadura principalmente en los sectores con pendiente longitudinal superior al 7% para lo cual se prevé ejecutar obras de construcción de pavimento en los sitios críticos, en una longitud estimada de 150 metros lineales, cuneta de evacuación de escorrentías y obras de mantenimiento periódico consistente en la conformación de la calzada de todo el tramo de vía.

2.2.3 Vía Tanela- Titumate (Municipio de Unguía)

Las obras a ejecutar se encuentran localizada aproximadamente a 42 Km de la cabecera municipal, específicamente en la vía que comunica a los corregimientos de Tanela – Titumate del Municipio de Unguía.

El Estado actual de la vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm² ó 3000 PSI) – PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma.

Actual mente el tramo vial a intervenir se encuentra en pésimo estado debido al tipo material que conforman la subrasante natural de la calzada existente y a la fuerte ola invernal que azota la región, por lo que esta se vuelve prácticamente intransitable para los habitantes de estos dos corregimientos y veredas aledañas que transitan por este corredor vial.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

Con la intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de un Puente en concreto reforzado de 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

2.2.4 Vía Vereda La Arboleda – Vía relleno sanitario (Municipio de EL Carmen de Atrato)

La zona de los trabajos se encuentra ubicada aproximadamente a 5 kilómetros de la zona urbana del Municipio, 20 minutos parque principal, la cual es una zona carreteable.

Las obras de construcción son en pavimento rígido en los sitios críticos, en una longitud estimada de 180 metros lineales, cuneta de evacuación de escorrentías y obras de mantenimiento periódico consistente en la conformación de la calzada de todo el tramo de vía.

2.2.5 Vía Cementerio (Municipio de Litoral de San Juan)

Este proyecto está localizado en Santa Genoveva de Docordó cabecera municipal del Litoral del San Juan, especifica mente en la “VIA CEMENTERIO” que busca comunicar a la cabecera municipal con el Cementerio (zona norte) en una extensión aproximada de 2 kilómetros.

El Estado actual de la vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm² ó 3000 PSI) – PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

de la misma, en una longitud aproximada de 350 metros. Así mismo se construirán 3 alcantarillas de 36", y dos Box Culvert de 2X2.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.


El proyecto está concebido para desarrollarse en las vías terciarias del Departamento del Chocó pertenecientes a los municipios de El Cantón del San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato y Litoral del San Juan, en las cuales se hace necesario realizar su inversión para su mejoramiento con el fin de facilitar el tránsito de vehículos e impulsar el comercio la reactivación económica.

Para el mejoramiento de las vías se consideran principalmente actividades destinadas a mejorar el estado actual de la superficie de rodadura mediante su conformación y el manejo adecuado de las aguas lluvias de escorrentía y nacimientos de agua existentes a los lados de la vía con la construcción de obras de drenaje como son Alcantarillas de Ø36", construcción de estructuras en concreto tipo Box Culvert, evitando así la afectación del agua en la subrasante y las capas superiores de la estructura de pavimento o capa de afirmado existente.

Así mismo, el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad mediante la construcción de pavimento rígido o la conformación y compactación de la capa de rodadura, en los sitios que se establezcan por la Interventoría como críticos, así como la construcción de muros de contención en concreto reforzado en los sitios en los que se prevé un deslizamiento o la pérdida de la banca.

Para la ejecución de estas actividades en el proyecto se ha establecido la aplicación de los diseños descritos en la cartilla técnica del Instituto Nacional de Vías, en la cual se establecen todos los parámetros técnicos en relación con las cuantías de refuerzo, resistencia a la compresión de los concretos, espesores del pavimento, características del material de afirmado y dimensionamiento de las estructuras y obras a construir.

Contrato Interventoria No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

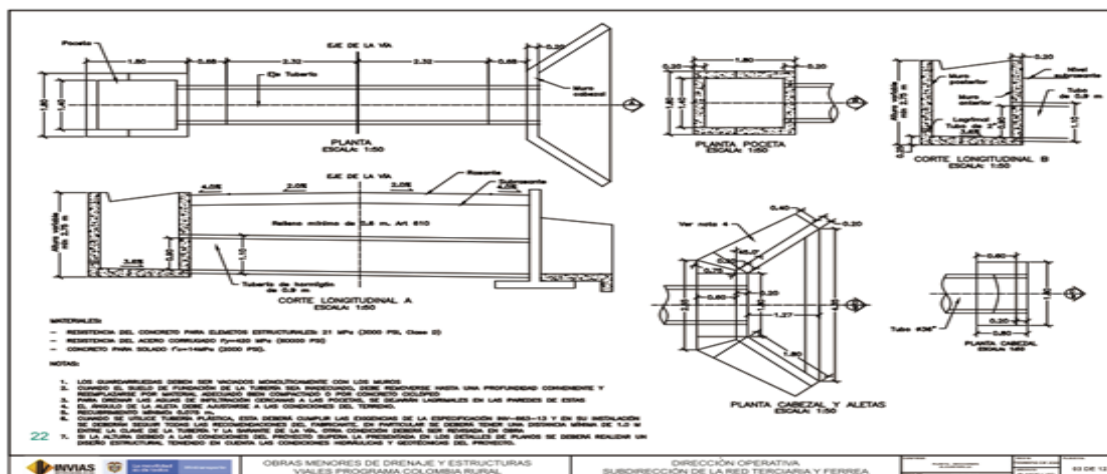

3 INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS.

3.1.1 Información General Contrato Municipio de El Cantón del San pablo.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO
CONTRATO DE OBRA No.	005-2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY – CC. No. 35.545.208
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$3.345.499.000). M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIO:	16 DE ENERO DE 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES
PRORROGA No.2	CINCO (5) MESES

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
FECHA DE FINALIZACIÓN	16 DE MAYO DE 2023 A LA FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Responsabilidad Civil Patronal	Seguros del estado	\$ 200.000.000	55-40-101033683	19/09/2022	31/12/2023
	Cumplimiento	Seguros del estado	\$ 869.003.503	55-40-101033683	19/09/2022	31/12/2023
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del estado	\$ 869.003.503	55-40-101033683	19/10/2022	31/07/2026
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del estado	\$ 869.003.503	55-40-101033683	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	
	Buen manejo del anticipo	Seguros del estado	\$ 4.345.017.515	55-40-101033683	19/09/2022	31/12/2023

3.1.2 Información General Contrato Municipio de Atrato

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE ATRATO					
CONTRATO DE OBRA No.	SAMC – 009 DE 2022					
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"					
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS S.A.S – NIT. 901.377.526-9					
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DOS CIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 260.000. 000.00) M/CTE.					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES					
FECHA INICIO:	14 DE DICIEMBRE de 2022					
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES					
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DE 2023 – YA FINALIZADO					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	10% del valor de la pérdida	55-40-101033521	09/09/2022	09/11/2022
	Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	\$ 26.000.000	55-44-101073513	09/09/2022	09/11/2022
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del Estado S.A.	\$ 13.000.000	55-44-101073513	09/09/2022	09/11/2025
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	\$ 26.000.000	55-44-101073513	09/11/2022	09/11/2025

3.1.3 Información General Contrato Municipio de Unguía.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE UNGUIA
CONTRATO DE OBRA No.	1050-15-103-2022-073
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Unguía en el Departamento de Chocó Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S NIT: 900.740.660-0
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 938.878. 144.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	DIEZ (10) MESES
FECHA INICIO:	DICIEMBRE 22 de 2022
PRORROGA No.1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL DE 2023
REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2023

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
PRORROGA No.3	UN MES Y 26 DIAS					
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 300.000.000	M- 100034815 Anexo 2	22/12/2022	31/05/2024
	Cumplimiento	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 93.887.814,4	M- 10017063 Anexo 2	22/12/2022	31/05/2024
	Buen Manejo del Anticipo	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 281.663.443,2	M- 10017063 Anexo 2	22/12/2022	31/05/2024
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 46.943.907,4	M- 10017063 Anexo 2	22/12/2022	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la obra	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 93.887.814	M- 10017063 Anexo 2	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	
					24/04/2023	31/12/2028
	Calidad y Correcto Funcionamiento	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	\$ 4.556.523	M- 10017063 Anexo 2	22/12/2022	31/12/2028

3.1.4 Información general Contrato Municipio de Litoral de San Juan

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN
CONTRATO DE OBRA No.	MLSJ-LPN-009-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAM JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACION
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LITORAL
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 920.000. 000.00) M/CTE.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES.					
FECHA INICIO:	FEBRERO 02 de 2023					
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL 2023					
SUSPENSIÓN No.2	04 DE JULIO 2023					
PRORROGA No.1	45 DIAS					
FECHA DE FINALIZACIÓN	SEPTIEMBRE 25 DE 2023 YA FINALIZADO					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Predios, laborales y operacionales	Seguros del estado	\$ 200.000.000	1744101204630	15/12/2022	25/09/2023
	Cumplimiento	Seguros del estado	\$ 92.000.000	1744101204630	15/12/2022	16/01/2024
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del estado	\$ 46.000.000	1744101204630	15/12/2022	25/09/2023
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del estado	\$ 92.000.000	1744101204630	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	

3.1.5 Información general Contrato Municipio El Carmen de Atrato

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO
CONTRATO DE OBRA No.	154
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA:	CAMPO ELIAS PALOMEQUE SERNA
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 260.000. 000.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES.
FECHA INICIO:	14 DE ABRIL 2023
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	28 DE JULIO 2023 YA FINALIZADO

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1 Actividades Ejecutadas Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

Las actividades físicas desarrolladas a la fecha son las siguientes:

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado. Esta actividad es de suma importancia debido a la disponibilidad de materiales en la zona de los trabajos; tal y como se mencionó anteriormente el fuerte invierno presentado en el primer semestre del año en la zona y que aún se mantiene, dificultando el acceso a las fuentes materiales.
2. El contratista completo los cajeos y lleno del mismo con material seleccionado y compactado. De acuerdo a la revisión en la ejecución de los diseños, fue necesario realizar unos cajeos para la ampliación del terraplén, en algunos casos superiores a 1.5 metros; esta condición fue verificada por la interventoría antes de comenzar con las actividades, ya que realizamos la ejecución de apiques y toma de ensayos de CBR, con el fin de poder identificar la capacidad portante de la subrasante existente. Lo anterior con el fin de poder realizar las ampliaciones correspondientes en el terraplén y que el mismo garantizara mediante su ejecución la sección transversal que se trae del corredor vial desde el tramo 1. A la fecha se tienen 741 metros lineales conformados lateralmente para esta ampliación.
3. El contratista realizó excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma localizada en el K1+690.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

4. El contratista realizó trabajos previos para la Construcción de pavimento. A la fecha se han seriado 741 metros lineales de sub base granular, entre el K0+944 al K1+685 y se han fundido 479 metros de concreto rígido a un carril, 316 Izquierdo y 163 en el derecho.

3.2.2 Actividades Ejecutadas Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 14 de diciembre de 2022, cuyo contrato tenía un plazo inicial de dos (02) meses y se realizó adición en tiempo mediante Otrosí No.01 del 13 de febrero de 2023 de (02) meses, para un plazo total acumulado de (04) meses; Este proyecto finalizó actividades constructivas el pasado 14 de abril de 2023 y se encuentra en proceso de liquidación final.

3.2.3 Actividades Ejecutadas Vía Tanela - Titumate (Municipio de Unguía).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 22 de diciembre de 2022 y tiene un plazo establecido de cuatro (04) meses. Que por medio del acto administrativo otro si número dos (02) modifíco la cláusula séptima del contrato de obra aumenta en tres (03) meses más el tiempo del contrato, quedando con una nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 5 de agosto de 2023. Que mediante acto administrativo otro si número 4 de fecha 02 de agosto de 2023 se amplió el tiempo del contrato en tres meses más, quedando la nueva fecha de terminación el 05 de noviembre de 2023. Se inicio el trámite para prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las obras a ejecutar se encuentran en la vía que comunica a los corregimientos de Tanela – Titumate, se contempla de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm² ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

Se ejecutan labores de construcción de Placa Huella en tres sectores críticos, uno de 130 metros, otro de 70 metros y otro de 50 metros, para un total de 250 metros lineales. Adicionalmente se construirá el puente sobre el Río Capitán.

Se realizaron las excavaciones en los costados del puente para la cimentación como la instalación de tubería en concreto a medida que esta actividad avanzaba, paralelo a ello las actividades de corte de Acero de Refuerzo Fy 420 MPa., figurado y amarre del mismo para canastillas de las pilas de cimentación del puente y la aplicación de concreto de 3000 Psi para las mismas.

3.2.4 Actividades Ejecutadas Vía Cementerio (Municipio. de Litoral del San Juan).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día Jueves 2 de febrero de 2023 y tiene un plazo establecido de cuatro (04) meses. para una fecha de finalización del día 2 de junio del 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 14 de junio de 2023. El día 4 de julio del 2023 el contrato de Obra presento suspensión de actividades reiniciado desde el 29 de agosto de 2023; Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 25 de septiembre de 2023.

A pesar del estado de suspensión en el que se encontró el proyecto durante todo el mes de agosto, las actividades ya estaban muy adelantadas y se terminaron los remates en obra el pasado 26 de agosto de 2023, iniciando su proceso de liquidación final.

Inicialmente se tenía proyectada la construcción de PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma, en una longitud aproximada de 350 metros. Así mismo se construirán 3 alcantarillas de 36", y dos Box Culvert de 2X2. Sin embargo, las obras de drenaje ya se

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

encontraban construidas y los recursos de las mismas se pasaron a longitud de placa huella, dejando finalmente una longitud construida de 500 metros lineales.

3.2.5 Actividades Ejecutadas en la vereda la arboleda – vía relleno sanitario. (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 14 de abril de 2023 y tiene un plazo establecido de tres (03) meses para una fecha de finalización del día 14 de julio del 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 28 de julio de 2023.

Las obras de construcción se realizaron en pavimento rígido en los sitios críticos, en una longitud final de 128 metros lineales, cuneta de evacuación de escorrentías y obras de mantenimiento periódico consistente en la conformación de la calzada de todo el tramo de vía.

Este contrato ya se terminó en obra física y se encuentra en etapa de revisión y liquidación.

3.3 SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS.

En este periodo no se tramitaron ítems no previstos en ninguno de los contratos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

<p style="text-align: center;">CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1</p>		
---	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	IX) OBRA PROGRAMADA	X) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	1	2	3	4	5	6
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	IX) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	16 enero - 16 febrero 2023	16 febrero - 16 marzo 2023	16 marzo - 16 abril 2023	16 abril - 16 mayo 2023	Indicador mes y año	Indicador mes y año
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA ENTUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L=7m, D=36" (900 mm))	\$119.794.200	3,55%	\$4.251.100	\$39.596.100	\$39.596.100	\$39.596.100			
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1610) ml	\$3.169.267.605	94,74%	\$3.158%		\$1.056.422.535	\$1.056.422.535	\$1.056.422.535		
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$19.045.000	0,54%					\$19.045.000		
CARACTERIZACIÓN VIAL	\$1.520.000	0,05%	\$1.520.000						
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	\$4.497.251,72	0,13%	\$1.124.313	\$1.124.313	\$1.124.313	\$1.124.313	\$1.124.313		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$33.086.076,70	0,99%	\$16.545.039			\$16.545.039	\$16.545.039		
GPP 7									
GPP 8									
TOTAL OTROS ITEMS									
VALOR BÁSICO DE OBRA 1 A I	\$ 3.345.210.235,42	100%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 1 A I									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				1,26%	32,80%	33,29%	32,65%		
VALOR (Miles de Pesos)				\$42.242.413	\$1.097.144.948	\$1.113.687.957	\$1.092.134.887		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				1,26%	34,06%	67,35%	100,00%		
VALOR (Miles de Pesos)				\$42.242.413	\$1.139.387.361	\$2.253.075.348	\$3.345.210.235		

Para este proyecto se establece que de acuerdo al contrato de obra suscrito por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance

PROGRAMADO: 71,84%

EJECUTADO: 54,56%

De acuerdo a los porcentajes de avance del proyecto inicial a la fecha tiene un atraso del (17,28%) el cual viene con tendencia a la baja desde mediados del mes de agosto de 2023, tal y como fue planeado de acuerdo a la nueva reprogramación presentada y aprobada para la prórroga otorgada desde el 31 de julio de 2023.

Sin embargo, la interventoría le reitera al contratista se realice un plan de contingencia para lograr nivelar el retraso presentado a la fecha e incrementar los frentes de trabajo correspondiente a la realización de alcantarillas, cajeros, llenos, instalación de base y por consiguiente la aplicación de pavimento rígido.

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

3.4.2 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	PROGRAMADA	PROGRAMADA	OBRA	\$ Valor			
	Miles de pesos		PROGRAMADA	programada			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutada	15 DICIEMBRE 2022 - 14 ENERO 2023	15 ENERO 2023 - 14 FEBRERO 2023	15 FEBRERO - 15 MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO ITEM(1,2,3,4,5,6 Y 7)	\$200.637.563	77,43%		%P	0,00%	0,00%	38,74%
				\$P	\$0	\$0	\$100.318.782
				\$E			
				%E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ITEM(2 Y 3)	\$5.624.468	2,17%		%P	0,00%	0,00%	2,17%
				\$P	\$0	\$0	\$5.624.468
				\$E			
				%E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS ITEM (4)	\$1.000.000	0,39%		%P	0,00%	0,00%	0,19%
				\$P	\$0	\$0	\$500.000
				\$E			
				%E			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ITEM(1)	\$10.000.000	3,86%		%P	0,00%	0,00%	1,93%
				\$P	\$0	\$0	\$5.000.000
				\$E			
				%E			
TOTAL OTROS ITEMS IP1 y IP2	\$41.669.320	16,09%		%P	0,00%	0,00%	8,05%
				\$P	\$0	\$0	\$20.834.660
				\$E			
				%E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 258.931.351,00	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				%	0,00%	0,00%	51,03%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$132.277.910
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				%	0,00%	0,00%	51,03%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0,00	\$132.277.910,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES				%			
				VALOR (Miles de Pesos)			

Este proyecto se encuentra terminado y ya se realizó el pago del 90% del total del contrato. En este momento se encuentra en fase de realización de trámites para su liquidación.

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
 Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
 Informe Mensual de Interventoría No 10.

3.4.3 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Tanela- Titumate (Municipio de Unguía)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Miles de pesos		Miles de pesos	Miles de pesos	22/12/2022 AL 22/01/2023	23/01/2023 AL 22/02/2023	23/02/2023 AL 22/03/2023	23/03/2023 AL 22/04/2023	23/04/2023 AL 22/05/2023	23/05/2023 AL 22/06/2023	23/06/2023 AL 22/07/2023	23/07/2023 AL 22/08/2023	23/08/2023 AL 22/09/2023	23/09/2023 AL 22/10/2023	23/10/2023 AL 05/11/2023
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA											
SECCIÓN 1- CONSTRUCCIÓN DE PLACA LUELLA EN EL VÍA TANELA-TITUMATE -230 m	\$58.436	55,0%													
SECCIÓN 1- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO REFORZADO L=10 m, A=5 m, 54 m - SOBRE LA VÍA TANELA-TITUMATE	\$432.434	40,50%													
SECCIÓN 3- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	\$46.333	4,40%													
TOTAL OTROS ITEMS															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 1.067.862,30	100,00%													

Para este proyecto se establece que de acuerdo a la programación de obra entregada por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance:

PROGRAMADO: 72.68%

EJECUTADO: 64.44%

De acuerdo a los porcentajes de avance del proyecto a la fecha tiene un atraso del **8.24%**, el cual se debe al bajo rendimiento por el clima y las inundaciones en las obras sobre el Puente Capitán.

3.4.4 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Cementerio (Municipio de Litoral del San Juan).

Este proyecto se encuentra terminado y ya se realizó el pago del 90% del total del contrato. En este momento se encuentra en fase de realización de trámites para su liquidación.

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

3.4.5 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Relleno Sanitario en la Vereda la Arboleda (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3
	Miles de pesos			2 Valor programado			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3 Valor Ejecutado			
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado	14 abril - 14 mayo 2023	14 mayo - 14 junio 2023	14 junio - 14 julio 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	\$241.092.097	93,10%		% P		50,00%	50,00%
				S P		\$120.546.049	\$120.546.049
				S E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$3.350.000	1,29%		% E	100,00%		
				S P	\$3.350.000		
				S E			
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	\$2.109.649	0,81%		% P	33,33%	33,33%	33,33%
				S P	\$703.216	\$703.216	\$703.216
				S E			
				% E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$2.410.921	0,93%		% P		60,00%	50,00%
				S P		\$1.205.461	\$1.205.461
				S E			
				% E			
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	\$10.000.000,00	3,86%		% P	0,97%	0,97%	0,97%
				S P	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333
				S E			
				% E			
GPP6				% P			
				S P			
				S E			
				% E			
TOTAL OTROS ÍTEMES				% P			
				S P			
				S E			
				% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	258.962.667	100%		% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				%	2,85%	48,57%	48,57%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$7.386.550	\$125.788.059	\$125.788.059
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				%	2,85%	51,43%	100,00%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$7.386.550	\$133.174.608	\$258.962.667

Para este proyecto se establece que de acuerdo a la programación de obra entregada por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance:

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

De acuerdo a los porcentajes de avance de la programación se establece que el proyecto a la fecha tiene un avance ejecutado del 100%, cumpliendo así con el objeto contractual.

Los controles de avance a la programación de obra se realizaron semanalmente estableciendo si existe atraso o adelanto.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

3.5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Se anexan los siguientes formatos diligenciados para los contratos de obra No. 005 - 2022 (Municipio de El Cantón de San pablo), No. SAMC – 009 - 2022 (Municipio de Atrato), No 1050-15-103-2022-073 (Municipio de Unguía), No MLSJ-LPN-009-2022 (Municipio Litoral de San Juan) y No 154 – 2022 (Municipio de El Carmen de Atrato):

1. MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUALI OBRA.
2. MEPI-MNT-IN-2-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA.
3. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV.
4. MEPI-MIN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES.
5. MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA.
6. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION.
7. MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY.
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.
10. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA.
11. MEPI-MINI-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
12. MEPI-MIN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO.
13. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA.
14. MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - (VÍA YESITA – MANAGRÚ)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSION	1
			PÁGINA	

FECHA

9/10/23
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

UNIDAD EJECUTORA:

INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JANNIER SALAS QUEJADA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1.90 KM

Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita –Managré mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía objeto del proyecto se construya en concreto rígido y adicionalmente se construyan cuatro (4) obras de drenaje tip alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

MARTHA YENNY MENA MONRROY

INTERVENTOR:

CONSORCIO INCOLURBA

INTEGRANTES:

IVA

INTEGRANTES:

J. LEONARDO ERWIN ANDRÉS CHAVEZ ORTEGA

CONTRATO No.

MESP-SP-1-005-2022

CONTRATO No.

1101 DE 2022

FECHA DE INICIO:

16/05/22

FECHA DE INICIO:

21/02/22

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

03 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

HASTA 30 ABRIL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/05/23

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

HASTA 30 ABRIL 2023

VALOR ADICIONES:

\$ 3.345.499.000,00

VALOR ADICIONES:

\$ 773.639.801,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 3.345.499.000,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 773.639.801,00

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 3.345.499.000			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 3.345.210.235,42	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 2.072.288.116,79	61,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.410.169.984,78	42,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 892.118.132,02	19,8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	0%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2.072.288.116,79	61,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.410.169.984,78	42,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 892.118.132,02	19,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 117.169.416,94	3,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 89.229.724,71	1,16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

=

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

SIN RADICADO

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	\$ 1.003.563.070,63
Amortizado \$	\$ -
Saldo \$	\$ 1.003.563.070,63

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

61,95%

Avance o Atraso Físico %

19,78%

Meta Física Ejecutada %

42,15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm))	UN	4			Prog		4,00		\$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		\$ 17.164.800,00	15%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) m	ML	1432,92			Prog		1.432,92		\$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			-
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		\$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		\$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		1
Volqueta		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FUENTES DE MATERIALES			IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	ZONAS DE DEPÓSITO SI			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI			
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI			
OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			CONCESIÓN DE AGUAS: SI			
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI			
			VERTIMENTOS: SI			
			EMISIONES: SI			
			OTROS (Especificar cual) SI			
			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:			
ESTADO:						
V. GESTIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	6	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						
VI. GESTIÓN PREDIAL			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NO SE REQUIERE					
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NO SE REQUIERE					
AVALÚOS APROBADOS:	NO SE REQUIERE					
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NO SE REQUIERE					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos.						
2. El contratista realizó Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.						
3. El contratista realizó excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma.						
4. El contratista realizó trabajos previos para la Construcción de Pavimento.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
1. Acopio de material de cantera para llenos.						
2. Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.						
3. Aplicación de concreto para Pavimento.						
4. Construcción de Alcantarilla.						
5. Construcción de pavimento.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.			Construcción de Alcantarilla.		Construcción de Pavimento.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.			FIRMA			
			NOMBRE:			
			Matrícula Profesional No.:			
			MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA			
			2520278504 CND			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.						
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
.....
UBICACIÓN:
.....

PERMISO MINERO: SI NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X
PERMISO MINERO: SI NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A.....

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PEDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos.
2. El contratista realizó Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.
3. El contratista realizó excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma.
4. El contratista realizó trabajos previos para la Construcción de Pavimento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Acopio de material de cantera para llenos.
2. Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.
3. Aplicación de concreto para Pavimento.
4. Construcción de Alcantarilla.
5. Construcción de pavimento.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.



Construcción de Alcantarilla.




Construcción de Pavimento.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA

23/10/23
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN	
PROYECTO:	EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ
SEMANA No.: 39 del 16/10/23 al 22/10/23 Último Informe Semanal Si ☐	
(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENORÍA:	JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM	
Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita -Managurú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó	

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía objeto del proyecto se construirá en concreto rígido y adicionalmente se construirán cuatro (4) obras de drenaje tipo alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:

[illegible]**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCO-LURBA		
INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO NO:	1101 DE 2022		
FECHA DE INICIO:	21/02/22	VALOR INICIAL:	\$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 773.639.801,00
		VALOR ANTICIPO:	\$ -
		VALOR AMORTIZADO:	\$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 3.345.499.000			
	RECURSOS POR VIGENCIA				
INTERVENTORA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 3,345,210,236.42
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA: CUMULADA (B):	\$ 2,296,626,950.68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2,296,626,950.68
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 67.1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 271,146,356.97
(Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)	\$ 271,146,356.97
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2,296,626,950.68
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2,296,626,950.68
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 68.71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 117,169,416.84
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 72,347,870.00
	\$ 61.76%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 1.003.563.070,63
Amortizado \$	\$ -
Saldo \$	\$ 1.003.563.070,63

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 773,639,801.00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
Observaciones:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	68.71%	Avance o Atraso Físico %	20.06%
Meta Física Ejecutada %	48.65%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m. D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		\$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,80		\$ 17.164.800,00	15%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		\$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		\$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		\$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Volqueta		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FUENTES DE MATERIALES			IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	ZONAS DE DEPÓSITO SI			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI			
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI			
OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:			
ESTADO:			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
V. GESTIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 OBRA 6			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
AVALÚOS APROBADOS:			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos. 2. El contratista realizó Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado. 3. El contratista realizó excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma. 4. El contratista realizó trabajos previos para la Construcción de Pavimento.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
1. Acopio de material de cantera para llenos. 2. Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado. 3. Aplicación de concreto para Pavimento. 4. Construcción de Alcantarilla. 5. Construcción de pavimento.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado.		Construcción de Alcantarilla.		Construcción de Pavimento.		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA						
1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
				FIRMA _____		
				NOMBRE: _____		
				Matrícula Profesional No.: _____		
				MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA		
				2520278504 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

FECHA

30/10/23
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN	
PROYECTO:	EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ
SEMANA No.: 40 del 23/10/23 al 29/10/23 Último Informe Semanal Si ☐	
(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENORÍA:	JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM	
Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita -Managurú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó	

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía objeto del proyecto se construirá en concreto rígido y adicionalmente se construirán cuatro (4) obras de drenaje tipo alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONROY	INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOLURBA
INTEGRANTES:	INCOBOL	INTEGRANTES:	R. LEGAL EDWIN ANDRÉS PARRALES OLIVERA
CONTRATO No:	1191 DE 2022	CONTRATO No:	1191 DE 2022
FECHA DE INICIO:	16/01/23	FECHA DE INICIO:	20/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/23	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/23	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/23
	VALOR INICIAL		VALOR INICIAL
	VALOR ADICIONES:		VALOR ADICIONES:
	VALOR ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:
			VALOR ANTICIPO:
			VALOR AMORTIZADO:
			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.345.499,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			\$ 1.627.521,355
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 3.345.499,000			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 3.345.210.235,42
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 2.403.118.700,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2.403.118.700,00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 0,00
(Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)	\$ 0,00
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2.403.118.700,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.403.118.700,00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 0,00
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 117.169.416,84
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 97.536.072,00

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 1.003.563.070,63
Amortizado \$	\$ -
Saldo \$	\$ 1.003.563.070,63

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

	SI	NO
--	----	----

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	71.84%	Avance o Atraso Físico %	17.28%
Meta Física Ejecutada %	54.56%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		\$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		\$ 17.164.800,00	15%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		\$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		\$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		\$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Volqueta		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Fuentes de Materiales				IV. Gestión Ambiental			
Ubicación:	Permiso Minero:	SI	DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A
	Licencia Ambiental:	SI	NO	Zonas de Depósito	SI	NO	N/A
Ubicación:	Permiso Minero:	SI	NO	Licencia Ambiental:	SI	NO	N/A
	Licencia Ambiental:	SI	NO	Aprovechamiento Forestal:	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA				OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:			
ESTADO: EL DOCUMENTO P.A.G.A YA SE RADICÓ EN INVIAS							
V. Gestión Social				OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	6	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:							
VI. Gestión Predial				OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NO SE REQUIERE						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NO SE REQUIERE						
AVALÚOS APROBADOS:	NO SE REQUIERE						
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NO SE REQUIERE						
VII. Gestión de Sostenibilidad							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos. 2. El contratista realizó Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado. 3. El contratista realizó excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma. 4. El contratista realizó trabajos previos para la Construcción de Pavimento.							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
1. Acopio de material de cantera para llenos. 2. Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado. 3. Aplicación de concreto para Pavimento. 4. Construcción de Alcantarilla. 5. Construcción de pavimento.							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Lleno con material seleccionado, sub-base granular clase A y compactado; excavación para construcción de alcantarilla.		Construcción de Alcantarilla.		Construcción de Pavimento.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.							
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.				FIRMA NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	06/07/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15655 DE 20/09/2022 **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 53600007167 **BANCO** BANCOLOMBIA S.A **SUCURSAL:** QUIBDO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 %
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 1.003.649.700,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.

CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONRROY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Facturas			MARTHA YENNY MENA MONRROY	\$ 297.898.231,93	1	Compra de Materiales Herramientas e Insumos
Cuentas de cobro			MARTHA YENNY MENA MONRROY	\$ 139.490.000,00	2	Pago de Mano de obra, Salarios y Prestaciones
Factura	BOTD154269	23-mar-23	MARTHA YENNY MENA MONRROY	\$ 120.000.000,00	3	Transporte, Compra y Alquiler de Maquinaria y Equipos
Cuentas de cobro			MARTHA YENNY MENA MONRROY	\$ 30.000.000,00	4	Gastos Administrativos (Oficina, Campamento y Servicios Públicos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de Materiales Herramientas e Insumos	\$ 620.000.000,00		\$ 297.898.231,93	\$ 297.898.231,93	\$ 322.101.768,07
2	Pago de Mano de obra, Salarios y Prestaciones	\$ 180.000.000,00		\$ 139.490.000,00	\$ 139.490.000,00	\$ 40.510.000,00
3	Transporte, Compra y Alquiler de Maquinaria y Equipos	\$ 120.000.000,00		\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ -
4	Gastos Administrativos (Oficina, Campamento y Servicios Públicos	\$ 83.649.700,00		\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 53.649.700,00
TOTALES		\$ 1.003.649.700,00		\$ 587.388.231,93		\$ 416.261.468,07

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () : \$ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)


RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO


(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma: 

Nombre: MARTHA YENNY MENA MONRROY
 Contratista
 Matriculación Profesional No.: 05202-144528 ANT

Firma: 

Nombre: HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
 Interventor
 Matriculación Profesional No.: _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

	FECHA
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES	
CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 (Indicar número y año)	CONTRATISTA: _____

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL-URBA (REP. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA)
--	--

JUSTIFICACIÓN:

 (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra de materiales, herramientas e insumos	\$ 270.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 620.000.000,00	62%
2	Pago de mano de obra, salarios y prestaciones	\$ 75.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 180.000.000,00	18%
3	Transporte y compra de maquinaria	\$ 53.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 120.000.000,00	12%
4	Gastos Administrativos (Oficina, Campamento y Servicios Públicos)	\$ 22.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 17.649.700,00	\$ 83.649.700,00	8%
TOTAL						\$ 1.003.649.700,00	100%

NOTAS:

- El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
- El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
- Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
- No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
- El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
- Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Nombre: MARTHA YENNY MENA MONRROY Representante Legal o su Apoderado: MARTHA YENNY MENA MONRROY Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-144528 ANT	Firma: Nombre: CONSORCIO INCOL-URBA Representante Legal o su Apoderado: EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA Interventor Matrícula Profesional No.:
--	---

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA			30	9	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2022 CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONRROY

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

FECHA DE INICIO: 16/01/23

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/05/23
(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUALIZADO: 31/12/23
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 3 345.499.035,00

VALOR ACUMULADO: \$ 3 345.499.035,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL - URBA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento		\$ 869.003.503,00	19	9	2022	19	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 4.345.017.515,00	19	9	2022	19	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 869.003.503,00	19	9	2022	19	5	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	\$ 869.003.503,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-40-101033683

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21 SEPTIEMBRE DE ##

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 200.000.000,00	19	9	2022	19	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 55-40-101033683 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	9	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:1.....

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 869.003.503,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 4.345.017.515,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 869.003.503,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	\$ 869.003.503,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
16	1	2023	16	1	2024
16	1	2023	16	1	2024
16	1	2023	15	9	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.55-44101073729.....

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS DEL ESTADO S.A.....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:1.....

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 869.003.503,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 4.345.017.515,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 869.003.503,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	\$ 869.003.503,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
16	1	2023	16	7	2024
16	1	2023	16	7	2024
16	1	2023	15	3	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.55-44101073729.....

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS DEL ESTADO S.A.....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:2.....

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 869.003.503,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 4.345.017.515,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 869.003.503,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	\$ 869.003.503,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
16	1	2023	19	7	2023
16	1	2023	19	7	2023
16	1	2023	19	5	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.55-44101073729.....

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS DEL ESTADO S.A.....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

	FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:
MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.


 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Miguel Rodríguez
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONTRATO DE OBRA No: 005 DE 2022	CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONDRÓY
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2022	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL - URBIA

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	
1	JHON EMILSON MOSQUERA PESTAÑA	1010049631	OFICIAL	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	COOSALOD ESS	7878430461	\$ 125.000	COLPENSIONES	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
2	MILDOGNO SANTO HINESTROZA FLORES	914205683	OFICIA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	COMFACHOCO	7878430461	\$ 125.000	COLPENSIONES	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
3	LUZ OMARA ASPRILLA ARBOLEDA	29607996	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	EPS COOSALUD	7878430461	\$ 125.000	PROTECCION	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
4	JOSE DOLORES HURTADO GARCIA	7709346	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	EPS COOSALUD	7878430461	\$ 125.000	COLPENSIONES	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
5	JESUS ARTURO HINESTROZA HINESTROZA	9094719	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	NUEVA EPS	7878430461	\$ 125.000	PORVENIR	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
6	PEDRO ERIN PALACIOS MOSQUERA	11894860	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	COMFACHOCO	7878430461	\$ 125.000	COLFONDO	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
7	JESUS ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	12921036	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	EPS SANTAS	7878430461	\$ 125.000	PORVENIR	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
8	JESUS IRIBN MURILLO MURILLO	4836354	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	COMFACHOCO	7878430461	\$ 125.000	PORVENIR	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
9	CARLOS ARIEL VALOYES URRUTIA	11860726	OPERADOR	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	NUEVA EPS	7878430461	\$ 125.000	COLPENSIONES	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
10	JOSE FRANCISCO SANCHEZ MOSQUERA	1030421630	OPERADOR	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTHA YENNY MENA MONROY	30	\$ 160.000	EPS SALUD TOTAL	7878430461	\$ 125.000	PORVENIR	7878430461	\$ 125.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000			
11	JHONNY ANYELINE MOSQUERA MENeses	1076821274	PALETERA	\$ 1.000.000																																											

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: Miguel Rodríguez
Director de Obra _____	Director de Interventoría _____
Matrícula Profesional No.: _____	Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901520668	NÚMERO PLANILLA:	7878430461	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EL CANTON DEL SAN PABLO	DEPARTAMENTO:	MARTHA YENNY MENA MORROY	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CUDDA/MUNICIPIO:	CALLE 24 # 12 - 86	TÉLEFONO:	CHOCO	DÍAS DE MORA:	43	MES noviembre	AÑO
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	115033300
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MORA		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE				COTIZACIÓN	FSP			
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.100	\$ 0	\$ 800.000	\$ 40.100	\$ 840.100
230301	230301-PORVENIR	9	\$ 1.357.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.000	\$ 0	\$ 1.357.400	\$ 68.000	\$ 1.425.400
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.100	\$ 0	\$ 160.000	\$ 8.100	\$ 168.100
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.100	\$ 0	\$ 320.000	\$ 16.100	\$ 336.100
SUBTOTALES:											\$ 2.637.400	\$ 132.300	\$ 2.769.700

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EP5037	EP5037- NUEVA EPS	8	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 935.500	\$ 0	\$ 46.900	\$ 0	\$ 935.500	\$ 46.900	\$ 0		\$ 982.400	
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	2	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 12.600	\$ 0	\$ 250.000	\$ 12.600	\$ 0		\$ 262.600	
EP5042	EP5042- COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 6.300	\$ 0	\$ 125.000	\$ 6.300	\$ 0		\$ 131.300	
EP5005	EP5005-SANITAS S.A.	2	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 12.600	\$ 0	\$ 250.000	\$ 12.600	\$ 0		\$ 262.600	
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 12.600	\$ 0	\$ 250.000	\$ 12.600	\$ 0		\$ 262.600	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 6.300	\$ 0	\$ 125.000	\$ 6.300	\$ 0		\$ 131.300	
EP5041	NUEVA EPS CM	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 6.300	\$ 0	\$ 125.000	\$ 6.300	\$ 0		\$ 131.300	
SUBTOTALES:													\$ 2.060.500	\$ 103.600	\$ 0		\$ 2.164.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RPP	PAGO A OTROS RIESGOS			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR			PLANILLA	VALOR		COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-11	14-11 - ARL SURA	17			\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 1.147.300	\$ 1.147.300	\$ 57.500	\$ 0	\$ 1.204.800
SUBTOTALES:										\$ 1.147.300	\$ 1.147.300	\$ 57.500	\$ 0	\$ 1.204.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	17	\$ 659.400	\$ 33.100	\$ 692.500
SUBTOTALES:			\$ 659.400	\$ 33.100	\$ 692.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	17	\$ 494.600	\$ 24.800	\$ 519.400	
PASENA	PASENA - SENA	17	\$ 329.700	\$ 16.600	\$ 346.300	
SUBTOTALES:			\$ 824.300	\$ 41.400	\$ 865.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES											
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES				SEGURIDAD SOCIAL			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE COTIZACIÓN	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1	CC 1007059430	VALENCIA	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	231001- COLFONDOS	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
2	CC 1010049631	ANGEL MOSQUERA	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	25-14 COLPENSIONES	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
3	CC 1010057333	PREMIANA JIMENEZ	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	230301- PORVENIR	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
4	CC 1030421630	SANCHEZ MOSQUERA JOSE	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	230301- PORVENIR	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
5	CC 1076821274	FRANCISCO MOSQUERA MENESSES	DEFEND	\$ 1.116.600	FILIO	NO	230301- PORVENIR	43	\$ 483.600	\$ 77.400	\$ 0
6	CC 11800726	VALDES LINDA CARLOS	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	25-14 COLPENSIONES	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
7	CC 11800908	SALAMANDEIRO A MARTINEZ	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	230301- PORVENIR	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
8	CC 11804860	PAJALOS MOSQUERA PERDUELO	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	231001- COLFONDOS	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
9	CC 1193229074	VIVAS GUPTO MARIA CAMILA	DEFEND	\$ 1.000.000	FILIO	NO	25-14 COLPENSIONES	33	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901520668	NÚMERO PLANILLA:	7878430461	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	E-EMPLEADOS	2023		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EL CANTON DEL SAN PABLO	DEPARTAMENTO:	MARTHA YENNY MENA MONROY	PERIODO COTIZACIÓN OTROS															
Ciudad/Municipio:	CALLE 24 # 12 - 86	TELÉFONO:	CHOCO	DÍAS DE MORA:															
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6716884	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:													
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES																
TIPO EMPRESA:	UNICO		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras																
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CC COTIZANTE	EXTRANEER	TRABAJA	ING	REF	IDE	TA	TP	CD	CD	CD	CD	CD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VST	SLN	COM	IDE	LVA	VAC	AVP	AVP	IRP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										ADMIN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR	TOTAL	ADMIN	SALUD		ARP		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DAS TOT	IBC	COTIZACIÓN	T



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 31/10/23
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
CONTRATO No. 005 DE 2022 CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONROY
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INCOL - URBA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA					A	A	A	I	I			A	I	A	A	R				A	A	R	I			A	A	A	I	I			I	A
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA					A	A	A	A	A			A	I	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
VOLQUETA					A	A	A	I	A			A	I	A	A	A				R	R	A	A			A	A	A	A	A			A	A
VOLQUETA					I	I	A	A	I			A	A	A	A	I				A	A	I	A			A	A	A	I	A			A	I
VOLQUETA					R	A	A	A	A			I	A	I	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	I
VOLQUETA					R	A	R	I	A			A	R	R	R	A				A	A	A	A			I	I	A	A	A			A	I
VOLQUETA					A	A	A	A	A			A	I	I	R	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	R
MOTONIVELADORA					I	I	I	I	I			I	R	A	R	I				I	I	I	I			I	I	I	I	I			I	R
MINICARGADOR					I	A	A	A	A			A	A	A	I	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
VIBRO COMPACTADOR					I	I	I	I	A			A	A	A	A	I				I	I	I	I			I	I	A	A	A			A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
TOTAL ACTIVO				4	7	7	5	7				8	4	7	6	6				7	7	6	7			7	7	9	7	8			8	5
TOTAL EN REPARACIÓN				2	0	1	0	0				0	2	1	3	1				1	1	1	0			0	0	0	0	0			0	2
TOTAL INACTIVO				4	3	2	5	3				2	4	2	1	3				2	2	3	3			3	3	1	3	2			2	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5,56	56%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,6	6%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2,24	22%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
- Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
- Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
- En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Joel Yesid Rivas Robledo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0549060 ANT

Firma
Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202178259ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	


FECHA			31/10/23 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	

CONTRATO DE OBRA No: 005 DE 2022	CONTRATISTA: MARTA YENNY MENA MONRROY
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL - URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	22	21	19	19	24	24	24	24	18	24	24	24	24	19	17	22	24	24	24	22	24	700,5
Lluvias moderadas										3	2	1,5		5										5	4	2				1		23,5
Lluvias intensas										2		2	5,5						6						3,5					1		20
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma 

Nombre: Onel Emilson Chalá Lemus

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma 

Nombre: Edwin Ariel Moreno

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202178259ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		


FECHA			31/10/23 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	

CONTRATO DE OBRA No: 005 DE 2022	CONTRATISTA: MARTA YENNY MENA MONRROY
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL - URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	22	21	19	19	24	24	24	24	18	24	24	24	24	19	17	22	24	24	24	22	24	700,5
Lluvias moderadas										3	2	1,5		5										5	4	2				1		23,5
Lluvias intensas										2		2	5,5						6						3,5					1		20
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma 

Nombre: Onel Emilson Chalá Lemus
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma 

Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202178259ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA

MUNICIPIO DE UNGUÍA

(VÍA TANELA- TITUMATE)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		9/10/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Uguá en el Departamento de Chocó Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional"			
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO
SEMANA No.:		38 del 2	al 8 Último Informe Semanal SI ☒
(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		JANNIER SALAS QUEJADA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Uguá en el Departamento de Chocó Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional"	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Río Capitán en el sector de Penagos.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metálicas el cual requiere ser reemplazado.			

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	INTERVENTOR:	CONSORCIO INCON-URBA
INTEGRANTES:	HERMES CORDOBA CORDOBA	INTEGRANTES:	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
CONTRATO No.	1050-15-103-2022- 073	CONTRATO No.	1101 DE 2022
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2022	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE NOVIEMBRE 2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.096.413.139		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.096.413.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 846.349.930,93	79,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 554.867.315,06	50,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 291.482.615,87	28,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 56.845	5,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 18.554	1,74%
SI NO		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:	agosto	
VALOR FACTURA:	\$ 143.687.771,00	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones:		

ANTICIPOS	
Otorgado \$	281.663.443
Amortizado \$	123.177.642,60
Saldo \$	158.485.800,40

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	130.023.496
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	79%	Avance o Atraso Físico %	28%
Meta Física Ejecutada %	51%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo se realizo la excavacion de pilas cimentacion y se realizo en vaciado de una pila de cimentacion, no se pudo vaciar otra pila por los inconvenientes por la lluvia que aumentaron el nivel del agua en el rio capitán

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se beda continuar con las excavaciones, concreto para las pilas de cimentacion y figurado y armado de acero para las zapatas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
instalación de canastilla de acero para pilas de cimentación del puente	concreto para pilas de cimentación del puente	inconvenientes por el alto nivel del río capitán
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
la interventoría realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construccion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el río capitán		
		FIRMA
		NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
		Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

16/10/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

UNIDAD EJECUTORA:

INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

SEMANA No.:

40 del 9 al 15

Último Informe Semanal SI

☒

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JANNIER SALAS QUEJADA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL

(Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Río Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metálicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

INTERVENIENTOR:

CONSORCIO INCON-URBA

INTEGRANTES:

HERMES CORDOBA CORDOBA

EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA

CONTRATO No.

1050-15-103-2022- 073

VALOR INICIAL:

\$ 938.878.144.00

FECHA DE INICIO:

22 DE DICIEMBRE 2022

VALOR ADICIONES:

\$ 1101 DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

22 DE ABRIL 2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.096.413.139.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

22 DE NOVIEMBRE 2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.096.413.139.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

HASTA EL 30 DE ABRIL 2023

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

VALOR POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.096.413.139		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.096.413.139.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 903.194.682.95 84.51%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 576.588.071.86 52.85%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 326.606.611.09 31.66%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 56.845 5.30%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 21.720 2.03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: agosto

VALOR FACTURA: \$ 143.687.771.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ - %

PROGRAMADA: \$ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTIPOIS

Otorgado \$ 281.663.443

Amortizado \$ 123.177.642,60

Saldo \$ 158.485.800,40

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTIPOIS

Otorgado \$ 130,023,496

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85% Avance o Atraso Físico % 28%

Meta Física Ejecutada % 53%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11 4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6 2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1 2

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVARSE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE

FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE

AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE

PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE

OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo se realizo la excavacion de pilas cimentacion y se realizo el vaciado de una pila de cimentacion para completar las dos del lado norte del puente, el el lado sur del puente no se ha terminado la excavacion de las pilas debido a el alto nivel de las aguas del rio caiptan, esto imposibilita los trabajos de excavacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se beda continuar con las excavaciones, concreto para las pilas de cimentacion y figurado y armado de acero para las zapatas del lado norte del puente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
instalacion de pilas de cimentacion del puente	concreto para pilas de cimentacion del puente	localizacion de zapata lado norte del puente
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construccion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitán		<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA</div> <div>Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

23/10/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Uguá en el Departamento de Chocó Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional"

UNIDAD EJECUTORA:

INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

SEMANA No.:

41

del

16

al

22

Último Informe Semanal SI

☒

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JANNIER SALAS QUEJADA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Uguá en el Departamento de Chocó Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Río Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metálicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
INTEGRANTES: HERMES CORDOBA CORDOBA
CONTRATO No. 1050-15-103-2022- 073
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 22 DE ABRIL 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22 DE NOVIEMBRE 2023

INTERVENTOR:

CONSORCIO INCON-URBA
INTEGRANTES: EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
CONTRATO No. 1101 DE 2022
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 30 DE ABRIL 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 30 DE ABRIL 2023

VALOR INICIAL: \$ 938.878.144,00
VALOR ADICIONES: \$ 157.534.995,00
VALOR ACUMULADO: \$ 1.096.413.139,00
VALOR ANTICIPO: \$ -
VALOR AMORTIZADO: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.096.413.139		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.096.413.139,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 960.039.434,96 89,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 596.116.555,83 54,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 363.922.879,13 35,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 56.845 5,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 19.526 1,83%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: agosto
VALOR FACTURA: \$ 143.687.771,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ -
PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ 281.663.443
Amortizado \$ 123.177.642,60
Saldo \$ 158.485.800,40

INDICADOR I/C
En el mes:
Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$ 130.023.496
Amortizado \$
Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89%
Meta Física Ejecutada % 55%
Avance o Atraso Físico % 25%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista
OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4

NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO Para EJECUTAR EL PROYECTOIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE
OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo se realizo la instalacion de concreto para solado de la zapata del lado norte del puente y se realizo el amarre del hierro de la zapata

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se debe realizar la instalacion de concreto para la zapata y terminar las excavaciones de las pilas de cimenacion del lado sur del puente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div><p>instalacion de acero de la zapata</p></div><div><p>hacero para zapatas</p></div><div><p>zapata norte del puente sobre el río capitán</p></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construccion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el río capitán	<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA</div><div>Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.	

[illegible]

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
en este periodo se realizo la instalacion de concreto para la zapata del lado norte del puente sobre el rio capitán		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
terminar las excavaciones de las pilas de cimentacion del lado sur del puente e instalacion de concreto para las pilas de cimentacion lado sur del puente sobre el rio capitán		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
limpieza de acero para la instalacion del concreto	instalacion de concreto	zapata norte del puente sobre el rio capitán
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construccion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitán		<div>FIRMA: </div> <div>NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA</div> <div>Matricula Profesional No.: 2520278504 CND</div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/10/23
(Día / Mes / Año)
1 de 3

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.10....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No.1050-15-103-2022- 073
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1110 DE 2022....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Reprogramacion de obra
Implementacion de plan de contingencia
Dificultades en el avance de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Reprogramacion de obra
Implementacion de plan de contingencia
Dificultades en el avance de obra



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/10/23

(Día / Mes / Año)

2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

R.I. Carlos Mosquera: dando cumplimiento al seguimiento técnico y administrativo del contrato en mención es preocupante para la interventoría que no se pueda cumplir con el alcance del proyecto en los tiempos estipulados, de igual forma se entiende que los bajos rendimientos son por fuerza mayor como las continuas inundaciones que se presenta en la zona de trabajo pero de igual forma se necesita buscar metodologías o alternativas que nos ayuden a mejorar los rendimientos por lo tanto a cumplir con el alcance del proyecto

R.L. contratista Hermes Córdoba: en el desarrollo del proyecto me he encontrado con muchas dificultades en especial en la construcción del puente ya que se vienen presentando bastantes inundaciones donde se está trabajando, también se me presentan inconvenientes con la mano de obra calificada en la excavación de las pilas ya que en la zona de influencia del proyecto no se cuenta con personal calificado, por otro lado entiendo la preocupación de la interventoría en cuanto a el tema de los tiempos que no me alcanzarían para cumplir con el alcance, debo solicitar otra prórroga de tiempo para que me pueda alcanzar para ejecutar las actividades contractuales, esta solicitud de prórroga está fundamentada en los inconvenientes que se han presentado a lo largo de ejecución y que son ajenos a nuestra voluntad como contratista

R.I. Carlos Mosquera, por parte de la interventoría se le solicita que como contratistas realice una reprogramación de obra y junto con ello elaborar un plan de contingencia donde se especifique las acciones que van a permitir un mejor rendimiento en la obra

R.L. contratista Hermes Córdoba: en este sentido tomare todas las medidas necesarias y realizaré las acciones pertinentes para cumplir con los tiempos establecidos del contrato y acatando todas las sugerencias realizadas por la interventoría, además realizaré la reprogramación y el plan de contingencia



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/10/23
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

solicitud de prorroga	19/10/23	contratista
respuesta a solicitud de prorroga	23/10/23	interventoria

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15/11/23
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carlos Andres Mosquera	residente de interventoria	incon urba	
Hermes Cordoba	director de obra	inverconstrucciones s.a.s	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31/10/23 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO
-------------------	--------	------------------------	-------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	AGOSTO	PROYECTO:	"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
--------------------------------	--------	-----------	---

CONTRATO No.	1050-15-103-2022- 073	CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
---------------------	-----------------------	---------------------	--

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INCON-URBA

[illegible]

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A. EN REPARACIÓN= R. INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo de informacion se realizaron mantenimientos rutinarios a las maquinarias por temas mecanicos en especial de los frenos

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma _____
Nombre: ERIK YEINER LOZANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma 

Nombre: CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202298933 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/10/23 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 1050-15-103-2022- 073	CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S. "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio PDET de Unguía en el Departamento de Chocó"
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2022	PROYECTO: MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1110 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x		30
Lluvias moderadas												X			X				X	X			X		X	X	X	X	X			
Lluvias intensas																						X								X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma _____

Nombre: ERIK YEINER

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: _____


Firma  _____

Nombre: CARLOS ANDRES MOSQUERA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202298933

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.



UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:	

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesionalmente, el Interventor debe adelantar o adelantará tendencias a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de seguridad social cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DEPENDENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					
LICITACIÓN PÚBLICA	CMA-DTE-SEP-197-2021					
CONTRATO No:	1101 DE 2022.					
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-URBA					
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$773.639.801), IVA incluido					
ADICIONAL 1	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)					
ADICIONAL 2	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)					
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$873.639.801), IVA incluido					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023					
FECHA INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2022					
SUSPENSIÓN No.1	ABRIL 27 DE 2023					
PRORROGA No.1	TRES (3) MESES					
PRORROGA No.2	CINCO (5) MESES					
FECHA TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2023					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Número de póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Cumplimiento	Seguros del Estado	\$ 82.363.980	65-44-101213919	25/07/2022	30/01/2024
	Calidad del servicio	Seguros del Estado	\$ 247.091.940	65-44-101213919	30/04/2023	30/08/2028
	Salarios y prestaciones sociales.	Seguros del Estado	\$ 164.727.960	65-44-101213919	25/07/2022	30/07/2026
	Buen Manejo de Anticipo	Seguros del Estado	\$ 130.023.496	65-44-101213919	25/07/2022	30/01/2024

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

La Interventoría dentro de su proceso de verificación y control del proyecto realizo en el periodo de este informe las siguientes actividades:

- ✓ Actividades de campo conjuntamente con los contratistas de obra, realizando recorridos de los tramos a intervenir para verificar las cantidades reales de las obras construidas y a construir.
- ✓ La Interventoría hizo control con topografía a las excavaciones, llenos y compactado como el retiro y disposición final del material sobrante.
- ✓ La Interventoría estuvo atenta a que los contratistas cumplieran con todas las especificaciones técnicas en las actividades desarrolladas en el presente mes, acorde con lo estipulado en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito por él y la Alcaldía e Invias.
- ✓ Se atendió a los llamados de los contratistas para aclarar algunas dudas referentes a los trabajos que se llevan acabó en las diferentes obras y las posibles soluciones del cambio y replanteo de las misma con fines de mejorar y garantizar un buen funcionamiento de las obras de Arte.

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS.

Se han realizado actividades de revisión de los siguientes documentos PAGA:

- PAGA Atrato
- PAGA Litoral de San Juan
- PAGA Carmen de Atrato
- PAGA Cantón de San Pablo
- PAGA Unguía

5.4 INFORME PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

Frente a los municipios de **Cantón del San Pablo (Vía La Yesita – Managrú), Municipio de Atrato (Vía Yuto-Ramal Samurindó), Municipio del Litoral del San Juan (Vía al Cementerio) y el Carmen de Atrato Chocó**, de acuerdo al flujo de fondos de inversión y programación de obra se presentó el siguiente avance, los cuales presentamos a continuación:

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1.4.1. PAC - Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mil. de pesos	IX) OBRA PROGRAMADA	X) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	Programa Ejecutado	1	2	3	4	5	6																																												
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mil. de pesos				16 enero - 16 febrero 2023	16 febrero - 16 marzo 2023	16 marzo - 16 abril 2023	16 abril - 16 mayo 2023	Indicar mes y año	Indicar mes y año																																												
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA ENTUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7m, D=36" (900 mm.)	\$119.794.200	3,55%			1,18%	1,18%	1,18%	1,18%																																														
					\$39.548.100	\$39.548.100	\$39.548.100																																															
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	\$3.169.267.605	94,74%				31,88%	31,88%	31,88%																																														
						\$1.056.422.535	\$1.056.422.535	\$1.056.422.535																																														
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$18.045.000	0,54%						0,54%																																														
								\$18.045.000																																														
CARACTERIZACIÓN VIAL	\$1.520.000	0,05%			0,05%																																																	
					\$1.520.000																																																	
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	\$4.497.251,72	0,13%			0,03%	0,03%	0,03%	0,03%																																														
					\$1.124.313	\$1.124.313	\$1.124.313	\$1.124.313																																														
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$33.086.076,70	0,99%					0,49%	0,49%																																														
							\$16.543.039	\$16.543.039																																														
GPP7																																																						
GPP8																																																						
TOTAL OTROS ITEMS																																																						
VALOR BÁSICO DE OBRA [A]	\$ 3.345.210.235,42	100%																																																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO [A']																																																						
<table> <tr> <td colspan="2">INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>1,26%</td><td>32,80%</td><td>33,29%</td><td>32,65%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>VALOR (Millar de Pesos)</td><td>\$42.242.413</td><td>\$1.097.144.948</td><td>\$1.113.687.987</td><td>\$1.092.134.887</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>1,26%</td><td>34,06%</td><td>67,35%</td><td>100,00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>VALOR (Millar de Pesos)</td><td>\$42.242.413</td><td>\$1.139.387.361</td><td>\$2.253.075.348</td><td>\$3.345.210.235</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	1,26%	32,80%	33,29%	32,65%							VALOR (Millar de Pesos)	\$42.242.413	\$1.097.144.948	\$1.113.687.987	\$1.092.134.887					INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	1,26%	34,06%	67,35%	100,00%							VALOR (Millar de Pesos)	\$42.242.413	\$1.139.387.361	\$2.253.075.348	\$3.345.210.235				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	1,26%	32,80%	33,29%	32,65%																																																
		VALOR (Millar de Pesos)	\$42.242.413	\$1.097.144.948	\$1.113.687.987	\$1.092.134.887																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	1,26%	34,06%	67,35%	100,00%																																																
		VALOR (Millar de Pesos)	\$42.242.413	\$1.139.387.361	\$2.253.075.348	\$3.345.210.235																																																

PROGRAMADO: 71,82%

EJECUTADO: 54,56%

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1.4.2. 3.4.2. PAC - Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	PROGRAMADA Miles de pesos	PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor programada			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos			\$ Valor Ejecutada % Ejecutada	15 DICIEMBRE 2022 - 14 ENERO 2023	15 ENERO 2023 - 14 FEBRERO 2023	15 FEBRERO - 15 MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO ITEM(1,2,3,4,5,6 Y 7)	\$200.637.563	77,49%		%P	0,00%	0,00%	38,74%
				\$ P	\$0	\$0	\$100.318.782
				\$ E			
				%E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ITEM(2 Y 3)	\$5.624.468	2,17%		%P	0,00%	0,00%	2,17%
				\$ P	\$0	\$0	\$5.624.468
				\$ E			
				%E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS ITEM (4)	\$1.000.000	0,39%		%P	0,00%	0,00%	0,19%
				\$ P	\$0	\$0	\$500.000
				\$ E			
				%E			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ITEM(1)	\$10.000.000	3,86%		%P	0,00%	0,00%	1,33%
				\$ P	\$0	\$0	\$5.000.000
				\$ E			
				%E			
TOTAL OTROS ITEMS IP1 y IP2	\$41.669.320	16,09%		%P	0,00%	0,00%	8,05%
				\$ P	\$0	\$0	\$20.834.660
				\$ E			
				%E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 258.931.351,00	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,00%	0,00%	51,09%	
	VALOR (Miles de Pesos)			\$0	\$0	\$132.277.910	
	%			0,00%	0,00%	51,09%	
	VALOR (Miles de Pesos)			\$0	\$0,00	\$132.277.910,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						


PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

CONSORCIO INCOL-URABÁ
NIT 901609799-1

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1.4.3. 3.4.2. PAC - Vía al Cementerio (Municipio de Litoral del San Juan).

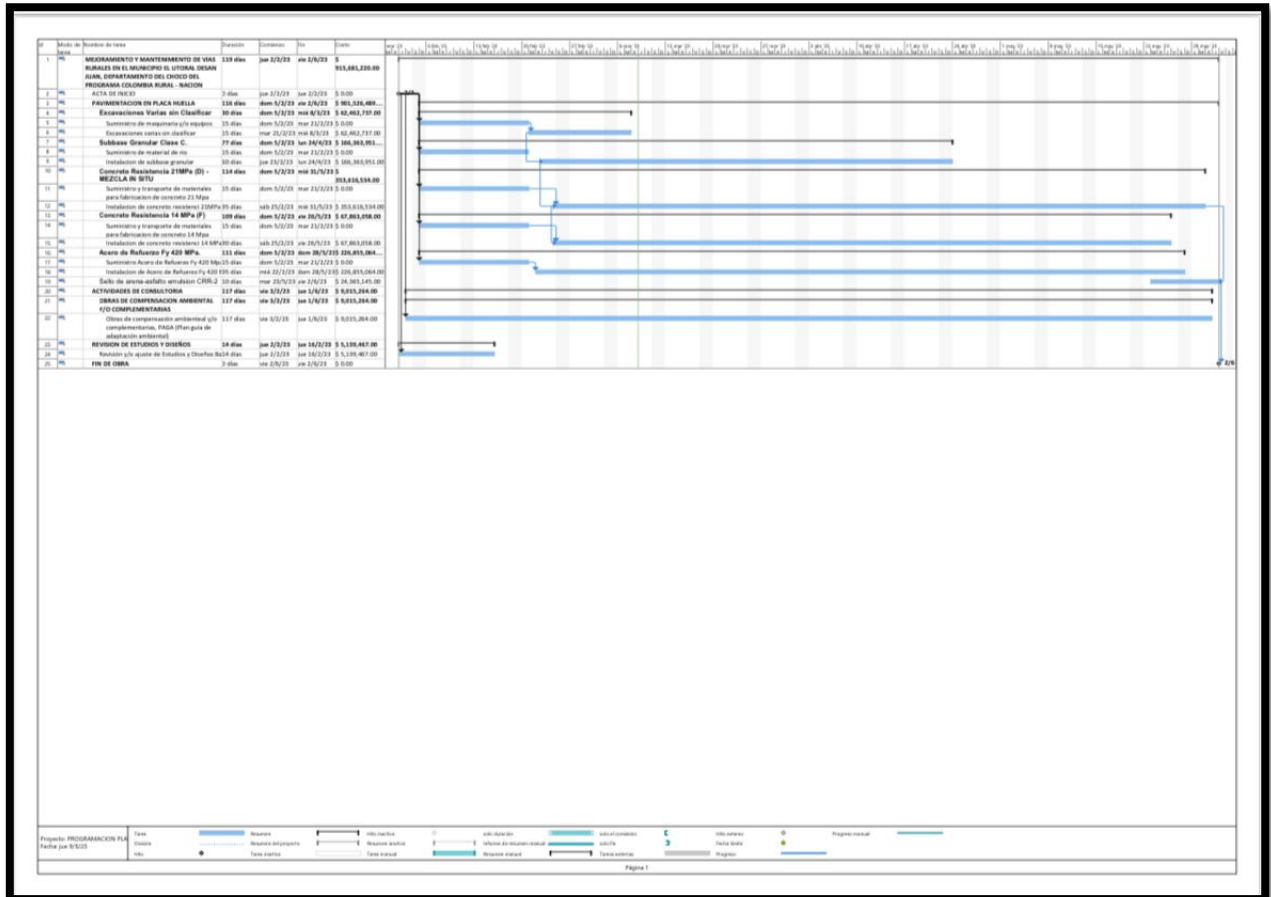

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

“Proyectos Confiables, Nuestro Compromiso”

Calle 49 Norte N° 8AN-100 PBX: (2) 6657793, Fax: (2) 6640017, Santiago de Cali -Colombia
Web www.diconsultoriaingenieros.com - e-mail contacto@diconsultoriaingenieros.com

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1.4.1. 3.4.2. PAC - Vía Tanela - Titumate (Municipio de Unguía).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(X) OBRA PROGRAMADA	(Y) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(X) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(Y) VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	Z	22/02/2022 AL 22/01/2023	23/01/2023 AL 22/02/2023	23/02/2023 AL 22/03/2023	23/03/2023 AL 22/04/2023	23/04/2023 AL 22/05/2023	23/05/2023 AL 22/06/2023	23/06/2023 AL 22/07/2023	23/07/2023 AL 22/08/2023	23/08/2023 AL 22/09/2023	23/09/2023 AL 22/10/2023	23/10/2023 AL 05/11/2024
SECCIÓN 1- CONSTRUCCIÓN DE PLACA UELLA EN EL VÍA TANELA-TITUMATE- 230 ml	\$588.436	55,0%		%P				7,87%	3,94%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%
				%P				\$54.651	\$12.652	\$54.651	\$54.651	\$54.651	\$54.651	\$54.651	\$54.651
				%E											
				%E											
SECCIÓN 1- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO REFORZADO L=10 m, A=7 m, 94 m - SOBRE LA VÍA TANELA-TITUMATE	\$432.434	40,50%		%P							5,08%	10,16%	10,16%	10,16%	5,08%
				%P							\$54.651	\$109.302	\$109.302	\$109.302	\$54.651
				%E											
				%E											
SECCIÓN 3- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	\$46.833	4,40%		%P										3,30%	1,10%
				%P										\$37.860	\$11.758
				%E											
				%E											
TOTAL OTROS ÍTEMES				%P											
				%P											
				%E											
				%E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 1.067.862,30	100,00%		%P											
				%P											
				%E											
				%E											

PROGRAMADO: 72,68%

EJECUTADO: 64,44%

CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1		
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

1.4.1. 3.4.2. PAC – Vía Relleno Sanitario en la Vereda la Arboleda (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	1	2	3
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	14 abril - 14 mayo 2023	14 mayo - 14 junio 2023	14 junio - 14 julio 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	\$241.092.097	93,10%		% P \$ P \$ E % E		50,00% \$120.546.049	50,00% \$120.546.049
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$3.350.000	1,29%		% P \$ P \$ E % E	100,00% \$3.350.000		
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	\$2.109.649	0,81%		% P \$ P \$ E % E	33,33% \$703.216	33,33% \$703.216	33,33% \$703.216
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$2.410.921	0,93%		% P \$ P \$ E % E		50,00% \$1.205.461	50,00% \$1.205.461
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	\$10.000.000,00	3,86%		% P \$ P \$ E % E	0,97% \$3.333.333	0,97% \$3.333.333	0,97% \$3.333.333
GPP6				% P \$ P \$ E % E			
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P \$ E % E			
VALOR BASICO DE OBRA (A)	258.962.667	100%		% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				%	2,85%	48,57%	48,57%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$7.386.550	\$125.788.059	\$125.788.059
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				%	2,85%	51,43%	100,00%
				VALOR (Miles de Pesos)	\$7.386.550	\$133.174.608	\$258.962.667

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.


6 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El personal de interventoría que laboró para este periodo fue el siguiente:

Cargo	Nombre	Fecha de vinculación
Director de Interventoría	Miguel Ángel Rodríguez Mantilla	07/12/2022
Residente de interventoría 1	Carlos Andrés Mosquera	25/01/2023
Residente de interventoría 2	Edwin Ariel Moreno	24/01/2023
Inspector de obra	Miguel Ángel Benítez	04/09/2023
Inspector SST	Laura Mosquera	04/10/2023
Secretaria	Carolina Carrillo	1/07/2023

Se anexan los siguientes formatos diligenciados por el personal de la Interventoría para el Contrato No 1101 de 2022:

1. MEPI-MN1-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INT.
2. MEPI-MINI-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT.
3. MEPI-MN1-IN-15-FR-1 LISTA CHEQUEO INFORME MENSUAL INT.
4. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVEN.
6. MEPI-MN1-IN- 15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT.
7. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT.
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INT.

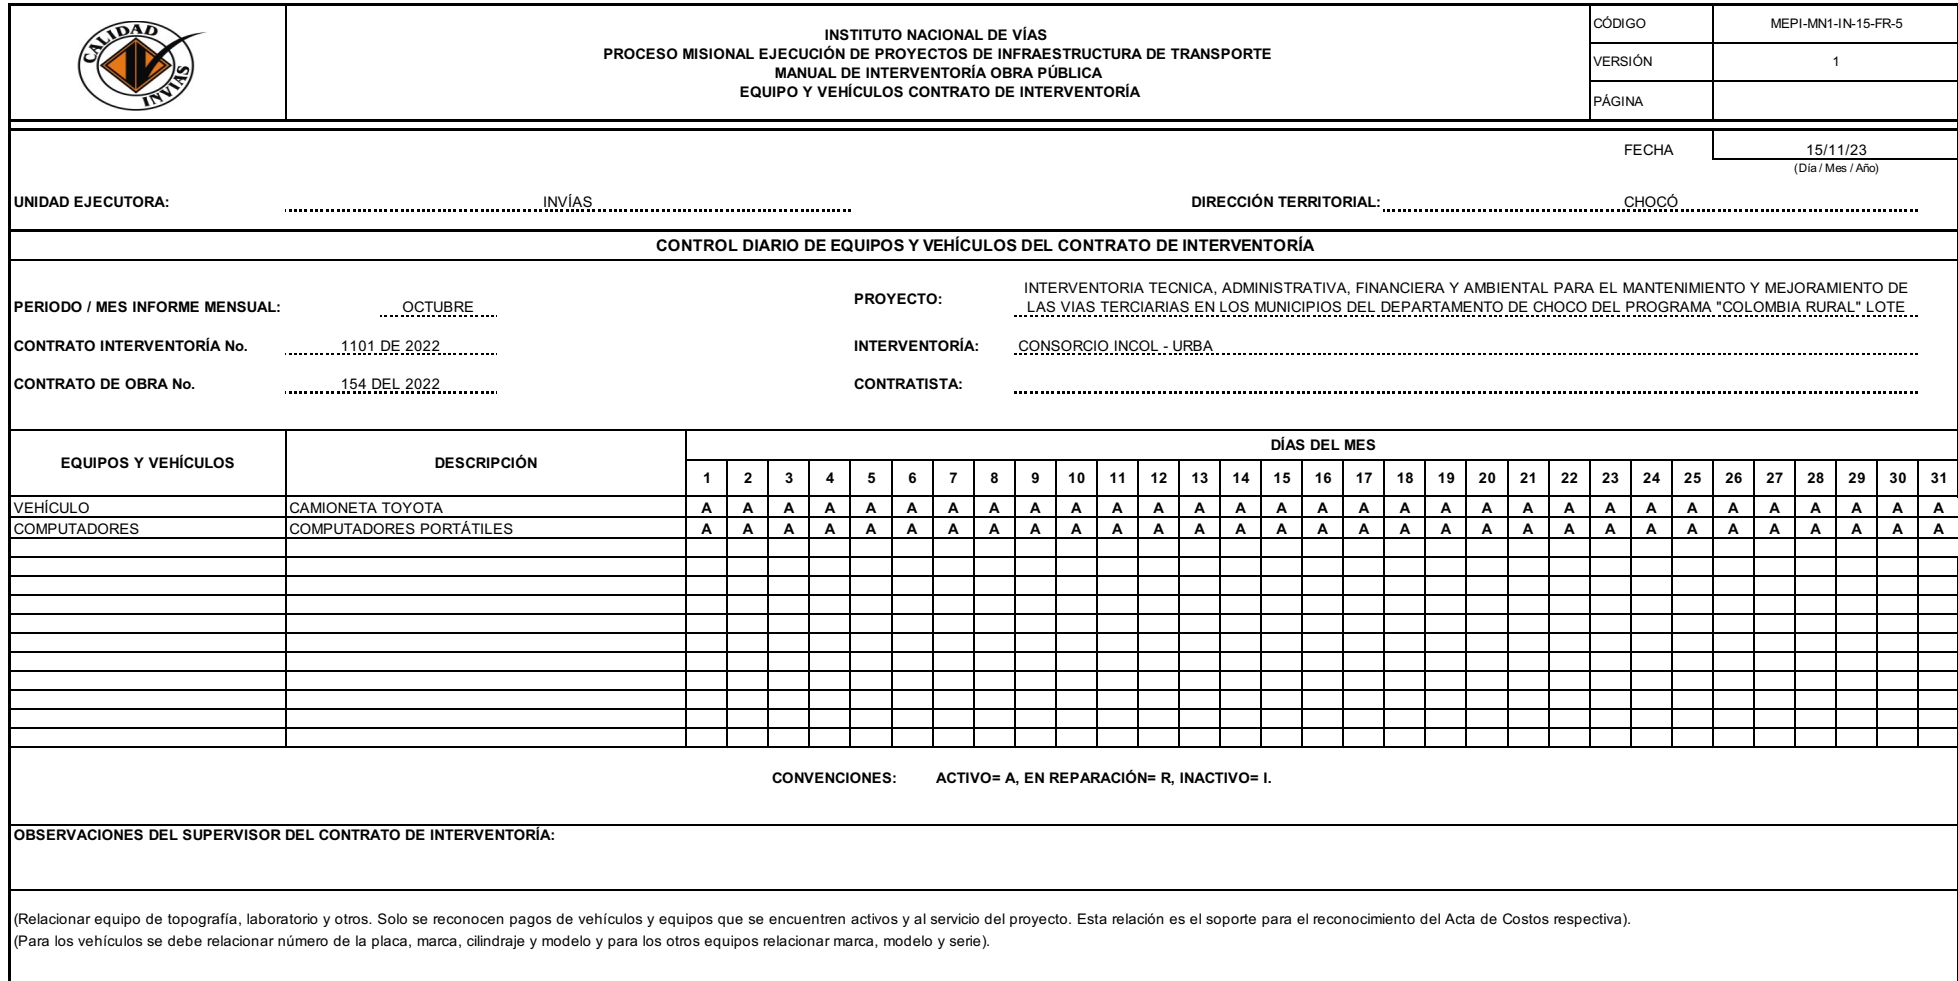



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 15/11/23
(Día / Mes / Año)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma


Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



FECHA	15/11/23 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	MOSP-SP-LP-005-2022 SAM-2000-2022 194-2022 1050-19-005-2022/073 ML-S-LP-000-2022	CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS CAMPO ELIAS PALOMEQUE INSTRUMENTACIONES METROSA CALZA S.A UNION TEMPORAL LITORAL
-----------------------	--	--------------	--

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/11/23 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato verificar la conformidad del personal profesional este debidamente acreditado y se cumple con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios, al momento de la ejecución del contrato, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


- ✓ El proyecto de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15 se encuentra previsto para la ejecución de obra en cinco (05) Municipios correspondiendo a Municipio de El Cantón de San Pablo (vía La Yesita-Managrú), Municipio de Unguía (vía Tanela- Titumate), Municipios de Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), Municipio de El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) Municipio Litoral de San Juan (Vía Cementerio), todos cinco (5) tienen acta de inicio tales como: El Cantón de San pablo (vía La Yesita-Managrú) a partir del 16 de enero de 2023, Unguía (vía Tanela- Titumate) a partir del 22 de diciembre de 2022, Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó) a partir del 14 de diciembre de 2022, Litoral de San Juan (Vía Cementerio) a partir del 02 de febrero de 2023 y El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) a partir del 14 de abril de 2023.
- ✓ El proyecto en la Vía la Yesita – Managrú, Municipio de Cantón de San Pablo se completaron las actividades de lleno vibrado con material seleccionado para los cajeos laterales en la vía donde se requiere la ampliación y se avanza con la instalación de sub base granular, se realizaron excavaciones varias sin clasificar para la construcción de Alcantarilla y la construcción de la misma y se realizaron trabajos previos para la Construcción de pavimento, la aplicación de concreto e instalación de acero.
- ✓ El frente de mejoramiento de la vía que conduce desde el Municipio de Yuto – Ramal Samurindo completo las obras programadas para el proyecto como las actividades y observaciones realizadas por la interventoría. Este proyecto se encuentra en proceso de liquidación final.
- ✓ El contrato del municipio de Unguia presenta un retraso de en el avance

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

físico de la obra de un 8,23% por lo cual la interventoría a solicitado al contratista planes de contingencia para cumplir con el alcance del proyecto en los tiempos estipulados.

- ✓ La construcción de las pilas del puente sobre el rio capitán en Unguia se han visto afectadas por las lluvias que generan inundaciones sobre las áreas de trabajo.
- ✓ Para construcción del puente sobre el rio capitán en un Unguia se recomienda aumentar el personal de obra que tenga experiencia en este tipo de construcciones
- ✓ El proyecto del Municipio de El Carmen de Atrato completo las obras programadas para el proyecto como las actividades y observaciones realizadas por la interventoría. Este proyecto se encuentra en proceso de liquidación final.
- ✓ El frente de mejoramiento de la vía Cementerio del Municipio de Litoral de San Juan completo las obras programadas para el proyecto como las actividades y observaciones realizadas por la interventoría. Este proyecto inicia su proceso de liquidación final.



Miguel Angel Rodríguez Mantilla
Director de Interventoría
Consortio Incol - Urba

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

8 ANEXOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 1 Cajeo y lleno compactado del mismo.



Foto No. 2 Construcción de Alcantarilla.



Foto No. 3 Construcción de Alcantarilla.



Foto No. 4. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

<div>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div>CANTÓN DE SAN PABLO</div>		<div>CONSORCIO INCOL-URBA</div> <div>NIT 901609799-1</div>	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:		MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		1101 DE 2022	



Foto No. 5. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 6 Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 7 Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 8. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 9. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 10. Acopio de material de cantera.



Foto No. 11. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 12. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 13. Pavimentos en concreto hidráulico MR –42.



Foto No. 14. Construcción de Alcantarilla fundición de loza piso.



Foto No. 15. Pavimentos en concreto hidráulico MR –42.



Foto No. 16. Instalación de la Sub-base granular clase A.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 17. Construcción de Alcantarilla instalación de tubería.



Foto No. 18. Construcción de Alcantarilla instalación de tubería.



Foto No. 19. Construcción de Alcantarilla atraque de tubería.



Foto No. 20. Construcción de Alcantarilla instalación de acero.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 21. Construcción de Alcantarilla instalación de acero.



Foto No. 22. Construcción de Alcantarilla instalación de acero.



Foto No. 23. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 24. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 25. Instalación de la Sub-base granular clase A y nivelación topográfica.



Foto No. 26. Construcción de alcantarilla instalación de formaletas.



Foto No. 27. Construcción de alcantarilla instalación de formaletas.



Foto No. 28. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 29. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo e Instalación de la Sub-base granular clase A.



Foto No. 30. Construcción de alcantarilla.



Foto No. 31. Formateado para pavimentos en concreto hidráulico.



Foto No. 32. Construcción de alcantarilla.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 33. Pavimentos en concreto hidráulico MR –42.



Foto No. 34. Pavimentos en concreto hidráulico MR –42.



Foto No. 35. Pavimentos en concreto hidráulico MR –42.



Foto No. 36. Construcción de alcantarilla.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 37. Instalación de la Sub-base granular clase A.



Foto No. 38. Construcción de Alcantarilla excavación mecánica.



Foto No. 39. Construcción de Alcantarilla excavación mecánica.



Foto No. 40. Formateado para pavimentos en concreto hidráulico.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 41 Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 42. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 43. Toma de muestras de concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 44. Construcción de Alcantarilla fundición de concreto para muro y aletas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 45. Toma de muestras de concreto.



Foto No. 46. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 47. Instalación de la Sub-base granular clase A y nivelación topográfica.



Foto No. 48. Formateado para pavimentos en concreto hidráulico e instalación de acero.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 49. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.



Foto No. 50. Construcción de Alcantarilla lleno compactado.



Foto No. 51. Construcción de Alcantarilla excavación mecánica.



Foto No. 52. Construcción de Alcantarilla instalación de tubería.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	

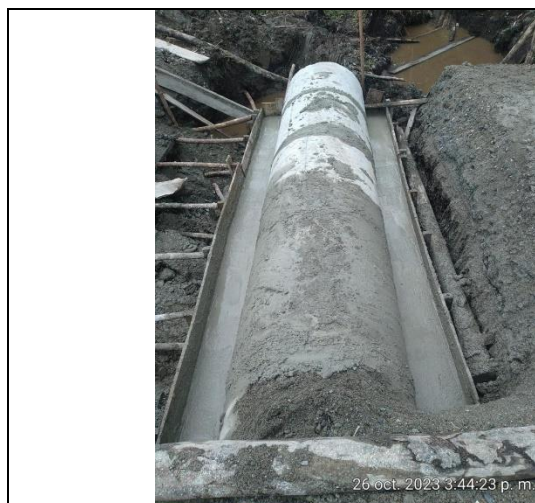


Foto No. 53. Construcción de Alcantarilla atracado de tubería.



Foto No. 54. Construcción de Alcantarilla instalación de acero.



Foto No. 55. Construcción de Alcantarilla instalación de acero.



Foto No. 56. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO		CONSORCIO INCOL-URBA NIT 901609799-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022	



Foto No. 57. Pavimentos en concreto hidráulico MR -42..



Foto No. 58 Toma de muestras de concreto hidráulico MR -42.

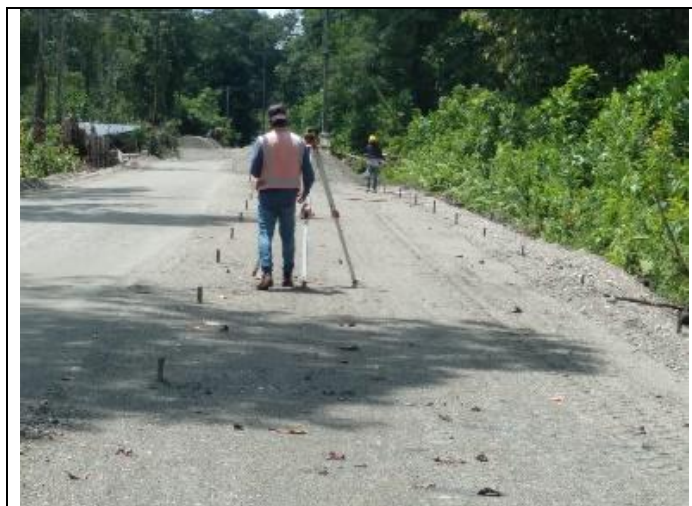


Foto No. 59. Instalación de la Sub-base granular clase A y nivelación topográfica.



Foto No. 60 Instalación de la Sub-base granular clase A y nivelación topográfica.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MUNICIPIO DE UNGUIA**

CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "Colombia Rural" Lote 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 1. Concreto para pila de cimentación río capitán



Foto No. 2. Concreto para pila de cimentación



Foto No. 3. Concreto para pilas de cimentación



Foto No. 4. Instalación de concreto para pilas de cimentación

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MUNICIPIO DE UNGUIA**

CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 5. Instalación de acero



Foto No. 6. Instalación de acero



Foto No. 7. Instalación de acero parilla inferior de la zapata



Foto No. 8. Instalación de acero para zapata

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MUNICIPIO DE UNGUIA**

CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 9. Instalación de acero para zapata



Foto No. 10. Instalación de acero para zapata



Foto No. 11. Limpieza de acero



Foto No. 12. Concreto para zapata

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MUNICIPIO DE UNGUIA**

CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 13. Vibrado del concreto



Foto No. 14. Instalación de concreto para zapata



Foto No. 15. Vaciado de concreto para zapata



Foto No. 16. Instalación de concreto para zapata

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MUNICIPIO DE UNGUIA**

**CONSORCIO INCOL-URBA
NIT 901609799-1**

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Chocó del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 17. Instalación de concreto para zapata



Foto No. 18. Instalación de concreto para zapata



Foto No. 19. Zapata lado norte del puente sobre el rio capitán



Foto No. 20. Zapata lado norte del puente capitán

	CONSORCIO INCOL-URABÁ NIT 901609799-1	
--	--	--

Contrato Interventoría No. 1101 DE 2022.
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vías
Terciarias En Los Municipios Del Departamento De Chocó Del Programa "Colombia Rural" Lote 15.
Informe Mensual de Interventoría No 10.

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

8.1.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CSIU-INV-063	Radicación PAGA Unguía	04 de octubre de 2023
CSIU-INV-064	Aprobación Prorroga 3 Unguía	31 de octubre de 2023
