

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA


•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realiza actividades instalación de rieles, armado de acero de refuerzo y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 13.04% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a \$1.263.797.847 Vs un porcentaje acumulado programado del 34.37% correspondiente a \$3.331.037.731 reflejando un atraso del 21.33%, se deja constancia que hay ítems que superan las cantidades contractuales de las cuales se obtiene un porcentaje ejecutado del 15.89%, de acuerdo a la reprogramación entregada ajustada con la fecha de reinicio N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realiza actividades instalación de rieles para fundida de placa huella, excavación manual para vigas riostra, fundida de placa de concreto y fundida de piedra pegada.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la vía.

PAGINA 1-4
7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

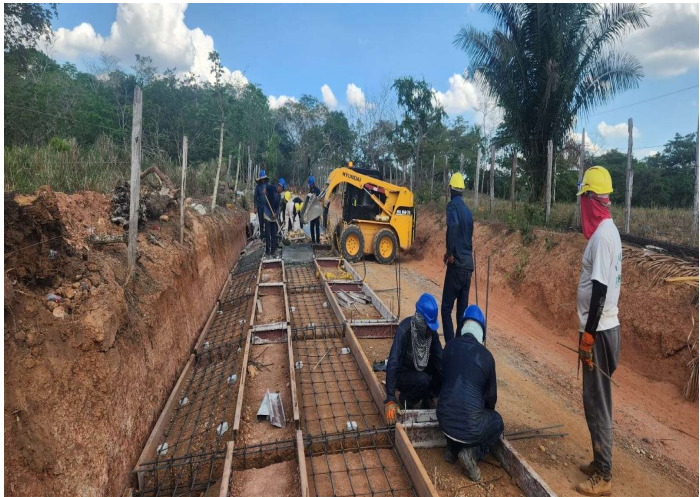

Se evidencia fundida de placas de concretos entre abscisas K2+340



Se evidencia Armado de acero de refuerzo para pilotes del puente



Se evidencia conformacion de taludes en tramo de via sobre la abscisa K1+680



Se evidencia adecuacion de desvio para la construccion del puente

 Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA				VERSIÓN 1							
					CODIGO DEL PROCESO:							
FECHA DE PRESENTACION		lunes, 1 de mayo de 2023		PAGINA 3-4		SEMANA No.		23	DEL	24/04/2023	AL	30/04/2023



27/04/2023 12:06:11 p. m.
K2+740
#Via a vereda Maracayo, municipio de Montería


Se evidencia relleno con material de sub base en abcisa k2+740



27/04/2023 10:06:58 a. m.
K1+780
#Via a vereda Maracayo, municipio de Montería

Se evidencia excavacion con maquina sobre la abcisa k1+780

FIRMA



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

PAGINA 4-4
