

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA



21/08/2023 – 27/08/2023

CONTRATO DE OBRA CO1_PCCNTR_5116115

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. INFORMACIÓN GENERAL
3. ALCANCE DEL PROYECTO
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO
5. EQUIPO DE TRABAJO
6. TIEMPO DE TRABAJO

INTRODUCCION

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía No. ICBF – SAMC – 002 – 2023 – BOG, convocó: “REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KRA. 30 NO. 12 – 35” de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales.

Como resultado del proceso, el Comité evaluador el día 22 de junio de 2023, seleccionó al CONTRATISTA CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA, para la ejecución de la obra.

En el presente informe se evidencian las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 21 de Agosto al 27 de Agosto del año 2023 correspondiente al contrato de obra No. CO1_PCCNTR_5116115, en el presente documento se consignan los aspectos técnicos y financieros de la ejecución del proyecto en mención.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1_PCCNTR_5116115
CONTRATANTE:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KRA. 30 NO. 12 – 35
UBICACIÓN:	KRA. 30 NO. 12 - 35
CONTRATISTA:	CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA
NIT:	901.727.341 – 6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 362.962.178
PLAZO INICIAL CONTRATO:	Sesenta (60) dias
FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA:	11 de julio de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	8 de septiembre de 2023
PERÍODO DEL INFORME:	21 de agosto al 27 de agosto de 2023

ALCANCE DEL PROYECTO

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Desmonte de impermeabilización de cubiertas en cualquier material. INCLUYE: Equipos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	580.00	\$ 28,312.50	\$ 16,421,250.00
1.2	Demolición cielo raso en cualquier material, INCLUYE: Equipos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	30.00	\$ 109,738.12	\$ 3,292,143.53
1.3	Retiro de escombros, incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	18.00	\$ 105,599.34	\$ 1,900,788.12
	SUB TOTAL				\$ 21,614,181.65
2	MUROS Y ACABADOS				
2.1	Cielo raso falso en lámina de drywall de 12mm terminado. INCLUYE: Equipos, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	100.00	\$ 103,007.67	\$ 10,300,767.00
	SUB TOTAL				\$ 10,300,767.00
3	CUBIERTAS				
3.1	Impermeabilización cubiertas (Bicapa de manto asfáltico de 6,2 mm)	M2	580.00	\$ 196,782.11	\$ 114,133,625.42
3.2	Cielo raso en acrílico de 60*1.20 m	UND	6.00	\$ 161,568.00	\$ 969,408.00
3.3	Flanche en lámina galvanizada	ML	60.00	\$ 84,371.25	\$ 5,062,275.00
3.4	Limpieza y mantenimiento de canales y bajantes	ML	190.00	\$ 24,462.00	\$ 4,647,780.00
3.5	Desmonte de remate de teja de zinc (Cara laterales fachada occidental)	ML	21.16	\$ 23,442.75	\$ 496,048.59
3.6	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Cal. 20; DS=25 Tipo A. INCLUYE: accesorios de anclaje y tapas laterales Fachada occidental	ML	21.16	\$ 84,371.25	\$ 1,785,295.65
3.7	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Cal. 20; DS=25 Tipo B. INCLUYE: accesorios de anclaje y tapas laterales Fachada occidental	ML	48.00	\$ 88,901.25	\$ 4,267,260.00
3.8	Suministro de andamios certificados, altura 14. (6 secciones de 2m)	SEM	14.00	\$ 526,680.00	\$ 7,373,520.00
3.9	Profesional SISOMA: Con experiencia como Asesor SISO y/o Residente SISO, y/o Coordinador SISO y/o Coordinador de salud ocupacional y/o de Riesgo SST en un (1) contrato cuyo objeto sea construcción, ampliación o mantenimiento de cubiertas. Debe tener curso de alturas certificado vigente.	GLB	1.00	\$ 3,771,225.00	\$ 3,771,225.00
	SUB TOTAL				\$ 142,506,437.66

VALOR TOTAL DIRECTO			\$	174,421,386.31
A.I.U	ADMINISTRACIÓN	15%	\$	26,163,207.95
	IMPREVISTOS	5%	\$	8,721,069.32
	UTILIDAD	5%	\$	8,721,069.32
	IVA (19% UTILIDAD)	19%	\$	1,657,003.17
VALOR TOTAL			\$	219,683,736.06

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA				
1.1	Pintura interior tipo 1. INCLUYE: 3 manos de pintura, filos, dilataciones y resanes, andamios y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	M2	800.00	\$ 29,280.79	\$ 23,424,630.00
1.2	Aplicación de Impermeabilizante acrílico en muros, para tanque subterráneo, (2) manos de imprimación de producto. INCLUYE: Todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	45.00	\$ 73,612.50	\$ 3,312,562.50
	SUB TOTAL				\$ 26,737,192.50

VALOR TOTAL DIRECTO			\$	26,737,192.50
A.I.U	ADMINISTRACION	15%	\$	4,010,578.88
	IMPREVISTOS	5%	\$	1,336,859.63
	UTILIDAD	5%	\$	1,336,859.63
IVA (19% UTILIDAD)				
VALOR TOTAL			\$	33,675,493.95

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PISOS Y MUEBLE DE COCINA					
1.1	Demolición de enchapes de piso y muro. INCLUYE: Herramienta necesaria para la actividad	M2	60.00	\$ 25,579.10	\$ 1,534,745.88
1.2	Demolición de mesón corrido. INCLUYE: Retiro de material sobrante. Herramienta necesaria para la actividad	UND	1.00	\$ 1,223,100.00	\$ 1,223,100.00
1.3	Retiro de escombros, incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	2.00	\$ 105,599.34	\$ 211,198.68
SUB TOTAL					\$ 2,969,044.56
2 MUROS Y ACABADOS					
2.1	Suministro e instalacion de enchape ceramico para muros 25x43 cm color a eleccion acabado brillante. INCLUYE pegante ceramico, emboquillado, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	M2	60.00	\$ 78,661.19	\$ 4,719,671.10
2.2	Suministro e instalacion de mesón para cocina en acero inoxidable cal. 16. L=1.80 m con salpicadero. Incluye todo lo necesario para su instalación.	UND	1.00	\$ 3,564,000.00	\$ 3,564,000.00
SUB TOTAL					\$ 8,283,671.10

VALOR TOTAL DIRECTO			\$	11,252,715.66
A.I.U	ADMINISTRACIÓN	15%	\$	1,687,907.35
	IMPREVISTOS	5%	\$	562,635.78
	UTILIDAD	5%	\$	562,635.78
	IVA (19% UTILIDAD)	19%	\$	106,900.80
VALOR TOTAL			\$	14,172,795.37

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HIDROSANITARIO					
1.1	Demoliciones de enchapes de piso y muro. INCLUYE herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	M2	60.00	\$ 25,579.10	\$ 1,534,745.88
1.2	Desmonte de lavamanos y sanitarios (Inc. Retiro de sobr.) Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion	UND	12.00	\$ 44,406.46	\$ 532,877.49
1.3	Demolicion pañetes (Inc. Retiro de sobr.) Incluye equipos, herramientas y todo los elementos necesarios para su correcta ejecucion.	M2	24.00	\$ 19,736.08	\$ 473,665.86
1.4	Demolicion cielo raso falso (Inc. Retiro de sobr.) Incluye equipos, herramientas y todo los elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	24.00	\$ 109,738.12	\$ 2,633,714.82
1.5	Retiro de escombros, incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	3.00	\$ 105,599.34	\$ 316,798.02
SUB TOTAL					\$ 5,491,802.07
2 MUROS Y ACABADOS					
2.1	Cielo falso en lamina de drywall 12 mm terminado. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	M2	24.00	\$ 103,007.67	\$ 2,472,184.08
2.2	Suministro e instalacion de enchape ceramico para muros 25x43 cm color a eleccion acabado brillante incluye pregante ceramico, emboquillado, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	M2	60.00	\$ 78,661.19	\$ 4,719,671.10
2.3	Suministro e instalacion de combo san giorgio blanco (sanitario y lavamanos) o similar.incluye tubería y todos los accesorios, equipos y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	UND	12.00	\$ 1,108,612.18	\$ 13,303,346.13
2.4	Suministro e instalacion de orinal blanco tipo institucional. Incluye tubería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	UND	4.00	\$ 267,270.00	\$ 1,069,080.00
SUB TOTAL					\$ 21,564,281.31
3 INST. HIDROSANITARIAS					
3.1	Suministro e instalacion de acometida pvc agua potable ø 1" (Inc. Accesorios)	ML	100.00	\$ 63,360.00	\$ 6,336,000.00
3.2	Acometida pvc desagües de 3" (Inc. Accesorios)	ML	60.00	\$ 128,700.00	\$ 7,722,000.00
3.3	Diagnostico (peritaje) hidrosanitario, para hallar soluciones especificas de fugas en alojamientos usados para internamiento preventivo, correspondencia cespa, dos baños y un archivo ubicados en fiscalia	GLB	1.00	\$ 138,600.00	\$ 138,600.00
SUB TOTAL					\$ 14,196,600.00

VALOR TOTAL DIRECTO			\$	41,252,683.38
A.I.U	ADMINISTRACIÓN	15%	\$	6,187,902.51
	IMPREVISTOS	5%	\$	2,062,634.17
	UTILIDAD	5%	\$	2,062,634.17
	IVA (19% UTILIDAD)	19%	\$	391,900.49
VALOR TOTAL			\$	51,957,754.72

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INST. ELECTRICAS PRELIMINARES					
1.1	Demolicion pafietes (Inc. Retiro de sobr.) Incluye equipos, herramientas y todo los elementos necesarios para su correcta ejecucion.	M2	12.00	\$ 19,736.08	\$ 236,832.93
1.2	Demolicion cielo raso falso (Inc. Retiro de sobr.) Incluye equipos, herramientas y todo los elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	12.00	\$ 109,738.12	\$ 1,316,857.41
1.3	Retiro de escombros, incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	2.00	\$ 105,599.34	\$ 211,198.68
SUB TOTAL					\$ 1,764,889.02

2 INST. ELECTRICAS					
2.1	Suministro, instalacion de salida de iluminacion promedio 6 m de longitud, incluye tubería tipo e.m.t., interruptor, resanes. Conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizada y accesorios. Incluye accesorios, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	UND	12.00	\$ 159,625.88	\$ 1,915,510.50
2.2	Suministro e instalacion de tablero de 12 circuitos bifasico con puerta, incluye breakers, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	UND	1.00	\$ 891,000.00	\$ 891,000.00
2.3	Suministro e instalacion panel tipo led 60x60 cm de 48w, 120 voltios incluye accesorios, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	UND	12.00	\$ 125,524.04	\$ 1,506,288.42
2.4	Suministro e instalacion de acometida eléctrica 1#12 + 1#12 + 1#12ten cable awg thhn desde tablero de distribucion por tubería existente. Incluye bkeaker 2x30 amperios, conectores roscados y accesorios.	ML	60.00	\$ 35,244.00	\$ 2,114,640.00
2.5	Realizar el levantamiento en planos de las instalaciones electricas en formato autocad, que incluya los equipos eléctricos e iluminación, planos unifilares, planos de salidas eléctricas normales, reguladas, iluminación, tableros, tipos de conductores de circuitos y ducteria, acometida principal, planta eléctrica, ups, cuadros de carga. Incluye la identificación y marquillado de salidas y tableros eléctricos, uso de equipo trazador e identificador de acometidas.	UND	1.00	\$ 693,000.00	\$ 693,000.00
SUB TOTAL					\$ 7,120,438.92

VALOR TOTAL DIRECTO			\$	8,885,327.94
A.I.U	ADMINISTRACION	15%	\$	1,332,799.19
	IMPREVISTOS	5%	\$	444,266.40
	UTILIDAD	5%	\$	444,266.40
	IVA (19% UTILIDAD)	19%	\$	84,410.62
VALOR TOTAL			\$	11,191,070.54

ITEM NRO.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 CARPINTERIA METALICA (PRELIMINARES)					
1.1	Desmonte de puerta de dos hojas, incluye herrameintas y equipos necesarios.	UND	1.00	\$ 139,561.37	\$ 139,561.37
1.2	Retiro de escombros, incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	1.00	\$ 105,599.34	\$ 105,599.34
SUB TOTAL					\$ 245,160.71
2 CARPINTERIA EN MADERA O ALUMINIO					
2.1	Puerta de dos hojas en aluminio y vidrio templado de 6mm, 2x2.10m, INCLUYE: Cierra puerta hidraulico ajustable hasta 80 kg en ambas hojas. Marco, accesorios y herramientas para su instalacion.	UND	1.00	\$ 5,148,000.00	\$ 5,148,000.00
2.2	Suministro e instalacion de reja metálica de seguridad en varilla cuadrada lisa de 1/2 " en reticula de 10x25 cm, incluye anticorrosivo y pintura, equipos y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	M2	12.00	\$ 425,700.00	\$ 5,108,400.00
SUB TOTAL					\$ 10,256,400.00

3	PALOMAS				
2.1	Suministro e instalación de malla liviana tipo gallinero no superior a 1 cm para la ventanera de fachadas exteriores e interiores y en espacios de cubierta por donde los vectores puedan acceder a la edificación (incluye personal calificado, equipos y toda herramienta necesaria para la correcta instalación).	M2	200.00	\$ 128,700.00	\$ 25,740,000.00
SUB TOTAL					\$ 25,740,000.00
VALOR TOTAL DIRECTO					\$ 36,241,560.71
A.I.U	ADMINISTRACION		15%		\$ 5,436,234.11
	IMPREVISTOS		5%		\$ 1,812,078.04
	UTILIDAD		5%		\$ 1,812,078.04
	IVA (19% UTILIDAD)		19%		\$ 344,294.83
VALOR TOTAL					\$ 45,646,245.72

DOCUMENTOS SUSCRITOS

Dentro de los documentos suscritos con el Instituto de Bienestar familiar, contratante del proyecto; se tienen los siguientes:

- Contrato de Obra.
- Acta de inicio Contrato de Obra.
- Pólizas aprobadas Contrato de Obra.

A continuación, se presenta el estado actual de las garantías de los contratos que hacen parte del proyecto.

Contrato de Obra – Seguros del estado S.A.


Póliza de Cumplimiento No. 15-44-101281700


Póliza R.C. No 15 -40 - 101088077

Las Pólizas legalizadas por el Contratista de Obra hasta la fecha son las de la firma del Contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

En el periodo transcurrido desde el día 21 de agosto hasta el 27 de agosto referenciamos desarrollo de diferentes actividades tanto constructivas como, ajustes a presupuestos y diseños dentro de las cuales se encuentra:

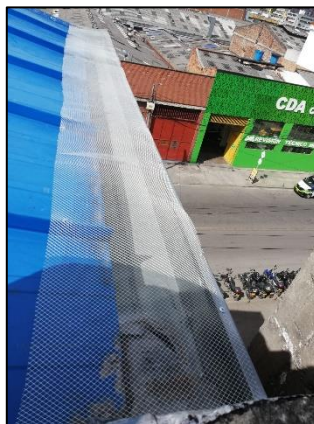

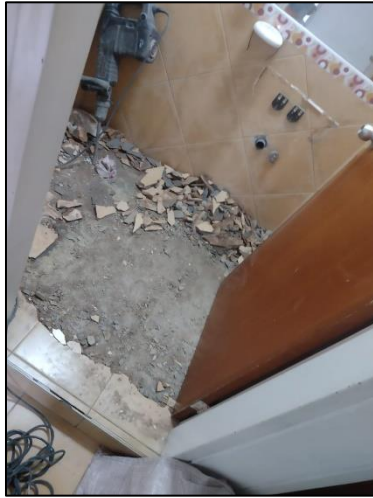



En la séptima semana de obra comprendida del 21 al 27 de agosto se trabaja en las siguientes actividades:

- PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN MUROS PARA TANQUE SUBTERRANEO, CON DOS MANOS DE IMPRIMACION DEL PRODUCTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.
- DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SAN GIORGIO BLANCO (SANITARIO Y LAVAMANOS) O SIMILAR. INCLUYE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC AGUA POTABLE Ø 1" (INC. ACCESORIOS)
- ACOMETIDA PVC DESAGUES DE 3" (INC. ACCESORIOS)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA LIVIANA TIPO GALLINERO NO SUPERIOR A 1 CM PARA LA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES Y EN ESPACIOS DE CUBIERTA POR DONDE LOS VECTORES PUEDAN ACCEDER A LA EDIFICACIÓN (INCLUYE PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS Y TODA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3, ESPESOR PROMEDIO 3 CM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO O PARED FORMATO A ELEGIR (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
- TRASIEGO DE EQUIPOS A PUNTO DE ACOPIDO DESTINADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ICBF
- MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TANQUES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES Y QUE GENERAN DETERIORO EN LAS ESTRUCTURAS (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO)

EQUIPO DE TRABAJO

Para el periodo entre el 21 al 27 de agosto de 2023 se contó con el siguiente personal obra:

SEMANA 7		DIA						
		42	43	44	45	46	47	48
NOMBRE	CARGO	21/8/2023	22/8/2023	23/8/2023	24/8/2023	25/8/2023	26/8/2023	27/8/2023
JORGE DAVID GONZALEZ MARTINEZ	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X	X	DOMINGO
HECTOR IVAN PARDO MORENO	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	
PEÑA RUIZ YEISON	INSPECTOR DE OBRA		X	X	X	X	X	
OSCAR ALIRIO MELO	MAESTRO (ALTURAS)	X	X	X	X	X	X	
DANIEL URIANA	OFICIAL (ALTURAS)		X	X	X	X	X	
ROBINSON REAL REAL	OFICIAL PINTURA (ALTURAS)		X	X	X	X	X	
JORGE MARIO TANGARIFE ALZATE	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
LUIS MAURICIO PACHON BARRIGA	OFICIAL		X	X	X	X	X	
ARMANDO BOSCAN	AYUDANTE		X	X	X	X	X	
VICTOR ERNESTO BOHORQUEZ CAMPOS	PROFESIONAL DE IMPERMEABILIZACION		X			X		
MEYER YESID PARRADO DIAZ	OFICIAL INSTALADOR DE IMPERMEABILIZACION		X			X		
NESTOR ROMERO	OFICIAL LAVADO DE TANQUES				X			
BRAYAN USAQUEN	OFICIAL LAVADO DE TANQUES				X			

TIEMPO DE TRABAJO

JORNADAS DE TRABAJO

Se estableció la jornada de trabajo de la siguiente forma para favorecer el rendimiento diario de las actividades y la optimización de la jornada de los sábados distribuida entre semana de la siguiente forma:

Lunes – Viernes:

Ingreso: 7:00 am

Salida: 5:00 pm

Sábado:

Ingreso: 7:00 am

Salida: 12:00 m.

Como complemento de los trabajos a ejecutar se pretende realizar trabajos en horarios adicionales después la jornada para adelantar atrasos generados en el periodo en un horario de 7:00 AM y un horario de 7:00 PM entre semana SABADOS, DOMIGOS Y FESTIVOS se realizarán trabajos como plan de contingencia.
