

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato: \$ 3.266.051.722,92

Valor aportado por el Municipio: \$ 3.266.051.722,92

Plazo de Ejecución: 12

Fecha de Inicio: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de Terminación: 17 DE FEBRERO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 45 Fecha de informe: De 18/12/2023 24/12/2023


INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 45	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 3.266.051.722,92	% Programado	82,00%	2,40%	84,40%	300
Valor Adicional:	\$ 438.224.588,16	% Ejecutado	82,00%	2,00%	84,00%	300
Valor Total:	\$ 3.266.051.722,92	Diferencia	0,00%	-0,40%	-0,40%	
Fecha de Inicio	27 DE DICIEMBRE DE 2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1	20 OCTUBRE DE 2023	Programado(%)	\$ 2.678.162.412,79	\$ 78.385.241,35	\$ 2.756.547.654,14	84,40%
Prorroga a la suspension N.1	20 NOVIEMBRE DE 2023	Ejecutado (%)	\$ 2.678.162.412,79	\$ 65.321.034,46	\$ 2.743.483.447,25	84,00%
Prórroga N°1 :	3 MESES	Diferencia	\$ 0,00	-\$ 13.064.206,89	\$ (13.064.206,89)	-0,40%
Plazo actualizado:	26 DE OCTUBRE 2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Prórroga N° 2 :	2 MESES					
Plazo actualizado:	17 DE FEBRERO DE 2023					
Fecha de reinicio:	11 DE DICIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	\$ 99.965.191,67	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 356.261.026,66					
Fecha de Inicio	27 DE DICIEMBRE DE 2022					
Suspensión N° 1	20 DE OCTUBRE DE 2023	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Prorroga a la suspension N.2	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :	3 MESES	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	26 DE OCTUBRE 2023	Normas ambientales			Interventoría	SI
Prorroga N.2	2 MESES					
Plazo actualizado:	17 DE FEBRERO DE 2023					
Fecha de reinicio:	11 DE DICIEMBRE DE 2023					

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se continua con muro de cerramiento, pintura en aerosol, pintura tanque elevado, suministro e instalacion de puertas y ventanas, cajas en mamposteria, instalaciones hidrosanitarias y electricas.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Se continúan con acabados, instalaciones eléctricas, tubería para aguas lluvias, instalaciones hidrosanitarias.	Se continúa con pintura, estuco, acabados finales, suministros.

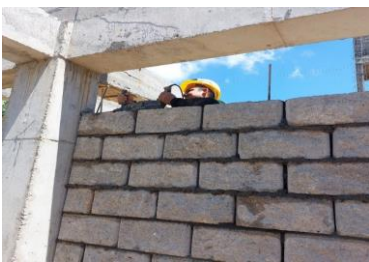

LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN

OBSERVACIONES		
Elaborado por: FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	Revisado y Aprobado por: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 25/12/2023
INTERVENTORIA	SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01
