

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL				
Página: 1 de 1		DÍA	15	MES	12	AÑO	2022	
SEMANA N°	24	DEL	8 de diciembre de 2022		AL	14 de diciembre de 2022		
FECHA INICIO :		1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :		31 de diciembre de 2022			
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN							
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES			NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA			NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO				
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA		PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS		
PRELIMINARES		3,830%	3,830%	EXCAVACIONES REDES HIDROSANITARIAS CON Y SIN RETIRO				
CIMIENTOS		0,490%	0,490%					
PISOS-BASES-RELLENOS		0,480%	0,470%					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		0,510%	0,640%					
INSTALACIONES HIDRÁULICAS		2,680%	2,675%					
INSTALACIONES ELECTRICAS		0,100%	0,100%					
OBRAS EXTERIORES		27,780%	27,780%	TERMINAN CON PUESTOS DE COMBATE, CONTINUAN CON MUROS DE CONEXIÓN, ANDENES Y CUNETAS				
BM-26 BASES MILITARES		31,450%	31,170%	SE CONTINUA TRABAJOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA, DE CUBIERTA Y DE PISOS				
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES		4,670%	4,670%	SE CONTINUA CON TRASIEGO DE MATERIALES				
TOTALES		71,99%	71,83%	Semana Anterior		68,24%		
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.		VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO	
		3.525.659.318,55	2.532.304.805,55	993.354.513,00		3,58%	71,83%	
IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA				V.ESTADO DEL TIEMPO				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-					
INGENIEROS	1,0	OBREROS	5,0					
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	11,0					
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO								

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1

DÍA

15

MES

12

AÑO

2022

SEMANA N°

24


DEL

8 de diciembre de 2022

AL

14 de diciembre de 2022

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

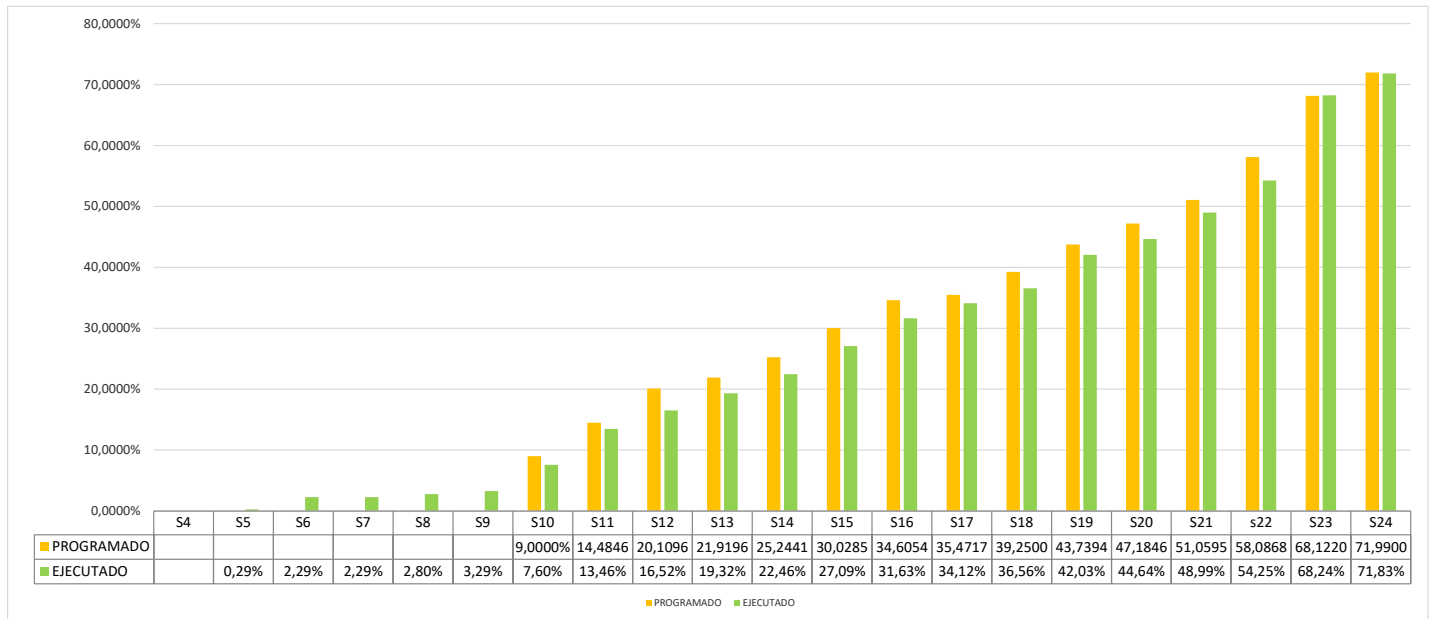

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

EL contratista continua con el Trasiego de Materiales a la parte alta de la Montaña.
 El contratista continua con trabajos de Modulares en campo (instalacion de estructuras, pisos y cubiertas)
 El contratista Continua con Fundicion de Andenes en concreto
 El contratista Finaliza en su Totalidad Puestos de Combate
 El contratista Continua con Muros de conexión en sitio, REALIZANDO DE MANERA MANUAL MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA ESTE MURO (esta actividad en adelante se tomara tiempo por la magnitud de movimientos de material de relleno para el Muro) ya se tienen todos los Modulos en Malla Armados en sitio
 Se presentaron fuertes Lluvias y Vientos que complicaron algunas actividades
 Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra
 El Contratista continúa con trabajo de taller de Muros de Modulares
 El contratista solicito a la interventoria Solicitud de Prorroga al contrato con soportes y analisis de tiempos en Transporte vertical de Materiales, problemas de seguridad para el ingreso de vehiculos de carga y por Movimientos de tierra de forma Manual (por que no se presento el apoyo Aereo para el ingreso de Equipo Mecanico tipo Bobcat), la Interventoría evalúa y avala la solicitud, por lo cual tramita la solicitud ante la entidad contratante mediante comunicación CENAC-ARGELIA-039-2022-C.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión: 14/12/2022		Página:	
SEMANA N°		24	DEL	8 de diciembre de 2022			AL	14 de diciembre de 2022
FECHA INICIO :		1/07/2022		FECHA TERMINO :		31/12/2022		
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN						
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES				NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-CODE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA				NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-CODE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MUROS CONEXIÓN	



Fotografía 2

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MUROS CONEXIÓN	



Fotografía 3

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
PUESTOS COMBATE	



Fotografía 4

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
CUBIERTA Y PISOS MODULARES	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			INFORME SEMANAL				
Código:		Versión:		Fecha de Emisión: 14/12/2022		Página:	
SEMANA N°		24 DEL		8 de diciembre de 2022		AL 14 de diciembre de 2022	
FECHA INICIO :		1/07/2022		FECHA TERMINO :		31/12/2022	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN					
INTERVENTOR		NESTOR ROJAS TORRES		NIT O C.C.		3249514	
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS ARGELIA		NIT O C.C.		901.585.221-1	
				CONTRATO N°		No 164-CODE-DICRE CENACINGENIEROS-2022	
				CONTRATO N°		163-CODE-DICRE- CENACINGENIEROS-2022	
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO							
<div></div>							
Fotografía 5							
UBICACIÓN: Base Argelia							
COMENTARIOS:							
CUBIERTA Y PISOS MODULARES							
